



**IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI
PLANA POSLOVANJA ZA PERIOD
01.01. – 31.12.2024. GODINE**

Sarajevo; mart/ožujak 2025.

SADRŽAJ

	Strana
U V O D	3
A. I JAVNI PRIHODI	6
A. II AMORTIZACIJA	10
B. I JAVNI RASHODI	11
1. Troškovi poslovanja	12
2. Služba „Pomoć-informacije na cestama“	14
3. Redovno održavanje	16
4. Rezervirana sredstva za rizike, neplanirane rashode i rashode koji ne terete projekte	25
5. Rezervirana sredstva za sudske presude	25
6. Troškovi konsultantskih usluga	26
7. Kamate	28
B. II TROŠKOVI AMORTIZACIJE	31
C. INVESTICIJE	32
1. Nabavka stalnih sredstava	33
2. Program „Modernizacija cesta u F BiH“	35
3. Projekti JP Ceste F BiH	39
4. Eksproprijacija i elaborati eksproprijacije	73
5. Projekti finansirani iz Budžeta FBiH	75
6. Sufinansiranja sa drugim nivoima vlasti	78
D. PLAN ODJELA JAVNE NABAVKE	80
E. PRAVNI I KADROVSKI POSLOVI	80

U V O D

Izvještaj o realizaciji Plana poslovanja Javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: JP Ceste F BiH) za period 01.01.- 31.12.2024. sačinjen je u skladu sa Zakonom o cestama F BiH, Zakonom o javnim preduzećima u F BiH, Statutom JP Ceste F BiH, Pravilnikom o računovodstvu i Računovodstvenim politikama JP Ceste F BiH usuglašenim sa važećim Međunarodnim računovodstvenim standardima (u daljem tekstu MRS) i Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (u daljem tekstu MSFI) u mjeri u kojoj je to moguće, te u skladu sa specifičnostima poslovanja i pravnog statusa JP Ceste F BiH. Osnovna djelatnost JP Ceste F BiH je upravljanje, građenje, rekonstrukcija, održavanje i zaštita magistralnih cesta.

JP Ceste F BiH su svoje aktivnosti fokusirale na održavanje magistralnih cesta, koje uključuje radove redovnog i zimskog održavanja, aktivnosti vezane za Program „Modernizacija cesta u F BiH“, započete projekte u prethodnom periodu, pribavljanje dokumentacije i dozvola za projekte koji će se raditi, eksproprijaciju i druge aktivnosti vezane za poslovanje JP Ceste F BiH.

Organi JP Ceste F BiH, u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima u F BiH, Zakonom o cestama F BiH i Statutom JP Cesta F BiH su:

- Skupština,
- Nadzorni odbor i
- Uprava, kao organi upravljanja, i
- Odbor za reviziju, kao poseban organ.

Ovlaštenja Skupštine JP Ceste F BiH obavlja Osnivač, odnosno Vlada F BiH.

Nadzorni odbor imenuje i razrješava Skupština JP Cesta F BiH na prijedlog Osnivača. Isti se sastoji od pet članova i imenuje se po propisanoj zakonskoj proceduri.

Upravu JP Ceste F BiH čine tri člana: direktor i dva izvršna direktora.

Plan poslovanja JP Ceste F BiH za 2024. godinu urađen je na osnovu Zakona o cestama u F BiH, Zakona o javnim preduzećima u F BiH, Statuta JP Ceste F BiH i Smjernica za izradu Plana poslovanja za 2024. godinu Federalnog ministarstva prometa i komunikacija. Nadzorni odbor je usvojio Plan poslovanja za 2024. godinu Odlukom broj 01-03.2 NO-11883-2/23 04.01.2024. godine, a Vlada Federacije BiH je dala suglasnost na navedeni Plan Odlukom V broj 476/2024 od 28.03.2024. godine, dok je Skupština donijela Odluku o potvrđivanju Odluke o davanju suglasnosti na Plan poslovanja broj 01-03.2 SK-2254-3/24 od 11.04.2024. godine.

Prateći realizaciju Plana poslovanja, Uprava JP Ceste F BiH se odlučila na izradu Rebalansa Plana poslovanja za 2024. godinu (u daljem tekstu: „Rebalans Plana“) zbog određenog povećanja javnog prihoda, prvenstveno od nafte i naftnih derivata, povećanja rashoda, izmjena na aktivnostima i planiranim budžetima pojedinih projekata u investicijama, te sanacije cestovne infrastrukture nakon poplava koje su pogodile Hercegovačko-neretvanski kanton 04.10.2024. godine. Nadzorni odbor je usvojio Rebalans Plana poslovanja za 2024. godinu Odlukom broj 01-03.2 NO-9529-2/24 dana 30.10.2024. godine, a Vlada Federacije BiH je dala suglasnost na navedeni Rebalans Plana Odlukom V broj 2011/2024 od 19.12.2024. godine, dok je Skupština donijela Odluku o potvrđivanju Odluke o davanju suglasnosti na Rebalans Plana poslovanja broj 01-03.2 SK-11081-3/24 od 30.12.2024. godine.

U obavljanju poslova i zadataka na magistralnim cestama zakonom predviđenih aktivnosti, JP Ceste F BiH posebnu pažnju usmjeravaju na ispunjavanju potreba korisnika, zaštitu dobara, zaštitu dobra od općeg javnog interesa i na zaštitu okoline.

Prioriteti JP Ceste F BiH odnose se na održavanje magistralnih cesta koje uključuje radove redovnog i zimskog održavanja cesta i objekata, dok su investiciona ulaganja usmjerena na aktivnosti vezane za okončanje Programa „Modernizacija cesta F BiH“, tj. završetak ranije započetih projekata, eliminaciju najštećenijih dijelova kolovoza, sanaciju klizišta i crnih tačaka, sistema za odvodnju, sanaciju cestovnih objekata i sanaciju cestovnih škarpi, kosina i zasjeka, projekte sigurnosti na magistralnim cestama (semaforizacija raskrsnica, izrada traka za lijeva skretanja), projekte izgradnje na magistralnim cestama, eksproprijaciju, poboljšanje građevinskih elemenata na složenim čvorištima i priključcima i izradu projektne dokumentacije.

Program „Modernizacija cesta u FBiH“ se najvećim dijelom financira iz kredita međunarodnih razvojnih banaka, a dijelom i vlastitim sredstvima JP Ceste F BiH. Odobreni krediti za podršku Programu „Modernizacija cesta u FBiH“ su:

1. Europska investicijska banka (EIB), kredit br. 82137 – 50 mil. EUR
2. Svjetska banka (WB), Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD), kredit br. 8640 – 58 mil. EUR
3. Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD), kredit br. 47461 – 65 mil. EUR.

Krajnji rok raspolaganja sredstvima kredita Međunarodne banke za obnovu i razvoja (IBRD) bio je 30.09.2023. Amandmanom br.1 na Financijski ugovor između BiH i EIB krajnji rok raspolaganja sredstvima kredita EIB bio je do 23.02.2023. Dakle, 2023. godina bila je posljednja godina realizacije projekata iz Programa koje samostalno i/ili zajednički financiraju EIB i IBRD.

U 2024. godini nastavljena je realizacija određenih projekata koji se financiraju iz kredita Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD). Krajnji rok raspolaganja sredstvima kredita Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) bio je 13.01.2024. godine. Međutim, II tranša kredita efektivna je tek od prvog kvartala 2022. godine, a ista obuhvata izgradnju novih dionica magistralnih cesta i obilaznica oko gradova sa dužim periodom građenja. Na početak implementacije istih najveći uticaj je imao dug i složen proces rješavanja imovinsko-pravnih pitanja i pribavljanja odobrenja za građenje. Praćenjem implementacije ovih projekata, očekivane nabavke radova i potrebnih sredstava za financiranje radova JP Ceste F BiH, je procijenilo da je neophodno produženje krajnjeg roka raspolaganja kreditom EBRD i realokacija sredstava između kategorija obuhvaćenih kreditom. Europskoj banci za obnovu i razvoj je, putem Ministarstva financija i trezora, u septembru 2023. dostavljen zahtjev za produženje krajnjeg roka raspolaganja sredstvima kredita do 30.09.2025. godine i za realokaciju iznosa između kategorija obuhvaćenih ovim kreditom u cilju potpune realizacije i ostvarenja ciljeva Projekta. EBRD je 18.01.2024. dostavio saglasnost na produženje krajnjeg datuma raspolaganja sredstvima kredita do 30.09.2025. i 02.02.2024. je dostavio obavijest o realokaciji 1,00 EUR sa kategorije konsultantskih usluga na kategoriju radova u okviru Tranše 2.

U 2024. godini 6-mjesečni EURIBOR-a ima tendenciju laganog pada od početka juna kada je iznosio 3,75 % u odnosu na period januar-maj 2024. kada se kretao između 3,9% i 3,8%, odnosno 4% početkom decembra 2023. godine. Međutim, potrebno je napomenuti da na promjenljivu kamatnu stopu međunarodne financijske institucije dodaju i utvrđene fiksne raspone. Kredit Svjetske banke za „Rehabilitaciju cesta u FBiH“ je odobren u Specijalnim pravima vučenja (SDR), te se kod istog javlja i obračun kursnih razlika.

JP Ceste F BiH su pripremile prijedlog četverogodišnjeg „Investicionog programa za izgradnju, rekonstrukciju i rehabilitaciju magistralnih cesta u F BiH“ za koji je Vlada F BiH usvojila informaciju i donijela Zaključak V broj: 1523/23 od 20.10.2023., kojim je zadužila nadležno ministarstvo i JP Ceste F BiH da nastave aktivnosti i razgovore sa međunarodnim finansijskim institucijama, u cilju priprema za kreditno zaduženje Investicionog programa. Programom su predviđeni projekti podijeljeni u tri grupe i to:

- Projekti rehabilitacije kolovoza magistralnih cesta (prema analizi iz dTIMS-a),
- Projekti rekonstrukcije i sanacije objekata (mostovi i tuneli) na magistralnim cestama i
- Projekti izgradnje i rekonstrukcije (nastavak izgradnje i završetak započetih projekata u Programu „Modernizacija cesta u F BiH“)

Opći cilj Programa je poboljšanje stanja magistralne cestovne infrastrukture u Federaciji BiH. Očekivani rezultati Programa su efikasniji i sigurniji prometni sustav kroz: smanjenje vremena putovanja, povećanje sigurnosti za sve učesnike u prometu, smanjenje troškova održavanja i upravljanja, povećanje otpornosti cestovne infrastrukture na klimatske promjene, otklanjanje uskih grla oko gradova.

U toku su pripremne aktivnosti u koordinaciji sa Federalnim ministarstvom prometa i komunikacija i Federalnim ministarstvom financija, neophodne za zaduživanje i dalji nastavak radnji prema međunarodnim finansijskim institucijama u vidu formiranja pregovaračkog tima za osiguranje kreditnih i grant sredstava za financiranje novog investicijskog Programa izgradnje, rekonstrukcije i rehabilitacije magistralnih cesta u Federaciji BiH.

Poslovne knjige i druge evidencije JP Ceste F BiH vodi u skladu sa zakonima i Međunarodnim računovodstvenim standardima i Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja, kojima se uređuje materijalno-finansijsko poslovanje i računovodstvene politike.

U nastavku su prikazani javni prihodi, rashodi, investicije, kao i druge aktivnosti koje JP Ceste F BiH je realiziralo u periodu 01.01.-31.12.2024. godine.


1. I JAVNI PRIHODI

Red Br.	O P I S	Šifra naknade	Realizirano 31.12.2023.	Rebalans Plana 2024.	Realizirano 31.12.2024.	Index 6/5	Index 6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Naknade od:		110.273.892	117.800.000	122.359.992	104	111
1.1	Nafte i naftnih derivata	717131 717114	55.182.567 17.990.322	59.750.000 19.270.000	63.589.852 19.287.207	106 100	115 107
1.2	Registracije – putarine – fizička lica	722532	19.323.633	20.100.000	20.498.197	102	106
1.3	Registracije – putarine – pravna lica	722531	9.135.633	9.600.000	9.438.751	98	103
1.4	Službe “Pomoć-informacije na cestama”	722535	5.755.415	6.100.000	6.059.130	99	105
1.5	Korištenja cestovnog zemljišta	722538	1.943.570	1.700.000	2.073.233	122	107
1.6	Vanrednih prevoza	722536 722534	788.855	1.100.000	1.186.006	150	150
1.7	Prekomjerne upotrebe cesta (vage)	722537	153.897	180.000	227.616	126	148
2.	Druga sredstva osigurana po posebnim propisima		642.305	500.000	590.735	118	92
2.1	Reklamni panoi	722539	478.163	300.000	422.536	141	88
2.2	Kamate	722565	67.854	50.000	53.678	107	79
2.3	Saglasnosti	722565	96.288	150.000	114.521	76	119
3.	Naknadno utvrđeni prihodi		803.951	400.000	448.655	112	56
	U K U P N O		111.720.148	118.700.000	123.399.382	104	110


Rebalansom Plana za 2024. godinu je predviđen prihod u iznosu od 118,70 mil. KM, a realiziran je u iznosu od 123,40 mil. KM što je 4% više od planiranih sredstava, a odnosno 4,70 mil. KM u odnosu na isti period prethodne godine. Najveći prihod je realiziran od naknada nafte i naftnih derivata sa 82,88 mil. KM ili 5% više od planiranih 79,02 mil. KM. U odnosu na prethodnu godinu veći je za 9,70 mil. KM.

Drugi po veličini je ostvaren prihod od registracija za pravna i fizička lica u iznosu od 29,94 mil. KM što je 1% više ili 0,24 mil. KM od planiranih 29,70 mil. KM za isti period prethodne godine.

Prihod od naknada Službe „Pomoć informacije na cestama“, korištenja zemljišta u putnom pojasu i vanrednog prevoza u zemlji i inostranstvo, realizovan je u iznosu od 9,32 mil. KM ili 5% više od planiranih 8,90 mil. KM. Reklamni panoi u putnom pojasu, kamate i saglasnosti realizovani su sa 0,59 mil. KM, što je 18% više od planiranih 0,50 mil. KM, a manji su za 0,05 mil. KM u odnosu na prethodnu godinu. Naknada od prekomjerne upotrebe cesta (vage) je realizirana u iznosu od 0,23 mil. KM što je više u odnosu na realizirano 0,15 mil. KM iz prethodne godine. Naknadno utvrđeni prihod iznosi 0,45 mil. KM.

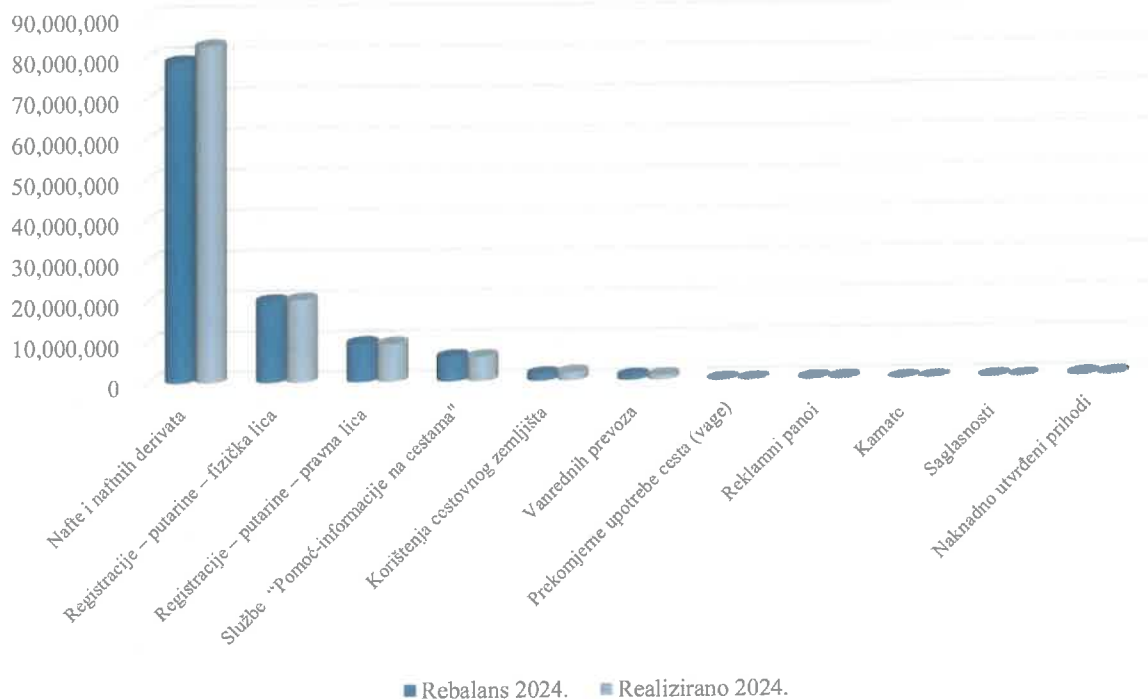

Grafikon prikazuje visinu planiranih i realiziranih prihoda

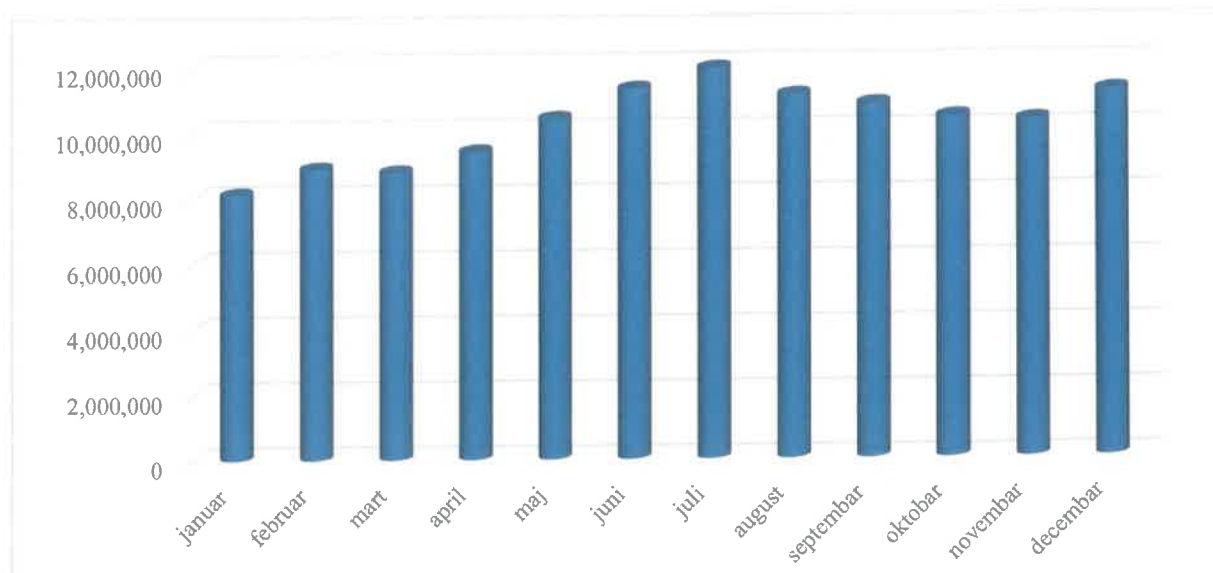

Visina ostvarenih prihoda po mjesecima u 2024.

1. Naknada od:

1.1. - nafte i naftnih derivata se realizuju na osnovu Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, br. 49/09, 49/14 i 60/14) i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama u BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 91/17.). Putarina, kao vrsta indirektnog poreza, plaća se na naftne derivate u iznosu od 0,15 KM/l za puteve na Jedinstven račun Uprave za indirektno oporezivanje. Na osnovu Pravilnika o izračunavanju koeficijenta doznačavanja sredstava entitetima i

Distriktu Brčko, te Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH, propisana je raspodjela i pripadnost javnih prihoda. JP Ceste F BiH, zajedno sa kantonalnim direkcijama za puteve u F BiH, pripada iznos od 3,9 % u odnosu na visinu predviđenih sredstava od čega, na osnovu Zakona o cestama u F BiH, JP Ceste F BiH pripada 40%. Prihod po ovoj osnovi je realiziran u iznosu od 63,59 mil. KM i veći je za 6% u odnosu na Rebalansom planiranih 59,75 mil. KM.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj: 91/2017.), putarina je povećana na 0,25 KM/l, od čega 0,05 KM/l za druge puteve, a namijenjena je za izgradnju autoputeva i izgradnju i rekonstrukciju drugih puteva. Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje usvojio je Odluku o privremenoj raspodjeli prihoda, kojom je utvrđeno da od ukupnih prihoda od putarine za izgradnju autoputeva i izgradnju i rekonstrukciju drugih puteva 10% ostaje na podračunu kod Centralne banke BiH i služi za poravnanje prihoda po utvrđivanju konačne metodologije raspodjele, a preostalih 90% prihoda podijeljeno je između entiteta i Brčko Distrikta. U Federaciji BiH prihod se raspoređuje na osnovu Zakona o cestama F BiH, po kome JP Ceste F BiH pripada 40 % od dobijenih sredstava. Prihod po ovoj osnovi je realiziran u iznosu od 19,29 mil. KM, što je na razini Rebalansom planiranih sredstava.

1.2. i 1.3. putarine za fizička i pravna lica – Od strane Vlade F BiH, na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija donesena je „Uredbe o visini godišnje naknade za javne ceste koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila“, V broj: 202/2015, na osnovu koje se obračunava naknada putarine za fizička i pravna lica. Putarine su realizirane u iznosu od 29,94 mil. KM, što je za 0,24 mil. KM ili 1% više u odnosu na Rebalansom predviđenih 29,70 mil. KM.

1.4. Službe “Pomoć-informacije na cestama” - definirane članom 88. i 100. Zakona o cestama F BiH i Odlukom Vlade F BiH V broj: 45/11 („Službene novine Federacije BiH“, br: 5/11.), a predstavlja pružanje tehničke pomoći motorizovanim učesnicima u saobraćaju na javnim cestama, uklanjanje sa javnih cesta oštećenih vozila i vozila u kvaru, davanje informacija o stanju prohodnosti cesta i pružanje druge pomoći. Navedeni prihod je realiziran u iznosu od 6,06 mil. KM, što je 5% više u odnosu na prethodnu godinu.

1.5. korištenja cestovnog zemljišta – je regulisana Uredbom o izmjeni i dopuni visine naknade za korištenje zemljišta uz javni pojas, V broj: 956/2015, donesenom od strane Vlade F BiH. Prihod po ovom osnovu je ostvaren u iznosu 2,07 mil. KM.

1.6. i 1.7. vanrednih prevoza i prekomjerne upotrebe cesta (vage) – se ostvaruju po osnovu Zakona o cestama u F BiH, Pravilnika o utvrđivanju uslova za obavljanje javnih prevoza vozila na magistralnoj cesti i Pravilnika za utvrđivanje prekomjerne upotrebe javnih cesta. Navedeni prihod je ostvaren u iznosu od 1,19 mil. KM, više u odnosu na prethodnu godinu za 50% uglavnom zbog prevoza gabaritne opreme neophodne za izgradnju vjetroelektrane „Bitovinja“ u Hercegovačko-neretvanskom kantonu kod Konjica. Sredstva od prekomjerne upotrebe cesta (vage) su realizirana u iznosu od 0,23 mil. KM.


2. Druga sredstva čine:

2.1. Naknada za reklamne znakove (panoi) u cestovnom pojasu – se obračunava na osnovu Zakona o cestama F BiH, Pravilnika o postavljanju reklamnih znakova na cestama i Uredbom o visini naknade za korištenje zemljišta uz javne ceste („Službene novine F BiH“, br: 58/2015.). Kao i prihod od naknada

za korištenje cestovnog zemljišta, očekuje se naplata u drugoj polovini godine, po izdatim i fakturiranim rješenjima, a u skladu sa revidiranim PDGS –om.

2.2. i 2.3. – kamata i saglasnosti – se odnosi na kamate ostvarene po transakcijskim računima, kao i prihod po osnovu izdatih saglasnosti za radove u cestovnom pojasu.

3. Naknadno utvrđen prihod – obuhvata prihod od naknade ukidanja rezerviranja po osnovu sudskih sporova, prihoda od naplate štete od osiguravajućih kuća po osnovu oštećenja na magistralnim pravcima, prihodi od prodaje otpada odnosno rashodovane odbojne ograde i dr.

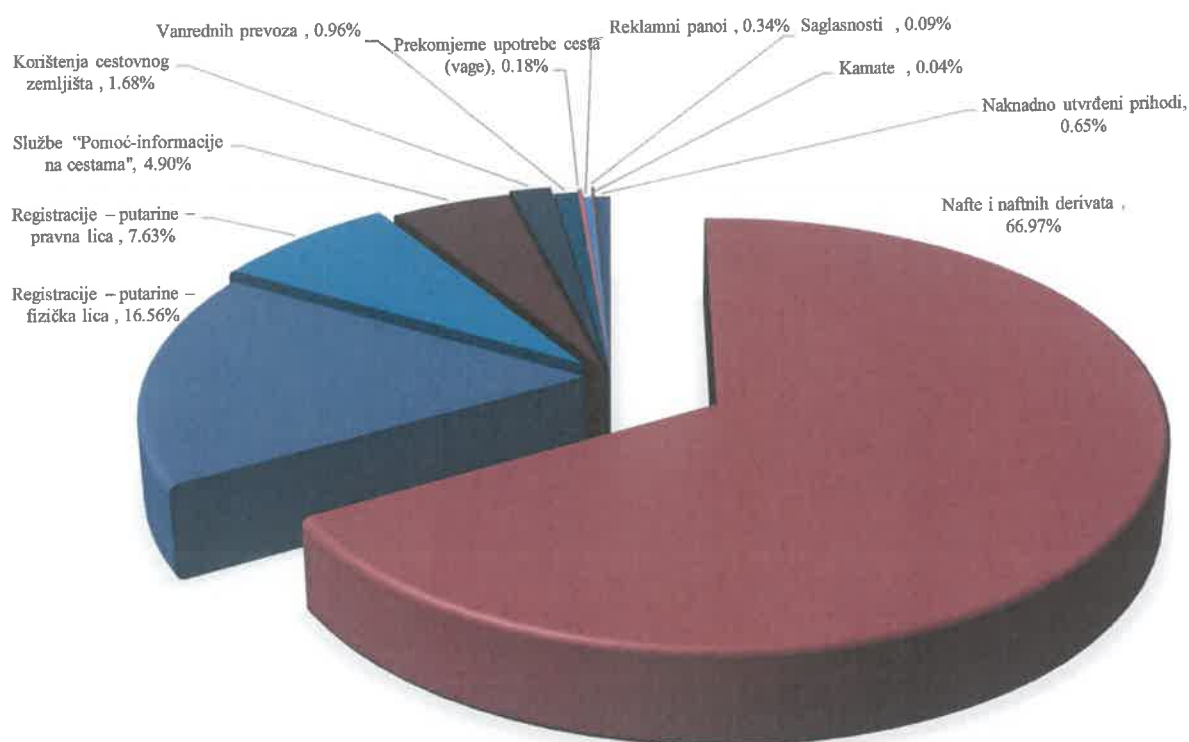

Grafički prikaz ostvarene strukture prihoda u 2024. godini

- Preknjižavanje javnih prihoda u skladu sa MRS 15

JP Ceste FBiH su postupile u skladu sa mišljenjem i preporukom Ureda za reviziju institucija u FBiH, iskazanim u Izvještaju o finansijskoj reviziji za 2019. godinu, da prikupljena novčana sredstva po osnovu naknada od nafte i naftnih derivata i naknada za upotrebu cesta koje se plaćaju pri registraciji motornih vozila (pravna i fizička lica), nisu poslovni već javni prihodi namijenjeni za održavanje, zaštitu, obnovu, rekonstrukciju i izgradnju javnih cesta i da ih treba iskazivati na poziciji dugoročnih razgraničenja od momenta uplate do njihove realizacije (ne podliježu primjeni MRS 15). Od navedenih naknada, naplaćena finansijska sredstva do momenta realizacije (datum bilansiranja) se raspoređuju na sljedeći način:

JP CESTE FEDERACIJE BIH

Javni prihodi		Za pokriće rashoda (655500)	Otplata kredita (409400)	Izvori-Investicije u toku (419860)	Ukupno
Nakada od:	Šifra naknade				
Nafte i naftnih derivata	717131	36.300.339	21.539.286	5.750.228	63.589.853
Nafte i naftnih derivata	717114	-	-	19.287.207	19.287.207
Registracije/putarine pravna lica	722531	9.438.751	-	-	9.438.751
Registracije/putarine fizička lica	722532	20.498.197	-	-	20.498.197
UKUPNO		66.237.287	21.539.286	25.037.435	112.814.008

- Naknade od nafte i naftnih derivata (717131 – 63.589.853 KM) na pokriće otplate kredita (21.539.286 KM), razliku do visine ukupnih rashoda poslovanja (36.300.339 KM) i ostatak na izvore sredstava rezervirane za investicije u toku (5.750.228 KM)
- Naknade od nafte i naftnih derivata (717114 – 19.287.207 KM) na izvore sredstava rezervirane za investicije u toku
- Naknade za upotrebu cesta/registracije za pravna (722531 – 9.438.751 KM) i fizička lica (722532 – 20.498.197 KM) za pokriće dijela troškova redovnog održavanja.

Napomena* - Iznos za pokriće rashoda 66.237.287 KM se dobije kada se od ukupnih javnih rashoda (sa amortizacijom) u iznosu od 78.030.507 KM oduzmu javni prihodi od 11.793.219 KM. Ovim iznosom obuhvaćene su sljedeće naknade:

- 722535 Služba pomoć-informacije – 6.059.130 KM
- 722538 korištenje cestovnog pojasa – 2.073.233 KM
- 722539 korištenje reklamnih panoa u cestovnom pojasu – 422.536 KM
- 722534 i 722536 vanredni prijevozi u zemlji i inostranstvu – 1.186.006 KM
- 722537 prekomjerna upotreba cesta – vage – 227.616 KM
- 722565 kamate i suglasnosti – 168.199 KM
- ostali prihodi – 448.655 KM
- prihodi po osnovu usklađivanja vrijednosti stalnih sredstava – 1.207.844 KM

A. II AMORTIZACIJA


Red. Br.	O P I S	Realizirano 31.12.2023.	Rebalans Plana 2024.	Realizirano 31.12.2024.	Index 5/4	Index 5/3
1	2	3	4		6	7
1.	Amortizacija stalnih sredstava	2.084.335	2.000.000	1.207.844	60	58
	UKUPNO	2.084.335	2.000.000	1.207.844	60	58

Napomena: Objašnjenje amortizacije dato na strani 31.

B. I JAVNI RASHODI

Red Br.	O P I S	Realizirano 31.12.2023.	Rebalans Plana 2024	Realizirano 31.12.2024.	Index 5/4	Index 5/3
1	2	3	4	5	6	7
1.	Troškovi poslovanja	7.526.202	9.141.000	9.344.487	102	124
2.	Služba pomoć-informacije	5.576.979	5.673.000	5.645.669	100	101
3.	Redovno održavanje	45.482.079	50.525.000	48.383.888	96	106
4.	Rezervirana sredstva za rizike, neplanirane rashode i rashode koji ne terete projekte	469.095	500.000	381.907	76	81
5.	Rezervirana sredstva za sudske presude	418.994	700.000	805.221	115	192
6.	Troškovi konsultantskih usluga	703.645	1.707.000	372.366	22	53
7.	Kamate, servisni troškovi, kursne razlike, provizije	7.035.286	11.650.000	11.889.126	102	169
	U K U P N O	67.212.280	79.896.000	76.822.664	96	114

Rashodi su realizirani u iznosu od 76,82 mil. KM, što je 96% od Rebalansom planiranih 79,90 mil. KM. Kao i uvijek, najveću realizaciju su imala sredstva redovnog održavanja u iznosu od 48,38 mil. KM, što je 96% od planiranih 50,53 mil. KM, a više su realizovana za 6 % ili 2,90 mil. KM, u odnosu na isti period prethodne godine. Sredstva redovnog održavanja čine najveći stavku rashoda, a obuhvataju zimsku službu, glavne preglede objekata, troškove električne energije za rasvjetu tunela, raskrsnica, mostova, semafora i brojača prometa, osiguranje pružnih pralaza u USK, održavanje i nadzor elektroopreme, poboljšanje sigurnosti prometa – izradu noveliranih prometnih projekata, sanaciju postojećih i izgradnju novih svjetlosnih prometnih znakova kod škola, redovno održavanje brojača prometa, monitoring vozila redovnog održavanja GPS-om. Troškovi poslovanja obuhvataju troškove zaposlenih i materijalne troškove i usluge i realizirani su u iznosu od 9,34 mil. KM, što je 2 % više od planiranih 9,14 mil.KM. Kamate, servisni troškovi, kursne razlike i provizije realizirane su u iznosu 11.89 mil. KM, što je 2% više od planiranih 11,65 mil. KM, a čak 4,85 mil. KM više nego u istom periodu prošle godine. Služba pomoć informacije na cesti je realizirana u iznosu od 5,65 mil. KM ili 1% više nego u istom periodu prošle godine, rezervirana sredstva za sudske presude 0,81 mil. KM, rezervirana sredstva za rizike, neplanirane rashode i rashode koji ne terete projekte sa 0,38 mil. KM, te konsultantske usluge su realizirane sa 0,37 mil. KM.

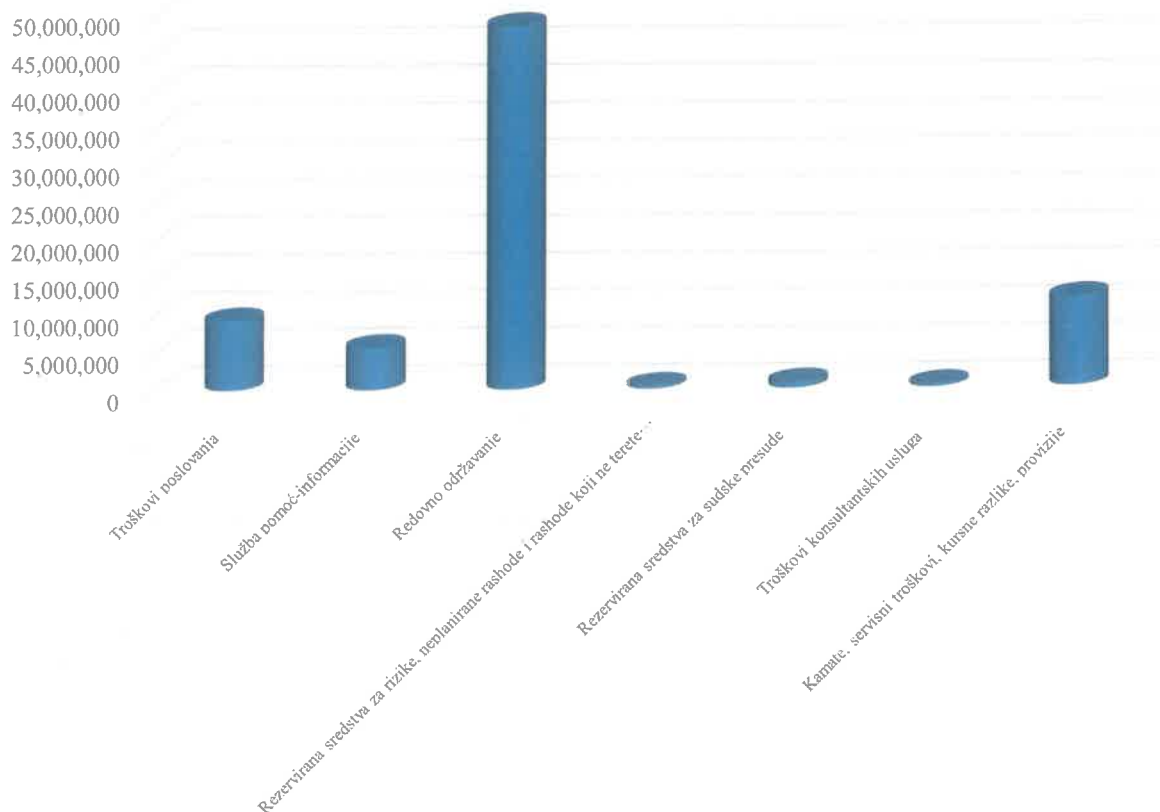

Grafički prikaz realiziranih rashoda u 2024.

1. Troškovi poslovanja

Red. br.	OPIS	Rebalans Plana 2024.	Realizirano 31.12.2024.	Index 4/3
1	2	3	4	5
I	Troškovi zaposlenih	7.300.000	7.505.998	103
II	Materijalni troškovi i usluge	1.841.000	1.838.489	100
	UKUPNO I+II	9.141.000	9.344.487	102

Od planiranih 9,14 mil. KM za troškove poslovanja, realizirano je u izvještajnom periodu 9,34 mil. KM, od čega se 7,51 mil. KM odnosi na zaposlene, a 1,84 mil. KM na materijalne troškove i usluge.

I Troškovi zaposlenih

Troškovi zaposlenih za 2024. godinu iznosili su 7,51 mil.KM, što je 3% više od planiranih 7,30 mil. KM. Istim su obuhvaćene bruto plaće zaposlenih, naknade u skladu sa Pravilnikom o radu i troškovi rezerviranja za otpremnine koji su znatno uvećani u odnosu na prethodne periode zbog izmjene člana 142. Pravilnika o radu kojim je definirana visina otpremnina prilikom odlaska zaposlenika u mirovinu.

II Materijalni troškovi i usluge

Red. br.	OPIS	Rebalans Plana 2024.	Realizirano 31.12.2024.	Index 4/3
1	2	3	4	5
1.	kancelarijski i potrošni materijal	70.000	42.377	61
2.	električna energija	60.000	51.059	85
3.	gorivo i mazivo za automobile	110.000	100.946	92
4.	otpis sitnog inventara i auto guma	20.000	24.060	120
5.	*usluge održavanja, servisiranja i registracije	210.000	276.883	132
6.	učešće na sajmovima i seminarima	75.000	93.462	125
7.	stručna literatura i časopisi	10.000	11.540	115
8.	grijanje	40.000	29.036	73
9.	zakupnina (poslovni prostori i licence)	220.000	175.742	80
10.	reklama i propaganda	30.000	0	0
11.	osiguranje imovine i lica i ljekarski pregledi	45.000	23.954	53
12.	bankarske usluge	25.000	14.094	56
13.	reprezentacija	50.000	43.373	87
14.	naknade za službena putovanja u zemlji	55.000	42.937	78
15.	naknade za službena putovanja u inostranstvu	30.000	28.814	96
16.	privremeni i povremeni poslovi, ugovori o djelu	10.000	0	0
17.	bruto naknade za članove Nadzornog odbora	120.000	117.272	98
18.	održavanje čistoće	65.000	64.486	99
19.	obezbjedenje zgrade	18.000	14.017	78
20.	PTT usluge	120.000	133.681	111
21.	komunalne usluge	25.000	20.953	84
22.	stručno osposobljavanje	10.000	1.760	18
23.	tenderi, konkursi i oglasi	60.000	65.258	109
24.	takse	40.000	24.235	61
25.	advokatske usluge i troškovi vještačenja	30.000	11.850	40
26.	troškovi eksterne revizije	12.000	11.700	98
27.	troškovi Odbora za reviziju	50.000	50.818	102
28.	*ostali troškovi poslovanja	115.000	247.094	215
29.	kamate i kursne razlike	1.000	12	1
30.	naknadno utvrđeni rashodi	70.000	70.000	100
31.	troškovi koji ne zavise od finansijskog rezultata	45.000	47.076	105
	UKUPNO II	1.841.000	1.838.489	100

Materijalni troškovi su realizirani u iznosu 1,84 mil. KM, što je na razini Rebalansom planiranih 1,84 mil. KM. Iako su u strukturi materijalnih troškova i usluga pojedine stavke realizirane više u odnosu na planirana sredstva (dodatno objašnjeno u napomeni), došlo je do preraspodjele sredstava sa stavki manje utrošenih sredstava, tako da su u ukupnom iznosu materijalni troškovi i usluge realizirani u približnom iznosu od planiranih sredstava.

***Napomena:**

- R.b.5: JP Ceste F BiH su 03.10.2023. godine potpisale ugovor 01-03.2-9299/23 sa Unioninvest d.d. Sarajevo za sanaciju sistema grijanja i hlađenja u poslovnoj zgradi, vrijednost ugovora 119.586 KM, a 63.353 KM od ukupno ugovorenog iznosa odnosi se na troškove servisiranja sistema grijanja i hlađenja evidentiranog na poziciji r.b. 5.

- R.b. 28: Dana 20.09.2024. godine je potpisan ugovor sa sa TEB Informatika d.o.o. Zagreb i TEB Informatika d.o.o. Sarajevo, 01-02.3-8608/24 ukupnog iznosa 143.395 KM što je i realizirano do obračunskog perioda. Ova stavka je Rebalansom Plana poslovanja za 2024. godinu planirana pod C. Investicije, 1. nabavka stalnih sredstava, r.b. 8 – nadogradnja sistema upravljanja cestama SUGOC, ali zbog vrste usluga je evidentirana kao trošak georeferenciranog panoramskog zapisa pod r.b. 28.

2. Služba „Pomoć – informacije na cestama“

Služba «Pomoć-informacije» na javnim cestama Federacije BiH (SPI) povjerena je kao javno ovlaštenje JP Ceste Federacije BiH po osnovu člana 100. stav 2. Zakona o cestama Federacije BiH («Službene novine F BiH» br. 12/2010.), a posebna naknada za SPI regulirana je na temelju člana 88. točke 5. i člana 100. stav 3 Zakona o cestama Federacije BiH i Odluke o službi „Pomoć-informacije“ (Vlada Federacije BiH od 20. januara 2011. godine).

Nakon provedene procedure otvorenog postupka javne nabavke, a po osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine («Sl. glasnik BiH» br. 39/14), a u skladu sa uvjetima definiranim Dokumentima ponude uz objavljeni Javni oglas za izbor najpovoljnije ponude za obavljanje poslova službe «Pomoć-informacije» na cestama Federacije BiH, za period: od 01.01.2022. do 31.12.2024. godine, okvirnog sporazuma, te na temelju Odluke o dodjeli ugovora za obavljanje usluga Službe «Pomoć-informacije» (SPI) na javnim cestama u Federaciji Bosne i Hercegovine su sklopljeni ugovori za 2024. godinu sa:

- **Bosanskohercegovački auto-moto klub, BIHAMK** Sarajevo za obavljanje poslova «Pomoć-informacije» na području gradova i općina: Bihać, Cazin, Bosanska Krupa; Bosanski Petrovac, Ključ; Sanski Most; Velika Kladuša, Bužim; Tuzla, Kladanj; Banovići, Živinice, Kalesija, Sapna, Teočak, Čelić, Srebrenik, Gračanica, Lukavac, Doboj Istok; Olovo; Zenica, Kakanj; Zavidovići, Žepče, Maglaj; Tešanj, Usora, Doboj Jug; Goražde, Prača, Ustikolina; Bugojno, Gornji Vakuf/Uskoplje, Donji Vakuf; Travnik, Novi Travnik; Konjic; Mostar; Jablanica, Prozor/Rama; Stari Grad-Sarajevo, Centar-Sarajevo, Novo Sarajevo, Novi Grad-Sarajevo, Ilidža, Vogošća, Hadžići, Trnovo; Ilijaš, Visoko, Breza, Vareš, i
- **Auto moto savez u Bosni i Hercegovini** (skraćeni naziv **AMS u BiH**) Mostar za obavljanje poslova «Pomoć-informacije» na području gradova i općina: Mostar, Čitluk; Stolac, Čapljina, Neum, Ravno; Ljubuški, Grude; Posušje, Široki Brijeg; Drvar, Bosansko Grahovo; Livno, Glamoč, Kupres, Tomislavgrad; Vitez, Busovača; Dobretići, Jajce; Kiseljak, Kreševo, Fojnica; Domaljevac-Šamac, Orašje i Odžak.

Ugovorom je definirano da se isplata vrši prema mjesečnim privremenim obračunskim situacijama nakon izvršene kontrole od strane uposlenika JP Ceste FBiH. Nadzor nad radom Službe «Pomoć-informacije» obavlja ovlašteno lice JP Ceste FBiH tako što vrši kontrolu privremenih obračunskih situacija, odnosno dnevnika informiranja i dnevnika pomoći na cesti za svaku bazu SPI. Planskim obilaskom baza SPI i putem nadzora pružanja intervencija na terenu kontrolira se na licu mjesta rad uposlenika SPI (izgled izvršioca i vozila, opremljenost, urednost vođenja dnevnika, tehnika pružanja pomoći i sl.), te se zapisnički konstatuje nađeno stanje.

Za svaku akciju iz Programa prometno - preventivnih aktivnosti izdaje se odobrenje, a na osnovu zahtjeva u kojem stoji šta će se raditi, od kada do kada, gdje, koliko će sudionika i vozila biti uključeno. Nakon završetka akcije, u okviru obračunske situacije, kontrolira se izvještaj koji sadrži navedene elemente i finacijski dio (strukturu i specifikaciju svih troškova sa računima za izvršene usluge i nabavke).

Prema dostavljenim obračunskim situacijama za 2024. godinu ostvaren je slijedeći obim poslova i prihod po osnovi naknade za poslove SPI:

R.br.	Izvršitelj usluga SPI	Realizirano/fakturisano	Prispjela sredstva (KM)	% umanjeње po osnovu člana 5. Ugovora **	Obaveza Razlika (3-4)	Vrijednost situiranih radova	Razlika (5-6) *
	1	2	3	4	5	6	7
1	BIHAMK Sarajevo	4.451.398	4.829.440	236.131	4.593.309	4.451.398	141.911
2	AMS u BIH Mostar	1.194.271	1.229.690	60.124	1.169.566	1.143.611	25.955
UKUPNO		5.645.669	6.059.130	296.255	5.762.875	5.595.009	167.866

Tabela 1: Pregled obima poslova i prihoda po osnovi naknade za poslove SPI za 2024. god.

* Napominjemo da će se u drugoj situaciji (za februar mjesec) izvršiti poravnjanje tj. uplata razlike po osnovu godišnjeg obračuna za 2024. godinu:

- 141.911, 55 KM kod BIHAMK-a, i
- 25.954, 58 KM kod AMS u BIH

** Procentualno umanjeње iz kolone 4 se vrši na osnovu Odluke o visini naknade za troškove implementacije iz sredstava za poslove „Pomoć – informacije“ na cestama (odluka Nadzornog odbora broj : 01-03.2-NO-6835-6/07 od 17.12.2007. godine), a po godišnjem obračunu za 2022. godinu, u iznosu od 4,8894 % (ovaj procenat predstavlja udio SPI u ukupnim prihodima po konačnom obračunu JP Ceste F BiH za 2024. godinu).

Za poslove SPI u Federaciji BiH, u periodu od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine utrošena su ukupna sredstva kako slijedi:

- Pomoć na cesti.....	4.575.241 KM
- Informiranje	783.751 KM
- Prometno-preventivne i aktivnosti	403.883 KM
UKUPNO :	5.762.875 KM

AMS u BIH (Auto-moto savez u Bosni i Hercegovini, Mostar) i BIHAMK (Bosanskohercegovački auto-moto klub, Sarajevo) su poslove pomoći na cesti, informiranja i prometno-preventivnih aktivnosti izvršili u potpunosti s obzirom na priliv finacijskih sredstava tokom 2024. godine.

3. Redovno održavanje cesta

Prema Zakonu o cestama u F BiH i Pravilniku o održavanju javnih cesta, održavanje cesta čini skup mjera i radnji koje se obavljaju tokom većeg dijela godine ili cijele godine na cestama, uključujući i sve objekte i instalacije sa svrhom održavanja prohodnosti, tehničke ispravnosti i sigurnosti prometa na cestama. U redovno održavanje cesta uključeni su i radovi održavanja cesta i objekata u zimskim uslovima.

Procedura postupka javne nabavke za potpisivanje postojećih okvirnih sporazuma je pokrenuta 11.11.2022. godine, i za 13 od 14 LOT-ova potpisani su okvirni sporazumi sa izvođačima radova za period 01.07.2023. – 30.06.2027. godine (LOT 1,2,3,4,6,8,9,10,11 i 12), odnosno 15.11.2023. do 14.11.2027.godine (LOT 5,7 i 14), i 01.02.2024.-31.01.2028. godine za LOT 13. U 2024. godini preuzeta je pristupna cesta, kružni tok na magistralnoj cesti M-14.1 – petlja Odžak, kategorisana kao magistralna cesta sa oznakom M-14.1, a koja je u skladu sa odlukom Vlade pridodata postojećem LOT-u 9, te regionalna cesta R-443a Lepenica – Han Ploča, kategorisana kao magistralna cesta M-4 D14, koja je u skladu sa odlukom Vlade pridodata postojećem LOT-u 10.

Obim i vrsta radova redovnog održavanja za period 16.03. do 14.11.2024. godine procijenjeni su na osnovu vrijednosti potpisanih ugovora sa izvođačima radova, odnosno sredstava planiranih tender dokumentacijom za pojedine LOT-ove. Vrijednost planiranih radova je određena na osnovu važećih jediničnih cijena u postojećim ugovorima redovnog održavanja.

Radovi redovnog održavanja u 2024. godine su vršeni na čišćenju i sanaciji kolovoza, ophodnji cesta, obnavljanju horizontalne i vertikalne prometne signalizacije i cestovne opreme, regulisanju odvodnje, košenju cestovnog pojasa i poboljšanju preglednosti, održavanju bankina, bermi, kosina usjeka i nasipa, održavanju objekata, potpornih i obložnih zidova, sve u skladu sa potrebama cesta i Pravilnikom o održavanju javnih cesta

Prema potpisanom Sporazumu, učešće JP Ceste FBiH u održavanju pružnih prelaza na cesti M-14 Bihać-Bosanska Krupa iznosi 50% vrijednosti radova, a učešće JP ŽFBiH 50% (Ugovor o održavanju putnih prijelaza broj: 01-02.2-2295/24 od 04.04.2024. godine).

Planirani troškovi električne energije za rasvjetu tunela, raskrsnica, mostova, semafora, brojača prometa, te održavanje elektroopreme za rasvjetu tunela i prilaznih zona tunelima, rasvjete raskrsnica, semafora i i trafostanica, su realizovani u okvirima planiranih veličina.

Vršeno je redovno održavanje mostova, glavni pregledi objekata, monitoring GPS-om vozila angažovanih u sklopu redovnog održavanja, te radovi iz oblasti poboljšavanja sigurnosti prometa: obilježavanje vertikalnom signalizacijom i optičko-vibracionim trakama blizine škola.

Zimsko održavanje cesta - zimska služba

Za period 01.01. – 15.03.2024. godine urađen je Operativni program i Plan zimske službe u okviru plana zimskog održavanja magistralnih cesta za zimu 2023/24 godine. Plan zimske službe je skup mjera i aktivnosti u cilju stvaranja uslova za trajno, bezbjedno i nesmetano odvijanje prometa na cestama u zimskim uvjetima, u skladu sa zakonskim obavezama. Plan zimske službe baziran je na stečenom iskustvu iz prethodnih godina i do sada primjenjivanim organizacijskim i tehnološkim postupcima.

U zimskoj službi izvođeno je čišćenje snijega i sprječavanje poledice na kolovozu, ulazno-izlaznim trakama, objektima i proširenjima kolovoza, obilježena širina planuma ceste rubnim motkama, uklanjanje osulinskog i drugog materijala sa kolovoza, uklanjanje vozila koja ometaju promet, osiguranje odvodnje u vrijeme padanja kiše i otapanja snijega, sprječavanje izlivanja vode na kolovoz, održavanje kolovoza i prometne signalizacije u ispravnom stanju, postavljanje znakova II-46 - „obavezna upotreba zimske opreme“ na pogodnim mjestima na ulazu u područje F BiH i pred usponima,

informiranje o stanju prohodnosti cesta, te druge mjere i aktivnosti u cilju stvaranja uslova za sigurno odvijanje prometa.

U skladu sa postojećim okvirnim sporazumom, planom je obuhvaćeno održavanje 2.422,44 km magistralnih cesta, od čega 64,37 km sa makadamskim kolovozom (Održavanje dijela magistralnih cesta kroz grad Sarajevo u dužini od 24,658 km organizovala je Direkcija za puteve Kantona Sarajevo, u skladu sa Ugovorom potpisanim sa JP Ceste FBiH).

Planom je predviđeno održavanje 1.551,48 km cesta u prvom prioritetu, 837,91 km cesta u drugom prioritetu i 33,05 km cesta u trećem prioritetu.

Prema novoj tender dokumentaciji, nabavku soli za posipanje cesta vrše izvođači radova, a 20% od planiranih količina za sve izvođače osigurava JP Ceste FBiH kao rezervu.

U donjoj tabeli dat je pregled Sporazuma i ugovora redovnog održavanja magistralnih cesta za period naveden u tabeli:

Red. br	LOT	Izvođač	Vrijednost Okvirnog sporazuma	Broj Okvirnog sporazuma	Period važenja Okvirnog sporazuma
1.	LOT 7	Konz. HP Investing d.o.o. Mostar i Hercegovinaputevi a.d. Trebinje	6.549.920	01-02.2-1325/20.	01.02.2020.-31.01.2024.
2.	LOT 13	Konz. Putovi d.o.o. Grude, KTM Brina d.o.o. Posušje HP Investing d.o.o. Mostar	5.670.853	01-02.2-1328/20.	01.02.2020.-31.01.2024.
3.	LOT 5	Jata group d.o.o. Srebrenik i Balegem d.o.o. Gradačac	9.682.264	01-02.2-8846/21.	01.09.2021.-31.08.2025.
UKUPNO					

Pregled Okvirnih sporazuma
za periode 01.07.2023.-30.06.2027., 15.11.2023.-14.11.2027. i 01.02.2024.-31.01.2028.

Red. br	LOT	Izvođač	Vrijednost Okvirnog sporazuma	Broj Okvirnog sporazuma	Period važenja Okvirnog sporazuma
1.	LOT 1	Rad-putevi Bihac, Behić Sanny Boy d.o.o. Bihac i Divel d.o.o. Sanski Most	14.332.236	01-02.2-4914/23	01.07.2023.-30.06.2027.
2.	LOT 2	Kov-grad Bužim i I-Selimović d.o.o.Cazin	12.909.974	01-02.2-4916/23	01.07.2023.-30.06.2027.
3.	LOT 3	Konz: Jata-group, Srebrenik,HIH Živinice,	22.853.497	01-02.2-4918/23	01.07.2023.-30.06.2027.
4.	LOT 4	Dobojputevi d.d. Doboj jug	13.819.616	01-02.2-4920/23	01.07.2023.-30.06.2027.
5.	LOT 5	Jata Group d.o.o. Srebrenik	11.128.897	01-02.2-10362/23	15.11.2023.-14.11.2027.
6.	LOT 6	Goraždeputevi Goražde	7.516.117	01-02.2-4922/23	01.07.2023.-30.06.2027.
7.	LOT 7	HP Investing d.o.o. Mostar	8.510.005	01-02.2-10471/23	15.11.2023.-14.11.2027.
8.	LOT 8	Sarajevoputevi d.d. Sarajevo	14.340.046	01-02.2-4924/23	01.07.2023.-30.06.2027.
9.	LOT 9	Ceste d.d. Mostar	5.283.413	01-02.2-4926/23	01.07.2023.-30.06.2027.
10.	LOT 10	Ceste d.d.Mostar	13.180.368	01-02.2-4928/23	01.07.2023.-30.06.2027.
11.	LOT 11	Ceste d.d.Mostar	27.749.825	01-02.2-4930/23	01.07.2023.-30.06.2027.
12.	LOT 12	Ceste d.d. Mostar	20.933.699	01-02.2-4932/23	01.07.2023.-30.06.2027.
13.	LOT 13	Konz: Ceste d.d. Mostar, KTM Brina d.o.o. Posušje i HP Investing d.o.o. Mostar	7.799.907	01-02.2-599/24	01.02.2024.-31.01.2028.
14.	LOT 14	Kov-Grad d.o.o. Bužim	4.899.907	01-02.2-10399/23	15.11.2023.-14.11.2027.
UKUPNO					

Ugovori 2023./2024.

Red. br	LOT	Izvođač	Vrijednost ugovora	Broj ugovora	Ugovoreni period:
1.	LOT 1	Rad-putevi Bihać, Behić Sanny Boy d.o.o.Bihać i Divil d.o.o.Sanski Most	3.583.059	01-02.2-4913/23	01.07.2023.-30.06.2024.
2.	LOT 2	Kov-grad Bužim i I-Selimović d.o.o.Cazin	3.227.493	01-02.2-4915/23	01.07.2023.-30.06.2024.
3.	LOT 3	Konz: Jata-group d.o.o. Srebrenik i HIH d.o.o. Živinice	5.713.374	01-02.2-4917/23	01.07.2023.-30.06.2024.
4.	LOT 4	Dobojputevi d.d. Doboj jug i Rial-Sped d.o.o. Doboj I.	3.454.904	01-02.2-4919/23	01.07.2023.-30.06.2024.
5.	LOT 5	Jata Group d.o.o. Srebrenik	2.782.224	01-02.2-10363/23	15.11.2023.-14.11.2024.
6.	LOT 6	Goraždeputevi d.d Goražde	1.879.029	01-02.2-4921/23	01.07.2023.-30.06.2024.
7.	LOT 7	HP Investing d.o.o. Mostar	2.127.501	01-02.2-10472/23	15.11.2023.-14.11.2024.
8.	LOT 8	Sarajevoputevi d.d. Sarajevo	3.585.012	01-02.2-4923/23	01.07.2023.-30.06.2024.
9.	LOT 9	Ceste d.d. Mostar	1.320.853	01-02.2-4925/23	01.07.2023.-30.06.2024.
10.	LOT 10	Ceste d.d.Mostar	3.295.092	01-02.2-4927/23	01.07.2023.-30.06.2024.
11.	LOT 11	Ceste d.d.Mostar	6.937.456	01-02.2-4929/23	01.07.2023.-30.06.2024.
12.	LOT 12	Ceste d.d. Mostar	5.233.425	01-02.2-4931/23	01.07.2023.-30.06.2024.
13.	LOT 13	Konzorcij: Putovi d.o.o. Grude, KTM Brina d.o.o. Posušje i HP Investing d.o.o. Mostar	1.494.631	01-02.2-918/23	01.02.2023.-31.01.2024.
14.	LOT 14	Kov-Grad d.o.o. Bužim	1.224.977	01-02.2-10400/23	15.11.2023.-14.11.2024.
		UKUPNO			

Ugovori 2024/2025 koji su potpisani dana 28.06.2024. i 06.11.2024. godine:

Red. br	LOT	Izvođač	Vrijednost ugovora	Broj ugovora	Ugovoreni period:
1.	LOT 1	Rad-putevi Bihać, Behić Sanny Boy d.o.o.Bihać i Divil d.o.o.Sanski Most	3.583.059	01-02.2-5943/24	01.07.2024.-30.06.2025.
2.	LOT 2	Kov-grad Bužim i I-Selimović d.o.o.Cazin	3.227.493	01-02.2-5944/24	01.07.2024.-30.06.2025.
3.	LOT 3	Konz: Jata-group d.o.o. Srebrenik i HIH d.o.o. Živinice	5.713.374	01-02.2-5946/24	01.07.2024.-30.06.2025.
4.	LOT 4	Dobojputevi d.d. Doboj jug i Rial-Sped d.o.o. Doboj I.	3.454.904	01-02.2-5947/24	01.07.2024.-30.06.2025.
5.	LOT 5	Jata Group d.o.o. Srebrenik	2.782.224	01-02.2-9882/24	15.11.2024-14.11.2025.
6.	LOT 6	Goraždeputevi d.d Goražde	1.879.029	01-02.2-5949/24	01.07.2024.-30.06.2025.
7.	LOT 7	HP Investing d.o.o. Mostar	2.127.501	01-02.2-9883/24	15.11.2024-14.11.2025.
8.	LOT 8	Sarajevoputevi d.d. Sarajevo	3.585.012	01-02.2-5942/24	01.07.2024.-30.06.2025.
9.	LOT 9	Ceste d.d. Mostar	1.320.853	01-02.2-5945/24	01.07.2024.-30.06.2025.
10.	LOT 10	Ceste d.d.Mostar	3.295.092	01-02.2-5948/24	01.07.2024.-30.06.2025.
11.	LOT 11	Ceste d.d.Mostar	6.937.456	01-02.2-5950/24	01.07.2024.-30.06.2025.
12.	LOT 12	Ceste d.d. Mostar	5.233.425	01-02.2-5951/24	01.07.2024.-30.06.2025.
13.	LOT 13	Konz: Ceste d.d. Mostar, KTM Brina d.o.o. Posušje i HP Investing d.o.o. Mostar	1.949.977	01-02.2-600/24	01.02.2024.-31.01.2025.
14.	LOT 14	Kov-Grad d.o.o. Bužim	1.244.977	01-02.2-9884/24	15.11.2024.-14.11.2025.
		UKUPNO			

U donjoj tabeli prikazani su planirani i realizovani iznosi
redovnog i zimskog održavanja po LOT-ovima

LOT	Mag. Cesta	Dužina u km	Dionice magistralnih cesta	Rebalans Plana 2024.			Realizirano 31.12.2024.		
				Redovno održavanje	Zimska služba	Ukupno	Redovno održavanje	Zimska služba	Ukupno
1. L=199,309 km	M5	115,116	(gr.Hrvatske) Izačić-Bihać-Ključ-Velečovo(gr.ent)	2.170.000	1.460.000	3.630.000	2.576.948	1.353.764	3.930.712
	M11	8,526	Ripač-Užljebić(gr.Hrvatske)						
	M14. 2	26,337	Bosanski Petrovac-Drvar						
	M15	49,33	(gr.ent)-Sanski Most-Kamičak-Ključ						
2. L=166,541 km	M4.2	51,564	(gr.Hrvatske)Velika Kladuša-Cazin-Srbljani	2.100.000	1.180.000	3.280.000	2.694.022	1.072.118	3.766.140
	M14	49,237	Bihać-Srbljani-Bosanska otoka-(Gr.entiteta)						
	M14. 2	53,674	Bosanska Krupa-Krnjeuša-Bosanski Petrovac						
		12,066	Čavkići-Spahići (u izgradnji)						
3. L=292,684km	M1.8	40,849	(gr.ent)-Arizona(gr.distr)	4.070.000	1.700.000	5.770.000	4.176.303	1.269.901	5.446.204
	M1.9	19,846	(gr.distr.)-Srebrenik-Šićki Brod						
	M4	71,881	(gr.ent)-Slatina-Gradačac-Ormanica						
	M14. 1	13,817	Donja Orahovica-Petlja Šićki Brod-Tuzla-Simin Han-Kalesija-Memići(gr.ent)						
	M18	84,38	(gr.ent)Modriča-Gradačac-Pelagićevo(gr.ent)						
	M19. 2	11,780	(gr.ent.)Priboj-Simin Han Šićki Brod-Kladanj-Tunel Karaula- Olovo						
	M17. 1	45,507	Vitalj-(gr.ent)						
4. L=182,996km	M4	38,694	Ribnica-Banovići-Živinice-Dubrave-Međaš, spoj na aerodrom Tuzla	2.260.000	1.240.000	3.500.000	2.208.063	1.074.763	3.282.826
	M5	5,217	(gr. Ent) Teslić -Jelah-Karuše; (gr.ent.) Doboj-Gračanica-Donja Orahovica						
	M17	97,081	Kaonik-Lašvanska petlja						
	M17. 1	42,04	(gr.ent.)Karuše-Žepče-Zenica-Lašva-Bilješevo (A1)						
5. L=132,782 km	M5	81,923	Žepče-Zavidovići-Ribnica	1.710.000	1.120.000	2.830.000	1.837.989	859.253	2.697.242
	M16	50,859	(gr.ent.) Jezero- Jajce-Travnik-Nević Polje						
6. L=95,191 km	M5	13,998	(gr.ent) Crna Rijeka-Jajce; Donji Vakuf-Bugojno-tunel Koprivnica	1.310.000	620.000	1.930.000	1.328.925	631.072	1.959.997
	M18	5,934	(gr.ent)Prača-Hrenovica(gr.ent.)						
	M18. 1	46,334	(gr.ent)Bogatići-Trnovo(gr.ent.)						
	M20	28,925	Ustikolina-Grebak-Trnovo						
7. L=128,837 km	M6.1	26,209	(gr.ent.)Foča-Ustikolina-Goražde-Ustiprača(gr.ent.)	1.540.000	640.000	2.180.000	1.686.572	587.476	2.274.048
	M14. 2	30,147	Mostar-Gnojnice-Nevesinje(gr.ent)						
	M17	72,481	Prozor-Jablanica						
8. L=130,617 km	M5	20,104	Konjic-Jablanica-Mostar-Gnojnice	2.170.000	1.460.000	3.630.000	2.467.854	1.298.948	3.766.802
	M17	56,302	Zelena meraja-Most.raskršće Vijećnica-Korija, Gradska obilaznica						
	M18	54,211	Jošanica-Stup; Stup-Tarčin-Konjic						
9. L=68,512 km	M1.8	7,992	Olovo-Semizovac-Koševsko brdo, Stup-Trnovo(gran.ent)	1.050.000	310.000	1.360.000	1.000.761	325.716	1.326.477
	M14. 1	28,670	(gr.Hrvatske)-Orašje-Lončari(gr.ent)						
	M14. 2	31,850	(gr.ent)Brod-Svilaj-Odžak-Modriča(gr.ent)-pristupna cesta za autocestu Odžak- Šamac (gr.ent)						
10	M5	58,096	(gr. ent) Šamac-Orašje	2.180.000	1.160.000	3.340.000	2.401.870	973.614	3.375.484
			Nević Polje-Kaonik-Busovača-Zelena Meraja						

JP CESTE FEDERACIJE BIH

	M16.2	39,096	Bugojno-Gornji Vakuf-Prozor						
	M16.4	38,617	Bugojno-Novi Travnik-Nević Polje						
	M5 D14	3,400	Han Ploča-Lepenica						
11. L=362,869 km	M6.1	158,647	(gr.Hrvatske) Kaldma-Bos.Grahovo-Livno-Kolo-Studena Vrla	4.640.000	2.320.000	6.960.000	5.084.976	2.019.276	7.104.252
	M14.2	33,355	Drvar-Resanovci; Bosansko Grahovo-Strmica (gr.Hrvatske)						
	M15	96,809	(gr.ent)-Glamoč-Priluka Livno-Šujica-Kolo						
	M16	56,778	Tunel K. Vrata-Kupres- Šujica Livno-Kamensko(gr.Hrvatske)						
	M16.3	3,210	Renjići-Prisika (gr.Hrvatske)						
	M16.5	14,07	Karlovo Han-Kazaginac						
12. L=366,858km	M2	9,258	(gr.Hrvatske)-Neum-(gr.Hrvatske)	4.180.000	1.100.000	5.280.000	3.342.176	1.316.410	4.658.586
	M6	86,449	(gr.Hrvatske) Gorica-Čapljina-Stolac-Ljubinj(gr.ent)						
	M6.1	70,224	Studena vrla-Posušje-Široki brijeg-Mostar Južna obilaznica Mostara						
	M15	3,111	Posušje-Kutleše-Gr.Hrvatske						
	M17	38,582	Gnojnice-Čapljina-Doljani (gr.Hrvatske)						
	M17.3	84,167	Buna-Masline; Stolac-Hutovo –Neum(+Neum-Babin do)						
	M20	8,49	(gr.Hrvatske)Dubrovnik-Duži-Trebinje(gr.ent)						
	M17.4	41,807	Mostar-Čitluk-Ljubuški-Crveni Grm(gr.Hrvatske)						
13. L=100,00km	M17.5	100,775	Jablanica-Blidinje-Posušje-Grude-Privalj	1.300.000	700.000	2.000.000	1.233.120	821.651	2.054.771
	M4.3	57,00	Velika Kladuša-Bužim-Bosanska Otoka	860.000	410.000	1.270.000	573.947	604.556	1.178.503
2.467,627 UKUPNO				31.540.000	15.420.000	46.960.000	32.613.526	14.208.518	46.822.044

Redovno održavanje mostova

Naziv	Rebalans Plana 2024.	Konsultant /Izvođač	Ugovoreno	Realizirano 01.01.- 31.12.2024.
Redovno održavanje mostova				
- Most M-4.2 001-3-preko rijeke Kladušnice, Velika Kladuša - Most M-4.2-001-585- preko nepoznatog potoka, Vejinac,Purići - Most M-4.2-002-506, preko radetina potoka, Čoralići, - Most M-4.2-002-589,preko lokalne ceste, Cazin - Most M-4.2-002-7 preko rijeke Une,Sedra, Ostrožac, - Most M-5-001-9, preko potok a Garavice, - Most M-5-003-17,preko potoka jaruga, Ripač, - PLP 15-004-478, pločasti propust preko potoka Sokolovo	550.000	BC Gradnja d.o.o. Bosanska Otoka 01-02.1-14740/19 26.12.2019. Anex na osnovni ugovor: 01-02.1-242/23 10.01.2023	48.105	-
Redovno održavanje pregledi mostova				
- Geodetsko opažanje mosta preko rijeke Bosne na M17 u Topčić polju km 0+747		Geobiro d.o.o.Konjic 01-02.1-9223/21. 10.09.2021.	6.903	6.903
UKUPNO	550.000			6.903

Poboljšanje sigurnosti prometa – izrada noveliranih prometnih projekata

Naziv	Rebalans Plana 2024.	Konsultant /Izvođač	Ugovoreno	Realizirano 01.01.- 31.12.2024.
Projektovanje noveliranih prometnih projekta na - M5- Podgrab (e.l.) –Prača-Hrenovica (e.l.), - M6.1-Priluka-Livno, - M17-Zenica-petlja Lašva, - M14.1-Brod (e.l.)-Svilaj-Vukosavlje (e.l.) - M16.5-Karlov Han-Kazaginac	140.000	Divel d.o.o.Sarajevo, 01-02.3-4453/23, 13.06.2023.	43.237 (preneseno 21.618)	21.618
Revizija noveliranih prometnih projekta na - M5- Podgrab (e.l.) –Prača-Hrenovica (e.l.), - M6.1-Priluka-Livno, - M17-Zenica-petlja Lašva, - M14.1-Brod (e.l.)-Svilaj-Vukosavlje (e.l.) - M16.5-Karlov Han-Kazaginac		Institut za saobraćaj i komunikacije Sarajevo, 01-02.3- 7484/23, 09.08.2023.	6.903	6.903
Izrada noveliranog prometnog projekta na: - M17.1: Žepče-Zavidovići-Ribnica-Banovići-Živinice-Medaš		Centar za projektovanje i konsalting „CPK“ d.o.o. Banja Luka 01- 02.3-217/24 10.01.2024.	25.448	-
Revizija noveliranog prometnog projekta: - M17.1: Žepče-Zavidovići-Ribnica-Banovići-Živinice-Medaš		Institut za saobraćaj i komunikacije Sarajevo, 01-02.3- 2805/24, 24.04.2024.	4.479	-
Izrada noveliranog prometnog projekta: M17.6: Dračevo-Cerovica-Hutovo		Institut za građevinarstvo „IG“ d.o.o. Banja Luka 01-02.3-7969/24 03.09.2024.	5.435	2.718
Revizija noveliranog prometnog projekta: - M17.6: Dračevo-Cerovica-Hutovo		Divel d.o.o. Sarajevo 01-02.3-9790/24 04.11.2024.	2.340	-
UKUPNO	140.000			31.239

Održavanje i nadzor elektroopreme (rasvjeta tunela i prilaznih zona tunelima, rasvjeta raskrsnica, semafori i trafo stanice)

Naziv i opis aktivnosti	Rebalans Plana 2024.	Konsultant /Izvođač	Ugovoreno	Realizirano 01.01.- 31.12.2024.
Usluge opravke, pregleda, održavanja i instalacija sistema za upravljanje tunelom Karaula	1.120.000	Matisa d.o.o. Tuzla, 01-02.2-12232/22. 23.12.2022.	4.651 (preneseno 1.271)	2.715
		Matisa d.o.o. Tuzla 01-02.2-10272/24 20.11.2024.	6.423	6.423
		Deling d.o.o. Tuzla 01-02.2-9447/24 21.10.2024.	6.903	-
		Hidroinvest d.o.o. Sarajevo 01-02.2-8383/24 17.09.2024.	6.962	6.962
		Matisa d.o.o. Tuzla 01-02.2-5178/24 03.06.2024.	4.651	3.320
		Clima Trade d.o.o. Sarajevo 01-02.2-6572/24 18.07.2024.	3.437	3.437
		Sicon Sas d.o.o. Tuzla 01-02.2-8144/24 09.09.2024.	6.809	6.809
		Deling d.o.o. Tuzla, 01-02.2-11210/23, 05.12.2023.	6.903	6.903
Redovno održavanje ventilatora, trafo stanica i UPS sistema u tunelu „Žaba“		Sicon sas d.o.o.Tuzla, 01-02.2-10772/23. 17.11.2023.	5.265	5.265

Redovno održavanje javne rasvjete tunela i prilaznih zona tunelima, raskrsnica i trafo stanica na mag.cestama	Step d.d.Sarajevo, 01-02.2-441/24. 19.01.2024.	314.357	291.164
	Step d.d. Sarajevo, 01-02.2-11667-1/21 24.11.2021.	8.060	4.478
Redovno održavanje semaforских uređaja, opreme i svjetlećih oznaka pješačkih prelaza na mag. cestama u FBiH 532801	Step d.d.Sarajevo, 01-02.2-8470/22. 26.09.2022.	319.643 (preneseno 22.436)	21.155
Redovno održavanje semaforских uređaja i opreme, svjetlosnih oznaka pješačkih prijelaza i svjetlosnih upozorenja na prekoračenje brzine kod škola na mag. cestama u FBiH 532801 532011	Step d.d. Sarajevo, 01-02.2-9255/23, 02.10.2023.	319.643 (preneseno 295.840)	136.444
	Step d.d. Sarajevo, 01-02.2-9316/24, 16.10.2024.	319.643	20.470
Nadzor nad radovima redovnog održavanja semaforских uređaja i opreme i svjetlećih oznaka pješačkih prelaza	Aber Design d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-12358/22. 28.12.2022.	7.000	7.000
	Aber Design d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-1752/24. 15.03.2024.	7.000	-
Nadzor nad radovima redovnog održavanja javne rasvjete tunela i prilaznih zona tunelima, raskrsnica i trafo stanica na mag.cestama	Aber Design d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-492/23. 17.01.2023.	7.000	7.000
	Aber Design d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-1733/24. 14.03.2024.	7.000	-
Ugradnja opreme i redovno održavanje opreme tunela Vranduk	Etas d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-373/24 16.01.2024.	6.412	6.412
	Etas d.o.o. Sarajevo 01-02.1-6642/24 22.07.2024.	3.159	3.159
	Elcom d.o.o. Tuzla SCADA sistem – po ponudama (5x)	-	5.121
	Deling d.o.o. Tuzla 01-02.2-9445/24 21.10.2024.	6.903	-
	Sicon Sas d.o.o. Tuzla 01-02.2-8143/24 09.09.2024.	6.377	6.377
	Hidroinvest d.o.o. Sarajevo 01-02.2-8142/24 09.09.2024.	6.962	6.962
	Hidroinvest d.o.o. Sarajevo-po ponudama (2x)	-	2.317
Usluge provjere stanja sekundarne obloge u tunelu Salakovac 3	Arting BH d.o.o. Sarajevo 01-02.2-7230/24 14.08.2024.	2.902	2.902
UKUPNO	1.120.000		562.795

Za radove redovnog održavanja semaforских uređaja i opreme i svjetlećih oznaka pješačkih prelaza na magistralnim cestama u F BiH, za period 2021.-2025., potpisan je Okvirni sporazum broj:01-02.2-9869/21. 29.09.2021. na iznos od 1.278.570 KM.

Okvirni sporazum broj: 01-02.2-11667/21. od 24.11.2021. potpisan je za redovno održavanje javne rasvjete tunela, prilaznih zona tunelima, raskrižja i trafo stanica na magistralnim cestama u F BiH za period 2021. - 2025. na iznos od 1.257.426 KM. Okvirni sporazumi su potpisani sa Step d.d. Sarajevo.

- Redovno održavanje brojača prometa

Okvirni sporazum redovnog održavanja brojača prometa postavljenih uz magistralne ceste u F BiH za period 2022. -2026. broj: 01-02.3.1-8621/22. potpisan je 03.10.2022. godine sa GP: Alem sistem d.o.o. Sarajevo i Bogal Inženjering d.o.o. Novi Sad u iznosu od 259.997 KM.

Naziv i opis aktivnosti	Rebalans Plana 2024.	Konsultant /Izvođač	Ugovoreno	Realizirano 01.01.- 30.06.2024.
Redovno održavanje brojača prometa postavljenih uz magistralne ceste u F BiH	65.000	GP:Alem sistem d.o.o. Sarajevo i Bogal Inženjering d.o.o. Novi Sad, 01-02.3-9290/23, 03.10.2023.	65.040	40.459
		GP:Alem sistem d.o.o. Sarajevo i Bogal Inženjering d.o.o. Novi Sad, 01-02.3-8910/24, 02.10.2024.	64.900	14.321
UKUPNO	65.000			54.780

- Redovno održavanje cestovnih meteoroloških stanica

Za redovno održavanje cestovnih meteoroloških stanica postavljenih uz magistralne ceste u F BiH 2022. – 2026. potpisan je 03.10.2022. (01-02.3.1-8623/22) Okvirni sporazum sa Alem Sistemi d.o.o. Sarajevo, vrijednosti 259.997 KM.

Naziv i opis aktivnosti	Rebalans Plana 2024.	Konsultant /Izvođač	Ugovoreno	Realizirano 01.01.- 31.12.2024.
Redovno održavanje cestovnih meteoroloških stanica postavljenih uz magistralne ceste u F BiH	65.000	Alem Sistem d.o.o. Sarajevo, 01-02.3-9249/23, 02.10.2023.	64.994	53.820
		Alem Sistem d.o.o. Sarajevo, 01-02.3-8797/24, 27.09.2024.	64.994	10.319
UKUPNO	65.000			64.139

- Sanacija postojećih i izgradnja novih svjetlosnih prometnih znakova kod škola

Naziv i opis aktivnosti	Rebalans Plana 2024.	Konsultant /Izvođač	Ugovoreno	Realizirano 01.01.- 31.12.2024.
Sanacija postojećih i izgradnja novih svjetlosnih prometnih znakova kod škola	370.000	Projecta d.o.o. Mostar, 01-02.3-9163/23, 27.09.2023.	149.919	91.875
Obilježavanje pješačkih prijelaza sa plastikom i optičko-zvučnim trakama kod škola		Sacom d.o.o. Sarajevo, 01-02.3-9531/23, 10.10.2023.	39.722	39.473
UKUPNO	370.000			131.348

- Monitoring vozila redovnog održavanja GPS-om

Naziv i opis aktivnosti	Rebalans Plana 2024.	Konsultant /Izvođač	Ugovoreno	Realizirano 01.01.- 31.12.2024.
Usluge satelitskog nadzora internog voznog parka	30.000	TIM System d.o.o. Sarajevo 01-03.2-2923/24 30.04.2024.	4.563	3.042
UKUPNO	30.000			3.042

REKAPITULACIJA ULAGANJA ZA REDOVNO ODRŽAVANJE

Red. br.	O P I S	Rebalans Plana 2024.	Realizirano 31.12.2024.	Index 4/3
1	2	3	4	5
1.	REDOVNO ODRŽAVANJE I ZIMSKA SLUŽBA	46.960.000	46.822.044	100
2.	Redovno održavanje mostova i tunela	550.000	6.903	1
3.	Troškovi električne energije za rasvjetu tunela, raskrsnica, mostova, semafora, brojača prometa i meteo stanica	800.000	703.613	88
4.	Osiguranje pružnih prelaza u USK (sufinansiranje)	50.000	3.985	8
5.	Poboljšanje sigurnosti prometa – izrada noveliranih prometnih projekata	140.000	31.239	22
6.	Održavanje i nadzor elektro-opreme i tunela (rasvjeta tunela i prilaznih zona tunelima, rasvjeta raskrsnica, semafori i trafo stanice, te zamjena rasvjetnih tijela LED svjetiljkama)	1.120.000	562.795	50
7.	Poboljšanje sigurnosti prometa kod škola: - Sanacija postojećih i izgradnja novih svjetlosnih prometnih znakova - Obilježav. pješack. prijelaza sa plastikom optičko-vibracionim trakama - Zaštita učenika kod škola na magistralnim cestama	370.000	131.348	35
8.	Redovno održavanje brojača prometa	65.000	54.780	84
9.	Redovno održavanje cestovnih meteoroloških stanica	65.000	64.139	99
10.	Monitoring vozila redovnog održavanja GPS-om	30.000	3.042	10
11.	Usklađivanje vertikalne signalizacije sa noveliranim prometnim projektima	300.000	-	-
12.	Rekalibracija mjernih uređaja za: Reflekciju horizontalne i vertikalne signalizacije i za praćenje stanja kolovoza	75.000	-	-
	UKUPNO REDOVNO ODRŽAVANJE	50.525.000	48.383.888	96

4. Rezervirana sredstva za rizike, neplanirane rashode i rashode koji ne terete projekte

NAZIV	Rebalans Plana 2024.	Realizirano 01.01.-31.12.2024.
1	2.	3.
Rezervirana sredstva za rizike i neplanirane rashode	500.000	
- Troškovi vezani za okončane projekte u ranijem periodu		375.004
- Monitoring i praćenje implementacije okolišnih i socijalnih aspekata na projektu izgradnje „Obilaznice Stoca“		6.903
UKUPNO	500.000	381.907

Troškovi vezani za okončane projekte se odnose na troškove izdavanja elektroenergetskih suglasnosti i priključke na javnu rasvjetu Obilaznice Bugojno, troškovi upotrebne dozvole za Tunel Vranduk, troškove eksproprijacije vezane za projekte rekonstrukcije ceste M18.1 Garež-Delijaš, rekonstrukcija raskrsnice u Husinu na M18, te semaforizaciju raskrsnice na M4.2 u Cazinu, troškove vodne suglasnosti za rekonstrukciju mosta preko potoka Rika sa rekonstrukcijom raskrsnice Skela, te na monitoring i praćenje implementacije okolišnih i socijalnih aspekata na projektu izgradnje „Obilaznice Stoca“.

Na osnovu preporuka Ureda za reviziju institucija FBiH i eksterne revizije, a u skladu sa Računovodstvenim politikama i drugim internim aktima JP Ceste FBiH, Uprava JP Ceste FBiH je po prijedlogu Komisije za popis investicija u toku, donijela Odluku o otpisu sljedećih projekata koji se neće dalje realizirati:

NAZIV PROJEKTA	Godina iz koje je projekat	Vrijednost projekta na dan 31.12.2024.
Izgradnja treće trake Bosanski Petrovac-Drvar/M14.2	2017.	54.245
Izgradnja treće trake Bosanski Petrovac-Pasjak/M14.2	2013.	37.835
Izgradnja obilaznice Bihać-Srbijani-Grmuški	2013.	95.355
Izgradnja obilaznice Livno	2013	145.914
Rekonstrukcija ceste Bulajića krivina/35+800-36+000	2015	10.352
UKUPNO		343.701

5. Rezervirana sredstva za sudske presude

NAZIV	Rebalans Plana 2024.	Realizirano 31.12.2024.	Napomena
1	2	3	4
Rezervirana sredstva za sudske presude	700.000	432.070	Troškovi rezerviranja po započetim sudskim sporovima
		138.088	Upravni i sudski troškovi po sudskim presudama
		131.217	Zatezne kamate temeljem sudskih presuda
		66.961	Nerezervirani troškovi po sudskim presudama
		33.885	Troškovi usluga advokata i notara
		3.000	Naknade fizičkim licima po sudskim rješenjima
UKUPNO	700.000	805.221	

U izvještajnom periodu realizovan je iznos od 0,81 mil. KM što je 15% više od Rebalansom planiranih 0,70 mil. KM, a odnosi se na rezerviranja po započetim sudskim sporovima, upravne i sudske troškove po sudskim presudama, zatezne kamate temeljem sudskih presuda, nerezervirane troškove po sudskim presudama, troškove usluga advokata i notara, te naknade fizičkim licima po sudskim rješenjima.

6. Troškovi konsultantskih usluga

Red br.	NAZIV	Rebalans Plana 2024	Konsultant	Ugovoreno	Realizirano 31.12.2024.	Index 4/3
1	2	3	4	5	6	7
1.	Obrada podataka i izrada Publikacije o prometu	91.000	Ugovor o djelu: 01-02.3-1231/24, 21.02.2024.	35.056	35.056	100
			Ugovor o djelu: 01-02.3-1232/24, 21.02.2024.	5.337	5.337	100
2.	Troškovi konsultantskih usluga za potrebe neovisne kontrole kvalitete radova - investicije ugovor 5164/24	7.000	-	-	-	-
3.	Troškovi održavanja sustava gospodarenja cestama – SUGOC	110.000	TEB Informatika d.o.o. Zagreb i TEB Informatika d.o.o. Sarajevo 01-02.2-8607/24 20.09.2024.	109.961	109.961	100
4.	Evidencija postojećeg stanja mreže magistralnih cesta FBiH sa uspostavom webGIS programskog rješenja za prikaz vlasništva (I faza)	500.000	-	-	-	-
5.	Izrada Studije utvrđivanja lokacija na mreži magistralnih cesta u F BiH na kojima se događaju učestale prometne nezgode (crne tačke)	89.000	Fakultet za saobraćaj i komunikacije UNSA, 01-02.3-1664/24, 12.03.2024.	88.920	88.920	100
6.	Izrada elaborata za uvezivanje sistema upravljanja objektima (tuneli) na magistralnim cestama	28.000	Manedra-Company d.o.o. Mostar, 01-02.3-4529/23. 14.06.2023.	29.952 (preneseno 20.966)	20.966	100
			Boldeming d.o.o. Sarajevo, 01-02.3-5832/24, 24.06.2024.	6.972	6.972	100
7.	Izrada elaborata procijene imovine	14.000	Ekonomski institut d.o.o. Banja Luka, 01-03.1-10706-3/23, 12.12.2023.	7.020	7.020	100
8.	Nabavka aplikacije za finansijsko upravljanje i kontrolu (FUK)	20.000	UHY Revident d.o.o. Mostar 01-03.1-5780/24 21.06.2024.	19.890	19.890	100
9.	Godišnji nadzorni audit za ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001	14.000	TUV Adria d.o.o. Sarajevo, 01-02.3-11684/23 od 21.12.2023.	6.991	6.991	100
10.	Održavanje sistema upravljanja cestovnom imovinom RAMS	194.000	Konzorcij: Telegroup d.o.o. Banja Luka i Telegroup d.o.o. Sarajevo 01-02.3-7373/24 21.08.2024.	193.050	64.350	33
11.	Elaborat uspostave sistema vaganja u pokretu	30.000	-	-	-	-
12.	Izrada studije za određivanje sastava kolovozne konstrukcije na mreži magistralnih cesta	50.000	-	-	-	-
13.	Troškovi konsultantskih usluga za „Investicioni program za izgradnju, rekonstrukciju i rehabilitaciju magistralnih cesta u Federaciji BiH“	300.000	IPSA Institut d.o.o. Sarajevo 01-02.1-8606/24 20.09.2024.	6.903	6.903	100
14.	Ažuriranje, obrada i izrada podataka georeferenciranog panoramskog video zapisa magistralnih cesta u F BiH	260.000	-	-	-	-
UKUPNO		1.707.000			372.366	22

- Rb. 1 - Izrada godišnjih publikacija o intenzitetu prometa na magistralnim cestama se radi na osnovu podatka o brojanju saobraćaja iz prethodne godine sa nestabilnih i pokretnih automatskih brojača prometa. Vršiti se pregled prikupljenih podataka i transformacija strukture saobraćaja dobivene brojanjem različitim vrstama brojača i različitim tehnologijama u ciljne kategorije, kako bi se omogućilo poređenje podataka sa različitim vrsta brojača. Podaci se obrađuju tekstualno, grafički, tabelarno kao i kartografski, u boji, i isti su obrađeni u GIS-u. . Za izradu godišnje publikacije potpisan je ugovor o djelu br. 01-02.3-1231/24 od 21.02.2024. sa dr.sc. Brankom Mazićem, a za recenziju publikacije potpisan je ugovor br. 01-02.3-1232/24 od 21.02.2024. sa dr.sc. Sanjinom Albinovićem.
- Rb. 3 - Održavanje, stručna podrška i unapređenje rada u programskim rješenjima SUGOC (e-mailom, telefonom ili udaljenim pristupom) sistema neophodni su za održavanje i upravljanje magistralnim cestama u Federaciji BiH, na osnovu ugovora sa GP TEB Informatika d.o.o. Zagreb i TEB Informatika d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-8607/24 od 20.09.2024. godine.
- Rb. 5 - Zakonska obaveza je izrada Studije crnih tačaka, na osnovu čega je zaključen ugovor sa Fakultetom za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu broj 01-02.3-1664/24 od 12.03.2024. godine i u cijelosti je realiziran u izvještajnom periodu.
- Rb. 6 - Izrađen je elaborat za uvezivanje upravljanja objektima (tuneli) sa pregledom postojećih i prijedlogom jedinstvenog sistema upravljanja. Naime, planirano je uvezivanje postojećih sistema upravljanja objektima na magistralnim cestama u jedinstven sistem, prenos signala u Kontrolni centar JP Ceste FBiH i uspostava osnovnog modela ITS sistema, te je zaključen ugovor broj 01-02.3-4529/23 od 14.06.2023. godine sa Manedra Company d.o.o. Mostar za izradu navedenog elaborata i Boldeming d.o.o. Sarajevo, ugovor broj 01-02.3-5832/24 od 24.06.2024. godine za tehničku reviziju.
- Rb. 7 - U skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji u F BiH („Službene novine F BiH“ 15/21.), neophodno je uraditi elaborat procjene vrijednosti ukupne dugotrajne imovine JP Ceste F BiH. Ugovor zaključen sa Ekonomski institut d.o.o. Banja Luka, broj ugovora 01-03.1-10706-3/23 od 12.12.2023., a realiziran u 2024. godini.
- Rb. 8 - Na osnovu Zakona o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u F BiH (uspostavljanje finansijskog upravljanja i kontrole) i Pravilnika o provođenju finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru u F BiH, angažiran je konsultant za ažuriranje sistema finansijskog upravljanja i kontrole u JP Ceste F BiH, UHY Revident d.o.o. Mostar na osnovu ugovora 01-03.1-5780/24 od 21.06.2024. godine.
- Rb. 9 - Tokom 2022. godine uveden je sistema upravljanja kvalitetom (QMS), standarda ISO 14001 sistem upravljanja okolišem (EMS) i sistema zaštite zdravlja i sigurnosti na radu (OH&S), kao integrirani sistemi upravljanja (IMS). Da bi sistem nastavio implementirati certifikaciju integritanog sistema upravljanja u preduzeću, neophodan je nadzorni certificirani audit. Potpisan je ugovor sa TUV Adria d.o.o. Sarajevo, 01-02.3-11684/23 od 21.12.2023. za provođenje godišnjeg nadzornog audita.
- Rb. 10 - Kroz program „Modernizacija cesta u F BiH“ nabavljen je sistem RAMS-a, za što je potrebno održavanje istog. Potpisan je Okvirni sporazum na 3 godine za održavanje sistema upravljanja cestovnom imovinom za period 2024.-2027. sa konzorcijem Telegroup d.o.o. Banja Luka i Telegroup d.o.o. Sarajevo, 01-02.3-7374/24 od 21.08.2024. godine na iznos 579.150 KM sa PDV-om.
- Rb. 13 – Rebalansom su planirani troškovi konsultantskih usluga za izradu tehničko investicione dokumentacije za „Investicioni program za izgradnju, rekonstrukciju i rehabilitaciju magistralnih cesta u Federaciji BiH“. Po tom osnovu potpisan je ugovor sa IPSA Institut

d.o.o. Sarajevo, br. 01-02.1-8606/24 od 20.09.2024. godine za reviziju cost-benefit analize za navedeni Program.

Rb. 2, 4, 11, 12 i 14 nije bilo realizacije u izvještajnom periodu.

7. Kamate

Red. Broj	NAZIV	Rebalans Plana 2024.	Realizirano 01.01.-31.12.2024.	Napomena
1.	Kamate, servisni troškovi i kursne razlike za kredit EIB-a i WB za program „Rehabilitacija cesta u F BiH“	1.550.000	1.524.953	Kamata EIB
			25.143	Kamata WB
			169.436	SDR Tečajne razlike WB-IDA
2.	Kamate, provizija i takse za kredit EIB-a, EBRD –a i IBRD-a za Program „Modernizacija cesta u F BiH“ (vlastita sredstva)	10.100.000	897.853	Kamata EIB
			378.429	
			5.537.354	Kamata IBRD
			3.122.413	Kamata EBRD
			227.374	Provizija na nepovučena sredstva EBRD
			6.171	Provizija IBRD
	UKUPNO	11.650.000	11.889.126	

Rb. 1.- Program „Rehabilitacija cesta u F BiH“ okončan je 2013. godine, a financiran je kreditnim sredstvima međunarodnih financijskih institucija i to:

- Europska investicijska banka (EIB), op. br. 23924 u iznosu 50,00 mil. EUR. Ugovorena kamatna stopa je varijabilna (6 mjesecni EURIBOR) + fiksni raspon koji EIB utvrđuje u momentu povlačenja tranše. Obračun kamate započinje šest mjeseci nakon datuma povlačenja tranše. Kredit je povučen u sedam tranši.
- kredit Svjetske banke (WB) – IDA op.br. 43710 u iznosu 8,20 mil. SDR. Kamata na kredit je 0,75% na povučeni iznos kredita, a naknada za održavanje kredita iznosi 0,5% godišnje na nepovučeni iznos kredita. Obzirom da je originalna valuta kredita SDR, zavisno od kretanja valuta koje čine SDR pojavljuju se pozitivne ili negativne kursne razlike.
- Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD) – op.br. 37543, u iznosu 45,00 mil. EUR. Otplata kredita je završena sa 05.06.2022. godine.

Rb.2 – Program „Modernizacija cesta u F BiH“ financira se iz kreditnih sredstava međunarodnih financijskih institucija i to:

- Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD), op.br. 47461, u iznosu 65,00 mil. EUR. U skladu sa sporazumom o zajmu između EBRD i BiH, troškovi održavanja kredita (provizija na nepovučena sredstva zajma) iznosi 0,5% godišnje. Period otplate kredita je 12 godina, uključujući 3 godine odgode otplate. Kamatna stopa je promjenljiva (6-mjesečni EURIBOR) + varijabilna marža 1%, a datumi plaćanja su 15.02. i 15.08. svake godine. Otplata kredita započela je 15.08.2019. godine. **Ukupne kamate u izvještajnom periodu po EBRD kreditu br. 47461 iznose 3.517.447 KM (3.122.413 KM za kamate koje terete rashode i 395.034 KM za kamate koje terete projekte – str. 37; obračunata kamata na međunarodne kredite tereti projekte koji su u toku sve do**

trenutka njihovog aktiviranja).

- Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD), op.br. 8640 u iznosu 58,00 mil. EUR. U skladu sa kreditnim sporazumom provizija na nepovučeni iznos kredita iznos 0,25% godišnje. Kamatna stopa je promjenljiva (6-mjesečni EURIBOR) + varijabilni raspon, a datumi plaćanja su 15.02. i 15.08. svake godine. Period otplate kredita je 22 godine, uključujući 12 godina period odgode otplate. Otplata kredita započinje 15.08.2028.
- Europska investicijska banka (EIB), op.br. 82137 u iznosu 50,00 mil. EUR. Povlačenje kredita u tranšama. U skladu sa finansijskim ugovorom između EIB i BiH moguće je odabrati promjenljivu ili fiksnu kamatnu stopu, dok EIB utvrđuje varijabilni raspon u momentu povlačenja tranše. Kredit je povučen u šest tranši, a na povučene tranše primjenjuje se fiksna kamatna stopa.

Potrebna sredstva za izmirenje obaveza po kamatama na odobrene kredite međunarodnih razvojnih banaka za program „Rehabilitacije cesta u FBiH“ i Program „Modernizacije cesta u FBiH“ u 2024. izvršena je na osnovu dostavljenih obračuna kreditora u 2023 i prognoza očekivanog rasta EURIBOR-za 2024. godinu. Nakon okončanja projekata finansiranih iz međunarodnih kredita, obračunate kamate terete rashod.


U nastavku su tabelarno prikazane pristigle i izmirene otplate kredita za Programe „Rehabilitacija cesta u F BiH“ i „Modernizacija cesta u F BiH“ u izvještajnom periodu.

Red.Br.	Naziv banke i broj kredita	Period	Otplata kredita
<i>Program „Rehabilitacija cesta u F BiH“</i>			
1.	EIB- 23924 – I tranša	12.09.2022. - 13.03.2023.	264.640
2.	EIB- 23924 – I tranša	13.03.2024. - 12.09.2024.	264.640
	EIB- 23924 – II tranša	05.08.2023. - 05.02.2024.	391.166
	EIB- 23924 – II tranša	05.02.2024. – 05.08.2024..	391.166
	EIB- 23924 – III tranša	28.08.2023. - 27.02.2024.	469.399
	EIB- 23924 – III tranša	27.02.2024. – 28.08.2024.	469.399
	EIB- 23924 – IV tranša	18.12.2023. - 18.06.2024.	352.049
	EIB- 23924 – IV tranša	18.06.2024. – 18.12.2024.	352.049
	EIB- 23924 – V tranša	11.09.2023. - 11.03.2024.	625.866
	EIB- 23924 – V tranša	11.03.2024. – 09.09.2024.	625.866
	EIB- 23924 – VI tranša	24.08.2023. - 26.02.2024.	1.173.498
	EIB- 23924 – VI tranša	26.02.2024. - 26.08.2024.	1.173.498
	EIB- 23924 – VII tranša	03.08.2023. - 05.02.2024.	430.283
	EIB- 23924 – VII tranša	05.02.2024. - 05.08.2024.	430.283
	WB – IDA 43710	15.12.2023. - 15.06.2024.	988.050
	WB – IDA 43710	15.06.2024. – 15.12.2024.	980.047
	WB-IDA SDR tečajne razlike		-20.292
A	UKUPNO		9.361.607
<i>Program „Modernizacija cesta u F BiH“</i>			

	EBRD - 47461	15.08.2023.-15.02.2024.	4.547.072
	EBRD - 47461	15.02.2024.-15.08.2024.	4.852.928
	EIB 82137 – I tranša	16.10.2023.-15.04.2024.	651.943
	EIB 82137 – II tranša	16.10.2023.-15.04.2024.	332.491
	EIB 82137 – I tranša	15.04.2024.-15.10.2024.	651.943
	EIB 82137 – II tranša	15.04.2024.-15.10.2024.	332.491
	EIB 82137 – III tranša	15.04.2024.-15.10.2024.	554.152
B	UKUPNO		11.923.020
	SVEUKUPNO A+B		21.284.627

Vlada Federacije BiH je donijela Zaključak V broj 955/2024 od 20.06.2024. godine kojim je zadužila Federalno ministarstvo financija da javno oglasi prodaju nedospjelih potraživanja Dužnika po Ugovoru o financiranju između BiH i Europske investicijske banke (EIB) za projekat Sanacije puteva u Federaciji BiH broj 23.924 zaključen 26.03.2007. godine. Po tom osnovu je dana 28.11.2024. Vlada Federacije BiH koju je predstavljalo Federalno ministarstvo financija, potpisala ugovor o otkupu potraživanja sa Union Bankom d.d. Sarajevo (broj ugovora 01-03.1-10479/24), BBI d.d. Sarajevo (broj ugovora 01-03.1-10477/24), Uni Credit Bank d.d. Mostar (broj ugovora 01-03.1-10476/24) i JP Ceste Federacije BiH d.o.o. kojim je definirano da banke preuzimaju potraživanja od dužnika JP Ceste Federacije BiH d.o.o. i to:

- Union Banka d.d. Sarajevo – po osnovu tranše G u iznosu 3.300.000,00 eura
- BBI d.d. Sarajevo – po osnovu tranši A, B, C i D u iznosu od 4.241.233,36 eura
- UniCredit Bank d.d. Mostar po osnovu tranši E i F u iznosu od 8.560.000,00 eura

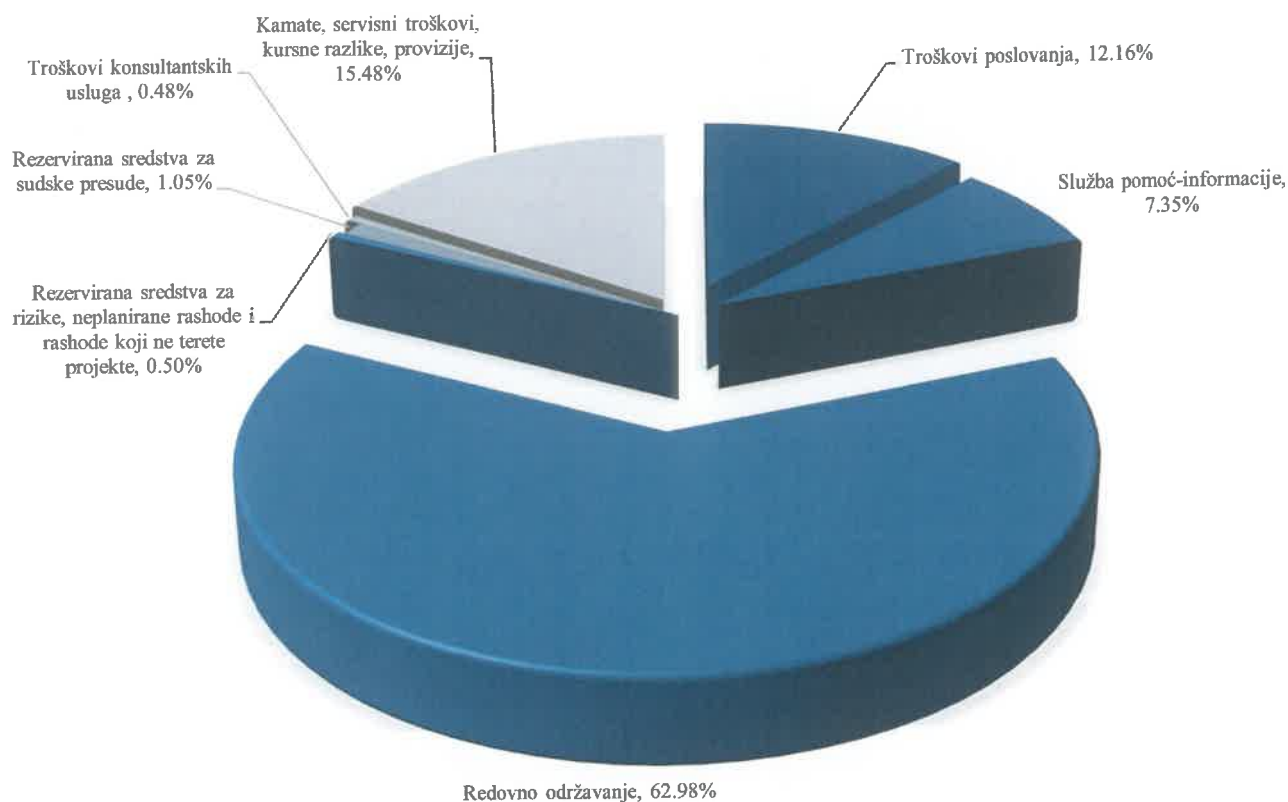

Grafički prikaz strukture realiziranih rashoda

B. II TROŠKOVI AMORTIZACIJE

Red. Br.	OPIS	Realizirano 31.12.2023.	Rebalans Plana 2024.	Realizirano 31.12.2024.	Index 5/4	Index 5/3
1	2	3	4	5	6	7
1.	Amortizacija stalnih sredstava	2.084.335	2.000.000	1.207.844	60	58
	UKUPNO	2.084.335	2.000.000	1.207.844	60	58

Vrijednost nematerijalne i materijalne imovine neophodne za obavljanje osnovne djelatnosti sistematski se otpisuje tokom procijenjenog vijeka trajanja i sučeljava sa pripadajućim dijelom odloženih prihoda (izvora) do momenta otpisa, u skladu sa MRS 20. Amortizacija se obračunava linearnom metodom otpisa, tokom procijenjenog korisnog vijeka trajanja stalnih sredstava. Amortizacija se odnosi na nematerijalna stalna sredstva, opremu i transportna sredstva.

C. INVESTICIJE

Red Br.	O P I S	Realizirano 31.12.2023.	Rebalans Plana 2024.	Realizirano 31.12.2024.	Index 5/4	Index 5/3
1	2	3	4	5	6	7
1.	Nabavka stalnih sredstava	1.018.550	2.676.000	981.525	37	96
2.	Program "Modernizacija cesta u F BiH"	37.045.232	17.744.900	15.781.250	89	43
	2.1. Program "Modernizacija cesta u F BiH" - vlastita sredstva	3.205.391	626.000	621.262	99	19
	2.2. Program "Modernizacija cesta u F BiH" - kreditna sredstva	33.839.841	17.118.900	15.159.988	89	45
3.	Projekti JP Ceste F BiH	24.412.597	67.403.798	26.840.719	40	110
	3.1. Projekti iz prethodnog perioda	23.520.731	42.311.960	20.459.727	48	87
	3.1.1. Projekti rekonstrukcije i izgradnje	3.406.966	5.227.300	1.349.477	26	40
	3.1.2. Rasvjeta i semaforizacija raskrsnica i tunela	24.383	1.473.300	337.190	23	1383
	3.1.3. Poboljšanje sigurnosti prometa	7.084.654	12.730.810	3.059.663	24	43
	3.1.4. Vanredno održavanje	13.004.728	22.880.550	15.713.397	69	121
	3.1.4.1. Sanacija cestovnih objekata	4.999.491	9.928.250	3.963.678	40	79
	3.1.4.2. Sanacija klizišta, odrona, sanacija slijeganja trupa puta, kosina i zasjeka	1.100.744	3.970.800	2.789.717	70	253
	3.1.4.3. Sanacija oštećenih asfaltnih kolovoza	6.904.493	8.981.500	8.960.002	100	130
	3.2. Planirani projekti u 2024. godini	891.866	25.091.838	6.380.992	25	715
	3.2.1. Projekti rekonstrukcije i izgradnje	382.826	717.350	197.505	28	52
	3.2.2. Rasvjeta i semaforizacija raskrsnica	0	7.000	0	0	-
	3.2.3. Poboljšanje sigurnosti prometa	0	6.919.770	1.065.021	15	-
	3.2.4. Vanredno održavanje	509.040	17.447.718	5.118.466	29	1006
	3.2.4.1. Sanacija cestovnih objekata	183.679	3.503.000	0	0	0
	3.2.4.2. Sanacija oštećenih asfaltnih kolovoza	163.565	7.055.815	4.351.606	62	2660
	3.2.4.3. Sanacija klizišta, odrona, sanacija slijeganja trupa puta, kosina i zasjeka	161.796	1.962.903	729.420	37	451
	3.2.4.4. Hitne intervencije na sanaciji šteta na cestovnoj infrastrukturi uzrokovanih poplavama	-	4.926.000	37.440	1	-
4.	Eksproprijacija i elaborati eksproprijacije	1.409.994	3.100.000	1.270.792	41	90
5.	Projekti iz Budžeta F BiH	2.973.804	24.920.000	19.780.281	79	665
6.	Sufinanciranje iz drugih nivoa vlasti	-	162.000	198.738	123	-
	U K U P N O	66.860.177	116.006.698	64.853.305	56	97

Od Rebalansom planiranih 116,01 mil. KM za investicije, u izvještajnom periodu realizovano je 64,85 mil. KM ili 56%. Od ovog iznosa, najveću realizaciju su imali projekti iz vlastitih sredstava od 26,84 mil. KM što je 40 % od planiranih 67,40 mil. KM. Projekti iz Programa „Modernizacije cesta u Federaciji BiH“ su realizirani sa 15,78 mil.KM ili 89% od planiranih 17,74 mil. KM, dok su sredstva za eksproprijaciju utrošena u iznosu od 1,27 mil. KM što je 41% od Rebalansom predviđenih 3,10 mil. KM. Projekti iz Budžeta F BiH za 2024. godinu realizirani su u iznosu 19,78 mil. KM ili 79% od planiranih 24,92 mil. KM, dok je Sporazumom broj: 04-11-162/24 o zajedničkom financiranju projekta „Sanacija mosta M15-003-42 preko rijeke Sane, Krkojevačko polje, na cesti M15, dionica Sanski Most 1-Kamičak, km 4+283 i Sporazumom broj 01-02.2-5009/24 za rekonstrukciju i sanaciju podhodnika u Živinicama II faza realizirano sufinanciranje u iznosu 0,20 mil. KM.

1. Nabavka stalnih sredstava

Red. Br.	OPIS	Rebalans Plana 2024.	Realizirano 01.01.-31.12.2024.	Index 4/3
1	2	3	4	5
1.	Automobili	250.000	119.990	48
2.	Oprema za poboljšanje funkcionisanja informatičkih sistema u JP Ceste F BiH	512.000	79.723	16
3.	Ulaganja u poslovnu zgradu	220.000	13.576	6
4.	Nabavka brojača prometa sa uvezivanjem u postojeći QLTCNet application sistem	350.000	295.138	84
5.	Nabavka cestovnih meteo stanica sa uvezivanjem u RWIS sistem JP Ceste FBiH	200.000	200.000	100
6.	Nabavka 1. kompleta prenosne osovine vage	70.000	69.207	99
7.	Nadogradnja aplikacije pipGIS JP Ceste FBiH	100.000	20.654	21
8.	Nadogradnja sistema upravljanje cestama - SUGOC	200.000	54.537	27
9.	Nadogradnja GROPRI sistema (generatora rješenja o cestovnim priključcima, reklamama i instalacijama)	129.000	128.700	100
10.	Razvoj sistema upravljanja kolovozima i kolovoznom konstrukcijom (RAMS) – sufinanciranje sa HAC	200.000	-	-
11.	Uspostava Sistema Weigh-in-Motion (WIM), vaganje u pokretu (nabavka opreme, softvera i edukacija korisnika)	400.000	-	-
12.	Nabavka GNSS uređaja (geodetski instrument za satelitsko mjerenje RTK metodom)	15.000	-	-
13.	Druge nabavke neophodne za izvršenje planiranih aktivnosti	30.000	-	-
UKUPNO		2.676.000	981.525	37

Rb. 1. - Planirana sredstva za automobile su dijelom realizirana u izvještajnom periodu ugovorom sa Auto Nuić d.o.o. Mostar, broj 01.03.2-11250/24 od 19.12.2024. godine i to u iznosu od 119.990 KM. Također je potpisan ugovor broj 01-03.2-11248/24 od 19.12.2024. sa AC Quattro d.o.o. Sarajevo na iznos 129.600 KM, ali se realizacija navedenog ugovora prenosi u naredni obračunski period.

Rb. 2. - Na osnovu ugovora potpisanog sa Config d.o.o. Mostar 01-02.3-11536/23 od 14.12.2023. godine za nabavku računarske opreme, realizirano je 31.752 KM. Potpisan je ugovor sa U-MKS d.o.o. Sarajevo 01-02.3-8912/24 od 02.10.2024. za nabavku telefonske centrale-migracija na IP sistem, ukupne vrijednosti 47.970 KM, što je i realizirano u izvještajnom periodu. Ugovor za nabavku računara i dodatne opreme je dana 30.12.2024. god. potpisan sa Config d.o.o. Mostar, broj ugovora 01-02.3-11513/24 ukupne vrijednosti 87.732 KM., te sa King ICT d.o.o. Sarajevo, broj ugovora 01-02.3-11512/24 vrijednosti 87.750 KM.

Rb. 3. – Iz sigurnosnih razloga planirano je ulaganje u poslovnu zgradu zbog dotrajalog kotla i instalacija za grijanje. Ugovor 01-03.2-2999/23 potpisan sa Unioninvest d.d. Sarajevo za sanaciju sistema grijanja i hlađenja u zgradi JP Ceste FBiH, vrijednost ugovora 119.586 KM i dio od 55.877 KM je realiziran 2023. godine, a ostatak ugovora od 63.353 KM je realiziran u 2024. godini, ali je knjižen kao trošak jer se radi o instaliranju novog kotla i radovima na sistemu grijanja. Na ovoj stavci u izvještajnom periodu je realizirano 13.576 KM što se odnosi na kupovinu novih ormara i uredskih stolica.

- Rb. 4.- Na osnovu ugovora 01-02.3-9290/23 od 03.10.2023. godine realiziran je dio nabavke brojača prometa u iznosu 13.139 KM. Također je potpisan je ugovor između JP Ceste Federacije BiH d.o.o. i ALEM Sistem d.o.o. Sarajevo 01-02.3-1668/24 od 13.03.2024. god. za nabavku, ugradnju i puštanje u rad automatskih brojača prometa u iznosu od 281.999 KM.
- Rb. 5. - Tokom 2020. godine uspostavljen je sistem ranog upozorenja na vremenske uvjete (RWIS) sa 13 meteoroloških stanica, koje su pozicionirane na kritičnim lokacijama. Da bi prognozni model bio u potpunosti pouzdan potrebno je izvršiti dopunu sistema sa novim meteorološkim stanicama. Sistem služi službama za planiranje i blagovremeno djelovanje u slučaju najavljenih ekstremnih uslova (snijeg, poplave...) uz racionalizaciju troškova održavanja. Također, podaci sa meteo stanica služe kao ulazni podaci za automatsko upravljanje objektima (tuneli, mostovi...). U izvještajnom periodu je realizirano 200.000 KM za nabavku cestovnih meteo stanica na osnovu ugovora sa ALEM Sistem d.o.o. Sarajevo, broj ugovora 01-02.3-10895/23 od 23.11.2023. godine.
- Rb. 6. - Nabavka komplet prenosne osovinske vage „za srednje točkove“ namijenjena je za mjerenje prekoosovinskog opterećenja vozila na magistralnim cestama. Prema ugovoru broj 01-02.3-10780/23 od 20.11.2023. godine, realizirana je nabavka u iznosu 69.207 KM.
- Rb. 7. - Ugovor za nadogradnju aplikacije pipGIS za upravljanje investicijama i projektima je zaključen sa TIM Konzalting d.o.o. Sarajevo, broj ugovora 01-02.3-9820/23 od 19.10.2023., a u izvještajnom periodu je realizirano 20.654 KM.
- Rb. 8. - Programskim rješenjima SUGOC sistema riješeno je održavanje i upravljanje magistralnim cestama u Federaciji BiH. Obzirom da se Program u JP Ceste F BiH koristi više od deset godina, a došlo je do novih operativnih sistema u međuvremenu, ukazala se potreba za nadogradnjom SUGOC-a. Nadogradnja sistema upravljanja cestama SUGOC, ugovor zaključen sa TEB Informatika d.o.o. Sarajevo, 01-02.3-9871/23 od 19.10.2023., vrijednost ugovora 298.089 KM, a do 31.12.2024. je realizirano preostalih 54.537 KM. Dana 20.09.2024. godine je potpisan ugovor sa sa TEB Informatika d.o.o. Zagreb i TEB Informatika d.o.o. Sarajevo, 01-02.3-8608/24 ukupnog iznosa 143.395 KM što je i realizirano do obračunskog perioda. Ova stavka je Rebalansom Plana poslovanja za 2024. godinu planirana pod C. Investicije, 1. nabavka stalnih sredstava, r.b. 8 – nadogradnja sistema upravljanja cestama SUGOC, ali zbog vrste usluga je evidentirana kao trošak georeferenciranog panoramskog zapisa pod r.b. 28 u materijalnim troškovima.
- Rb. 9. - GROPRI sistem je integritan sa ArhCoordinator sistemom za upravljanje priključcima i projektima, te OWIS DMS sistemom. GROPRI aplikacija sastoji se od više modula kroz koje se upravlja ključnim podacima, poput korisnika cestovnog zemljišta, partnera, priključaka, reklama instalacija... Potrebno je module proširiti prostornim podacima, da se kroz iste može unositi, brisati i mijenjati vezani podatak, tačka ili površina koja predstavlja poziciju u prostoru, ovisno o prikladnosti. To je potrebno omogućiti kroz vlastitu komponentu za vizuelizaciju na mjestu postojećeg uređjivanja podataka za svaki od tri modula. Ugovor za nadogradnju GROPRI softverskog rješenja je potpisan sa Zeljko d.o.o. Široki Brijeg, broj ugovora 01-02.3-5563/24 od 12.06.2024. godine i po ovom ugovoru je realizirano 128.700 KM.
- R.b. 10., 11, 12 i 13 nije bilo realizacije u izvještajnom periodu.

2. Zajednički projekti sa međunarodnim finansijskim institucijama

Program „Modernizacija cesta u F BiH“

Program „Modernizacija cesta u FBIH“ (Program) obuhvatao je više podprojekata koji su podijeljeni u dvije grupe i to:

- **I grupa** projekti izgradnje cestovnih dionica od strateškog značaja za FBIH/ BiH i izgradnje obilaznica oko gradova; i
- **II grupa** projekti rekonstrukcije/sanacije postojećih cesta i kolovozne konstrukcije, korekcija osovine, izgradnje trećih traka za spora vozila, rehabilitacije/ rekonstrukcije mostova i tunela, rehabilitacije/ rekonstrukcije crnih tačaka i opasnih mjesta i dr.

Za izvršenje ovih projekata osigurani su dugoročni krediti međunarodnih razvojnih banaka, dok su za finansiranje troškova eksproprijacije i PDV-a korištena sredstva Budžeta FBIH/JP Ceste FBIH.

Krajnji rok raspolaganja sredstvima kredita Međunarodne banke za obnovu i razvoja (IBRD) bio je 30.09.2023. godine. U skladu sa Amandmanom br. 1 na Financijski ugovor između BiH i EIB krajnji rok raspolaganja sredstvima kredita EIB bio je do 23.02.2023. Dakle, 2023 godina je bila posljednja godina realizacije projekata iz Programa koje su samostalno i/ili zajednički i/ili financirale IBRD i EIB.

U 2024. godini se realiziran određen broj projekata koji se financiraju iz kreditnih sredstava Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD). U narednom periodu su preostala još dva projekta da se okonča Program „Modernizacija cesta u Federaciji BiH“, a to su „Izgradnja tunela „Novi“ na južnoj obilaznici Mostara i „Bihać-Bos.Krupa, I faza Jablanska-Mali Lug dužine 3,5 km“, procijenjeno vrijeme za završetak radova je jedna godina, te bi isti trebao biti završen do krajnjeg datuma raspolaganja kreditom EBRD (30.09.2025).“

Raspoloživa kreditna sredstva EBRD, prema sadašnjem toku implementacije projekata, trebala bi biti dovoljna za završetak projekata.

2.1. Radovi na modernizaciji magistralnih cesta i objekata i konsultantske usluge nadzora

2.1.1. Preneseni projekti iz prethodnog perioda

U dole navedenoj tabeli dat je pregled planiranih i realizovanih troškova za radove na obilaznicama oko gradova, rekonstrukcije i izgradnje cesta i konsultantske usluge nadzora za projekte čija implementacija je započeta u ranijim godinama, a nastavljena u 2024, kao i izvori financiranja:

Red. Br.	Mag. Cesta	Dionica	DIONICA	Aktivnosti na projektu	Rebalans Plana 2024.	Izvođač /konsultant ugovor	Ugovoreno	Realizirano 01.01.-31.12.2024.	Napomena
4. Izgradnja i rekonstrukcija obilaznica									
4.2	M5		Mostar obilaznica- Izgradnja dionice Miljkovići-Rodoč, vijadukt Marjanovića Draga	Izvođenje	200.500	JV Hering i KTM Brina d.o.o Posušje BA/FBH/FRU/W/4-1/20 Amandman 3 01-05.2-7462/23, 08.08.2023 Amandman br.4 01-05.2-5433/24 19.06.2024.	11.428.085	164.415	Radovi okončani. Očekuje se ispostavljanje okončane situacije u I kvartalu 2025 god.
				Kamata				2.732	
				Ukupno				167.147	
4.2	M5		Izgradnja obilaznice Donji Vakuf – I faza	Izvođenje	898.000	JVCA Bossil d.o.o. Vitez-Point d.o.o. Sarajevo,	3.717.227	677.930	Radovi okončani.

JP CESTE FEDERACIJE BIH

						01-05.2-3/21.BP. 05.01.2021. Amandman 3 Amandman 6 Amandman br. 7			Potvrda o preuzimanju radova izdata 16.12.2022. Očekuje se ispostavljanje okončane situacije u I kvartalu 2025 god
				Kamata				11.265	
				Ukupno				689.195	
5. Izgradnja i rekonstrukcija obilaznica									
5.2	M15		Livno obilaznica – I faza	Izvođenje	180.000	JV Livnopotovi d.o.o Livno i KTM Brina d.o.o Posušje 01-05.2-3382/22 BP 31.05.2022 Amandman br.1 01-05.2-12336/22, 27.12.2022	4.605.564	179.915	Radovi završeni 29.11.2023 godine. Izvršen tehnički prijem, konačni obračun radova i izdata upotrebna dozvola. Period za otklanjanje nedostataka ističe 29.11.2025
				Nadzor	41.100	Roughton International LTD. UK, Amandman br.2 01-05.2-3288/22 06.05.2022. Amandman 4 ;01-05.2-11231/23, 06.12.2023	356.079	18.532	
				Ukupno				198.447	
6. Izgradnja i rekonstrukcija pristupnih cesta i obilaznica									
6.1	M18	007 i 009	Olovo – Semizovac – rekonstrukcija škarpi i spora traka Čevljanovići – Nišići	Izvođenje	2.764.000	Strabag AG 01-05.2-8863/22 11.10.2022. Amandman 1 01-05.2-6610/23, 10.07.2023	5.517.712	2.636.180	Radovi završeni 30.09.2024 godine. Dana 02.10.2024 godine predstavnici Nadzora i Investitora obavili pregled i ustanovili nedostatke koji se trebaju otkloniti. Očekuje se ispostavljanje okončane situacije u I kvartalu 2025. god
				Nadzor	235.000	Roughton International LTD. UK, 01-05.2-511/20. 13.01.2020. Amandman 1 01-05.2-2615/22, April 2022 Amandman 4 01-05.2-11231/23, 06.12.2023	125.181	261.387	
				Kamata				99.480	
				Ukupno				2.997.047	
6.2	M 6.1		Mostar obilaznica – Izgradnja dionice Miljkovići – Rodoč (Tunel Novi)	Izvođenje	8.530.300	JV Hering d.o.o. Široki brijeg & Azvirt LLC Baku Azerbejdžan 01-05.2-7664/22 30.08.2022	25.131.195	8.212.666	Radovi u toku. Dana 24.01.2025 potpisan amandman br. 4, definisan novi rok za završetak radova sa 09.05.2025. godine.
				Kamata				169.793	
				Ukupno				8.382.459	
7.4	M6		Grude (veza M6 i R420) – Izgradnja sjeverne obilaznice	Izvođenje	3.000.000	Putovi D.o.o. Grude i HP Investing d.o.o. Mostar, 01-05.2-10159/22 BP 14.11.2022	5.056.283	2.990.102	Radovi okončani. Potvrda o preuzimanju radova izdata 29.11.2024 godine. Period za otklanjanje nedostataka je 730 dana i ističe 23.11.2026. god.
				Kamata				111.764	
				Ukupno				3.101.866	
	M5		Izgradnja obilaznice Kiseljaka I faza	Nadzor	1.900	Roughton International LTD. UK, Amandman 3 01-05.2-6717/23		1.920	Nadzor okončan
				Ukupno				1.920	
7. Izgradnja obilaznica									
9.1	M14		Bihać-Bos.Krupa, I faza Jablanska-Mali Lug km 3,5 0168	Izvođenje	1.200.000	JVCA Prijedorputevi a.d. & Kov Grad d.o.o. 01-05.2-8659/24, 23.09.2024.	12.958.591	-	Izvođač je uveden u posao 03.12.2024 godine.
				Nadzor	68.100	Roughton International LTD 01-05.2-511/20. 13.01.2020	102.010	16.941	
				Ukupno				16.941	
UKUPNO E B R D				Izvođenje	16.772.800			14.861.208	
				Nadzor	346.100			298.780	

Konsultantske usluge

NAZIV	Rebalans Plana 2024.	Izvođač/ Konsultant-ugovor	Ugovoreno	Realizirano 01.01.-31.12.2024.	Finansijer
Nadzor za projekte finansirane od strane EBRD iz II tranše	226.000				
- Obilaznica Grude (sjeverna)		GP:IGH d.o.o.Mostar, Integra d.o.o. Mostar i Trasa d.o.o. Sarajevo,01- 02.1-2256/23. 24.03.2023	349.339 (preneseno 170.066)	166.068	Vlastita sredstva 0169
		Dodatne usluge nadzora: GP:IGH d.o.o.Mostar, Integra d.o.o. Mostar i Trasa d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-10221/24. 18.11.2024.	56.318	60.160	
UKUPNO	226.000			226.228	

Kamate na međunarodne kredite

NAZIV	Rebalans Plana 2024.	Realizirano 31.12.2024.	Napomena
Kamate i servisni troškovi za program „Modernizacija cesta u FBiH“	400.000	395.034	Vlastita sredstva
UKUPNO	400.000	395.034	

U skladu sa Sporazumom o kreditu između EBRD i BiH, troškovi održavanja kredita (provizija na nepovučena sredstva zajma) iznose 0,5% godišnje. Kamatna stopa je promjenljiva (6-mjesečni EURIBOR) + fiksni raspon 1%. Datumi plaćanja kamate 15. mart i 15. septembar svake godine.

Realizirana kamata se odnosi samo na plaćene kamate EBRD-a sa 31.12.2024. godine raspoređene na investicije.

U skladu sa kreditnim sporazumom između Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) i BiH provizija na nepovučeni iznos kredita iznosi 0,25 % godišnje. Kamatna stopa je promjenljiva (6-mjesečni EURIBOR) plus varijabilni raspon. Datumi plaćanja kamate 15. februar i 15. august svake godine.

Za povlačenje tranši kredita EIB-a, u skladu sa kreditnim sporazumom, moguće je odabrati fiksnu ili promjenljivu kamatnu stopu, dok EIB utvrđuje varijabilni raspon u momentu povlačenja tranše. Povlačenje sredstava kredita izvršeno je u šest tranši, a prilikom povlačenja tranši primjenjena je fiksna kamatna stopa.

Obračunata kamata na međunarodne kredite tereti projekte koji su u toku sve do trenutka njihovog aktiviranja.

Revolving sredstva za PDV

U skladu sa odredbama člana 29. Zakona o porezu na dodanu vrijednost i instrukcijom Uprave za indirektno oporezivanje o uslovima i načinu povrata PDV-a po osnovu uvoza i isporuke dobara, nabavke radova i usluga za međunarodne projekte, može se ostvariti povrat PDV-a uz podnošenje propisane dokumentacije i dokaza o uplati PDV-a. Obzirom da se radi o povratnim sredstvima, plaćanje istih će se vršiti iz tekućeg priliva sredstava, a nadopunjavati povratom sredstava od Uprave za indirektno oporezivanje.

**REKAPITULACIJA PLANIRANIH ULAGANJA ZA
PROGRAM „MODERNIZACIJA CESTA U FBiH“**

Red. Br.	O P I S	Rebalans Plana		Realizirano 31.12.2024.	
		EBRD	UKUPNO	EBRD	UKUPNO
I	Radovi	16.772.800	16.772.800	14.861.208	14.861.208
1.	Troškovi nadzora	346.100	346.100	298.780	298.780
II	Konsultantske usluge – ukupno	346.100	346.100	298.780	298.780
III	SVEUKUPNO (I+II)	17.118.900	17.118.900	15.159.988	15.159.988

3. Projekti JP Ceste F BiH
3.1. Projekti iz prethodnog perioda
3.1.1. Projekti rekonstrukcije i izgradnje

Red Br.	Mag. Cesta	Naziv i opis projekta	Aktivnosti na projektu	Rebalans Plana 2024.	Izvođač/ Konsultant-ugovor	Ugovoreno	Realizirano 01.01.-31.12.2024.	Napomena
1.	M5	Obilaznica Kiseljaka - Glavni projekat trase (II faza), tunela (L=cca 600m) ukupna dužina dionice L=cca 1.000m	Projektiranje	68.000	Ipsa Institut d.o.o.Sarajevo 01-02.1-8987/20. 14.09.2020. Dodatne usluge projektiranja: 01-02.1-172/24 08.01.2024.	149.200 (preneseno 47.531) 20.241	67.733	Okončano projektiranje i revizija, radovi u toku
			Revizija	10.000	GP: IG d.o.o.Banja luka i Divel d.o.o. Sarajevo 01-02.1-4549/21. 12.04.2021.	9.594	9.594	
			Izvođenje	565.000			-	
			Nadzor	1.100			-	
			Ukupno				77.327	
2.	M14.1	Glavni projekat izgradnje dionice ceste Grmuša – Mali Radić, L=8km, uključujući Misiju G21	Projektiranje	23.000	Geoput d.o.o Banja luka, 01-02.1-9577/21. 22.09.2021.	75.763 (preneseno 22.729)	-	U toku
			Revizija	3.000	Trasa d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-10254/18 20.11.2018.	2.925	-	
			Ukupno				-	
3.	M17.3	Rekonstrukcija ceste M17.3, dionica: Drenovac-Stolac, L=cca 8 km - Glavni projekat	Projektiranje	22.600	Integra d.o.o. Mostar, 01-02.1-12269/19 18.10.2019.	39.817 (preneseno 22.576)	22.576	Okončano
			Revizija	5.000	Pronasa d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-3227/20. 12.03.2020.	4.998	4.998	
			Ukupno				27.574	
4.	M14	Izgradnja obilaznice Bosanska Otoka (veza cesta M14 i R 401) - Glavni projekat trase i mosta preko rijeke Une	Projektiranje	56.300	GP: Routing d.o.o.Banja luka i Geoput d.o.o. Banja luka, 01-02.1-5342/21. 05.05.2021.	84.800 (preneseno 56.318)	30.878	Glav. Projekat predat za reviziju
			Revizija	4.700	Trasa d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-7980/21. 29.07.2021.	4.680	-	
			Ukupno				30.878	
5.	M6	Izrada glavnog projekta izmještanja trase ceste M6 na dionici Gornji Trebižat-spoj sa M17 u Klepcima (obilaznica Čapljine) (L=cca 8,7km)	Projektiranje	420.000	GP: Integra d.o.o. Mostar, IGH d.o.o. Mostar i Interprojekt d.o.o. Mostar, 01-02.1-1708/24, 14.03.2024	420.170	29.250	U toku (Projekat bio u zastoju zbog prethodne vodne saglasnosti koja je izdata nakon 6 mjeseci)
			Revizija	40.000	GP: Infra d.o.o. Sarajevo i PPG d.o.o. Sarajevo 01-02.1-8595/24 20.09.2024.	31.590	-	
			Ukupno				29.250	
6.	M6 i M17.4	Izgradnja obilaznice Ljubuškog (Spoj M6 i M17.4) Izvođenje radova od P61 A do P71	Izvođenje	500.000			-	Proveden postupak nabavke – Ugovaranje čeka eksprop.
			Nadzor	15.000			-	
7.	M6	Izgradnja Južne obilaznice Gruda – Izlaz Prispa	Izvođenje	131.000	Putovi d.o.o. Grude, 01-02.1-6647/23, 11.07.2023.	499.701 (preneseno 130.839)	130.709	Okončano

JP CESTE FEDERACIJE BIH

		(Spoj kružnog toka na M6 sa izgrađenim dijelom obil.)	Nadzor	3.100	IGH d.o.o. Mostar, 01-02.1-6648/23, 11.07.2023.	11.911 (preneseno 3.082)	3.131	
			Ukupno				133.840	
8.	M4.2	Izgradnja obilaznice Cazina - Izrada Glavnog projekta (izmještanja) raskrsnice Čizmići na projektu izgradnje Obilaznice Cazina	Projektiranje	1.000	Geo-Feld d.o.o.Bihać, 01-02.1-11407/22 01.12.2022.	6.962 (preneseno 697)	-	Okončano
			Revizija	2.000	GF Univerziteta u Sarajevu, 01-02.1-11886/23, 29.12.2023.	1.980	1.980	
			Ukupno				1.980	
9.	M18	Rekonstrukcija ceste M18, dionica Kladanj-Podpaklenik – u ukupnoj dužini cca 3,50km Glavni projekat trase i idejni projekat objekata - dionica 1 (LOT 1) Kladanj-Karaula, - dionica 2 (LOT 2) Karaula - Olovo	Projektiranje	102.000	Institut za građevinarstvo „IG“ d.o.o. Banja Luka, 01-02.1-9861/23, 19.10.2023.	101.895	41.751	U toku
			Revizija	8.500	TZI d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-3626/24 13.05.2024.	8.494	-	
			Ukupno				41.751	
10.	M6	Izmještanje trase ceste M6, Grude-Ljubuški-Čapljina Izrada idejnog rješenja trase, dionica: Podledinac-Lipno-križanje sa M17.4(Cerno)-Miletina, L=cca 26,00 km	Projektiranje	43.300	Divel d.o.o. Sarajevo 01-02.1-337/24 15.01.2024.	43.290	43.290	Okončano
			Ukupno				43.290	
11.	M17	Revizija glavnog projekta petlje Drivuša i izrada separata za saglasnosti i dozvole	Revizija	10.000			-	U toku
12.	M17.6	Izrada idejnih i glavnih projekata magistralne ceste M17.6, na području općine Ravno i općine Neum, L= 15,52 km	Projektiranje	323.000	Integra d.o.o. Mostar 01-02.1-11032/24 12.12.2024.	116.988	-	U toku
			Ukupno				-	
13.	M18	Izrada idejnog projekta rekonstrukcije ceste M18, dionice Stupari – Vitalj L=cca 10km	Projektiranje	87.000	IG d.o.o. B. Luka 01-02.1-5828/24 24.06.2024.	86.996	42.474	U toku
			Ukupno				42.474	
14.	M4	Izrada glavnog projekta izgradnje mosta preko rijeke Jale u Slavinovićima (T9) u okviru projekta izgradnje dionice Ši Selo – Slavinovići	Projektiranje	30.000	TZI Inženjering d.o.o. Sarajevo 01-02.1-10216/24 18.11.2024.	25.483	-	Projekt. u toku Nabavka usluga revizije u pripremi
			Revizija	4.000			-	
			Ukupno				-	
15.	M15	Izgradnja novog mosta (M15-004-50) preko rijeke Banjice, dionica Kamičak-Ključ, km 18+414	Idejni projekat	-	Infra d.o.o. Sarajevo 01-02.1-6045/24 02.07.2024.	6.845	6.845	Idejni. Projekat okončan. U pripremi PZ za Glavni projekat Okončano
			Projektiranje	15.000			-	
			Izvođenje	815.000			-	
			Nadzor	25.000			-	
			Ukupno				6.845	
16.	M14.1 i 14.2	Izgradnja sjevernog kraka obilaznice Odžaka („Sjeverna veza“-nastavak) – II faza	Izvođenje	726.000	Balegem d.o.o. Gradačac 01-02.1-1713/24 14.03.2024.	725.828	724.456	Okončano
			Nadzor	13.400	AIK Inženjering d.o.o. Banovići 01-02.1-1711/24 14.03.2024.	13.338	13.338	
			Ukupno				737.794	
17.	M17.4	Izrada idejnog rješenja izmještanja ceste M17.4 u zoni Čitluka, dionica: Sretnice-Služanj-Cerno sa vrednovanjem varijanti (Izrada idejnog rješenja obilaznice Čitluka)	Projektiranje	50.000	GP: Radis d.o.o. Istočno Sarajevo i AIK Inženjering d.o.o. Banovići 01-02.1-9916/24 06.11.2024	22.129	-	U toku

			Ukupno					
18.	M14	Izmjena idejnog i glavnog projekta izgradnje obilaznice Bihaća, dionica: Jablanski čvor-Mali Lug-veza na M14	Projektiranje	44.000	Institut za građevinarstvo „IG“ d.o.o. Banja Luka, 01-02.1-9286/23, 02.10.2023.	43.875	17.550	Idejni okončan, glavni proj. u izradi
			Revizija	4.000	Trasa d.o.o. Sarajevo 01-02.1-3002/24 07.05.2024.	4.000	-	
			Ukupno				17.550	
19.	M18	*Izgradnja ceste Tuzla (Drežnik)-Šićki Brod, dovršetak izgradnje kružne raskrsnice Lipnica	Izvođenje	832.000			-	Nabavka radova okončana
			Nadzor	25.000			-	U toku nabavka nadzora
			Ukupno				-	
20.	M14	Glavni projekat ceste Bihać-Bos.Krupa, dionica: Veliki Radič-Vranjska, L=cca 6,4 km	Projektiranje	117.000	TZI Inženjering d.o.o. Sarajevo 01-02.1-1394/24 28.02.2024	116.881	116.881	Okončano
			Revizija	3.800	CPK d.o.o. Banja Luka 01-02.1-7118/24	3.744	3.744	
			Ukupno				120.625	
21.	M20	Izgradnja kružnog toka u Goraždu na M20 - Rušenje ekpropisanog objekta	Projektiranje	-	Uniprojekt d.o.o. Goražde 01-02.1-8872/24 01.10.2024.	2.340	2.340	Okončano
			Izvođenje	30.000	Okac d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-4839/24 20.05.2024.	29.917	29.460	
			Ukupno				31.800	
22.	M5	Bihać 4-Ripač, ispravljanje osovine ceste (Devijacija puta AVNOJ-a)	Projektiranje	6.500	Arting BH d.o.o. Sarajevo 01-02.2-7158/24 12.08.2024.	6.499	6.499	Okončano
			Ukupno				6.499	
23.	M17.3	Izrada glavnog projekta trake za spora vozila na M17.3_001: - dionica 1: km4+900-km8+200, - dionica 2: km17+600-km18+500 ***	Projektiranje	35.000	Trasa d.o.o. Sarajevo 01-02.1-9468/24 22.10.2024	34.998	-	U toku
			Revizija	7.000	TZI Inženjering d.o.o. Sarajevo 01-02.1-11031/24 12.12.2024.	5.628	-	
			Ukupno				-	
UKUPNO				5.227.300			1.349.477	

***Napomena:** Red. broj. 19. – Zbog prekoračenja procjenjene vrijednosti poništen postupak nabavke. U ponovljenom postupku povećana procjenjena vrijednost na 832.000 KM (sa PDV-om). Nedostajuća sredstva preko 600.000 KM koliko je predviđeno Planom poslovanja JP Ceste FBiH za 2024. god., će osigurati Grad Tuzla, kako je potvrđeno Pismom namjere 02-425-08/2024 od 02.08.2024. godine.

3.1.2. Rasvjeta i semaforizacija raskrsnica

Red br.	Mag. Cesta	Naziv i opis projekta	Aktivnosti na projektu	Rebalans Plana 2024.	Izvođač/ Konsultant- ugovor	Ugovoreno	Realizirano 01.01.- 31.12.2024.	Napomena
1.	M16	Rasvjeta tunela Tuk na M16, dionica: Crna Rijeka – Jajce	Izvođenje	400.000			-	Priprema TD
			Nadzor	7.000			-	
2.	M14.2	Semaforizacija mosta u Prudu /Šamac na cesti M14.2	Izvođenje	55.000			-	Nabavka u toku
3.	M1.9	Rasvjeta tunela Ormanica	Izvođenje	100.000	Nexen d.o.o. Banja Luka, 01-02.2-3061/23 20.04.2023	99.886	99.886	Okončano

JP CESTE FEDERACIJE BIH

			Nadzor	3.000	Advanced Technology and Systems d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-1128/22, 08.02.2022.	2.995	2.995	
			Ukupno				102.881	
4.	M14.1 M1.9	Rasvjeta raskrsnice cesta M14.1 i M1.9 u Gradačcu (kružni tok)	Izvođenje	250.000	Konzorcij ELVIK d.o.o. Srebrenik i KOP i KO d.o.o. Živinice, 01-02.2-5386/24, 10.06.2024.	249.987	-	Radovi u toku
			Nadzor	2.500	Elsoft d.o.o. Gradačac 01-02.2-7979/24 03.09.2024.	2.500	-	
			Ukupno				-	
5.	M16 M16.2	Rasvjeta raskrsnice cesta M16 i M16.2, općina Bugojno	Izvođenje	120.000	Nexen d.o.o. Banja Luka, 01-02.4-4781/24 16.05.2024	119.848	-	Nabavka u toku
			Nadzor	2.500	BNT Inženjering d.o.o. Novi Travnik, 01-02.4-4782/24 16.05.2024	2.457	-	
			Ukupno				-	
6.	M4.2	Rasvjeta raskrsnice na cesti M4.2, skretanje Mihaljevac, grad Cazin	Projektiranje	3.900	Manedra d.o.o. Mostar, 01-02.2-10676/22, 18.11.2022.	3.861	3.861	Okončano
			Izvođenje	120.000	MC Stella d.o.o. Velika Kladuša, 01-02.2-5172/24 03.06.2024.	119.165	119.038	
			Nadzor	2.500	Euroing d.o.o. Bihać 01-02.4-7499/24 27.08.2024.	2.500	2.500	
			Ukupno				125.399	
7.	M6 M16.5	Rasvjeta raskrsnice cesta M6.1 i M16.5, Karlov Han, općina Livno	Izvođenje	103.000	Nexen d.o.o. Banja Luka, 01-02.2-9060/23, 21.09.2023.	102.869	92.957	Okončano
			Nadzor	1.800	IPSA Institut d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-9061/23, 21.09.2023.	1.708	-	
			Ukupno				92.957	
8.	M17	Sanacija semafora u Konjicu na M17 i R435	Izvođenje	75.000			-	Priprema TD
			Nadzor	5.000			-	
9.	M17	Rasvjeta Ribičkog mosta, dionica: Konjic-Jablanica	Projektiranje	5.600	IPSA Institut d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-9993/23, 25.10.2023.	5.540	5.540	Okončano
			Ukupno				5.540	
10.	M17	Glavni projekat rasvjete raskrsnice ceste M17 i lokalne ceste za naselje Papratnica dionica M17_006: Ozimica-Topčić polje, km 9+180, općina Žepče	Projektiranje	6.000	Manedra Company d.o.o. Mostar, 01-02.2-6114/24, 24.06.2024	5.967	5.967	Okončano
			Ukupno				5.967	
11.	M14.1	Rasvjeta kružnog toka Odžak, spoj na AC	Projektiranje	4.500	Manedra Company d.o.o. Mostar, 01-02.2-2105/24, 27.03.2024	4.446	4.446	Okončano projektiranje. Nabavka radova u toku
			Izvođenje	200.000			-	
			Nadzor	6.000			-	
			Ukupno				4.446	
				1.473.300			337.190	

3.1.3. Poboljšanje sigurnosti prometa na magistralnim cestama izgradnjom traka za lijeva skretanja, pješačkih staza sa odvodnjom kišne kanalizacije, odmorišta i sanacija crnih tačaka

Red Br.	Mag. Cesta	Naziv i opis projekta	Aktivnosti na projektu	Rebalans Plana 2024.	Izvođač/ Konsultant-ugovor	Ugovoreno	Realizirano 01.01.-31.12.2024.	Napomena
1.	M18	*Rekonstrukcija raskrsnice na M18 010 Kobilja Glava-Sarajevo – Malta km 8+340	Izvođenje	1.360.000			-	Priprema TD. U prvoj nabavci nije bilo zainteresovanih ponuđača za radove.
			Nadzor	15.000			-	
2.	M1.8	Izgradnja pješačke staze na dionici Ježinac-Čehaje-Srebrenik-skretanje za Ljenobud, L=3179 m (I faza)	Projektiranje	7.000			-	Projekat ustupila općina. Potpisan ugovor za radove i nadzor.
			Izvođenje	200.000	Jata Group d.o.o. Srebrenik 01-02.2-6612/24 18.07.2024	199.381	-	
			Nadzor	7.000	Arting d.o.o. Sarajevo 01-02.2-7157/24 12.08.2024.	6.997	-	
			Ukupno				-	
3.	M5	Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok na cesti M5 u naseljenom mjestu Kalibunar, općina Travnik	Izvođenje	698.000	GP: Struktura d.o.o. Jajce i MIG Elektro d.o.o. Mrkonjić Grad 01-02.2-7032/24 06.08.2024.	697.539	697.415	Okončano
			Nadzor	7.000	Arting BH d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-9736/20. 12.10.2020.	6.929	6.929	
			Ukupno				704.344	
4.	M 16.2	Rekonstrukcija raskrsnice za naselje Duge, općina Prozor	Izvođenje	549.000	HP Investing d.o.o. Mostar 01-02.1-7983/24 03.09.2024.	548.857	-	Odgođen početak radova za proljeće zbog sanacija šteta od poplava
			Nadzor	15.000	Arting BH d.o.o. Sarajevo 01-02.1-7984/24 03.09.2024.	5.534	-	
			Ukupno				-	
5.	M17	Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok, cesta M17-skretanje Hadžići	Izvođenje	170.000	Strabag d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-2153/24	169.930	169.678	Okončano
			Ukupno				169.678	
6.	M1.9	Rekonstrukcija ceste M1.9. Slatina (gr.entiteta) – Gradačac – izgradnja kružnog toka na križanju za industrijsku zonu, općina Gradačac	Izvođenje	650.000			-	Rješavanje IP odnosa
			Nadzor	7.000			-	
7.	M6.1	Izgradnja nogostupa uz cestu M6.1 u naseljenom mjestu Knešpolje	Izvođenje	300.000			-	Grad treba da položi vodovod
			Nadzor	7.000			-	
8.	M18	Rekonstrukcija pješačkih staza sa rješavanjem odvodnje, mag. Cesta M18, dionica 010 Semizovac – Sarajevo – Malta, km 8+400 km – km 10+400 (Kobilja glava – Šip)	Izvođenje	100.000			-	Priprema TD
			Nadzor	4.000			-	
9.	M5	Rekonstrukcija raskrsnice sa pješačkom stazom u naselju Barice, općine Donji Vakuf	Izvođenje	250.000			-	Ishodovanje odobrenja za gradnje
			Nadzor	7.000			-	
10.	M4	Rekonstrukcija raskrsnice na ulazu u Jelah, općina Tešanj (Sufinansiranje sa Općinom Tešanj)	Projektiranje	6.600			-	Usklađivanje projekta sa općinom
11.	M1.8	Rekonstrukcija raskrsnice cesta M1.8 i R 461 u Srebreniku, na cesti M1.8, dionica Orašje – Tuzla	Projektiranje	12.100	Infra d.o.o. Sarajevo 01-02.2-6072/24 03.07.2024.	12.051	-	Projektovanje u toku
			Revizija	3.000			-	

JP CESTE FEDERACIJE BIH

			Ukupno					
12.	M5	Rekonstrukcija/Sanacija raskrsnice na M5 Azize Šećerbegović-Korija-Ljubogošta, km 1+350	Projektiranje	5.800	Design&QC d.o.o. Sarajevo 01-02.2-1431/24 04.03.2024	5.733	5.733	Ishodovanje odobrenja za građenje
			Revizija	2.300	Artimg BH d.o.o. Sarajevo 01-02.2-6341/24 11.07.2024	2.332	2.332	
			Izvođenje	500.000			-	
			Nadzor	7.000			-	
			Ukupno				8.065	
13.	M4	Rekonstrukcija i dogradnja potputnjaka na M4 u Mravićima, općina Doboj jug	Projektiranje	7.000			-	Ne može se uraditi projekat za ova sredstva. Nema potrebe za većim podputnjakom trenutno.
			Revizija	-			-	
14.	M18	Rekonstrukcija raskrsnice cesta M18 i R455a u km 6+100, općina Živinice, naselje Maline	Revizija	2.400	Artimg BH d.o.o. Sarajevo 01-02.2-6341/24 11.07.2024.	2.332	2.332	Ishodovanje odobrenja za građenje u toku.
			Izvođenje	400.000			-	
			Nadzor	7.000			-	
			Ukupno				2.332	
15.	M17.3	Rješavanje odvodnje u Neumu (II faza)	Izvođenje	399.000	HP Investing d.o.o Mostar, 01-02.2-9583/23, 12.10.2023.	398.842	361.142	Okončano
			Nadzor	3.500	ProKonsing d.o.o. Mostar, 01-02.2-9584/23, 12.10.2023.	3.452	3.452	
			Ukupno				364.594	
16.	M18	Rekonstrukcija raskrsnice na cesti M18, skretanje Vogošća centar, općina Vogošća	Izvođenje	250.000			-	Ishodovanje odobrenja za građenje u toku.
			Nadzor	7.000			-	
17.	M16	Izgradnja pješačke staze u naselju Guber, općina Livno	Projektiranje	4.700	Design&QC d.o.o. Sarajevo 01-02.2-1225/24 21.02.2024	4.680	4.680	Okončano projektovanje. Priprema TD
			Izvođenje	150.000			-	
			Nadzor	7.000			-	
			Ukupno				4.680	
18.	M6.1	Sanacija raskrsnice M6.1 i lokalne ceste u naselju Knežpolje, Grad Široki Brijeg	Izvođenje	400.000			-	Općina radi Izmjenu projektnog rješenja
			Nadzor	7.000			-	
19.	M5	Izgradnja pješačke staze uz magistralnu cestu M5, naselje Kačuni-Polje, općina Busovača	Projektiranje	4.600	Design&QC d.o.o. Sarajevo 01-02.2-443/24 19.01.2024.	4.563	4.563	Projektovanje završeno. Priprema TD za radove i nadzor.
			Izvođenje	140.000			-	
			Nadzor	3.000			-	
			Ukupno				4.563	
20.	M4	Sanacija raskrsnice cesta M4 i R461A u mjestu Rečica, općina Gračanica	Projektiranje	3.600	Artimg BG d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-11767/23, 25.12.2023.	3.510	3.510	Okončano
			Revizija	4.000	Pronasa d.o.o. Sarajevo	2.925	-	

JP CESTE FEDERACIJE BIH

					01-02.2-11247/24 19.12.2024.			
			Ukupno				3.510	
21.	M4	Idejni projekat rekonstrukcije raskrsnice na cesti M4, ulaz u Gračanicu, grad Gračanica	Projektiranje	15.000	AIK Inženjering d.o.o. Banovići 01-02.1-9837/24 04.11.2024.	6.786	6.786	Okončano
			Ukupno				6.786	
22.	M16	Izgradnja pješačke staze na M16, 006 Crna rijeka-Jajce jug u naselju Vidikovac-Zastinje, općina Jajce	Projektiranje	6.500	Arting d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-11435/23, 13.12.2023.	6.500	6.500	Okončano
			Ukupno				6.500	
23.	M4	Rekonstrukcija raskrsnice na cesti M4, skretanje Stanić Rijeka, općina Doboj Istok	Projektiranje	5.200	Urbis Centar d.o.o. Banja Luka, 01-02.2-11062/23, 30.11.2023.	5.148	5.148	Okončano
			Ukupno				5.148	
24.	M17.4	Izgradnja trake za lijeva skretanja na cesti M17.4 u općini Čitluk	Izvođenje	322.300	Demus d.o.o. Sarajevo 01-02.2-9339/24 16.10.2024.	322.280	-	Radovi u toku
			Nadzor	1.800	ProKonsing d.o.o. Mostar 01-02.2-9547/24 24.10.2024	1.755	-	
			Ukupno				-	
25.	M17	Zamjena odbojnih ograda na magistralnim cestama minimalnog nivoa H1 - Dionica 006, Žepče	Izvođenje	800.000	Sacom d.o.o. Sarajevo 01-02.2-1391/24 28.02.2024.	327.191	278.602	Okončano
			Ukupno				278.602	
26.	M4	Rekonstrukcija raskrsnice na cesti M4, skretanje Mala Brijesnica, općina Doboj Istok	Projektiranje	3.900	Arting BH d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-11484/23, 14.12.2023.	3.900	3.900	Okončano
			Ukupno				3.900	
27.	M18	Rekonstrukcija raskrsnice na cesti M18, skretanje za naselje Ugorsko, općina Vogošća	Projektiranje	7.000			-	Priprema TD
28.	M15	Izgradnja pješačke staze na cesti M15:Sanski Most-Tomina	Izvođenje	248.000	Behić Sanny Boy d.o.o. Bihać 01-02.2-7240/24 14.08.2024	247.542	196.059	Okončano
			Nadzor	1.800	Arting BH d.o.o. Sarajevo 01-02.1-9322/24 16.10.2024	1.797	1.797	
			Ukupno				197.856	
29.	M14.1	Izrada idejnog i glavnog projekta izgradnje raskrsnice (kružnog toka) na M14.1 dionica: Odžak-Brod,(veza poslovnih zona Svilaj 1 i Svilaj 2 na M14.1)	Projektiranje	22.000	IPSA Institut d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-10944/23, 27.11.2023.	21.528	-	U toku
			Revizija	3.000	Arting BH d.o.o. Sarajevo 01-02.1-1709/24 14.03.2024	2.625	-	
30.	M6.1	Izgradnja pješačke staze na M6.1 dionica 011: Gnojnice- Nevesinje 2	Projektiranje	4.700	Design&QC d.o.o.Sarajevo 01-02.2-10094/23. 30.10.2023.	4.680	4.680	Okončano
			Ukupno				4.680	
31.	M17.4	Izgadnja trake za lijevo skretanje za poslovnu zonu „Mostarska vrata“, na	Projektiranje	5.900	Design&QC d.o.o.Sarajevo 01-02.2-3796/23. 19.05.2023.	5.850	5.850	Okončano

JP CESTE FEDERACIJE BIH

		M17.4_002, dionica: Čitluk-Međugorje –Ljubuški, općina Ljubuški	Revizija	1.500	Pronasa d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-2257/24, 03.04.2024.	1.427	1.427	
			Izvođenje	342.000	Putovi d.o.o. Grude 01-02.2-7231/24 14.08.2024.	341.059	341.054	
			Nadzor	6.910	Integra d.o.o. Mostar 01-02.2-7026/24 06.08.2024.	6.903	6.903	
			Ukupno				355.234	
32.	M6	Izgradnja pješačke staze uz cestu M6 u naselju Ružići, općina Grude	Izvođenje	283.000	Putovi d.o.o. Grude, 01-02.2-10380/23, 07.11.2023.	282.482	282.351	Okončano
			Ukupno				282.351	
33.	M6	Izgradnja i sanacija pješačke staze uz cestu M6_001 Gorica-Vitina, II faza	Izvođenje	136.000	Putovi d.o.o. Grude, 01-02.2-10117/23, 31.10.2023.	135.682	135.669	Okončano
			Ukupno				135.669	
34.	M14.2	Izgradnja pješačke staze uz cestu M14.2, općina Domaljevac, II faza	Izvođenje	150.000			-	Priprema ponovljene TD. Nije bilo zainteresovanih ponuđača
			Nadzor	7.000			-	
35.	M16.2	Izgradnja pješačke staze uz cesti M16.2, općina Prozor/Rama	Projektiranje	3.500	EDI-ING d.o.o. Donji Vakuf, 01-02.2-11079/23, 30.11.2023.	3.510	3.510	Okončano
			Izvođenje	200.000	Rocco Commerce d.o.o. Livno 01-02.2-6021/24 02.07.2024.	199.090	198.935	
			Nadzor	3.300	Institut za građevinarstvo „IG“ d.o.o.o B.Luka 01-02.2-6038/24 02.07.2024.	3.276	3.276	
			Ukupno				205.721	
36.	M5	Rješavanje odvodnje na cesti M5, prolaz kroz Travnik (Lokalitet Bolnica Travnik)	Projektiranje	7.000			-	Općina treba da riješi IP odnose. Radi se o kasami u kojoj nemamo pristup.
			Izvođenje	100.000			-	
			Nadzor	3.000			-	
37.	M17	*Rekonstrukcija raskrsnice cesta M17 i lokalnih cesta, (OBI) u kružni tok, općina Ilidža (sufinanciranje općina Ilidža)	Izvođenje	600.000			-	Okončano – implementator općina Ilidža
38.	M18	Izgradnja pješačke staze uz cestu M18, Husino-Ljubače, grad Tuzla	Projektiranje	6.800	EDI-ING d.o.o. Donji Vakuf 01-02.2-6039/24 02.07.2024.	6.786	6.786	Potpisani ugovori za radove i nadzor.
			Izvođenje	200.000	Jata Group d.o.o. Srebrenik 01-02.2-9008/24 04.10.2024.	198.996	-	
			Nadzor	7.000	Artimg BH d.o.o. Sarajevo 01-02.2-9414/24 21.10.2024.	1.891	-	
			Ukupno				6.786	
39.	M5	Izgradnja pješačke staze uz cestu M5, naselje Jehovac, općina Kiseljak	Projektiranje	2.900	EDI-ING d.o.o. Donji Vakuf, 01-02.2-11080/23, 30.11.2023.	2.867	2.866	Okončano
			Izvođenje	200.000	Ceste Company d.o.o. Kiseljak, 01-02.2-5141/24 31.05.2024	198.315	197.243	
			Nadzor	7.000	AIK Inženjering d.o.o. Banovići, 01-02.2-5140/24 31.05.2024.	6.845	6.845	

JP CESTE FEDERACIJE BIH

			Ukupno				206.954	
40.	M1.8	Rekonstrukcija raskrsnice na cesti M1.8, skretanje za poslovnu zonu, naselje Tinja, općina Srebernik	Izvođenje	400.000			-	Ishodovanje odobrenja za građenje
			Nadzor	10.000			-	
41.	M6	Rekonstrukcija raskrsnice cesta M6.1 i R419, naselje Trn, općina Široki Brijeg (sufinanciranje općina Š. Brijeg)	Izvođenje	50.000			-	U toku pribavljanje urbanističke
			Nadzor	-			-	
42.	M4.3	Rekonstrukcija raskrsnice na cesti M4.3 i lokalne ceste, općina Velika Kladuša	Projektiranje	6.800	EDI-ING d.o.o. D. Vakuf 01-02.2-6497/24 16.07.2024	6.763	-	U toku projektovanje
			Revizija	-	Design QC d.o.o. Sarajevo 01-02.1-10247/24 19.11.2024.	2.106	-	
			Ukupno				-	
43.	M17	Glavni projekat rekonstrukcije raskrsnice na cesti M17_009, Vrelo Bosne, općina Ilidža	Projektiranje	4.800	Design QC d.o.o. Sarajevo 01-02.2-445/24 19.01.2024.	4.739	4.739	Okončano
			Revizija	2.400	Artimg BH d.o.o. Sarajevo 01-02.2-6341/24 11.07.2024.	2.332	2.332	
			Ukupno				7.071	
44.	M16	Izrada glavnog projekta rekonstrukcija raskrsnice na cesti M16, dionica Bugojno 2-Kupres 1, naselje Čipuljić-Poriće	Projektiranje	28.000	Institut za građevinarstvo „IG“ d.o.o. B. Luka 01-02.1-6095/24 03.07.2024.	27.203	19.042	U toku
			Revizija	5.000	Routing d.o.o. Banja Luka 01-02.1-10507/24 29.11.2024.	4.446	-	
			Ukupno				19.042	
45.	M6	Rješavanje odvodnje (Izgradnja oborinske kanalizacije) na cesti M6, prolaz kroz Čapljinu	Izvođenje	300.000			-	Priprema TD
			Nadzor	10.000			-	
46.	M4	Rekonstrukcija raskrsnice na M4.2 002, naselje Šepići, općina Cazin	Projektiranje	10.000			-	Priprema PZ
47.	M6.1	Izgradnja pješačke staze uz M6.1_011, Gnojnice-Nevesinje2, naseljeno mjesto Dračevice	Izvođenje	100.000			-	Priprema TD
			Nadzor	3.000			-	
48.	M20	Izgradnja odmorišta uz magistralnu cestu M20_009, Ustikolina- Goražde 8, km 0+950	Izvođenje	65.000	Goraždeputevi d.o.o. Goražde, 01-02.2-2836/24, 25.04.2024	65.000	64.978	Okončano
			Ukupno				64.978	
49.	M4	Rekonstrukcija raskrsnice cesta M4 i R469, općina Kalesija, km 8+860	Projektiranje	12.000			-	Priprema PZ
50.	M17	Rekonstrukcija raskrsnice sa M17 i lokalne ceste za naselje Papratnica, dionica M17_006:Ozimica-Topčić Polje, km 9+180, općina Žepče	Izvođenje	1.286.000			-	Provedeni postupci nabavke. Čeka se građ. dozvola
			Nadzor	15.500			-	
51.	M17	Glavni projekat pješačke staze uz cestu M17 dionica: Potoci-Mostar L=cca 2,00 km	Projektiranje	10.000			-	Nabavka u toku
52.	M4.2	Rekonstrukcija raskrsnice cesta M4.2 i R402, Grad Cazin	Projektiranje	6.700	Geo Feld d.o.o. Bihać, 01-02.2-11175/22, 29.11.2022.	6.669	6.669	Okončano
			Ukupno				6.669	
53.	M16	Sanacija raskrsnice na M16 u Kupresu	Revizija	2.000	Design&QC d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-11541/23, 15.12.2023.	2.000	2.000	Okončano
			Ukupno				2.000	

JP CESTE FEDERACIJE BIH

54.	M4	Rekonstrukcija raskrsnice za poslovnu zonu Glinište	Revizija	-	PPG d.o.o. Sarajevo 01-02.2-12395/21 20.12.2021.	1.950	1.950	Okončano
			Ukupno				1.950	
		UKUPNO		12.730.810			3.059.663	

***Napomena:** R.B. 1: Na osnovu Sporazuma između JP Ceste Federacije BiH d.o.o., Općine Vogošća i KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo, broj 01-02.3-5809/24 od 24.06.2024. godine KJKP Vodovod i Kanalizacija d.o.o. Sarajevo će osigurati 360.000 KM za izmještanje vodovoda na navedenom projektu.

***Napomena:** R.B. 37: JP Ceste Federacije BiH d.o.o. su prema Sporazumu broj 01-02.2-8782/23 od 13.09.2023. godine potpisanog sa Direkcijom za puteve KS i Općinom Ilidža doznačile 600.000 KM općini Ilidža predviđenih Rebalansom Plana poslovanja za 2023. i Planom poslovanja za 2024. godinu namjenjenih za izvođenje radova na projektu „Rekonstrukcija raskrsnice cesta M17 i lokalnih cesta, (OBI) u kružni tok, općina Ilidža“.

3.1.4. Vanredno održavanje

3.1.4.1. Sanacija cestovnih objekata

Red br.	Mag. Cesta	Naziv i opis projekta	Aktivnosti na projektu	Rebalans Plana 2024.	Izvođač/ Konsultant- ugovor	Ugovoreno	Realizirano 01.01.- 31.12.2024.	Napomena
1.	M5	Rekonstrukcije mosta preko Koševskog potoka u Sarajevu, Skenderija (M 05.0-5-01-a) dionica Stup-Vijećnica-Gr Ent ... Gr Ent Prača-Renovica-Gr Ent Kaljani, km 7+310	Projektiranje	17.500	Design & QC d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-4907/19. 24.04.2019.	17.550	-	U toku
			Ukupno				-	
2.	M17	Rekonstrukcija/sanacija tunela „Ivan“ (T17-011-46) l=646m, Ivan sedlo, dionica Tarčin-Konjic, km 7+750	Projektiranje	49.000	GP PPG d.o.o. Sarajevo i Pronasa d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-5662/21. 14.05.2021.	111.939 (preneseno 48.947)	-	U toku
			Revizija	-	Arkus d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-9740/24 31.10.2024.	7.008	-	
			Ukupno				-	
3.	M18	Rekonstrukcija/Sanacija mosta preko rijeke Suha u Stuparima (M18-007-83) dionica Živinice 1 – Vitalj, km 16+426	Izvođenje	1.150.000	HP Investing d.o.o. Mostar, 01-02.1-8743/23 23.09.2023. godine	1.148.056	976.215	Okončano
			Nadzor	25.200	AIK Inženjering d.o.o. Banovići, 01-02.1-1712/24, 14.03.2024.	25.155	25.155	
			Ukupno				1.001.370	
4.	M15	Rekonstrukcija mosta preko potoka Krbava (M15-004-49), dionica Kamičak-Ključ, km 9+622	Izvođenje	560.000			-	TD u pripremi
			Nadzor	15.000			-	
5.	M18	Sanacija (rekonstrukcija) mosta preko nepoznatog potoka u Poturovićima (M18-009-604), dionica Olovo – Semizovac, km 31+567	Izvođenje	445.000			-	TD u pripremi
			Nadzor	12.000			-	
6.	M4.3	Rekonstrukcija mosta preko rijeke Baštre (M4.3-003-626), lokacija Baštre dionica Bosanska Otoka-Bužim, km 8+882	Projektiranje	22.000	GP:Infra d.o.o. Pronasa d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-10497/22, 15.11.2022.	32.312 (preneseno 21.583)	19.451	Projekat predat na reviziju, revizija u toku
			Revizija	2.200	IG d.o.o. Banja Luka, 01-02.1-4460/23. 13.06.2023.	2.118	-	
			Ukupno				19.451	

JP CESTE FEDERACIJE BIH

7.	M4.3	Rekonstrukcija mosta preko rijeke Baštre (M4.3-003-624), lokacija Čava, dionica Bosanska Otoka-Bužim, km 7+695	Projektiranje	5.500	GP:Infra d.o.o. Pronasa d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-10497/22, 15.11.2022.	32.429 (preneseno 5.472)	7.605	Okončano
			Revizija	2.200	IG d.o.o. Banja luka, 01-02.1-4460/23. 13.06.2023.	2.117	-	
			Ukupno				7.605	
8.	M18	Rekonstrukcija mosta preko rijeke Gostelja (M18-007-81), lokacija Tarevo –kamenolom Stupari, dionica Živinice 1 – Vitalj – sa izmještanjem trase	Projektiranje	41.000	Infra d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-4667/23. 20.06.2023.	48.181 (preneseno 40.576)	40.576	Okončano
			Revizija	3.800	Institut za građevinarstvo „IG“ d.o.o. Banja Luka, 01-02.1-9888/23, 20.10.2023.	3.744	-	
			Ukupno				40.576	
9.	M16	Rekonstrukcija mosta preko rijeke Vrbas (M16-007-259) u Donjem Vakufu, na cesti M16, dionica Donji Vakuf 1- Bugojno	Izvođenje	449.000	Struktura d.o.o. Jajce, 01-02.1-4353/23, 08.06.2023.	836.903 (preneseno 286.454)	448.451	Okončano
					Dodatni radovi: Struktura d.o.o. Jajce 01-02.1-7029/24 06.08.2024.	162.000		
			Nadzor	17.000	INK Constructor d.o.o. Banja Luka, 01-02.1-3704/23. 16.05.2023.	19.167 (preneseno 6.517)	6.517	
					Infra d.o.o. Sarajevo 01-02.1-374/24 16.01.2024.	6.786	6.786	
					Dodatne usluge nadzora: INK Constructor d.o.o. Banja Luka 01-02.1-8604/24 20.09.2024.	3.650	3.650	
			Ukupno				465.404	
10.	M18.1	Rekonstrukcija mosta preko Crne rijeke, Garež (M18.1-001-448) dionica Ustikolina-Grebak-Delijaš-Trnovo, km 46+237	Projektiranje	4.500	IG d.o.o. Banja luka, 01-02.1-8060/20. 10.08.2020	9.957 (preneseno 4.446)	-	Revizija u toku
			Revizija	750	Infra d.o.o. Sarajevo 01-02.1-2144/21. 24.02.2021.	1.500 (preneseno 750)	-	
			Ukupno				-	
11.	M20	Sanacija mosta (M20-008-206) preko rijeke Koline u Ustikolini, na cesti M20, dionica Foča 1-Ustikolina, km 9+916	Izvođenje	449.000	HP Investing d.o.o. Mostar, 01-02.1-10004/23, 25.10.2023.	448.759	387.054	Okončano
			Nadzor	8.100	IPSA Institut d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-10195/23, 01.11.2023.	8.073	8.073	
			Ukupno				395.127	
12.	M15	*Sanacija mosta M15-003-42 preko rijeke Sane, Krkojevačko polje, na cesti M15, dionica Sanski Most 1-Kamičak, km 4+283	Izvođenje	980.000	HP Investing d.o.o. Mostar, 01-02.1-5190/23, 05.07.2023.	2.129.400 (preneseno 820.705)	978.180	Okončano – prema Sporazumu, optina je doznačila na račun JP Ceste FBiH 161.831 KM za izvođenje radova
					Dodatni radovi HP Investing d.o.o. Mostar 01-02.1-7031/24 06.08.2024.	159.284		
			Nadzor	50.000	JV PPG d.o.o. i Pronasa d.o.o., 01-02.1-5189/23, 05.07.2023.	49.993	49.993	
			Ukupno				1.028.173	
13.	M18		Izvođenje	560.000			-	TD u pripremi

JP CESTE FEDERACIJE BIH

		Sanacija mosta M18-009-395 preko rijeke Ljubine, dionica Olovo – Semizovac, km 38+850	Nadzor	15.000			-	
14.	M20	Sanacija mosta M20-009-210 preko Odske rijeke u Mravinju, na cesti M20, dionica Ustikolina-Goražde 8, km 14+840	Izvođenje	440.000	HP Investing d.o.o. Mostar, 01-02.1-10007/23, 25.10.2023.	439.656	-	Odgođen početak radova
			Nadzor	4.600	Radis d.o.o. Istočno Sarajevo 01-02.1-1710/24 14.03.2024.	4.516	-	
			Ukupno				-	
15.	M18	Zamjena dilatacija na mostu preko rijeke Ljubine (M18-009-397) na cesti M18, dionica Olovo – Semizovac km 39+201, Semizovac (M 18.0-2-53)	Izvođenje	104.000	Sikra d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-9692/23, 13.10.2023.	103.661	103.606	Okončano
			Nadzor	1.700	Radis d.o.o. Istočno Sarajevo 01-02.1-2151/24 29.03.2024.	1.697	1.697	
			Ukupno				105.303	
16.	M5	Sanacija mosta (M05.0-5-02) preko strme padine, Babin zub u Sarajevu, na cesti M5, dionica Stup-Vijećnica-Gr. Ent. Km 9+992	Projektiranje	30.200	INK Constructor d.o.o. Banja luka, 01-02.1-1741/23. 08.03.2023	30.116	19.405	U toku
			Revizija	3.300	IG d.o.o. Banja luka, 01-02.1-4668/23. 20.06.2023.	3.276	-	
			Ukupno				19.405	
17.	M5	Sanacija mosta (M05.0-5-04) preko rijeke Miljacke, Dariva na cesti M5 dionica Stup-Vijećnica-Gr ent., km 10+390	Projektiranje	25.000	Trasa d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-5187/23, 05.07.2023.	24.544	17.524	U toku
			Revizija	3.500	Infra d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-7933/23, 29.08.2023.	3.510	-	
			Ukupno				17.524	
18.	M5	Sanacija mosta (M05.0-5-05) preko rijeke Miljacke, Krečane na cesti M5 dionica Stup-Vijećnica-Gr.ent. km 10+610	Projektiranje	31.100	Trasa d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-5188/23, 05.07.2023.	31.089	22.197	U toku
			Revizija	4.000	PPG d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-7607/23, 15.08.2023.	3.978	-	
			Ukupno				22.197	
19.	M5	Sanacija mosta (M5-016-433) objekat na petlji Korija, cesta M5 dionica Azize Šaćirbegović – Korija – Ljubogošta km 6+394 (M 05.0-A-11)	Projektiranje	38.000	INK Constructor d.o.o. Banja Luka, 01-02.1-8724/23, 12.09.2023. INK Constructor d.o.o. Banja Luka, 01-02.1-6468/24, 15.07.2024	49.725 (preneseno 34.837) 2.925	19.627	U toku
			Revizija	4.500	Institut za građevinarstvo „IG“ d.o.o. Banja Luka, 01-02.1-11134/23, 01.12.2023.	4.446	-	
			Ukupno				19.627	
20.	M14	Rekonstrukcija mosta preko željezničke pruge Bihać-Bosanski Novi, Kostela (M14-002-51) dionica: Srbijani-Bos. Krupa 1, km 5+171 - Projekat izmještanja stuba/ova kontaktne mreže sa opremom, - Projekat izmještanja željezničkih telefonskih kablova.	Projektiranje	13.700	IPSA Institut d.o.o. Sarajevo 01-02.1-7982/24 03.09.2024.	13.690	13.689	U toku Nabavka revizije u pripremi
			Revizija	3.000			-	
			Ukupno				13.689	
21.	M19.2	Sanacija tunela Ravne (T19.2-001-33) na cesti M19.2, dionica Kladanj-Vlasenica, km 7+748	Projektiranje	41.000	IPSA Institut d.o.o. Sarajevo 01-02.1-8760/24	40.809	-	U toku

JP CESTE FEDERACIJE BIH

					26.09.2024.			
			Revizija	5.000	Tracest d.o.o. Sarajevo 01-02.1-11018/24 12.12.2024.	3.042	-	
			Ukupno				-	
22.	M19.2	Sanacija mosta M19.2-001-97 preko rijeke Drinjače, u Gojsalićima na cesti M19.2, dionica Kladanj-Vlasenica, km 2+323	Projektantski nadzor	-	Infra d.o.o. Sarajevo 01-02.1-8792/24 27.09.2024.	2.180	2.180	U toku
			Izvođenje	546.000	Hering d.d. Široki Brijeg, 01-02.1-9507/23, 10.10.2023.	545.770	541.086	
			Nadzor	15.000	IPSA Institut d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-9912/23, 23.10.2023.	14.988	14.987	
			Ukupno				558.253	
23.	M17.1	Rekonstrukcija/izgradnja mosta preko rijeke Krivaje na cesti M17.1_001-643, Žepče-Zavidovići-Ribnica, lokacija Mustajbašići – Čanici, općina Zavidovići, km 15+385	Projektiranje	51.400	CPK d.o.o. Banja Luka 01-02.1-7981/24 03.09.2024.	51.363	-	Projekt. u toku – Ugovor za reviziju u pripremi
			Revizija	10.000			-	
			Ukupno				-	
24.	M17.1	Rekonstrukcija mosta preko rijeke Gostović na cesti M17.1_001_642; Žepče-Zavidovići-Ribnica, lokacija Potkleče, km 9+650	Projektiranje	32.800	INK Constructor d.o.o. Banja Luka 01-02.1-338/24 15.01.2024	32.702	-	U toku
			Revizija	3.300	Infra d.o.o. Sarajevo 01-02.1-6044/24 02.07.2024.	3.276	-	
			Ukupno				-	
25.	M1.8	Sanacija mosta na M1.8_001_62, preko rijeke Save u Orašju, dionica: Granica BiH/ HR (Županja)-Lončari, km 0+000	Projektiranje	70.000	Institut za građevinarstvo „IG“ d.o.o. Banja Luka 01-02.1-8925/24 02.10.2024.	69.129	-	Nabavka usluga revizije u toku
			Revizija	9.000			-	
			Ukupno				-	
26.	M5	Rekonstrukcija mosta (M-5-012-227) preko r. Bile, na cesti M-5, dionica Nević Polje- Kaonik, km 4+988	Izvođenje	8.000	Struktura d.o.o. Jajce, 01-02.1-8415/20. 25.08.2020. Anex 01-02-1-8225/22, 16.09.2022.	8.023	-	Radovi okončani nije dostavljena okončana situacija
			Ukupno				-	
27.	M4	Rekonstrukcija mosta preko rijeke Soline u Tuzli (M-04.0-4-05), dionica Šiški Brod – Kalesija – Gr. Ent (Memići), km 9+555	Izvođenje	450.000			-	Tenderisano 2x – Bez ponuda
			Nadzor	15.000			-	
28.	M5	Rekonstrukcija mosta (M5-001-8) preko potoka Mrižnica u Kamenici, na cesti M5, dionica Granica RH (Izačić) – Bihać, km 7+765	Izvođenje	675.000			-	Ponovljeni Tender u pripremi
			Nadzor	20.000			-	
29.	M5	Rekonstrukcija mosta (M5-009- 508) preko potoka Bravnice, na cesti M5, dionica Jajce Jug –Donji Vakuf 1, km 3+746	Projektiranje	12.500	Divel d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-5319/24 06.06.2024.	12.461	-	Projektiranje u toku
			Revizija	2.300	Infra d.o.o. Sarajevo 01-02.1-6644/24 22.07.2024. RB 4?	2.223	-	
			Izvođenje	400.000			-	
			Nadzor	12.000			-	
			Ukupno				-	

JP CESTE FEDERACIJE BIH

30.	M5	Rekonstrukcija mosta (M5-009-218) preko Sandžačke rijeke, na cesti M5, dionica Jajce Jug –Donji Vakuf 1, km 26+245	Izvođenje	298.500	Struktura d.o.o. Jajce 01-02.1-9489/24 23.10.2024.	298.450	-	Odgođen početak radova za proljeće
			Nadzor	4.000	CPK d.o.o. Banja Luka 01-02.1-9487/24 23.10.2024.	4.563	-	
			Ukupno				-	
31.	M18.1	Rekonstrukcija mosta preko Crne rijeke, skretanje za Govediće (M18.1-001-442) dionica Ustikolina-Grebak-Delijaš-Trnovo, km 40+088	Izvođenje	943.000	MGBH d.o.o. Sarajevo 01-02.1-9352/24 16.10.2024	942.998	-	Odgođen početak radova za proljeće
			Nadzor	21.000	Trasa d.o.o. Sarajevo 01-02.1-9453/24 22.10.2024.	21.039	-	
			Ukupno				-	
32.	M5	Zamjena dilatacija na mostu preko duboke doline na Komaru (M5-010-224), na cesti M5, dionica Donji Vakuf 1 – Turbe, km 17+773, Komar donji	Izvođenje	79.000	Sikra d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-10770/23, 17.11.2023	109.948 (preneseno 78.244)	77.906	Okončano
			Nadzor	2.500	Institut za građevinarstvo „IG“ d.o.o. Banja Luka, 01-02.1-10771/23, 17.11.2023.	3.393 (preneseno 2.414)	2.414	
			Ukupno				80.320	
33.	M17	Sanacija dilatacija na mostu preko potoka Jelašje (M17-012-307) u Donjem Papraskom, na cesti M17 dionica Konjic- Jablanica 1, km 17+923	Izvođenje	100.000			-	Tender u pripremi
			Nadzor	4.000			-	
34.	M18	Zamjena dilatacija na mostu preko rijeke Ljubine (M18-009-390) u Poturovićima, na cesti M18 dionica Olovo – Semizovac, km 31+941	Izvođenje	100.000			-	Tender u pripremi
			Nadzor	4.000			-	
35.	M18	Zamjena dilatacija na mostu preko rijeke Ljubine (M18-009-392) u Gareži, na cesti M18 dionica Olovo – Semizovac, km 36+957	Izvođenje	94.000	Sikra d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-11250/23, 06.12.2023.	93.504	103.244	Okončano
			Nadzor	5.500	Radis d.o.o. Istočno Sarajevo 01-02.1-1714/24 14.03.2024.	5.499	5.440	
			Ukupno				108.684	
36.	M17	Zamjena dilatacionih naprava na mostu preko rijeke Save (M17-001-574) u Bosanskom Šamcu na stubnim mjestima S9, S13 i OS16, na cesti M17 dionica Granica RH-Bosanski Šamac- Granica entiteta, km 0+000	Izvođenje	207.000	Sikra d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-11250/23, 06.12.2023.	206.303	196.182	Okončano
			Nadzor	5.500	Radis d.o.o. Istočno Sarajevo 01-02.1-1714/24 14.03.2024.	5.440	5.440	
			Ukupno				201.622	
37.	M5	Rekonstrukcija mosta preko Koševskog potoka u Sarajevu, Skenderija (M 05.0-5-01-a) dionica Stup-Vijećnica-Gr Ent ... Gr Ent Prača-Renovica-Gr Ent Kaljani, km 7+310 - Glavni projekat izmještanja instalacija (elektroinstalacije, vodovod, kanalizacija, telekom)	Projektiranje	20.000	Design&QC d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-11674/23, 20.12.2023.	19.890	19.890	Okončano, revizija nije fakturisana
			Revizija	3.000	Infra d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-5827/24 24.06.2024		-	
			Ukupno				19.890	
38.	M5	Sanacija mosta preko rijeke Lašve (M5-010-225) u Turbetu,, na cesti M5,	Projektiranje	20.000	Design&QC d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-2234/24, 02.04.2024.	19.890	-	U toku

		dionica Donji Vakuf 1-Turbe, km 25 +545	Revizija	1.800	Divel d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-2919/24 30.04.2024.	1.755	-	
			Ukupno				-	
39.	M17	Sanacija mosta preko Babine rijeke i lokalnog puta (M17-007-176) na cesti M17, dionica Topčić polje – Lašva 0, km 21+935	Projektiranje	14.800	CPK d.o.o. Banja Luka 01-02.1-8913/24 02.10.2024.	14.742	-	U toku
			Revizija	3.500	Divel d.o.o. Sarajevo 01-02.1-10220/24 18.11.2024.	2.925	-	
			Ukupno				-	
40.	M18.1	Rekonstrukcija mosta preko Crne rijeke, Demira mlin (M18.1-001-606) dionica Ustikolina-Grebak-Delijaš-Trnovo, km 40+705	Projektiranje	25.000			-	Ugovor za proj. u pripremi
			Revizija	3.500			-	
41.	M4	Zamjena diletacija na mostu preko rijeke Spreče, Donja Orahovica-Šićki Brod na M4	Izvođenje	-	Trasa d.o.o. Sarajevo 01-02.1-7614/22 23.08.2022.	2.758 (preneseno 1.289)	1.289	Okončano
			Ukupno				1.289	
		UKUPNO		9.928.250			4.125.509	

***Napomena:** R.b. 12: na projektu „Sanacija mosta M15-003-42 preko rijeke Sane, Krkojevačko polje, na cesti M15, dionica Sanski Most 1-Kamičak, km 4+283”, Općina je sudjelovala u financiranju servisne saobraćajnice za vrijeme izvođenja radova u iznosu od 161.831 KM, , tako da je ukupni iznos realizacije iz prethodne tabele u prikazan u tabeli C Investicije (rekapitulacija str. 32) u dvije pozicije:

- 3.1.4.1. Sanacija cestovnih objekata
- 6. Sufinanciranje iz drugih nivoa vlasti

3.1.4.2. Sanacija klizišta, odrona, sanacija slijeganja trupa puta, kosina, usjeka i zasjeka

Red. Br.	Mag. Cesta	Naziv i opis projekta	Aktivnosti na projektu	Rebalans Plana 2024.	Izvođač/ Konsultant- ugovor	Ugovoreno	Realizirano 01.01.- 31.12.2024.	Napomena
1.	M16.4	Sanacija slijeganja trupa ceste, dionica: Bugojno – Nević polje, km 22+900	Izvođenje	140.000	Ceste Company d.o.o. Kiseljak, 01-02.2-9978/23, 25.10.2023.	199.962 (preneseno 139.507)	139.481	Okončano
			Nadzor	6.900	GP: PPG d.o.o. Sarajevo i Arting BH d.o.o. Sarajevo 01-02.2-3997/23 25.05.2023.	6.845	6.845	
			Ukupno				146.326	
2.	M18.1	Sanacija slijeganja trupa ceste cesta M18.003, dionica: Pelagićevo-Srebrenik (Blaževac)	Izvođenje	250.000			-	Priprema TD
			Nadzor	5.500			-	
3.	M5	Sanacija škarpi i kosina, dionica: Kaonik-Lašva km 3+100 do km 3+250 i od 3+600 do km 3+850	Izvođenje	450.000	GP: Komgrad Ze d.o.o. Zenica i Menadžer d.o.o. Lukavac, 01-02.2-2551/24, 15.04.2024.	449.981	449.976	Okončano
			Nadzor	6.900	GP: PPG d.o.o. Sarajevo i Arting BH d.o.o. Sarajevo 01-02.2-3996/23, 25.05.2023.	6.845	6.845	
			Ukupno				456.821	

JP CESTE FEDERACIJE BIH

4.	M17	Sanacija slijeganja i izdizanja trupa ceste petlja Blatuša, Zenica, I faza	Izvođenje	300.000	Jata Group d.o.o. Srebrenik, 01-02.2-7645/23, 17.08.2023.	299.919	299.912	Okončano
			Nadzor	10.000	GF UNSA, 01-02.2-4513/23.	9.828	9.828	
			Ukupno				309.740	
5.	M18	Sanacija skarpe na cesti M18_010 dionica: Semizovac-Sarajevo-Malta, općina Vogošća km 2+100	Izvođenje	370.000			-	Više puta pokrenuta javna nabavka za radove. Nema zainteresovanih ponuđača.
			Nadzor	6.100	GP: PPG d.o.o. Sarajevo i Arting BH d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-3797/23, 19.05.2023.	6.084	-	
			Ukupno				-	
6.	M16	Sanacija skarpi i nestabilnih kosina na cesti M16_006, dionica: Crna Rijeka-Jajce, lokacija 2 (km 7+050 - km 7+800)	Izvođenje	700.000	Mrkonjićputevi d.o.o. Mrkonjić Grad 01-02.2-1226/24 21.02.2024	699.857	699.845	Okončano
			Nadzor	29.000	PPG d.o.o. Sarajevo 01-02.2-1666/24 12.03.2024.	28.431	28.431	
			Ukupno				728.276	
7.	M14	Sanacija skarpi i nestabilnih kosina na cesti Srbljani-Bos.Krupa	Izvođenje	450.000			-	Priprema TD
			Nadzor	15.000			-	
8.	M16	Sanacija skarpi i nestabilnih kosina na cesti M16_006, dionica: Crna Rijeka-Jajce, lokacija 4 (km 9+270-km 9+700)	Izvođenje	500.000	GP: Mrkonjićputevi d.o.o. Mrkonjić Grad i Struktura d.o.o. Jajce, 01-02.2-11733/23, 23.12.2023.	499.545	499.534	Okončano
			Nadzor	20.000	PPG d.o.o. Sarajevo 01-02.2-216/24 10.01.2024.	19.890	19.890	
			Ukupno				519.424	
9.	M16	Sanacija skarpi i nestabilnih kosina na cesti M16_006, dionica: Crna Rijeka-Jajce, km 16+130- km16+310	Projektiranje	10.000	PPG d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-11734/23, 23.12.2023.	10.000	10.000	Okončano projektovanje
			Revizija	4.000			-	
			Ukupno				10.000	
10.	M16	Sanacija skarpi i nestabilnih kosina na cesti M16_006, dionica: Crna Rijeka-Jajce, km 16+450 – km 18+270	Projektiranje	15.000	PPG d.o.o. Sarajevo 01-02.2-903/24 08.02.2024.	14.999	14.999	Okončano projektovanje
			Revizija	5.000			-	
			Ukupno				14.999	
11.	M16	Sanacija skarpi i nestabilnih kosina na cesti M16_006, dionica: Crna Rijeka-Jajce, km 19+190- km 19+800	Projektiranje	17.000	Design&QC d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-11732/23, 23.12.2023.	16.380	16.380	Okončano projektovanje
			Revizija	5.000			-	
			Ukupno				16.380	
12.	M16	Sanacija skarpi i nestabilnih kosina na cesti M16_006, dionica: Crna Rijeka-Jajce, km 20+390 do km 20+900	Projektiranje	15.000	PPG d.o.o. Sarajevo 01-02.2-1667/24 08.02.2024.	14.976	14.976	Okončano projektovanje
			Revizija	5.000			-	
			Ukupno				14.976	
13.	M16	Sanacija skarpi i nestabilnih kosina na cesti M16_006, dionica: Crna Rijeka-Jajce, od km 22+550 do km 22+670	Projektiranje	10.000	Design&QC d.o.o. Sarajevo 01-02.2-772/24 12.03.2024.	9.945	9.945	Okončano projektovanje
			Revizija	3.000			-	
			Ukupno				9.945	
14.	M18	M18, Sanacija slijeganja trupa ceste na M18_010, Semizovac-Sarajevo-Malta, od km 7+750 do km 8+300	Projektiranje	25.000			-	Priprema PZ
			Revizija	3.000			-	

JP CESTE FEDERACIJE BIH

15.	M16.2	Sanacija škarpi zasjeka, cesta M16.2, dionica 002, Gornji Vakuf – Prozor , na potezu od km 13+000 do km 15+150 II faza	Izvođenje	300.000	HP Investing d.o.o. Mostar 01-02.2-1108/24 15.02.2024.	299.297	299.267	Okončano
			Nadzor	10.000	Ipsa Institut d.o.o. Sarajevo 01-02.2-1224/24 21.02.2024.	9.945	9.945	
			Ukupno				309.212	
16.	M17	Sanacija škarpi i nestabilnih kosina na cesti M17_013,dionica: Jablanica - Potoci	Projektiranje	25.000			-	Priprema PZ
			Revizija	5.000			-	
17.	M17	Sanacija slijeganja trupa ceste, cesta M17_013, dionica: Jablanica I-Potoci, km 2+600	Izvođenje	249.000	HP Investing d.o.o. Mostar, 01-02.2-8575/22. 30.09.2022.	248.688	248.236	Okončano
			Nadzor	5.400	GP AIK Inženjering d.o.o. Banovići Arting BH d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-12347/22. 28.12.2022.	5.382	5.382	
			Ukupno				253.618	
		UKUPNO		3.970.800			2.789.717	

3.1.4.3. Sanacija oštećenih asfaltnih kolovoza

Red br.	Mag. Cesta	Naziv i opis projekta	Aktivnosti na projektu	Rebalans Plana 2024.	Izvođač/ Konsultant- ugovor	Ugovoreno	Realizirano 01.01.- 31.12.2024.	Napomena
1.	M4	Sanacija asfaltnog kolovoza na cesti: M4_010: Donja-Orahovica – Šićki Brod	Izvođenje	998.000	Rial Šped d.o.o. Klokotnica, 01-02.2-1298/24, 23.02.2024.	997.987	997.780	Okončano
			Nadzor	7.900	AIK Inženjering d.o.o. Banovići, 01-02.2-10566/23, 13.11.2023.	7.839	7.839	
			Ukupno				1.005.619	
2.	M15	Sanacija asfaltnog kolovoza na cesti M15: Obilaznica Tomislavgrad-Šuica	Izvođenje	495.000	Livnopotovi d.o.o. Livno, 01-02.2-9338/23, 04.10.2023.	494.056	494.036	Okončano
			Nadzor	4.000	IPSA Institut d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-9347/23, 04.10.2023.	3.920	3.920	
			Ukupno				497.956	
3.	M16.2	Sanacija asfaltnog kolovoza na cesti M16.2_001 Bugojno 2 – Gornji Vakuf	Izvođenje	500.000	Doboputevi d.d. Doboj Jug, 01-02.2-2099/24, 27.03.2024.	499.880	499.880	Okončano
			Nadzor	1.300	Konstrukt d.o.o. Banja Luka, 01-02.2-444/24, 19.01.2024.	1.229	1.228	
			Ukupno				501.108	
4.	M14.2	Sanacija asfaltnog kolovoza na cesti M14.2_002 Krnjeuša – Bosanski Petrovac 4	Izvođenje	400.000	I-Selimović d.o.o. Cazin, 01-02.2-11437/23, 13.12.2023.	399.231	399.227	Okončano
			Nadzor	3.800	Arting BH d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-846/24, 07.02.2024.	3.738	3.738	
			Ukupno				402.965	
5.	M14	Sanacija asfaltnog kolovoza na cesti M14_002 Srbijani – Bosanska Krupa 1	Izvođenje	500.000	Kov-Grad d.o.o. Bužim, 01-02.2-11615/23, 19.12.2023.	499.434	499.262	Okončano

JP CESTE FEDERACIJE BIH

			Nadzor	3.300	Institut za građevinarstvo „IG“ d.o.o. Banja Luka, 01-02.2-11769/23, 25.12.2023.	3.276	3.276	
			Ukupno				502.538	
6.	M16.2	Sanacija asfaltnog kolovoza na cesti M16.2_003 Prozor – Jablanica 1	Izvođenje	399.000	HP Investing d.o.o. Mostar, 01-02.2- 11689, 21.12.2023.	398.421	371.932	Okončano
			Nadzor	2.800	ProKonsing d.o.o. Mostar 01-02.2-442/24 19.01.2024.	2.808	2.808	
			Ukupno				374.740	
7.	M17.5	Sanacija kolovoza na cesti M17.5_004: Grude 2 – Privalj	Izvođenje	200.000	Putovi d.o.o. Grude, 01-02.2-9731/23, 16.10.2023.	199.879	199.867	Okončano
			Nadzor	1.200	Arting BH d.o.o. Sarajevo 01-02.2-546/24 23.01.2024.	1.170	1.170	
			Ukupno				201.037	
8.	M4	Sanacija kolovoza na cesti M4_012: Simin Han 1 – Donje Caparde	Izvođenje	327.000	Jata Group d.o.o. Srebrenik, 01-02.2- 10364/23, 07.11.2023.	326.272	326.266	Okončano
			Nadzor	2.900	AIK Inženjering d.o.o. Banovići 01-02.2-525/24 23.01.2024.	2.906	2.906	
			Ukupno				329.172	
9.	M15	Sanacija kolovoza na cesti M15: Barači – Glavica	Izvođenje	400.000	Livnoputovi d.o.o. Livno, 01-02.2- 10378/23, 07.11.2023.	399.727	399.692	Okončano
			Nadzor	5.000	Ipsa Institut d.o.o. Sarajevo 01-02.2-906/24 08.02.2024.	5.031	5.031	
			Ukupno				404.723	
10.	M16	Sanacija asfaltnog kolovoza na cesti M16_011: Livno 3-Renjići	Izvođenje	500.000	Livnoputovi d.o.o. Livno, 01-02.2- 10384/23, 07.11.2023.	499.653	499.654	Okončano
			Nadzor	1.800	Arting BH d.o.o. Sarajevo, 01-02.2- 11133/23, 01.12.2023.	1.748	1.748	
			Ukupno				501.402	
11.	M14	Sanacija asfaltnog kolovoza na cesti M14_003 Bosanska Krupa 1-Bosanska Otoka	Izvođenje	200.000	BC Gradnja d.o.o. Bosanska Otoka, 01- 02.2-10411/23, 08.11.2023.	199.567	199.508	Okončano
			Nadzor	4.900	AIK Inženjering d.o.o. Banovići 01-02.2-1085/24 15.02.2024	4.867	4.867	
			Ukupno				204.375	
12.	M5	Sanacija kolovoza na cesti M5_012 Nević polje – Kaonik	Izvođenje	695.000	Dobojputevi d.o.o. Doboj Jug 01-02.2-1228/24 21.02.2024.	694.351	694.345	Okončano
			Nadzor	3.400	Arting BH d.o.o. Sarajevo 01-02.2-845/24 07.02.2024.	3.387	3.387	
			Ukupno				697.732	
13.	M17.1	Sanacija kolovoza na cesti M17.1 Zavidovići – Ribnica	Izvođenje	779.100	Dobojputevi d.o.o. Doboj Jug, 01-02.2- 11768/23, 25.12.2023.	799.040	799.040	Okončano

JP CESTE FEDERACIJE BIH

			Nadzor	3.400	AIK Inženjering d.o.o. Banovići 01-02.2-783/24 05.02.2024	3.393	3.393	
			Ukupno				802.433	
14.	M17	Sanacija kolovoza na cesti M17_007 Nemila – Lašva	Izvođenje	350.000	Dobojputevi d.o.o. Doboj Jug, 01-02.2- 10689/23, 16.11.2023.	349.782	349.760	Okončano
			Nadzor	1.050	Celab d.o.o. Kakanj, 01-02.2-11538/23, 15.12.2023.	1.053	1.053	
			Ukupno				350.813	
15.	M16.4	Sanacija kolovoza na cesti M16.4_001 Bugojno-Nević polje (prevoj Rostovo)	Izvođenje	300.000	Komgrad-Ze d.o.o. Zenica, 01-02.2- 2806/24, 25.04.2024.	299.315	294.869	Okončano
			Nadzor	1.300	Ida Inženjering d.o.o. Bugojno 01-02.2- 5137/24 31.05.2024.	1.223	1.045	
			Ukupno				295.914	
16.	M5	Sanacija kolovoza na cesti M5_013 Kaonik-Gromiljak (Kaonik-Busovača)	Izvođenje	351.000	Jata Group d.o.o. Srebrenik, 01-02.2- 11022/23, 29.11.2023.	350.601	350.597	Okončano
			Nadzor	3.500	Arting BH d.o.o. Sarajevo, 01-02.2- 11023/23, 29.11.2023.	3.504	3.504	
			Ukupno				354.101	
17.	M4.2	Sanacija kolovoza na cesti M4.2_001 Granica BiH/HR-Skokovi	Izvođenje	397.000	Kov-Grad d.o.o. Bužim 01-02.2-1050/24 13.02.2024.	396.045	396.045	Okončano
			Nadzor	7.000	Arting BH d.o.o. Sarajevo 01-02.2-1080/24 14.02.2024	6.997	6.997	
			Ukupno				403.042	
18.	M14	Sanacija kolovozne konstrukcije i pješačkih staza na M14. 001 Bihac 4- Srbijani, L=2,00km	Projektiranje	9.150	CPK d.o.o. Banja Luka 01-02.2- 7040/24, 07.08.2024.	9.126	9.126	Okončano
			Ukupno				9.126	
19.	M17.5	Sanacija kolovoza na cesti M17.5 Blidinje-Posušje	Izvođenje	309.000	KTM Brina d.o.o. Posušje, 01-02.2- 11645/23, 20.12.2023.	308.880	308.566	Okončano
			Nadzor	3.500	IGH d.o.o. Mostar, 01-02.2-11387/23, 11.12.2023.	3.489	3.489	
			Ukupno				312.055	
20.	M14.2	Sanacija kolovoza na cesti M14.2_007_ Bos.Šamac-Orašje	Izvođenje	46.000	Jata Group d.o.o. Srebrenik, 01-02.2- 10365/23, 07.11.2023.	209.056 (preneseno 45.491)	45.490	Okončano
			Nadzor	2.800	AIK Inženjering d.o.o. Banovići, 01- 02.2-10456/23, 09.11.2023.	2.808	2.808	
			Ukupno				48.298	
21.	M5	Sanacija kolovoza na cesti M5 Azize Šećerbegović-Korija	Izvođenje	500.000	Sarajevoputevi d.d. Sarajevo, 01-02.2- 9706/23, 16.10.2023.	499.963	499.753	Okončano
			Nadzor	1.400	Arting BH d.o.o. Sarajevo, 01-02.2- 10768/23, 17.11.2023.	1.404	1.404	
			Ukupno				501.157	

JP CESTE FEDERACIJE BIH

22.	M14	*Sanacija kolovoza na cesti M14_003: Bos.Krupa 1-Bos.Otoka	Izvođenje	260.000	BC Gradnja d.o.o. Bosanska Otoka 01-02.2-7489/24 26.08.2024.	259.717	259.696	Okončano
			Ukupno				259.696	
		UKUPNO		8.981.500			8.960.002	

***Napomena:** R.B. 22 - Sporazumom 01-02.2-2136/24 od 28.03.2024. god. je ugovoreno da će Grad Bosanska Krupa zajednički implementirati projekat „Sanacija asfaltnog kolovoza na cesti M14_003 Bosanska Krupa 1 - Bosanska Otoka“ i da će osigurati nepovratna sredstva i prebaciti na račun JP Ceste Federacije BiH d.o.o. u iznosu od 100.000 KM za izvođenje radova na navedenom projektu.

3.2. Planirani projekti

3.2.1. Projekti rekonstrukcije i izgradnje

Red br.	Mag. Cesta	Naziv i opis projekta	Aktivnosti na projektu	Rebalans Plana 2024.	Izvođač/ Konsultant- ugovor	Ugovoreno	Realizirano 01.01.- 31.12.2024.	Napomena
1.	M4.3	Glavni projekt rekonstrukcije ceste M4.3, dionica Velika Kladuša- Bužim, potez Podzvizd-Slapnica, km 2.400 do km 8+900 (L= cca 6,5 km)	Projektiranje	70.000			-	Nabavka proj. u toku
			Revizija	7.000			-	
2.	M16.2	Glavni projekt rekonstrukcije ceste sa dogradnjom trake za spora vozila na cesti M16.2, Prozor -Jablanica, cca 3 km	Projektiranje	30.000	GP: Radis d.o.o. Istočno Sarajevo i Građevinski institut „Makedonija“ AD Skopje 01-02.1- 10217/24 18.11.2024.	21.364	-	Nabavka usluga revizije u toku
			Revizija	3.000			-	
			Ukupno				-	
3.	M6	Glavni projekt rekonstrukcije ceste M6, dionica Tasovčići – Domanovići, potez prolaz kroz naselje Modrić, km 1+800 do km 2+500	Projektiranje	10.000	HKP Consulting d.o.o. Banja Luka 01-02.1-10508/24 29.11.2024	7.488	-	Nabavka usluga revizije u toku
			Revizija	1.500			-	
			Ukupno				-	
4.	M1.8	Izgradnja mosta preko suhe prepreke u Previlama na cesti M1.8, dionica Srebrenik - Šićki Brod 3, km 16+000	Projektiranje	100.000			-	Nabavka u toku
			Revizija	10.000			-	
5.	M17.3	*Izgradnja obil. Stoca – sanacija servisne saobraćajnice tokom izvođenja radova	Izvođenje	250.000			-	
	M5	Izrada studije za prethodnu vodnu suglasnost za rekonstrukciju mosta preko potoka Mrižnica u Kamenici, na cesti M5, dionica 001 granica BH/HR (Izačić)-Bihać 4 u km 7+765	Ostalo	200.000	ASI Inženjering d.o.o. Sarajevo 01-02.1-372/24 16.01.2024.	2.340	2.340	
					Suglasnost, taksa	491	491	
	M17	Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok _ulaz u Hadžiće			Divel d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-8451/22, 26.09.2022..	1.755	-	
	M16	Izgradnja obilaznice Livna			Tehnički pregled	3.104	3.104	
	M14	Izgradnja obilaznice Bosanska Otoka			Suglasnost	391	391	
	M14	Izgradnja ceste Grnuša-Mali Radić			Suglasnost	378	378	

M6	Izmještanje trase ceste M6 na dionici Gornji Trebižat-spoj sa M17 u Klepcima (obilaznica Čapljine) (L=cca 8,7km)		Suglasnost	80	80	
M14	Izgradnja ceste Bihać-Bos. Krupa, dionica Veliki Radić-Vranjska		Suglasnost, taksa	1.597	1.597	
M5	Rekonstrukcija mosta (M5-009- 508) preko potoka Bravnice, na cesti M5, dionica Jajce Jug –Donji Vakuf 1, km 3+746		Naknada, suglasnost	64	64	
M17	Rekonstrukcija tunela Crnaja na magistralnoj cesti M17, dionica Konjic-Jablanica		Tehnički pregled	29.565	29.565	
M14	Izgradnja mosta preko ž. pruge u Brkićima na M14		Naknada, taksa	142	142	
M18	Rekonstrukcija raskrsnice na M18 010 Kobilja Glava-Sarajevo – Malta km 8+340		Suglasnost	146	146	
M5	Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok na cesti M5 u naseljenom mjestu Kalibunar, općina Travnik		Naknada, suglasnost, taksa	4.953	4.953	
M18	Rekonstrukcija raskrsnice cesta M18 i R455a u km 6+100, općina Živinice, naselje Maline		Taksa	250	250	
M16 M16.2	Rasvjeta raskrsnice M16 i M16.2 u Bugojnu		Taksa	321	321	
M1.9 M14.1	Rasvjeta raskrsnice cesta M14.1 i M1.9 u Gradačcu (kružni tok)		Taksa	326	326	
M4.2	Rasvjeta raskrsnice na cesti M4.2, skretanje Mihaljevac, grad Cazin		Suglasnost	76	76	
M14.2	Rasvjeta raskrsnice na M14.2 u Odžaku		Naknada	2.340	2.340	
M18	Rekonstrukcija raskrsnice na cesti M18, skretanje Vogošća centar, općina Vogošća		Suglasnost	73	73	
M5	Rekonstrukcija raskrsnice sa pješačkom stazom u naselju Barice, općine Donji Vakuf		Suglasnost	50	50	
M16	Izrada glavnog projekta rekonstrukcija raskrsnice na cesti M16, dionica Bugojno 2-Kupres 1, naselje Čipuljić-Poriče		Suglasnost	76	76	
M17	Rekonstrukcija raskrsnice cesta M17 i lokalnih cesta,(OBI) u kružni tok, općina Ilidža (sufinanciranje općina Ilidža)		Taksa	502	502	
M17	Rekonstrukcija raskrsnice na M17 u naselju Papratnica, općina Žepče, studija za prethodnu vodnu suglasnost i elaborat za vodnu suglasnost		Suglasnost, taksa, , elaborat	1.637	1.637	
	Izrada dodatnih profila na privremenoj obilaznici za projekat rekonstrukcije raskrsnice na M17 u naselju Papratnica, općina Žepče		Sendo d.o.o. Sarajevo 01-02.1-6643/24 22.07.2024.	2.691	2.691	
	Geodetsko dosnimanje profila za potrebe izdavanja suglasnosti JP „Željeznice FBiH“ za projekat rekonstrukcije raskrsnice na M17 u naselju Papratnica, općina Žepče		Trafficon d.o.o. Odžak 01-02.1-10804/24 06.12.2024.	1.030	1.030	
			Trafficon d.o.o. Odžak, 01-02.1-5476/24 11.06.2024.	1.053	1.053	
M5	Rekonstrukcije mosta preko Koševskog potoka u Sarajevu, Skenderija (M 05.0-5-01-a) dionica Stup-Vijećnica-Gr Ent ... Gr Ent Prača-Renovica-Gr Ent Kaljani, km 7+310		Elaborat: Design&QC d.o.o. Sarajevo 01-02.1-9733/24 31.10.2024.	2.340	-	
			Infra d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-9064/24, 08.10.2024	6.821	6.821	
			Naknada, suglasnost	2.330	2.330	
M5	Rekonstrukcija/Sanacija raskrsnice na M5 Azize Šećerbegović-Korija-Ljubogošta, km 1+350		Elaborat-ZT Tehnozaštita d.o.o. Sarajevo; 032-07/24	936	936	

M18	Rekonstrukcija/Sanacija mosta preko rijeke Suha u Stuparima (M18-007-83) dionica Živinice 1 – Vitalj, km 16+426	Naknada	50	50
M16	Rekonstrukcija mosta preko rijeke Vrbas (M16-007-259) u Donjem Vakufu, na cesti M16, dionica Donji Vakuf 1- Bugojno	Suglasnost	60	60
M20	Sanacija mosta (M20-008-206) preko rijeke Koline u Ustikolini, na cesti M20, dionica Foča 1-Ustikolina, km 9+916	Suglasnost	76	76
M18	*Rekonstrukcija i dogradnja podhodnika Šiški Brod 3-Živinice 1/10+200 II faza	Taksa, naknada	36.947	36.947
M5	Sanacija kolovoza i pješačkih staza na cesti M5_006 Gornje Bravsko-Ključ, prolaz kroz Ključ	Naknada	994	994
M20	Sanacija mosta M20-009-210 preko Odske rijeke u Mravinju, na cesti M20, dionica Ustikolina-Goražde 8, km 14+840	Suglasnost	76	76
M18	Rekonstrukcija ceste Kladanj-Karaula 2+862 -4+540 na M18	Suglasnost	76	76
M5	Rekonstrukcija mosta (M5-009- 218) preko Sandžačke rijeke, na cesti M5, dionica Jajce Jug –Donji Vakuf 1, km 26+245	Taksa	280	280
M18.1	Rekonstrukcija mosta preko Crne rijeke, skretanje za Govediće (M18.1-001-442) dionica Ustikolina-Grebak-Delijaš-Trnovo, km 40+088	Naknada, suglasnost, taksa	362	362
M1.8	Rekonstrukcija mosta preko rijeke Tinje u Donjoj Potpeći, 10+709	Elaborat: ZT Tehnozaštita d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-7030/24, 06.08.2024.	948	948
		Suglasnost, taksa, naknada	504	504
		Elaborat: Proving d.o.o. Sarajevo 01-02.1-7980/24 03.09.2024.	1.287	1.287
M6.1	Rekonstrukcija raskrsnice sa LC za Blagaj 2+000 na M6.1	Naknada, suglasnost	344	344
M18	Izgradnja trake Živinice-Vitalj (Gojsalići-Vitalj)	Suglasnost	2.570	2.570
M17.3	Izgradnja ceste Neum-Stolac M17.3	Tehnički pregled	32.820	32.820
M17.3	Izgradnja ceste Neum Stolac, poddionica Cerovica-Stolovi-Drenovac	Naknada	274	274
M17.4	Izgradnja trake za lijeva skretanja na cesti M17.4 u općini Čitluk	Suglasnost, taksa	1.650	1.650
		Elaborat: Tehnozaštita d.o.o. 01-02.2-9927/24, 07.11.2024.	2.340	2.340
M6.1	Rekonstrukcija raskrsnice Trn 27+188 – R852	Suglasnost, taksa	163	163
M17	Rekonstrukcija raskrsnice na cesti M17_009, Vrelo Bosne, općina Ilidža	Suglasnost	117	117
M4	Rekonstrukcija raskrsnice na cesti M4 sa T9 (Transferzala 9) u Tuzli	Suglasnost	493	493
M17.4	Izgradnja trake za lijevo skretanje za poslovnu zonu „Mostarska vrata“, na M17.4_002, dionica: Čitluk-Medugorje –Ljubuški, općina Ljubuški	Suglasnost, elaborat	654	654
M5	Izgradnja obilaznice Kiseljaka I faza	Tehnički pregled, upotrebna dozvola	20.078	20.078
	Izgradnja gradskog autoputa, XII transferzala, Stupska petlja-gr.entiteta	Naknada	600	600
M14	Rekonstrukcija raskrsnice M14 i M14.2 u Bos. Krupi	Suglasnost	575	575
M4.2	Rekonstrukcija raskrsnice cesta M4.2 i R402 u Cazinu	Suglasnost	1.055	1.055
M5	Rekonstrukcija ceste Jajce jug-Donji Vakuf 1	Komisija, taksa	750	750
M16	Sanacija raskrsnice na M16 u Kupresu	Taksa	20	20

JP CESTE FEDERACIJE BIH

	Izgradnja gradskog autoputa u Sarajevu, dionica: Stup- Buća potok-Pofalići – Velešići-Bentbaša			Naknada, suglasnost, taksa	514	514	
M16.2	Rekonstrukcija raskrsnice za naselje Duge, općina Prozor			Taksa	150	150	
M14	Rekonstrukcija raskrsnice i lokalne ceste u naselju Brekovica, Bihać-Srbljani 7+830			Suglasnost	344	344	
M4	Rekonstrukcija raskrsnice na cesti M4, skretanje Mala Brijesnica, općina Doboj Istok			Suglasnost	146	146	
M17	Rekonstrukcija raskrsnice Rajlovačka cesta/5+000			Suglasnost, naknada	196	196	
				ZT Tehnozaštita 013-09/2024 11.09.2024.	819	819	
M4	Izrada studije za prethodnu vodnu suglasnost za rekonstrukciju mosta preko rijeke Soline u Tuzli (M04.0-4-05) dionica Šiški Brod-Kalesija-gr. Entiteta (Memići) km 9+555			Sendo d.o.o. Sarajevo 01-02.1-371/24 16.01.2024	1.170	1.170	
M4	Izrada stručne ocjene sa potvrdom o primljenim mjerama zaštite na radu I zaštite od požara na Glavnom projektu rekonstrukcije mosta preko rijeke Soline u Tuzli (M04.0-4-05) dionica Šiški Brod-Kalesija-gr. Entiteta (Memići) km 9+555			Protect-Ing d.o.o. Sarajevo 01-02.1-10745/24 05.12.2024.	585	585	
M17	Izgradnja južne obilaznice Mostara - Izgradnja dionice Miljkovići-Rodoč, vijadukt Marjanovića Draga			Naknada, suglasnost, taksa	211	211	
M14.1	Izgradnja sjevernog kraka obilaznice Odžaka („Sjeverna veza“ -nastavak) – II faza			Taksa, tehnički pregled	10.442	10.442	
M17	Rekonstrukcija raskrsnice M17, sjeverni priključak Mostara			Naknada, suglasnost	1.264	1.264	
M18	Poddionica: Šiški Brod-Đurđevik na trasi ceste Tuzla –Sarajevo			Naknada, suglasnost, oglaš, taksa	1.761	1.761	
M5	Uskladjivanje izvedenog stanja trase dionice D2 sa korigovanim projektom raskrsnice R2, izgradnja obilaznice Donji Vakuf I faza			Arting BH d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-2560/24 15.04.2024.	5.265	5.265	
				Suglasnost, taksa	1.109	1.109	
M14	Izrada elaborata za vodnu suglasnost za projekat Izgradnje obilaznice Bihaća			IG d.o.o. Banja Luka, 01-02.1-2550/24 15.04.2024.	2.340	2.340	
				Euroing d.o.o. Bihać, 01-02.1-10024/22. 07.11.2022. Sporazum o raskidu ugovora: 01-02.1-8603/24, 20.09.2024.	4.914	-	
				Naknada, suglasnost, taksa	4.866	4.866	
M4	Izrada zahtjeva za prethodnu procjenu utjecaja na okoliš I studije za prethodnu vodnu suglasnost za projekat izgradnje Južne saobraćajnice u Tuzli (dionica Ši Selo Slavinovići, T7-T8-T9 L=2,0 km)			Gradevinski fakultet UNSA, 01-02.1-5211/24 04.06.2024	2.280	2.280	
M5	Izgradnja obilaznice Kiseljaka II faza			Suglasnost, taksa	473	473	
M5	Bihać 4-Ripač, ispravljanje osovine ceste (Devijacija puta AVNOJ-a)			Naknada, suglasnost	2.619	2.619	
				Suglasnost	193	193	
M6	Rekonstrukcija raskrsnice cesta M6 i R427 ulaz u Stolac: - Revizija elaborata o inženjerskogeološkim karakteristikama - Revizija elektrotehničkog projekta rasvjete			Integra d.o.o. Mostar, 01-02.1-1905/22. 14.03.2022.	1.147	-	
				Habitat d.o.o. Mostar, 01-02.1-4573/22.	585	-	
M17	Rasvjeta na M17 u naselju Ortiješ, Grad Mostar			Habitat d.o.o. Mostar, 01-02.2-3792/23.	2.925	-	

					19.05.2023.			
	M18	Rekonstrukcija raskrsnice na M18_010 Kobilja Glava-Sarajevo-Malta km 8+340 (geotehnički izvještaj o stabilnosti terena i nosivosti tla)			Design&QC d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-11542/23, 15.12.2023.	7.020	7.020	
	M15	Rekonstrukcija mosta preko potoka Krbava (M15-004-49), na cesti M15, dionica Kamičak-Ključ, km 9+622			Studija: Sendo d.o.o. Sarajevo 01-02.1-10235/24 19.11.2024.	2.808	-	
	M16	Revizija Glavnog projekta rasvjete mosta i raskrsnice za projekat rekonstrukcije priključka lokalne ceste za Zdaljevac na cestu M16			Trasa d.o.o. Sarajevo 01-02.1-9735/24 31.10.2024.	1.872	1.872	
	M18	Neovisna kontrola kvaliteta radova na projektu LOT 1 Izgradnja trake za spora vozila na cesti Olovo-Semizovac, poddionica Čevljanovići-Nišići			AIK Inženjering d.o.o. Banovići, 01-02.2-5164/24, 03.06.2024	6.973	6.962	
	M15	Izgradnja novog mosta (M15-004-50) preko rijeke Banjice, dionica Kamičak-Ključ, km 18+414			Naknada, suglasnost, taksa	302	302	
	M18	Izrada idejnog projekta rekonstrukcije ceste M18, dionice Stupari – Vitalj L=cca 10km			Suglasnost	76	76	
7.		Glavni projekat izgradnje ceste Bihać-Bosanska Krupa, dionica Tabla Grmuša (L=cca 2,5km)	Projektiranje	30.000	GP: Radis d.o.o. Istočno Sarajevo i CPK d.o.o. Banja Luka 01-02.1-8761/24 26.09.2024	29.877	11.186	Izrada u toku
			Revizija	5.850	IPSA Institut d.o.o. Sarajevo 01-02.1-10240/24 19.11.2024.	5.850	-	
			Ukupno				11.186	
		UKUPNO		717.350			234.412	

***Napomena:** R.B. 5: Prema sporazumu 01-03.1-5320/24 od 06.06.2024. sa Gradom Stolac, sredstva od 250.000 KM od strane JP Ceste Federacije BiH d.o.o. su doznačena Gradu Stolac predviđena za izvođenje radova na projektu „Izgradnja obilaznice. Stoca – sanacija servisne saobraćajnice tokom izvođenja radova“.

***Napomena:** R.B. 6: Potpisan je Sporazum 01-02.2-5009/24 između Grada Živinice i JP Ceste Federacije BiH d.o.o. o zajedničkoj implementaciji projekta „Rekonstrukcija i dogradnja podhodnika na M18 u Živinicama II faza“ gdje će Grad Živinice radi realizacije navedenog projekta, za ishodovanje trajne promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe osigurati nepovratna sredstva u iznosu od 36.907 KM što je i realizirano 26.08.2024. godine, dok će JP Ceste Federacije BiH d.o.o. u narednom periodu osigurati sredstva za izvođenje radova i nadzor na predmetnom projektu. Shodno tome, ukupni iznos realizacije iz prethodne tabele u prikazan u tabeli C Investicije (rekapitulacija str. 32) u dvije pozicije:

- 3.2.1. Projekti rekonstrukcije i izgradnje
- 6. Sufinanciranje iz drugih nivoa vlasti

3.2.2. Rasvjeta i semaforizacija raskrsnica i tunela

Red br.	Mag. Cesta	Naziv i opis projekta	Aktivnosti na projektu	Rebalans Plana 2024.	Izvođač/ Konsultant-ugovor	Ugovoreno	Realizirano 01.01.-30.06.2024.	Napomena
1.	M5	Modernizacija semafora na ulazu u Vitez M5	Projektiranje	7.000			-	Priprema TD
		UKUPNO		7.000			-	

3.2.3. Poboljšanje sigurnosti prometa na magistralnim cestama izgradnjom traka za lijeva skretanja, pješačkih staza sa odvodnjom kišne kanalizacije, odmorišta i sanacija crnih tačaka

Red br.	Mag. Cesta	Naziv i opis projekta	Aktivnosti na projektu	Rebalans Plana 2024.	Izvođač/ Konsultant- ugovor	Ugovoreno	Realizirano 01.01.- 31.12.2024.	Napomena
1.	M5	Izrada idejnog projekta rekonstrukcije raskrsnice u kružni tok, u naselju Pijavice na cesti M5, dionica Jajce - Jajce Jug	Projektiranje	10.000			-	PZ u toku
2.	M4	Izrada idejnog projekta rekonstrukcije raskrsnice „Brčanska Malta“ u kružni tok, u Tuzli na cesti M4	Projektiranje	7.000	Radis d.o.o. Istočno Sarajevo 01-02.1-10218/24 18.11.2024.	6.903	-	Izrada u toku u toku
			Ukupno				-	
3.	M16	Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok na cesti M16 (spoj Slavonska i Splitska ulica), općina Kupres.	Izvođenje	850.000			-	Poništena JN i priprema nove TD
			Nadzor	15.000			-	
4.	M14.2	Izgradnja pješačke staze uz cestu M14.2 naselje Donja Mahala, općina Orašje.	Projektiranje	7.000			-	Okončano
			Izvođenje	200.000	Jata Group d.o.o Srebrenik 01-02.2-7009/24 06.08.2024	199.997	199.997	
			Nadzor	1.600	Trafficon d.o.o. Odžak, 01-02.2-7146/24 09.08.2024.	1.591	1.591	
			Ukupno				201.588	
5.	M1.8	Rekonstrukcija raskrsnice na cesti M1.8_004 skretanje za poslovnu zonu "Srebernik 2", grad Srebrenik.	Projektiranje	10.000	PPG d.o.o. Sarajevo 01-02.2-9780/24 01.11.2024.	6.727	-	U toku
			Ukupno				-	
6.	M4.2	Izgradnja pješačke staze uz cestu M4.2_001 naselje Barake, općina Velika Kladuša.	Izvođenje	200.000	KOV-GRAD d.o.o. Bužim 01-02.2-10506/24 29.11.2024.	199.980	-	Ugovoreno. Očekuje se početak radova po stvaranju povoljnih vremenskih prilika
			Nadzor	7.000	CPK d.o.o. Banja Luka 01-02.2-10551/24 02.12.2024.	6.938	-	
			Ukupno				-	
7.	M16.2	Izgradnja pješačke staze uz cestu M16.2_001, općina Gornji Vakuf-Uskoplje – Humac-Dražev dolac	Projektiranje	5.500	EDI-ING d.o.o. D.Vakuf 01-02.2-7972/24 03.09.2024.	5.499	5.499	Priprema TD za radove i nadzor
			Izvođenje	150.000			-	
			Nadzor	7.000			-	
			Ukupno				5.499	
8.	M5	Izgradnja pješačke staze uz cestu M5, naselje Gudelj-Vatrostalna, općina Busovača	Projektiranje	5.300	EDI-ING d.o.o. D.Vakuf 01-02.2-7973/24 03.09.2024.	5.265	5.265	Priprema TD za radove i nadzor
			Izvođenje	150.000			-	
			Nadzor	7.000			-	
			Ukupno				5.265	
9.	M6	Izgradnja pješačke staze uz cestu M6 u naselju Ričina - Crnogorci	Projektiranje	6.900	Integra d.o.o. Mostar 01-02.2-6126/24 04.07.2024	6.903	6.903	Okončano
			Izvođenje	140.000	KTM Brina d.o.o. Posušje	139.928	139.725	

JP CESTE FEDERACIJE BIH

					01-02.2-7906/24 30.08.2024.			
			Nadzor	3.850	Artimg BH d.o.o. Sarajevo 01-02.2-8206/24 10.09.2024.	3.849	3.849	
			Ukupno				150.477	
10.	M17.1	M-17.1, 002, izgradnja pješačkih staza kraj škola u naseljenim mjestima Kovači, općina Zavidovići	Projektiranje	7.000	FM Inženjering d.o.o. Sarajevo 01-02.2-10390/24 26.11.2024.	3.721	-	U toku projektovanje
			Izvođenje	150.000			-	
			Nadzor	4.000			-	
			Ukupno				-	
11.	M17.1	M-17.1, 002, izgradnja pješačkih staza kraj škola u naseljenim mjestima Krivaja, općina Zavidovići	Projektiranje	7.000	Pronasa d.o.o. Sarajevo 01-02.2-11532/24 30.12.2024.	3.507	-	Nabavka u toku
			Ukupno				-	
12.	M17.1	M-17.1, 002, izgradnja pješačkih staza kraj škola u naseljenim mjestima Vozuća, općina Zavidovići	Projektiranje	7.000	Pronasa d.o.o. Sarajevo 01-02.2-11532/24 30.12.2024.	3.507	-	Nabavka u toku
			Ukupno				-	
13.	M5	Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok na M5– spoj Hasan-paše Predojevića i Nositelja hrvatskog trolista u Bihaću	Projektiranje	20.000			-	Nabavka projekt. u toku
			Revizija	3.000			-	
14.	M14	Rekonstrukcija raskrsnice cesta M14 i M14.2 u Bosanskoj Krupi	Izvođenje	400.000			-	Ishodovanje odobrenja za građenje u toku.
			Nadzor	7.000			-	
15.	M15	Izgradnja pješačke staze na M15 Krkojevići-Čaplje u Šanskom Mostu, dionica Sanski Most 1 – Kamičak od km 3+700 do 5+100	Izvođenje	200.000			-	Nabavka radova u toku
			Nadzor	6.000			-	
16.	M20	Izgradnja pješačke staze na cesti M20 kroz grad Goražde kod „Binga“ i u naselju Bačci	Projektiranje	3.900	FM Inženjering d.o.o. Sarajevo 01-02.2-9130/24 09.10.2024.	3.861	-	U toku projektovanje
			Izvođenje	328.000			-	
			Nadzor	5.000			-	
			Ukupno				-	
17.	M17.1	Rekonstrukcija raskrsnice cesta M-17.1 i R467, Ribnica, općina Zavidovići	Projektiranje	15.000	PPG d.o.o. Sarajevo 01-02.2-9413/24 21.10.2024.	9.242	-	U toku
			Ukupno				-	
18.	M15	Rekonstrukcija raskrsnice na cesti M15 003, općina Sanski Most	Projektiranje	15.000			-	Priprema PZ
19.	M17.3	Izgradnja nogostupa na M 17.3, ulaz u Neum	Izvođenje	175.000			-	Nabavka u toku. Ponuda bila veća od planiranog budžeta.
			Nadzor	5.000			-	
20.	M6	Izgradnja kružnog toka kod Lagera, Posušje	Izvođenje	900.000			-	Ishodovanje odobrenja za građenje u toku.
			Nadzor	15.000			-	
21.	M4	Rekonstrukcija raskrsnice na M4, ulaz u Gračanicu	Projektiranje	15.000			-	Priprem PZ za glav. Projekat u toku
			Izvođenje	670.000			-	
			Nadzor	15.000			-	
22.	M16.4		Izvođenje	120.000			-	Priprema TD

JP CESTE FEDERACIJE BIH

		Izgradnja pješačke staze naselje Bučići, Novi Travnik na M16.4	Nadzor	4.000				
23.	M18	*Izgradnja pješačke staze općina Centar Sarajevo M18 – sufinansiranje s općinom	Izvođenje	243.000				Prebačena sredstva općini na osnovu sporazuma
			Nadzor	7.000				
24.	M6	Izgradnja pješačke staze na M6 Livno-Tomislavgrad u naselju Žabljak, grad Livno	Projektiranje	4.100	EDI-ING d.o.o. D./Vakuf 01-02.2-9992/24 11.11.2024.	4.095		Projektovanje u toku
			Izvođenje	168.000				
			Nadzor	5.000				
			Ukupno					
25.	M6	Izrada idejnog i glavnog projekta izgradnje kružnog toka na križanju obilaznice i ulice Župana Želimira u Livnu	Projektiranje	-				Projekat ranije urađen
26.	M5	Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok na M5 na ulazu u grad Bihać – kod Poliklinike	Projektiranje	45.000	INK Konstruktor d.o.o. Banja Luka 01-02.1-9881/24 06.11.2024.	24.041		Nabavka usluga revizije u toku
			Revizija	5.000				
			Ukupno					
27.	M14	Sanacija pješačke staze na M14 Bihać 4-Srbijani- prolaz kroz Bihać	Izvođenje	248.100	I-Selimović d.o.o. Cazin 01-02.2-8628/24 23.09.2024.	248.021	248.009	Okončano
			Nadzor	6.720	Arting BH d.o.o. Sarajevo 01-02.2-8871/24 01.10.2024.	6.716	6.716	
			Ukupno				254.725	
28.	M4	Izgradnja pješačke staze na mag. cesti M4 u naselju Ljetinići, Jelah	Projektiranje	6.000				Priprema TD
			Izvođenje	120.000				
			Nadzor	4.000				
29.	M5	Izgradnja priključka na M5 za poslovnu zonu „Kombiteks“, grad Bihać	Izvođenje	47.000	I-Selimović d.o.o. Cazin 01-02.2-10189/24 18.11.2024.	46.911	46.899	Okončano
			Nadzor	3.000	Arting BH d.o.o. Sarajevo 01-02.2-9456/24 22.10.2024.	2.340	2.340	
			Ukupno				49.239	
30.		Zamjena i dogradnja odbojnih ograda minimalnog nivoa zaštite H1	Izvođenje	500.000				TD u pripremi
31.	M17	*Izgradnja raskrsnice u mjestu Janjići, Grad Zenica, za potrebe izgradnje HE Janjići, M17, dionica 007 Nemila-Lašva 0, km 25+700	Izvođenje	416.000	Dobojuptevi d.d. Doboj Jug, 01-02.3-5541/24 12.06.2024.	415.569	392.436	Okončano
			Nadzor	5.800	PPG d.o.o. Sarajevo, 01-02.3-5647/24 18.06.2024.	5.792	5.792	
			Ukupno				398.228	
32.	M4	Rekonstrukcija raskrsnice ceste M4 sa lokalnom cestom za Usoru, dionica Teslić (Barići) – Karuše, km 17+900 – dovršetak radova	Izvođenje	70.000				TD u pripremi
33.	M5	Postavljanje ograde na potpornim zidovima R2 i R4 – Projekat izgradnje Obilaznice Donjeg Vakufa	Izvođenje	45.000				TD u pripremi
34.	M6.1		Projektiranje	7.000	AN-Projekt d.o.o. Visoko 01-02.1-9734/24	6.800		TD u pripremi

JP CESTE FEDERACIJE BIH

		Rekonstrukcija raskrsnice na cesti M6.1 sa lokalnom cestom za Blagaj, dionica Gnojnice-Nevesinje 2, u km 2+300			31.10.2024.			
			Revizija	2.000				
35.		Sanacija pružnog prelaza – Zapadni prilaz (Rješenje FUIP)-sufinansiranje sa DP KS i OT FBiH	Izvođenje	82.000	OZ Pruga p.o. Sarajevo 01-02.2-10457/24 27.11.2024.	81.900		Očekuje se početak radova prema Sporazumu
			Ukupno					
		UKUPNO		6.919.770			1.065.021	

***Napomena:** R.B. 23: Sporazumom 01-02.2-6610/24 od 18.07.2024. godine, JP Ceste Federacije BiH će doznačiti Općini Centar Sarajevo 250.000 KM za radove i nadzor, a Općina će implementirati projekat.

***Napomena:** R.B. 31: Prema Sporazumu 01-02.3-7700/23 od 18.08.2023. JP Elektroprivreda BiH d.d. je osigurala 500.000 KM za izvođenje radova i nadzor za projekat „Izgradnja raskrsnice u mjestu Janjići, Grad Zenica, za potrebe izgradnje HE Janjići, M17, dionica 007 Nemila-Lašva 0, km 25+700“. Do kraja izvještajnog perioda, JP Elektroprivreda BiH d.d. je doznačila na račun JP Ceste FBiH iznos od 373.346 KM, te je preostao dug prema JP Ceste FBiH od 24.882 KM.

***Napomena:** R.B. 35: JP Ceste FBiH su potpisale Sporazum o izvođenju radova i financiranju sanacije pružnog prelaza u Blažuju sa Direkcijom za puteve KS i Operatorom Terminali Federacije d.o.o., broj 01-02.2-2802/24 od 25.04.2024. god. kojim je definirano da će JP Ceste FBiH osigurati novčana sredstva za financiranje radova koji se odnose na kolovoznu konstrukciju, odvodnju, te saobraćajnu opremu i signalizaciju u vrijednosti 82.000 KM.

3.2.4. Vanredno održavanje

3.2.4.1. Sanacija i rekonstrukcija cestovnih objekata

Red br.	Mag. Cesta	Naziv i opis projekta	Aktivnosti na projektu	Rebalans Plana 2024.	Izvođač/ Konsultant- ugovor	Ugovoreno	Realizirano 01.01.- 31.12.2024.	Napomena
1.	M5	Sanacija vijadukta „Mjedenica“ (M5-016-426), na cesti M5, dionica A.Šaćirbegović-Korija-Ljubogošta, km 3+511	Izvođenje	850.000	Hering d.d. Široki Brijeg 01-02.1-9146/24 09.10.2024.	845.945	-	Početak radova odgođen za proljeće
			Nadzor	30.000	GP: PPG d.o.o. Sarajevo i Celab d.o.o. Kakanj 01-02.1-9147/24 09.10.2024	29.777	-	
			Ukupno				-	
2.	M17	Sanacija kolovozne ploče na mostu (M17-014-313) preko gradske ulice (Bajatova), Bjelušine - Mostar obilaznica, dionica Potoci - Mostar (centar) 1, km 13+227	Izvođenje	104.000	Sikra d.o.o. Sarajevo 01-02.1-10509/24 29.11.2024.	103.960	-	Nabavka usluga nadzora u toku
			Nadzor	4.000			-	
			Ukupno				-	
3.	M17	Zamjena dilatacija na mostu (M17-012-302) preko duboke doline, Ostrožac, na cesti M17, dionica Konjic- Jablanica 1, km 13+227	Izvođenje	150.000			-	U pripremi ponovljeni Tender (2x poništavan)
			Nadzor	5.000			-	
4.	M19.2	Zamjena dilatacija na mostu (M19.2-001-96) preko rijeke Drinjače, Vitalj na cesti M19.2, dionica Kladanj – Vlasenica, km 0+081	Izvođenje	104.000			-	U pripremi ponovljeni Tender (2x poništavan)
			Nadzor	4.000			-	
5.	M17	Sanacija dilatacije na mostu (M17-012-304) preko nepoznaog potoka, Crnaja na	Izvođenje	35.000			-	U pripremi ponovljeni

JP CESTE FEDERACIJE BIH

		cesti M17,dionica Konjic- Jablanica 1, km 15+734						Tender (2x poništavan
6.	M17.1	Izrada glavnog projekta sanacije/rekonstrukcije mosta (M17.1-003-147)-preko rijeke Velika Ribnica, (kamenolom dijabaza Velika Ribnica), dionica Ribnica - Banovići – Živinice, km 3+800 (35,65)	Projektiranje	50.000			-	Nabavka usluga projektiranja u toku
			Revizija	5.000			-	
7.	M17.1	Izrada glavnog projekta sanacije/rekonstrukcije mosta (M17.1-004-111) preko rijeke Krivače, Dubrava Gornja, dionica Živinice - Dubrave – Medaš, km 7+954 (15)	Projektiranje	40.000			-	Nabavka usluga projektiranja u toku
			Revizija	4.000			-	
8.	M15	Izrada glavnog projekta sanacije/rekonstrukcije mosta (M15-D04-35) preko rijeke Sane, Vrhpolje na cesti M15, dionica Kamičak - Gornji Kamičak, 0+074 (106,20)	Projektiranje	80.000			-	Nabavka usluga projektiranja u toku
			Revizija	8.000			-	
9.	M17.1	Izrada glavnog projekta sanacije/rekonstrukcije mosta (M17.1-003-156) preko rijeke Litve, Banovići na cesti M17.1, dionica Ribnica - Banovići – Živinice, km 19+138 (31)	Projektovanje	40.000			-	Nabavka usluga projektiranja u toku
			Revizija	4.000			-	
10.	M4.2	Izrada glavnog projekta sanacije/rekonstrukcije (M4.2-001-1) preko rijeke Maljevac , gr. prijelaz Maljevac na cesti M4.2, dionica Skokovi –Srbijani, km 0+006 (10)	Projektiranje	40.000			-	PZ u pripremi
			Revizija	4.000			-	
11.	M18	Izrada glavnog projekta sanacije/rekonstrukcije pločastog propusta (PLP4-012-35) preko potoka Bjeljevac, Miljanovci-Kalesija, na cesti M4, dionica Simin Han 1 – Donje Caparde, km 14+675	Projektiranje	25.000			-	TD u pripremi
			Revizija	3.000			-	
12.	M18	Izrada glavnog projekta sanacije/rekonstrukcije pločastog propusta (PLP4-012-38) preko Kalesijske rijeke, Kalesija selo, Kalesija, na cesti M4, dionica Simin Han 1 – Donje Caparde, km 18+552	Projektiranje	25.000			-	TD u pripremi
			Revizija	3.000			-	
13.	M17.5	Izrada glavnog projekta sanacije/rekonstrukcije pločastog propusta (PLP17.5-001-480) preko rijeke Doljanke, Sovići - Jablanica, na cesti M17.5, dionica Jablanica - Blidinje, km 18+780	Projektiranje	25.000			-	Nabavka usluga projektiranja u toku
			Revizija	3.000			-	
14.	M17	Sanacija mosta preko rijeke Bosne (M17.1-001-636)u Žepču, na cesti M17.1, dionica Žepče – Zavidovići - Ribnica, km 0+980	Projektiranje	30.000			-	Nabavka usluga projektiranja u toku
			Revizija	3.000			-	
15.	M6	Zamjena diletacija na mostu na obilaznici Livna-prema Grahovu	Izvođenje	125.000			-	Predmjer u pripremi
			Nadzor	5.000			-	
16.	M6	Zamjena dilatacionih naprava na mostu (M6-002-368) preko rijeke Vriostice, u Vitini na cesti M6, dionica Vitina-Tasovčići, km 1+534	Izvođenje	105.000			-	Ugovor za Radove u pripremi
			Nadzor	4.000	Trasa d.o.o. Sarajevo 01-02.1-11255/24 19.12.2024.	3.950	-	
			Ukupno				-	
17.	M5	Rekonstrukcija mosta M 05.0-5-01-a preko Koševskog potoka, Skenderija, na cesti M5, dionica Stup-Vijećnica-Gr. entiteta ...Gr. entiteta- Prača-Renovica-Gr. Entiteta-Kaljani, km 7+310	Izvođenje	1.260.000			-	TD za radove i nadzor u pripremi
			Nadzor	40.000			-	
18.	M17	Zamjena dilatacija na mostu (M17-012-301) preko rukavca Jablaničkog jezera, Ribići, na cesti M17, dionica Konjic - Jablanica 1, km 10+384	Izvođenje	280.000			-	TD u pripremi
			Nadzor	6.000			-	
		UKUPNO		3.503.000			-	

3.2.4.2. Sanacija oštećenih asfaltnih kolovoza

Red br.	Mag. Cesta	Naziv i opis projekta	Aktivnosti na projektu	Rebalans Plana 2024.	Izvođač/ Konsultant-ugovor	Ugovoreno	Realizirano 01.01.-31.12.2024.	Napomena
1.	M14	Rekonstrukcija i modernizacija kolovoza i pješačkih staza na cesti M14_001 od km 0+500 do km 2+170, grad Bihać.	Izvođenje	1.000.000			-	Priprema TD
			Nadzor	20.000			-	
2.	M4	Sanacija kolovoza na cesti M4_012 Simin Han 1 - Donje Caparde III faza	Izvođenje	500.000	Jata Group d.o.o. Srebrenik 01-02.2-7241/24 14.08.2024	499.984	499.982	Okončano
			Nadzor	3.300	AJK Inženjering d.o.o. Banovići 01-02.2-8627/24 23.09.2024.	3.276	3.276	
			Ukupno				503.258	
3.	M4	Sanacija kolovoza na cesti M4_010 Donja Orahovica - Šićki Brod I	Izvođenje	750.000	Jata Group d.o.o. Srebrenik 01-02.2-9388/24 18.10.2024	748.860	748.857	Okončano
			Nadzor	565	Radis d.o.o. Istočno Sarajevo 01-02.2-9370/24 17.10.2024.	561	467	
			Ukupno				749.324	
4.	M4	Sanacija kolovoza na cesti M4_009 Doboj - Donja Orahovica	Izvođenje	499.100	Roading d.o.o. Gračanica 01-02.2-7039/24 07.08.2024.	499.044	490.856	Okončano
			Nadzor	3.100	GP: Celab d.o.o. Kakanj i PPG d.o.o. Sarajevo 01-02.2-8010/24 03.09.2024.	3.100	2.584	
			Ukupno				493.440	
5.	M1.9	Sanacija kolovoza na cesti M1.9_002 Gradačac - Kerep, dužina cca. 6 km, grad Gradačac	Projektiranje	13.900	Institut za građevinarstvo „IG“ d.o.o. Banja Luka 01-02.2-7238/24 14.08.2024.	13.900	-	Izrada projekta u toku. Nakon završetka projektovanja biće pokrenuta JN za radove i nadzor.
			Izvođenje	800.000			-	
			Nadzor	30.000			-	
			Ukupno				-	
6.	M5	Sanacija kolovoza i pješačkih staza na cesti M5_006 Gornje Bravsko-Ključ, prolaz kroz Ključ	Projektiranje	7.000			-	Okončano
			Izvođenje	400.000	Behić Sanny Boy d.o.o. Bihać 01-02.2-8602/24 20.09.2024.	399.038	384.352	
			Nadzor	6.000	CPK d.o.o. Banja Luka 01-02.2-8596/24 20.09.2024.	5.908	5.908	
			Ukupno				390.260	
7.	M17.5	Sanacija kolovoza na cesti M17.5_004 Grude 2-Privalj	Izvođenje	150.000	Putovi d.o.o. Grude 01-02.2-8379/24 17.09.2024.	149.982	149.919	Okončano
			Nadzor	5.000	Smajić Inženjering d.o.o. Goražde, 01-02.2-8382/24 17.09.2024.	4.914	4.914	
			Ukupno				154.833	

JP CESTE FEDERACIJE BIH

8.	M6	Sanacija kolovoza na cesti M16_011 Livno - Renjići od Km 16+500 do 17+500, L=1000m.	Izvođenje	295.000	Roco Commerce d.o.o. Livno 01-02.2-7237/24 14.08.2024.	294.723	294.619	Okončano
			Nadzor	1.100	Smajić Inženjering d.o.o. Goražde, 01- 02.2-7239/24 14.08.2024.	1.051	1.051	
			Ukupno				295.670	
9.	M1.8	Sanacija kolovoza na cesti M1.8_003 Pelagićevo-Srebrenik	Izvođenje	351.000	Jata Group d.o.o. Srebrenik 01-02.2-9457/24 22.10.2024.	351.000	351.000	Okončano
			Nadzor	3.400	AIK Inženjering d.o.o. Banovići 01-02.2-9385/24 18.10.2024.	3.393	3.393	
			Ukupno				354.393	
10.	M5	Sanacija kolovoza na cesti M5_012 Nević polje-Kaonik, potez Vitez-Kaonik	Izvođenje	397.000	Jata Group d.o.o. Srebrenik 01-02.2-7975/24 03.09.2024.	396.206	396.202	Okončano
			Nadzor	3.100	Smajić Inženjering d.o.o. Goražde 01-02.2-7974/24 03.09.2024.	3.042	3.042	
			Ukupno				399.244	
11.	M17.3	Sanacija kolovoza na cesti M17.3 Buna- Masline	Izvođenje	297.200	HP Investing d.o.o. Mostar 01-02.2-8867/24 01.10.2024.	297.178	295.190	Okončano
			Nadzor	1.800	ProKonsIng d.o.o. Mostar 01-02.2-9338/24 16.10.2024.	1.800	1.800	
			Ukupno				296.990	
12.	M5	Sanacija kolovoza na cesti M5 Kaonik- Gromiljak, prolaz kroz Jehovac	Projektiranje	3.000	-	-	-	Okončano
			Izvođenje	340.000	Jata Group d.o.o. Srebrenik 01-02.2-7281/24 15.08.2024.	339.299	339.296	
			Nadzor	1.300	Smajić-Inženjering d.o.o. Goražde 01-02.2-7977/24 03.09.2024.	1.286	1.286	
			Ukupno				340.582	
13.	M5	*Sanacija kolovoza na M5 i M18 – prolaz kroz Sarajevo (sufinanciranje sa Direkcijom za puteve KS)	Izvođenje	300.000				Sporazum sa DP KS
14.	M17.4	Sanacija asf. kolovoza sa izgradnjom pješačke staze na M17.4 Mostar-Čitluk- Brdo Hum	Projektiranje	10.000				Priprema TD
			Izvođenje	475.000				
			Nadzor	15.000				
15.	M14.2	Sanacija asf. kolovoza na M14.2 na dionici Šamac-Orašje	Izvođenje	247.000	Jata Group d.o.o. Srebrenik 01-02.2-7010/24 06.08.2024	246.746	246.745	Okončano
			Nadzor	2.700	Trafficon d.o.o. Odžak 01-02.2-7252/24 15.08.2024.	2.691	2.691	
			Ukupno				249.436	
16.	M17.1	Sanacija asfaltnog kolovoza Žepče- Zavidovići	Izvođenje	122.500	Dobojputevi d.d. Doboj Jug 01-02.2-7976/24 03.09.2024.	122.443	122.442	Okončano

			Nadzor	1.750	AIK Inženjering d.o.o. Banovići 01-02.2-7280/24 15.08.2024	1.732	1.732	
			Ukupno				124.174	
		UKUPNO		7.055.815			4.351.606	

***Napomena: R.B. 13.** Sporazumom o sufinanciranju projekta broj 01-02.2-11549/24 od 30.12.2024. godine potpisanog između JP Ceste Federacije BiH d.o.o. i Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo utvrđeno je da će projekat implementirati Direkcija za puteve KS. JP Ceste Federacije BiH d.o.o. će prema Sporazumu prebaciti sredstva u iznosu od 300.000 KM koja su predviđena u Rebalansu Plana poslovanja za 2024. i u Planu poslovanja za 2025. godinu na račun Direkcije za puteve KS.

3.2.4.3. Sanacija klizišta, odrona, sanacija slijeganja trupa puta, kosina, usjeka i zasjeka

Red br.	Mag. Cesta	Naziv i opis projekta	Aktivnosti na projektu	Rebalans Plana 2024.	Izvođač/ Konsultant- ugovor	Ugovoreno	Realizirano 01.01.- 31.12.2024.	Napomena
1.	M14	Sanacija klizišta na cesti M14_003 km 7+460 (L) Bosanska Krupa 1-B.Otoka.	Projektiranje	15.000			-	Priprema PZ
			Izvođenje	300.000			-	
			Nadzor	7.000			-	
2.	M16	Sanacija škarpi i nestabilnih kosina na cesti M16_006, dionica: Crna Rijeka-Jajce, lokacija 2 (km 7+050 - km 7+800) – II faza	Izvođenje	500.000			-	Čekao se završetak I faze. Priprema TD za II fazu
			Nadzor	10.000			-	
3.	M17	Sanacija škarpi i uklanjanje ili stabilizacija Ostenjaka iznad ceste M17 i brane HE Grabovica	Projektiranje	30.000			-	Usaglašavanje sa EP BiH
			Revizija	5.000			-	
4.		Izrada projektne dokumentacije za novonastale sanacije slijeganja, klizišta i škarpi						
		- Sanacija klizišta, cesta M17_011, Tarčin-Konjic, km 8+650	Projektiranje	100.000	Design&QC d.o.o. Sarajevo 01-02.2-1665/24 12.03.2024	13.806	13.806	Okončano
		- Sanacija slijeganja trupa ceste na cesti M14_003, Bosanska Krupa-Bosanska Otoka, km 6+630			Design&QC d.o.o. Sarajevo 01-02.2-5129/24 31.05.2024	15.210	15.210	Okončano
		- Sanacija klizišta, cesta M4.3_002, dionica Radića most-Bužim, km 21+700			Design&QC d.o.o. Sarajevo 01-02.2-7978/24 03.09.2024	11.700	11.700	Okončano
		- Sanacija propusta i sanacija škarpi na cesti M16.2_003, km 27+100			PPG d.o.o. Sarajevo 01-02.2-10991/24 12.12.2024.	6.000	-	U toku
		- Sanacija škarpe iznad nivelete, izrada propusta i sanacija škarpe ispod nivelete cesta M16.2_003, dionica Prozor-Jablanica, km 26+100			PPG d.o.o. Sarajevo 01-02.2-10992/24 12.12.2024.	3.000	-	U toku
		- Sanacija škarpe iznad nivelete, sanacija propusta i sanacija škarpe ispod nivelete cesta M16.2_003, dionica Prozor-Jablanica, km 26+500			PPG d.o.o. Sarajevo 01-02.2-10992/24 12.12.2024.	3.000	-	U toku
		Ukupno						40.716
5.	M17	Sanacija klizišta, cesta M17_011, Tarčin-Konjic, km 8+650	Izvođenje	682.000	MGBH d.o.o. Sarajevo 01-02.2-2108/24 27.03.2024	681.858	681.801	Okončano

			Nadzor	6.903	PPG d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-2104/24, 27.03.2024	6.903	6.903	
			Ukupno				688.704	
6.	M4.3	Sanacija klizišta na cesti M4.3_002: Radića Most-Bužim, km 21+700	Izvođenje	300.000			-	Priprema TD
			Nadzor	7.000			-	
		UKUPNO		1.962.903			729.420	

3.2.4.4. Hitne intervencije na sanaciji šteta na cestovnoj infrastrukturi uzrokovanih poplavama

Red br.	Mag. Cesta	Naziv i opis projekta	Aktivnosti na projektu	Rebalans Plana 2024.	Izvođač/ Konsultant- ugovor	Ugovoreno	Realizirano 01.01.- 31.12.2024.	Napomena
1.	M17	Sanacija oštećenog dijela trupa ceste na dionici 012 Konjic-Jablanica 1, km 16+000-km 16+200	Projektiranje	15.000	Divel d.o.o. Sarajevo 01-02.2-9779/24 01.11.2024.	17.550	-	U toku
			Izvođenje	750.000			-	
			Nadzor	15.000			-	
			Ukupno					
2.	M17	Sanacija oštećenog dijela trupa ceste na dionici 013 Jablanica 1-Potoci, km 1+150	Projektiranje	6.000	Design&QC d.o.o. Sarajevo 01-02.2-9776/24 01.11.2024.	9.360	9.360	Projektovanje završeno. Radovi ugovoreni. Nabavka za nadzor u toku
			Izvođenje	300.000	Grakop d.o.o. Kiseljak 01-02.2-11536/24 30.12.2024.	202.133	-	
			Nadzor	7.000			-	
			Ukupno				9.360	
3.	M17	Sanacija oštećenog dijela trupa ceste na dionici 013 Jablanica 1-Potoci, km 2+450	Projektiranje	10.000	Design&QC d.o.o. Sarajevo 01-02.2-9776/24 01.11.2024	9.360	9.360	Projektovanje završeno. Radovi ugovoreni. Nabavka za nadzor u toku
			Izvođenje	650.000	Grakop d.o.o. Kiseljak 01-02.2-11536/24 30.12.2024.	283.978	-	
			Nadzor	12.000			-	
			Ukupno				9.360	
4.	M17	Sanacija oštećenog dijela trupa ceste na dionici 013 Jablanica 1-Potoci, km 4+450	Projektiranje	8.000	Design&QC d.o.o. Sarajevo 01-02.2-9775/24 01.11.2024	7.020	7.020	Projektovanje završeno. Radovi ugovoreni. Nabavka za nadzor u toku
			Izvođenje	650.000	HP Investing d.o.o. Mostar 01-02.2-11534/24 30.12.2024.	180.865	-	
			Nadzor	12.000			-	
			Ukupno				7.020	
5.	M17	Sanacija oštećenog temelja potpornog zida ispod nivelete ceste na dionici 013 Jablanica 1-Potoci, km 4+650	Projektiranje	4.000	Design&QC d.o.o. Sarajevo 01-02.2-9775/24 01.11.2024	7.020	7.020	Projektovanje završeno. Radovi ugovoreni. Nabavka za nadzor u toku
			Izvođenje	650.000	HP Investing d.o.o. Mostar 01-02.2-11534/24 30.12.2024.	201.896	-	
			Nadzor	12.000			-	
			Ukupno				7.020	
6.	M17		Projektiranje	4.000	Design&QC d.o.o. Sarajevo 01-02.2-9775/24	4.680	4.680	Projektovanje završeno.

		Sanacija oštećenog dijela trupa ceste na dionici 013 Jablanica 1-Potoci, km 4+950			01.11.2024				Radovi ugovoreni. Nabavka za nadzor u toku
			Izvođenje	150.000	HP Investing d.o.o. Mostar 01-02.2-11534/24 30.12.2024.	59.993	-		
			Nadzor	5.000			-		
			Ukupno				4.680		
7.	M16.2	Sanacija oštećenih dijelova trupa ceste na dionici 003 Prozor/Rama-Jablanica 1, km 25+000 -km 28+000	Projektiranje	16.000			-		Izrada projekta u toku
			Izvođenje	1.500.000			-		
			Nadzor	30.000			-		
8.	M17.5	Sanacija oštećenog dijela trase ceste dionica 001 Jablanica-Blidinje, poddionica Jablanica-Kosne Luke, km 0+600 – km 6+500, L= 6 km	Projektiranje	110.000	Integra d.o.o. Mostar 01-02.1-10113/24 14.11.2024.	109.512	-		U toku
			Revizija	10.000	Trasa d.o.o. Sarajevo 01-02.1-10127/24 14.11.2024.	9.828	-		
			Ukupno				-		
9.	M17	Sanacija trupa ceste M17_013 Jablanica 1-Potoci, km 5+900-6+100	Projektiranje	-	Infra d.o.o. Sarajevo 01-02.2-11531/24 30.12.2024.	34.979	-		U toku projektovanje i revizija
			Revizija	-	Design&QC d.o.o. Sarajevo 01-02.2-11533/24 30.12.2024	5.850	-		
			Ukupno				-		
		UKUPNO		4.926.000			37.440		

U noći sa 03. na 04.10.2024. godine, područje općina Jablanica, Kiseljak, Fojnica, Kreševo i grada Konjica zadesilo je veliko nevrijeme u vidu obilnih kišnih padavina, što je izazvalo velika oštećenja na mnogim infrastrukturnim, stambenim i poslovnim objektima i na žalost značajan je broj ljudskih žrtava. Zbog obilnih padavina došlo je do formiranja bujica na padinama iznad i ispod ceste na više lokacija na magistralnoj cesti M17 dionica 012 Konjic – Jablanica 1 i dionica 013 Jablanica 1 – Potoci, na magistralnoj cesti M16.2 dionica 003 Prozor – Jablanica 1, na magistralnoj cesti M17.5_001 Jablanica – Blidinje, te na magistralnoj cesti M5_014 Gromiljak – Blažuj.

Bujice su teško oštetile navedene dionice magistralnih cesta na više lokacija, a na nekim lokacijama su oštećenja takve prirode da je bujica odnijela kompletan trup magistralne ceste čime je onemogućeno odvijanje prometa. Posebno ističemo dionicu magistralne ceste M17_013 na lokaciji "Komadinovo vrelo" gdje je bujica odnijela trup magistralne ceste u dužini cca 80 metara, dubine cca 8 metara, dionicu ceste M17.5_001 gdje su bujice na dva lokaliteta odnijele kompletan trup magistralne ceste na dva lokaliteta u dužinama cca 250 m i cca 200 m, dubine 5-15 metara. Na određenim lokacijama na magistralnoj cesti bujice su nanijele ogromne količine nanosnog materijala sa okolnih padina (kameniti i muljeviti materijal), što je također onemogućilo odvijanje prometa.

Na više lokacija na navedenim dionicama magistralnih cesta, bujice su oštetile trup magistralne ceste na način da je došlo do ispiranja nasipa i gornjeg stroja kolovozne konstrukcije, ulegnuća kolovoza, oštećenja potpornih konstrukcija i sl. Na ovakvim mjestima je velika vjerovatnoća nastavka oštećenja trupa čime bi došlo do još većih oštećenja a i odvijanje prometa bi bilo značajno ugroženo. Ovakve lokacije su trenutno ograđene i obilježene vertikalnom signalizacijom koja upozorava na oštećenja na cesti i izmjeni režima odvijanja prometa.

Iz svih naprijed navedenih razloga, te potrebne hitne intervencije koja bi spriječila značajno veću štetu, u cilju što bržeg i sigurnijeg uspostavljanja prometa, pokrenut je hitni pregovarački postupak za izradu projektne dokumentacije, te nakon toga i za radove na navedenim lokacijama iz tabele 3.2.4.4.

4. Eksproprijacija i elaborati eksproprijacije

Za projekte gdje su neophodne pripreme za eksproprijaciju, elaborati eksproprijacije, kao i vještačenja i konsultantske usluge (pravna pomoć) JP Ceste FBiH su Planom planirale vlastita sredstva u iznosu od 3,1 mil. KM.

Red. br.	O P I S	Rebalans Plana 2024.	Izvođač/ Konsultant - ugovor	Ugovoreno	Realizirano 01.01.- 31.12.2024.
1.	Elaborati eksproprijacije i pripremne faze za eksproprijaciju (vještačenja, pretvorbe zemljišta..i sl.)	100.000			
	Pripremne faze za eksproprijaciju (vještačenja, pretvorbe zemljišta..i sl.)				
	Rekonstrukcija raskrsnice magistralne ceste M18_006: Šićki Brod 3-Živinice 1 i regionalne ceste R455b, km 6+100, grad Živinice		Geo_xyz d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-11777/23 25.12.2023.	1.404	1.404
	Izrada geodetskog elaborata za projekat izgradnje ceste Neum-Stolac, poddionica Cerovica-Stolovi L=cca 5km		Geodet d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-2150/24 29.03.2024.	5.900	5.900
	Izgradnja južne obilaznice Mostara -Izgradnja dionice Miljkovići-Rodoč, vijadukt Marjanovića Draga		Ugovor o djelu	12.429	12.429
	Izgradnja južne obilaznice Gruda		Grad Mostar 6/2024 – katastar)	4.860	4.860
	Izgradnja obilaznice Gruda (sjeverna)		Ugovor o djelu	7.300	7.300
	Izgradnja obil. Bihaća, dionica Jablanska ulica-čvor Mali Lug-veza na M14		Ugovor o djelu	1.577	1.577
	Rekonstrukcija raskrsnice za naselje Duge, općina Prozor		Ugovor o djelu	8.657	8.657
	Izgradnja ceste Neum-Stolac M17.3		Ugovor o djelu	415	415
	Izgradnja trake Živinice-Vitalj (Gojsalići-Vitalj)		Ugovor o djelu	712	712
	Izgradnja obilaznice Goražde		Ugovor o djelu	6.197	6.197
	Izgradnja obilaznice Bugojna		Ugovor o djelu	332	332
	Rekonstrukcija raskrsnice sa M17 i lokalne ceste za naselje Papratnica, dionica M17_006:Ozimica-Topčić Polje, km 9+180, općina Žepče		Ugovor o djelu	415	415
	Rekonstrukcija ceste M15, Livno-Šujica		Općina Žepče-geodetske usluge	120	120
	Rekonstrukcija ceste M1.9. Slatina (gr.entiteta) – Gradačac – izgradnja kružnog toka na križanju za industrijsku zonu, općina Gradačac		Ugovor o djelu	652	652
	Konsultantske usluge –pravna pomoć		Ugovor o djelu	356	356
			Ugovor o djelu	949	949
	UKUPNO	100.000			52.275

Red.br	Mag. Cesta	NAZIV PROJEKTA	Rebalans Plana 2024.	Realizirano 31.12.2024.
1.	M17.3	Neum – Stolac, dionica: Stolac-Drenovac 0052	3.000.000	9.261
2.	M6.1	Južna obil. Mostara, dionice Međine - Miljkovići – Rodoč - veza na M17		
3.	M14	Obilaznica Bihaća, dionica Izačić – Kamenica - Vrkašić		
4.	M16.4	Obilaznica Bugojna		9.892
5.	M4.2	Obilaznica Cazina		

6.	M6	Južna obilaznica Gruda	125.865
7.	M14.1	Izgradnja mag. ceste Bihać – Bos. Krupa, Srbaljansko – Grmuški plato	
8.	M5	Rekonstrukcija raskrsnice cesta M-5 i R-403 u Kamenici	
9.	M5	Bihać: Devijacija pored Robota i Doma zdravlja Bihać	
10.	M1.8	Rekonstrukcija raskrsnice ceste M-1.8 u Špionici dionica (003), km 21+200	
11.	M15	Izgradnja obilaznice Livna	25.350
12.	M4	Rekonstr. raskrsnice ceste M-4 i lokane ceste za Bistarac, dionica: Donja Orahovica-Šićki Brod, km 23+500	
13.	M6.1	Rekonstrukcija ceste M-6.1, dionica , km 9+000 do 10+000 Dobrič	
14.	M5	Rekon. raskrsnice M-5 i lokalne ceste Dolac na Lašvi, km 10+200-9+950	
15.	M5	Izgradnja pješačke staze u neslju Izačić, M5_001, km 2+450 – km 3+000	
16.	M5	Rekonstrukcija raskrsnice Vjetrenica, Općina Vitez	
17.	M17	Topčić Polje – Lašva 0, km 1+600 i km 3+880	
18.	M18	Priboj 2 – Simin Han 0, km 9+100 – km 9+200	
19.	M18	Priboj 2 – Simin Han 1, km 11+050 do km 21+300	
20.	M15	Kamičak – Ključ, km 17+000	
21.	M4	Mag. cesta Doboj - Tuzla, dionica Drežnik (bolnica „Kreka“-petlja Šićki Brod	
22.	M6.1	Izgradnja pješačke staze na dionici: Mostar - Široki Brijeg, mjesto Međine	
23.	M18	Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok na Šipu, općina Centar, Sarajevo	
24.	M14	Izgradnja kružnog toka u Bosanskoj Krupi (kolodvor) dionica 002	
25.	M15	Izgradnja kružnog toka u S. Mostu na spoju cesta M-15 i R-405 dionica 003	
26.	M5	Rekonstr. raskrsn. cesta M-5 i M-16.4 u kružni tok, km 0+000 (Nević Polje)	
37.	M18	Rekonstruk. raskrsnice cesta M-17 i ulice Safeta Zajke u kružni tok, km 7+350	
28.	M5	Rekonstrukcija raskrsnica na obilaznici Viteza	
29.	M18	Rekon. raskrsnica na cesti M-18 u kružne tokove (prolaz kroz Vogošću)	
30.	M17	Izgradnja potpunjaka za naselje Nemila, M-17	
31.	M17	Rekonstrukcija crne tačke Bulajića krivina na M-17 013, km 35+80 do 36+800	
32.	M5	Izgradnja traka za spora vozila, Bihać - Bos.Petrovac, dionica: Ripač - Dubovsko	
33.	M17	Izgradnja pješačkog prelaza izvan nivoa kolovoza za naselje Nemila, km 4+700	
34.	M4.3	Izgradnja Obilaznice Bužim	
35.	M6.1	Izgradnja trake Tomislavgrad-Široki	
36.	M5	Rekon. raskrsnice sa pješačkom stazom u naselju Barice, Općina Donji Vakuf	
37.	M18.1	Rekon. magistralne ceste M 18.1, dionica Garež-Delijaš, Općina Trnovo	
38.	M1.9	Rekon. kolovoza mag. puta i svih priključaka na dionici Slatina-Gradačac	
39.	M1.9	Rekon. raskrsnice na mag. cesti M1.9 sa reg. cestom R463 u k. tok Gradačac	
40.	M14	Izgradnja obil. Bihaća, dionica Jablanska ulica-čvor Mali Lug-veza na M14	342.559

41.	M5	Izgradnja obilaznice Kiseljak		357.187
42.	M16.2	Rekon. raskrsn. na M16.2 Prozor/Rama-Jablanica i lok. ceste za naselje Duge		480
43.	M15	Izgrad. trake za spora vozila na M15 dionica Livno-Šuica, potez Borova Glava		1.000
44.	M17	Rekonstrukcija raskrsnice na M17 ulaz u Hadžiće		
45.	M4	Rekonstrukcija raskrsnice na M4-ulaz u Lukavac		
46.	M14	Rekonstrukcija ceste M14, raskrsnice cesta M14 sa lokalnom cestom za naselje Brekovica sa izgradnjom mosta preko rijeke Une		
47.	M17.3	Izgradnja Obilaznice Stoca		
48.	M18	Treća traka Čevljanovići – Nišići		812
49.		Izgradnja obilaznice Gruda		318.086
50.	M17	Petlja Drivuša		
51.		Drugi projekti za koje neophodna eksproprijacija, a nisu obuhvaćeni tabelom: - Izgradnja trake Živinice-Vitalj (Gojsalići-Vitalj) M18 - Rekonstrukcija raskrsnice sa M17 i lokalne ceste za naselje Papratnica, dionica M17 006:Ozimica-Topčić Polje, km 9+180, općina Žepče 0990		2.668 25.357
UKUPNO			3.000.000	1.218.517

5. Projekti finansirani iz Budžeta FBiH

Vlada Federacije BiH je Odlukom o usvajanju Programa utroška dijela sredstava „Kapitalni transferi javnim preduzećima – transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta“ V broj: 1155/2019. od 10.10.2019. utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2019. godinu, započela implementaciju navedenog programa.

Odlukom V broj 406/2024 od 13.03.2024. godine Vlada Federacije BiH je kroz Program utroška sredstava „Kapitalni transferi javnim poduzećima – transfer za izgradnju autocesta, brzih cesta, magistralnih i drugih cesta, utvrdila sljedeće projekte koji će se finansirati putem ovog programa:

1. Izgradnja južne obilaznice Mostara, pristupne ceste Varda-Rodoč i rekonstrukcija ceste Ilići-Mostar - 6,10 mil. KM
2. Izgradnja i rješavanje spoja magistralnih cesta M17.4 i M17, te sanacija i rekonstrukcija magistralnih cesta i rasvjeta na M17, Ortiješ u Gradu Mostaru i Počitelju – 0,50 mil. KM
3. Izgradnja dionice Šićki Brod-Đurđevik na trasi ceste Tuzla Sarajevo – 2,50 mil. KM
4. Izgradnja gradskog autoputa u Sarajevu, dionica Stup-Buća Potok-Pofalići-Velešići-Bentbaša – 2,00 mil. KM
5. Rekonstrukcija i sanacija ceste Kreševo-Kiseljak – 3,50 mil. KM
6. Izgradnja XII transferzale, spoj od Stupske petlje do aerodroma Sarajevo – 1,00 mil. KM
7. Rekonstrukcija dijela tomlavgradske obilaznice – 1,00 mil. KM
8. Izgradnja obilaznice Kiseljaka II faza (tunel i trasa i sanacija ceste Lepenica-Han Ploča) – 2,50 mil. KM
9. Izgradnja „Južne saobraćajnice“ u Tuzli, dionica Ši Selo-Slavinovići I faza (nastavak od Prinčeve džamije) – 2,50 mil. KM
10. Izgradnja kružnog toka Mlake, na cesti M18, dionica Šićki Brod 3-Živinice 1 – 0,70 mil. KM
11. Izgradnja kružnog toka HIDANI, na cesti M4 u Kalesiji, dionica Simin Han-Donje Caparde – 0,70 mil. KM

Odlukom o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška dijela sredstava „Kapitalni transferi javnim preduzećima – transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta“ V broj 1895/2024 od 19.11.2024. godine utvrđene su izmjene u budžetima na sljedećim projektima:

1. Izgradnja južne obilaznice Mostara, pristupne ceste Varda-Rodoč i rekonstrukcija ceste Ilići-Mostar - 7,80 mil. KM
2. Izgradnja dionice Šićki Brod-Đurđevik na trasi ceste Tuzla Sarajevo – 9,30 mil. KM
3. Izgradnja gradskog autoputa u Sarajevu, dionica Stup-Buća Potok-Pofalići-Velešići-Bentbaša – 0,80 mil. KM
4. Rekonstrukcija i sanacija ceste Kreševo-Kiseljak – 3,62 mil. KM
5. Izgradnja XII transferzale, spoj od Stupske petlje do aerodroma Sarajevo – 0,30 mil. KM
6. Izgradnja obilaznice Kiseljaka II faza (tunel i trasa i sanacija ceste Lepenica-Han Ploča) – 1,00 mil. KM
7. Izgradnja „Južne saobraćajnice“ u Tuzli, dionica Ši Selo-Slavinovići I faza (nastavak od Prinčeve džamije) – 0,50 mil. KM
8. Izgradnja kružnog toka Mlake, na cesti M18, dionica Šićki Brod-Živinice 1 – 0,05 mil. KM
9. Izgradnja kružnog toka HIDANI, na cesti M4 u Kalesiji, dionica Simin Han-Donje Caparde – 0,05 mil. KM

Red br.	Mag. Cesta	Naziv i opis projekta	Aktivnosti na projektu	Rebalans Plana 2024.	Izvođač/ Konsultant - ugovor	Ugovoreno	Realizirano 01.01.- 31.12.2024.	Napomena
1.	M6.1	Izgradnja Južne obilaznice Mostara, pristupne ceste Varda-Rodoč i rekonstrukcija ceste Ilići –Mostar	Eksproprijacija	4.300.000			6.010.827	Ugovoreni radovi na pristupnim cestama okončani. Radovi na tunelu Novi u toku, pa je i Nadzor u toku
			Projektiranje					
			Izvođenje	3.500.000	Putovi d.o.o. Grude 02-11-10724/23/9	2.480.400	2.480.178	
					JP Komunalno d.o.o. Mostar 02-11-19650/24-5	149.998	149.998	
					KTM Brina d.o.o. Posušje 02-11-18978/23-8	1.046.906	1.046.249	
			Nadzor		GP:IGH d.o.o. Mostar i Institut IGH d.d.Zagreb, 01-02.1-7720/22	847.693	347.680	
					Dodatne usluge nadzora: GP:IGH d.o.o. Mostar i Institut IGH d.d.Zagreb, 01-02.1-9161/24 10.10.2024.	169.428	128.647	
					Cadoro-ing d.o.o Mostar 02-11-2589/24-3	6.961	6.961	
					Ecoplan d.o.o. Mostar 02-11-1827/24-6	6.962	-	
Ukupno			10.170.540					
2.	M17 M17.4	Izgradnja i rješavanje spoja magistralnih cesta M17.4 i M17, te sanacija i rekonstrukcija magistralnih cesta i rasvjeta na M17 Ortiješ u gradu Mostaru i Počitelju	Eksproprijacija	500.000				Radovi na rasvjeti u toku. Čeka se Urbanistička za rekonstrukcij u raskrsnice M17.4 i M17
			Projektiranje		Manedra Company d.o.o. Mostar 01-02.4-6113/24 24.06.2024	6.903	6.903	
					T3 Consulting TIM d.o.o. 01-02.-10177/23 01.11.2023	6.950	6.950	
					Electra d.o.o. 01-02.2-11492/23 14.12.2023.	6.997	6.997	
					Vodovod d.o.o. Mostar 01-02.1-3684/23 15.05.2023.	7.020	7.020	
			Revizija		ProKonsIng d.o.o. Mostar 01-02.1-3265/23 27.04.2023.	1.170	1.170	
					ProKonsIng d.o.o. Mostar 01-02.1-369/24 16.01.2024.	6.786	6.786	

			Izvođenje		Step d.d. Sarajevo. 01-02.2-840/24, 07.02.2024.	137.262	94.701	
					Nexen d.o.o. Banja Luka 01-02.4-9492/24 23.10.2024.	195.624	-	
			Nadzor		Etas d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-1127/24, 16.02.2024.	3.978	3.978	
					Habitat d.o.o. Mostar, 01-02.2-3792/23. 19.05.2023.	2.925	-	
					IGH d.o.o. Mostar 01-02.4-9493/24 23.10.2024.	5.001	-	
			Ukupno				134.505	
3.	M18	Poddionica: Šićki Brod-Đurdevik na trasi ceste Tuzla – Sarajevo	Eksproprijacija				3.975.040	Projektiranje okončano
			Projektiranje	3.300.000	GP: PPG d.o.o. Sarajevo, Divel d.o.o. Sarajevo i Infra d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-4892/22 21.09.2022.	1.219.243 (preneseno 357.121)	357.121	
					PPG d.o.o. Sarajevo 01-02.1-7352/24 20.08.2024.	6.903	6.903	
					Energoinvest d.d. Sarajevo 01-02.1-5826-3/24 09.07.2024.	6.800	6.800	
			Revizija		Institut za građevinarstvo d.o.o. Banja Luka 01-02.1-12389/22 29.12.2022.	89.856	89.856	Radovi ugovoreni, očekuje se izdavanje građevinske dozvole za I fazu
			Izvođenje	6.000.000	JV Jata Group d.o.o. Srebrenik, Euro Asfalt d.o.o. Sarajevo HIH d.o.o. Živinice, Rading d.o.o. Gračanica Rial-Šped d.o.o. Doboj Istok Cestotehnik d.o.o. Tuzla 01-02.1-11347/24 23.12.2024.	58.499.974	-	
			Nadzor		Konzorcij: AIK Inženjering d.o.o. Banovići i PPG d.o.o. Sarajevo 01-02.1-11345/24 23.12.2024.	1.797.026	-	
			Ukupno				4.435.720	
4.		Izgradnja gradskog autoputa u Sarajevu, dionica: Stup- Buća potok-Pofalići – Velešići-Bentbaša	Projektiranje	800.000	GP: Divel d.o.o., Ipsa Institut d.o.o. PPG d.o.o., Saraj inženjering d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-10265/20. 29.10.2020	1.604.105 (preneseno 1.538.805)	-	Projektiranje u zastoju zbog problema oko izdavanja urb. Suglasnosti za geotehničke istraživanja
					GP: Divel d.o.o. Sarajevo, Ipsa Institut d.o.o. Sarajevo, PPG d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-3273/22. 06.05.2022.	1.084.724 (preneseno 962.681)	148.301	
			Revizija		TZI – Inženjering d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-993/21. 28.01.2021.	80.968	28.337	
					IG d.o.o. Banja Luka 01-02.1-2941/23. 17.04.2023.	75.348	-	
			Ukupno				176.639	
5.		Rekonstrukcija i sanacija ceste Kreševo-Kiseljak	Eksproprijacija					Ugovoreni radovi okončani
			Projektiranje					
			Izvođenje	3.620.000	GP: Dobojputevi d.d. Doboj Jug i Euro Asfalt d.o.o. Sarajevo 01-02.1-9865/23 20.10.2023.	2.434.770 (preneseno 2.162.215)	2.162.215	
					GP: Dobojputevi d.d. Doboj Jug i Euro Asfalt d.o.o. Sarajevo 01-02.1-1229/24 21.02.2024.	968.632	968.632	
					Dodatni radovi: GP: Dobojputevi d.d. Doboj Jug i Euro Asfalt d.o.o. Sarajevo 01-02.1-8437/24 19.09.2024	348.215	348.211	

					Dodatni radovi: GP: Doboiputevi d.d. Doboj Jug i Euro Asfalt d.o.o. Sarajevo 01- 02.1-11280/24 20.12.2024	110.000	109.999	
			Nadzor		GP: PPG d.o.o. Sarajevo i Celab d.o.o. Sarajevo 01-02.1- 10777/23 20.11.2023.	17.601	17.601	
					AIK Inženjering d.o.o. Banovići, 01.02.1-1075/24 14.02.2024.	12.753	-	
			Ukupno				3.606.658	
6.	M18	Izgradnja XII transferzale spoj od Stupske petlje do areodroma Sarajevo	Eksproprijacija	300.000			1.423	Postupak eksproprijaci je u toku
					Geodet d.o.o. Sarajevo 01-02.1-6246/24 09.07.2024.	5.815	5.815	
			Geobiro d.o.o. Konjic 01-02.1-11511/24 27.12.2024.		6.903	-		
			Projektiranje					
			Izvođenje					
			Nadzor					
Ukupno			7.238					
7.		Rekonstrukcija dijela tomislavgradske obilaznice	Izvođenje	1.000.000	Livnoputovi d.o.o. Livno 01-02.2-11863/23 28.12.2023.	486.155	486.148	Okončano
					KTM Brina d.o.o. Posušje 01-02.2-8380/24 17.09.2024.	430.209	430.134	
			Nadzor		ProKonsing d.o.o. Mostar 01-02.2-8381/24 17.09.2024.	5.558	5.558	
			Ukupno				921.840	
8.	M5	Izgradnja obilaznice Kiseljaka II faza (tunel i trasa i sanacija ceste Lepenica-Han Ploča)	Eksproprijacija	1.000.000			86.834	Eksproprijac ija u toku
					AMG d.o.o. Visoko 01-02.1-6641/24 22.07.2024.	1.170	1.170	
			Projektiranje		-	-	-	
			Izvođenje		JP Elektroprivreda HZ-HB d.d. 01-02.1-8168/24 09.09.2024.	93.600	38.329	
					Jata Group d.o.o. Srebrenik 01-02.2-9009/24 04.10.2024.	1.506.959	200.807	
			Nadzor		Modus Projekt d.o.o. Kakanj 01-02.2-9342/24 16.10.2024.	1.053	-	
Ukupno			327.140					
9.	M4	Izgradnja „Južne saobraćajnice“ u Tuzli, dionica Ši Selo-Slavinovići, I faza (nastavak od Prinčeve džamije)	Eksproprijacija	500.000				*
10.	M18	Izgradnja kružnog toka Mlake, na cesti M18, dionica Šićki Brod 3-Živinice I	Eksproprijacija	50.000				**
			Izvođenje					
			Nadzor					
11.	M4	Izgradnja kružnog toka HIDANI, na cesti M4 u Kalesiji, dionica Simin Han- Donje Ceparde	Eksproprijacija	50.000				***
			Izvođenje					
			Nadzor					
		UKUPNO		24.920.000			19.780.280	

- *Cijepanje parcela okončano, očekuje se izdavanje urbanističke suglasnosti nakon čega će se podnijeti prijedlog za eksproprijaciju.


- ** Očekuje se izdavanje urbanističke suglasnosti za LOT 1 (Zahtjev kompletiran), u okviru koga će I faza izgradnje biti kružni tok Mlake. Nakon dobijanja urbanističke suglasnosti podnijeti će se prijedlog za utvrđivanje javnog interesa, te pokrenuti dalje aktivnosti u postupku eksproprijacije.
- *** Općina je u suradnji sa predstavnicima JP Ceste FBiH naručila izmjenu/prilagođavanje glavnog projekta kako bi se smanjenjem obuhvata eksproprijacije izbjegli problemi u postupku. Izrada prilagođenog projekta u toku.

6. Sufinansiranja iz drugih nivoa vlasti

Sporazumom broj: 04-11-162/24 od 15.01.2024. godine o zajedničkom finansiranju projekta „Sanacija mosta M15-003-42 preko rijeke Sane, Krkojevačko polje, na cesti M15, dionica Sanski Most 1-Kamičak, km 4+283“ koji je potpisala Općina Sanski Most sa JP Ceste FBiH, Općina Sanski Most se obavezuje da će osigurati sredstva za radove u iznosu od 161.831 KM, što je i realizirano 27.02.2024. godine.

JP Ceste Federacije BiH d.o.o. su sa Gradom Bosanska Krupa potpisale Sporazum broj 01-02.2.-2136/24 dana 28.03.2024. o zajedničkoj implementaciji projekta „Sanacija asfaltnog kolovoza na cesti M14_003 Bosanska Krupa 1-Bosanska Otoka“ kojim će nakon provođenja postupka javne nabavke, a prije potpisivanja Ugovora sa odabranim izvođačem, Grad Bosanska Krupa prebaciti sredstva na račun JP Ceste Federacije BiH d.o.o. u iznosu 100.000 KM namjenjenih za izvođenje radova.

Potpisan je Sporazum 01-02.2-5009/24 između Grada Živinice i JP Ceste Federacije BiH d.o.o. o zajedničkoj implementaciji projekta „Rekonstrukcija i dogradnja podhodnika na M18 u Živinicama II faza“ gdje će Grad Živinice radi realizacije navedenog projekta, za ishodovanje trajne promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe osigurati nepovratna sredstva u iznosu od 36.907 KM što je i realizirano 26.08.2024. godine, dok će JP Ceste Federacije BiH d.o.o. u narednom periodu osigurati sredstva za izvođenje radova i nadzor na predmetnom projektu.

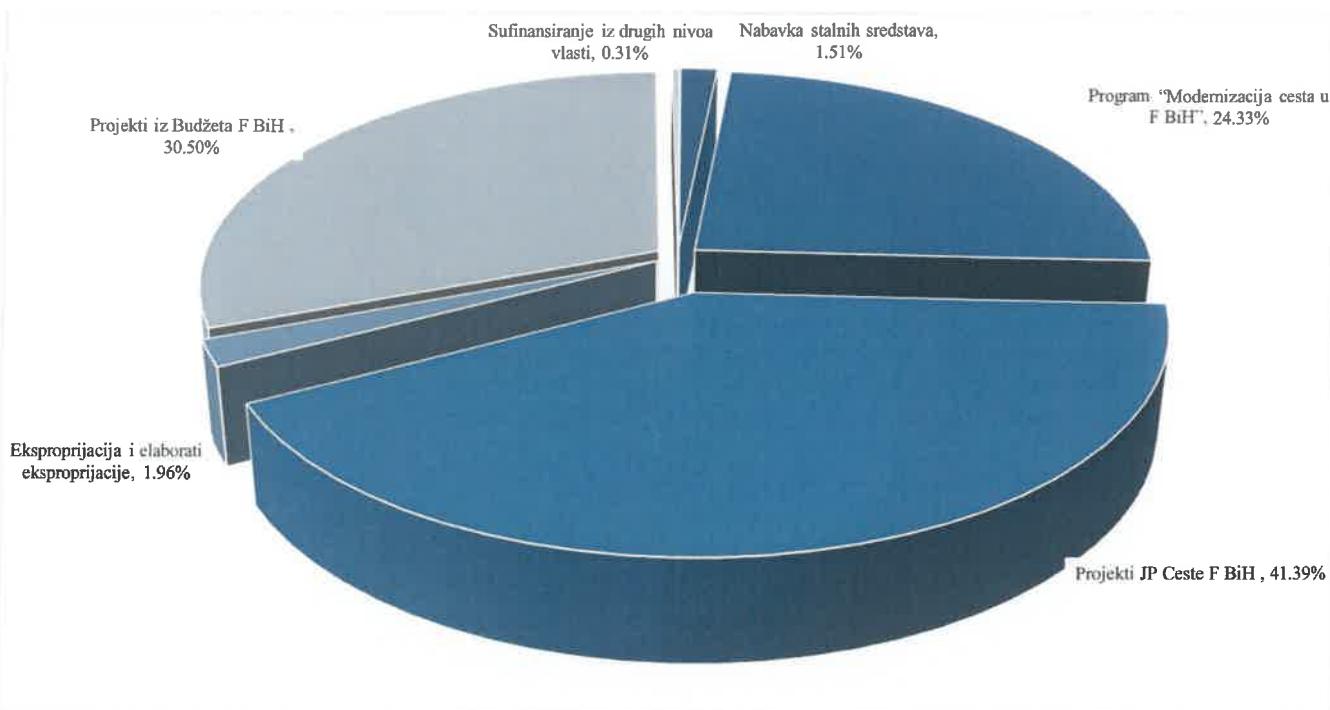

Grafički prikaz strukture realiziranih investicija u 2024. god.

D. ODJEL ZA JAVNE NABAVKE

Izveštaj o radu, za period 01.01.-31.12.2024. godine, je urađen na bazi raspoloživih podataka, i odnosi se na nabavke provedene po Zakonu o javnim nabavkama BiH i usvojenim planovima nabavki.

Za navedeni period, na osnovu provedenih postupaka nabavki, zaključeno je 337 ugovora u iznosu od **136.838.985,54 KM (sa PDV-om)**. Od navedenog broja ugovora 31 ugovor je potpisan u postupcima započetim u 2023. godini i okončanim u 2024. godini, dok se 306 ugovora odnosi na postupke pokrenute u 2024. godini.

- **Ugovorene nabavke po vrstama postupaka uključujući vrijednosti**

Vrsta postupka nabavke	Iznosi u KM (sa PDV-om)	Broj ugovora
Otvoreni	85.364.866,38	172
Konkurentski	92.057,83	8
Pregovarački	4.521.892,12	25
Direktni sporazumi	509.705,08	116
Anneks II	36.087,00	2
Ograničeni postupak	46.314.377,13	14
Ukupno	136.838.985,54	337

Na dan 31.12.2024. godine u toku je 40 aktivnih postupaka od kojih je 34 postupka u različitim fazama: procjena ponuda / potpisivanje ugovora, dok za dodatnih 24, raspisanih javnih poziva, nije istekao rok za dostavu ponude. Poništeno je 66 postupaka nabavki.

- **Žalbe**

Tokom navedenog perioda podnesena je 51 žalba. Za 1 žalbu proces rješavanja je u toku, dok je preostalih 50 riješeno i postupci su nastavljeni.

E. PRAVNI I KADROVSKI POSLOVI

Sektor pravnih, kadrovskih i općih poslova JP Cesta F BiH sve svoje poslove i aktivnosti bazira na primjeni svih pozitivnih zakonskih propisa koji su doneseni i važe u F BiH, odnosno u državi BiH kao i svih izmjena i dopuna koje se donesu u planiranoj godini.

Svi pravni poslovi se dijele na sve oblasti prava i to prvenstveno na oblast privrednog prava, gdje se reguliše rad privrednih društava, javnih preduzeća itd. kao i oblast parničnih, vanparničnih, prekršajnih, izvršnih i upravnih postupaka i imovinsko-pravnih poslova.

Najveća aktivnost pravnog Sektora usmjerena je na organizaciju i zastupanje JP Ceste F BiH pred nadležnim sudovima u F BiH, u BiH i u pojedinim predmetima i u regionu.

Vođene su aktivnosti na pokretanju tužbi, gdje se kao tužilac pojavljuje JP Ceste F BiH, kao i pokretanje izvršnih prijedloga na temelju pravosnažnih i izvršnih presuda protiv korisnika koji redovno ne plaćaju svoje obaveze, te pokretanje tužbi za naknadu štete na cestovnoj opremi i sl.

Izdvajamo također i aktivnosti na regresnim tužbama gdje za to postoje zakonski uslovi.

U sudskim postupcima gdje se JP Ceste F BiH pojavljuje u ulozi tužitelja, broj aktivnih tužbi JP Ceste F BiH protiv trećih lica na dan 31.12.2024.god. iznosi 41 predmet (naplata za cestovno zemljište, regresne tužbe i oštećenje cestovne opreme).

U predmetima gdje je JP Ceste F BiH tužena strana, u izvještajnom periodu podneseno je 93 novih tužbi. Broj aktivnih tužbi protiv JP Ceste F BiH na dan 31.12.2024.god. iznosi 278 predmeta.

U oblasti imovinsko-pravnih poslova vodile su se aktivnosti na provođenju postupka eksproprijacije nepokretnosti, zaključivanju sporazuma o naknadi na planiranim projektima kao i onim već otpočetim te zastupanje pred organima uprave-uglavnom općinskim radi sporazumnog određivanja naknada za izuzete nekretnine kao i zastupanje pred svim sudovima (vanparnični i parnični postupak) u okviru rješavanja imovinsko-pravnih poslova. Broj aktivnih predmeta imovinsko-pravne prirode na dan 31.12.2024.god. iznosi 40 predmeta od kojih je 16 broj aktivnih tužbi protiv JP Ceste FBIH dok su 24 predmeta aktivni vanparnični postupci, odnosno sudski postupci utvrđivanja naknade za ekspropisane nekretnine.

U izvještajnom periodu su obavljane aktivnosti na usklađivanju akata JP Ceste F BiH sa izmjenama i dopunama pozitivnih propisa, kao i aktivnosti na izradi nacrti i prijedloga opštih akata preduzeća za usvajanje od strane nadležnih organa JP Ceste F BiH.

U periodu 01.01.- 31.12.2024. godina obavljane su aktivnosti koje se odnose na sve stručne i administrativne poslove vezane za rad i funkcionisanje organa JP Ceste F BiH i to: Uprave, Odbora za reviziju, Nadzornog odbora i Skupštine društva.

Vršene su pripreme sjednica organa JP Ceste F BiH, pripremanje i distribucija materijala za iste kao i aktivnosti vezane za realizaciju odluka i zaključaka sa sjednica Skupštine, Nadzornog odbora, Odbora za reviziju i Uprave ovog preduzeća.

U izvještajnom periodu održane su 4 sjednice Skupštine, održana je konstituirajuća i sedam redovnih sjednica Nadzornog odbora, 12 sjednica Odbora za reviziju i 25 sjednica Uprave JP Ceste F BiH.

Članovi Nadzornog odbora JP Ceste BiH su imenovani Odlukom Skupštine društva od dana 28.12.2023. godine broj: 01-03.2SK-11575-4/23 na period od 4 (četiri) godine, počev od 28.12.2023. godine, a na osnovu prethodne saglasnosti za imenovanje članova Nadzornog odbora JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo V. broj: 1803/2023 koju je Vlada Federacije BiH donijela dana 12.12.2023. godine. Sastav Nadzornog odbora:

1. Danijel Nikolić - član
2. Nermin Bojčić - član
3. Nermin Jašarević - član
4. Said Kikić - član
5. Željko Petrović - član

U oblasti općih poslova provodile su se aktivnosti na održavanju voznog parka, održavanju sistema mašinskih instalacija-grijanje i hlađenje, održavanju elektro i vodoinstalacija, održavanju radnih prostorija i poslovi protivpožarne zaštite te poslovi digitalnog protokola.

Također, u izvještajnom periodu su se obavljali poslovi iz oblasti radnih odnosa i kadrovski poslovi u skladu sa zakonom i opštim aktima. Obavljane su aktivnosti na prijemu novih radnika (poslovi sekretara Komisije i sačinjavanje svih potrebnih akata) u skladu sa Zakonom i opštim aktima JP Ceste BiH kao i redovne svakodnevne aktivnosti iz ove oblasti.

Kadrovski poslovi

Na dan 31.12.2024.god. obrazovna struktura radnika JP Ceste F BiH je sljedeća:

Red.br.	Vrsta školske spreme	Stanje 31.12.2024.
1.	Doktori nauka (građ., saobr.i ecc)	3
2.	Magistri nauka (saob. ecc. komunikologije)	2
3.	Magistri struke (građ. saob. mašin. ecc. prava. saobraćaja i komunikacija, menadžmenta, geografije i ost.društ.smjera	18
4.	VSS građevinske struke	28
5.	VSS saobraćajne struke	3
6.	VSS ekonomske struke	11
7.	VSS pravne struke	11
8.	VSS geodetske struke	2
9.	VSS inform.struke	2
10.	VSS dipl. ing. arhitekture	1
11.	VSS dipl.ing.sigurnosti	1
12.	VSS dipl.ing.sigurnosti i pomoći	1
13.	VSS bakalaureat (umjetnosti) međunarodnih odnosa	1
14.	VSS (bachel.poslovanja, inženjer građevine, ing.cestov.prometa)	6
15.	SSS građevinski tehničar	2
16.	SSS saobraćajne struke	3
17.	SSS mašinske struke	1
18.	SSS ekonomske struke	3
19.	SSS ostale struke (opća gimnazija, tehničar elektroenerg. upravno administrat.tehničar)	3
UKUPNO		102

U izvještajnom periodu pet radnika je otišlo u penziju.

v.d. direktora


Ljubo Pravdić, dipl.ing.građ.
