

**IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PLANA
POSLOVANJA ZA PERIOD
1.1.-31.12.2019. GODINA**

Sarajevo, februar/veljača 2020. godina

SADRŽAJ

	Strana
U V O D	3
A. I JAVNI PRIHODI	7
A. II AMORTIZACIJA	12
B. I JAVNI RASHODI	13
1. Troškovi poslovanja	14
2. Služba „Pomoć-informacije na cestama“	16
3. Redovno održavanje	17
4. Rezervirana sredstva za rizike i neplanirane rashode	26
5. Rezervirana sredstva za sudske presude	27
6. Troškovi konsultantskih usluga	27
7. Kamate	29
B. II TROŠKOVI AMORTIZACIJE	31
C. INVESTICIJE	32
1. Nabavka stalnih sredstava	33
2. Program „Modernizacija cesta u F BiH“	34
3. Projekti JP Ceste F BiH	49
4. Eksproprijacija i elaborati eksproprijacije	81
5. Projekti iz Budžeta F BiH i GSM licence	84
6. Sufinansiranja/donacije	86
D. ODJEL JAVNE NABAVKE	87
E. PRAVNI I KADROVSKI POSLOVI	87

U V O D

Izvještaj o realizaciji Plana poslovanja Javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: JP Ceste F BiH), za period 01.01.- 31.12.2019. urađen je u skladu sa Zakonom o cestama F BiH („Službene novine F BiH“ br:12/10., 16/10. i 66/13) Zakonom o javnim preduzećima u F BiH („Službene novine F BiH“ br:8/05.), Statuta JP Ceste F BiH, Pravilnika o računovodstvu i Računovodstvenih politika JP Ceste F BiH usagalašenih sa važećim Međunarodnim računovodstvenim standardima, koliko je to moguće (u daljem tekstu: “MRS”), Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja („MSFI“), te u skladu sa specifičnostima poslovanja i pravnog statusa JP Ceste F BiH. Osnovna djelatnost JP Ceste F BiH je upravljanje, građenje, rekonstrukcija, održavanje i zaštita magistralnih cesta.

Plan poslovanja JP Ceste F BiH za 2019. godinu predstavljao je osnov svih aktivnosti JP Ceste F BiH. Na isti je Nadzorni odbor JP Ceste F BiH, dao saglasnost Odlukom broj: 01-03.2NO-11505/18. od 08.01.2019. Vlada F BiH je Odlukom V broj.610/2019. od 18.04. 2019 godine dala saglasnost na Plan poslovanja, a krajem mjeseca juna (27.06.2019.) ovlaštenje punomoćniku za zastupanje na Skupštini JP Ceste F BiH. **Skupština JP Ceste F BiH je potvrdila Odluku Vlade F BiH na svojoj sjednici održanoj 02. jula 2019. Odlukom broj:01-03.2SK-7856-1/19.** Obzirom da Plan poslovanja predstavlja osnov za sve aktivnosti, a za njegovo usvajanje je proteklo pola godine, sve se odrazilo i na plan nabavki roba i usluga za projekte finansirane iz sredstava JP Ceste F BiH, kao i na njihovu realizaciju.

Obzirom da je Plan poslovanja kasno usvojen i da je tokom implementacije došlo do okolnosti koje su bitno uticale na na dalju realizaciju Plana, Uprava JP Ceste F BiH u sastavu:

- Ljubo Pravdić, direktor,
- Dedo Pjanić, izvršni direktor za tehničke poslove i
- Bekir Isaković, izvršni direktor za ekonomske i pravne poslove,

u skladu sa Statutom preduzeća, odlučila se za revidiranje Plana tj. za izradu Rebalansa Plana poslovanja za 2019 godinu. (u daljem tekstu: „Rebalans“). Vlada F BiH je dala saglasnost na isti Odlukom V broj:1491/2019. od 12.12.2019.

Većina aktivnosti JP Ceste F BiH se odnosila radove redovnog održavanja uključujući i zimsku službu, dok su investiciona ulaganja bila usmjerena na Program „Modernizacija cesta u F BiH“, realizaciju projekata započetih u prethodnom periodu, zatim aktivnosti vezane za poslove eksproprijacije i neophodne dokumentacije, te na pribavljanju odobrenja za građenje, gdje je potrebno, za planirane projekte.

Osnovni razvojni cilj Programa modernizacije cesta u F BiH je modernizacija cestovne infrastrukture duž prioritetnih dionica na magistralnoj cestovnoj mreži i poboljšanje sigurnosti prometa, te jačanje kapaciteta za održivo upravljanje magistralnom cestovnom mrežom u FBIH. Program modernizacije cesta u FBIH za period (2017-2021) obuhvata kratkoročne investicije na magistralnoj cestovnoj mreži u ukupnom iznosu EUR 173,00 mil. od čega je EUR 50,00 mil. obezbijeđeno iz kredita Evropske investicijske banke (EIB), EUR 58,00 mil. iz kredita Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) i EUR 65,00 mil. iz kredita Evropske banke za

JP CESTE FEDERACIJE BIH

obnovu i razvoj (EBRD). Ministarstvo finansija i trezora, u ime Bosne i Hercegovine (BiH), potpisalo je Sporazume o kreditima sa međunarodnim razvojnim bankama u 2016. godini. Krediti su stavljeni na raspolaganje FBiH na osnovu Supsidijarnih sporazuma između BiH i FBiH, i nadalje JP Ceste F BiH za implementaciju Programa.

Početak realizacija Programa bio je planiran u 2017 godini. Međutim, zbog složene procedure prihvatanja kreditnih zaduženja na nivou BiH/FBiH i ratifikacije kreditnih sporazuma, te zbog kašnjenja u ispunjavanju uvjeta koji, u skladu sa sporazumima o zajmu/ kreditu, prethode efektivnosti kredita početak implementacije Programa pomjeren je u 2018.godinu.

EIB i IBRD dogovorile su zajedničko finansiranje dijela građevinskih radova i konsultantskih usluga i to:

- Radove na izgradnji, poboljšanju i sanaciji dionica magistralnih cesta i objekata na cestama (mostovi i tuneli) i radove na poboljšanju sigurnosti prometa (rekonstrukcija/sanacija crnih tačaka i opasnih mjesta); i
- Konsultantske usluge za upravljanje i implementaciju Programa.

Nakon proglašenja efektivnosti IBRD kredita i ispunjenja uvjeta za povlačenje prve tranše EIB kredita (oktobar 2017) značajniji napredak u nabavci i ugovaranju radova zabilježen je u 2018. godini. U 2019. godini zaključeno je pet ugovora za radove, te je za izgradnju ceste Stari Neum-Drenovac LOT 3 dionica Broćanac-Prapratnica izvršena nabavka radova i dodjela ugovora, a potpisivanje ugovora se očekuje početkom 2020. godine. Nadalje, ugovori za konsultantske usluge nadzora nad građevinskim radovima na izgradnji ceste Stolac-Neum i konsultantske usluge nadzora na ostalim projektima poboljšanja i modernizacije zaključeni u 2018 su u implementaciji, dok je u aprilu 2019 zaključen ugovor za vanjsku kontrolu tokom radova na izgradnji ceste Stolac-Neum i isti je u implementaciji. Nabavka roba koje će doprinijeti poboljšanju upravljanja mrežom magistralnih cesta je okončana u 2019, ali se potpisivanje ugovora očekuje početkom 2020 godine.

Obzirom na izmjene i dopune Zakona o akcizama, EBRD se saglasio da za I tranšu kredita odstupi od člana 5.1 (d) Uvjeti koji prethode efektivosti Ugovora o zajmu, a koji se odnose na izmjenu zakonskih propisa o godišnjoj alokaciji sredstava od naknada za naftu i naftne derivate za JP Ceste F BiH, te je efektivnost kredita EBRD - I tranša proglašena tek 29.05.2019, nakon čega se pristupilo nabavci i potpisivanju ugovora za rekonstrukcije/sanacije mostova. Radovi na južnoj obilaznici Mostara, dovršetak dionice Međine –Miljkovići, u skladu sa odlukom Vlade FBiH, započeti su iz vlastitih sredstava JP Ceste FBiH, a nakon proglašenja efektivnosti I tranše u skladu sa kreditnim sporazumom izvršena je refundacija JP Ceste FBiH iz kredita EBRD.

Do 31.12.2019.godine zaključeno je ukupno 31 ugovora za radove, konsultantske i nekonsultantske usluge ukupne vrijednosti KM 155,71 mil. (protuvrijednost EUR 79,62 mil.), a najznačajnije učeće imaju ugovori zajednički finansirani od EIB i IBRD.

Pregled planiranih i zaključenih ugovora i procjenjenih i ugovorenih vrijednosti po kreditorima dat je u niže navedenoj tabeli:

Kreditor	Planirani ugovori		Potpisani ugovori			
	broj	Procjenjena vrijednost (mil.KM)	broj	Ugovoren iznos (mil.KM)	% od ukupno planiranih	% od ukupno ugovorenih
EIB/WB	28	163,28	18	109,95	49,82	70,66
EIB	5	31,53	5	31,66	9,62	20,34
WB	11	7,09	3	0,60	2,16	0,39
EBRD	27	125,86	5	13,40	38,40	8,61
Ukupno	71	327,76	31	155,61	100,00	100,00

Napomena: Iskazani iznosi su bez PDV

Rješavanja imovinsko-pravnih pitanja ima najveći uticaj na implementaciju ugovora za radove, kako već potpisanih tako i na ugovaranje preostalih. Pribavljanje urbanističkih saglasnosti i odobrenja za građenje, gdje je potrebno, takođe utiče na implementaciju Projekta zbog „prebacivanja“ nadležnosti za izdavanje između nadležnih institucija na federalnom i kantonalm nivou. Dugotrajan proces rješavanja imovinsko-pravnih pitanja i pribavljanja urbanističkih saglasnosti i odobrenja za građenje ima za posljedicu prolongiranje realizacije projekata i nepovlačenje kreditnih sredstava. Od izuzetne je važnosti da se proces rješavanja imovinsko-pravnih pitanja okonča u prvoj polovini 2020. godine u cilju završetka Programa u planiranom vremenskom okviru.

JP Ceste F BiH u 2019 godini su ostvarile ukupan javni prihod od 97,87 mil.KM, što je 3 % više od planiranih 95,40 mil.KM, a javni rashodi su realizovani sa 53,44 mil.KM, ili 96 % od planiranih 55,41 mil.KM.

Razlika javnih prihoda i javnih rashoda JP Ceste F BiH iznosi 44,43 mil.KM i predstavlja finansijski rezultat koji je neoporeziv. Iskazani finansijski rezultat ne može biti predmet ponovne raspodjele na dividendu ili povećanje kapitala. Prema Zakonu o cestama F BiH, finansijski rezultat se raspoređuje na obaveze prema planiranoj namjeni. Ovako stvorene obaveze predstavljaju izvor sredstava koji će se utrošiti isključivo za dospjele obaveze po kreditima Programa „Rehabilitacija cesta u F BiH“, zatim upravljanje, građenje, rekonstrukciju, održavanje i zaštitu magistralnih cesta.

Program „Rehabilitacija cesta u F BiH“ je okončan 2013.godine, a projekti su finansirani iz kreditnih sredstava međunarodnih finansijskih institucija i to:

- Ugovor o zajmu između BiH i EBRD op. br. broj: 37543 potписан 17.7.2007. godine na EUR 45,00 mil., sa periodom otplate od 12 godina, uključujući tri godine odgode plaćanja;
- Ugovor o kreditu između BiH i EIB-a op.br. broj: 23924 potписан 26.03.2007 na EUR 50,00 mil. Povlačenje kredita je vršeno u tranšama i otplata kredita se vrši prema povučenim tranšama. Period otplate kredita je 18 godina, uključujući šest godina odgode plaćanja.
- Sporazum o finansiranju između BIH i WB- Međunarodna asocijacija za razvoj potписан 22.05.2008. op.br.4371 na SDR 8,20 mil. sa periodom otplate 20 godina, uključujući deset godina odgode plaćanja.

Otplate kredita za Program „Rehabilitacija cesta u FBIH“ su otpočele u ovisnosti od uvjeta definisanih u ugovorima o zajmu/kreditu i JP Ceste FBIH, kao krajnji korisnik ovih kredita, je u 2019.godini realizovalo 16,55 mil.KM od 16,50 mil.KM planiranih sredstava za otplatu pristiglih rata kredita.

JP CESTE FEDERACIJE BIH

U investicije je uloženo 66,81 mil.KM, ili 56% od planiranih 119,12 mil.KM.

Tokom godine Vlada F BiH je donijela slijedeće:

Odluke o kategorizaciji regionalnih u magistralne ceste V broj: 231/19 i 232/19:

- Regionalna cesta R-401, Velika Kladuša-Vrnograč-Radića most-Bužim-Bosanska Otoka u magistralnu cestu M-4.3 i
- Regionalna cesta R-419 Jablanica-Posušje i R-420 Posušje-Grude-Privalj u magistralnu cestu M-17.5;

Odluke o odobravanju realizacije projekta „Sanacije magistralnog puta M-17.5, dionica Sovićka vrata – Potok Zec“, V broj:910/2019 od 31.07.2019. i dopunama Odluke za isti projekat: V broj:1040/2019 od 12.09.2019. U skladu sa istim JP Ceste F BiH trebaju osigurati sredstava za nastavak projekta u iznosu od 0,76 mil.KM. Realizacija Odluka se očekuje u narednoj godini.

Odluka o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška dijela sredstava „Kapitalni transferi javnim preduzećima – transferi za izgradnju autocesta i brzih cesta“ u iznosu od 153,00 mil.KM utvrđenih Budžetom F BiH za 2018.godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija, V broj:665/2019. kojom su JP Ceste F BiH implementator sredstava za „Projekat izgradnje i rješavanja spoja magistralnih cesta M-6.1 i M-17, te sanacija i rekonstrukcija magistralnih cesta u gradu Mostaru“;

Odluka o usvajanju Programa utroška dijela sredstava „Kapitalni transferi javnim preduzećima –transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta“ utvrđenih Budžetom F BiH za 2019 godinu Federalnom ministrstvu prometa i komunikacija, V broj: 1155/2019. od 10.10.2019. kojom su JP Ceste F BiH implementator sredstava za slijedeće projekte: Izgradnja brze ceste Lašva-Nević polje - prolaz kroz zonu Vitez u iznosu od 34,00 mil.KM, Izgradnja Južne obilaznice Mostara u iznosu od 7,00 mil.KM, Projekat izgradnje i rješavanja spoja magistralnih cesta M-6.1 i M-17, te sanacija i rekonstrukcija magistralnih cesta u gradu Mostaru 13,00 mil.KM i Poddionica: Šiće Brod-Đurđevik na trasi ceste Tuzla-Sarajevo u iznosu od 40,00 mil.KM.

Realizacija odobrenih sredstava iz Budžeta F BiH se očekuje u narednom periodu, nakon sprovedenih odredbi iz Odluka.

JP Ceste F BiH su bile angažovane na LOT – 2C projekta Sarajevska obilaznica, na osnovu Odluke Vlade F BiH broj: 233/05, koji se u poslovnim knjigama JP Ceste F BiH vodi vanbilansno. Nakon donošenja odluke, od strane Vlade F BiH, izvršit će se prenos na krajnje korisnike, odnosno upravitelje.


U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, JP Ceste F BiH obavljaju nabavke roba, usluga i radova, finansirane iz vlastitih sredstava, a nabavke iz međunarodnih kreditnih sredstava po međunarodnim procedurama kreditora.

Javni prihodi, rashodi, investicije kao i ostale aktivnosti koje će JP Ceste F BiH provoditi tokom izveštajnog perioda, dato je u nastavku.

1.I JAVNI PRIHODI

Red. Br.	O P I S	Šifra naknade	Realizovano 2018.	Plan 2019.	Rebalans plana 2019.	Realizovano 2019.	Index 7/6	Index 7/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Naknade od:		88.245.029	91.995.000	94.480.000	96.669.587	102	110
1.1	Nafte i naftnih derivata	717131 717114	41.880.799 14.558.361	42.601.000 15.994.000	43.900.000 17.430.000	46.124.233 17.080.801	105 98	110 117
1.2	Registracije – putarine – fizička lica	722532	16.642.153	17.200.000	17.500.000	17.682.373	101	106
1.3	Registracije – putarine – pravna lica	722531	8.205.373	8.600.000	8.200.000	8.065.460	98	98
1.4	Službe “Pomoć-informacije na cestama“	722535	5.094.481	5.300.000	5.300.000	5.268.037	99	103
1.5	Korištenja cestovnog zemljišta	722538	1.195.033	1.600.000	1.600.000	1.845.449	115	154
1.6	Vanrednih prevoza	722536 722534	552.219	500.000	420.000	461.310	110	84
1.7	Prekomjerne upotrebe cesta (vage)	722537	116.610	200.000	130.000	141.924	109	122
2.	Druga sredstva osigurana po posebnim propisima		517.727	675.000	520.000	488.340	94	94
2.1	Reklamni panoi	722539	371.609	470.000	350.000	330.012	94	89
2.2	Kamate	722565	40.495	50.000	50.000	37.978	76	94
2.3	Saglasnosti	722565	100.801	150.000	120.000	120.350	100	119
2.4	Tenderi	722565	4.822	5.000	-	-	-	-
3.	Naknadno utvrđeni prihodi		403.489	200.000	400.000	708.900	177	176
U K U P N O			89.166.245	92.870.000	95.400.000	97.866.827	103	110

Prihodi su realizovani u iznosu od 97,87 mil.KM, ili 3% više u odnosu na Rebalansom planiranih 95,40 mil.KM. Najveći prihod ostvaren je po osnovu naknada iz nafte i naftnih derivata sa 63,21 mil.KM, što je 3% ili 1,88 mil.KM više u odnosu na 61,33 mil.KM planiranih sredstava. U ukupnom prihodu ova naknada učestvuje sa 64,58%. Prihod od naplate korištenja cestovnog pojasa realizovan je sa 1,85 mil.KM, što je 15% više u odnosu na planiranih 1,60 mil.KM ili 0,25 mil.KM. Također, prihod od putarine fizičkih lica je ostvaren u iznosu od 17,68 mil.KM, što je 1% ili 0,18 mil.KM više od planiranih 17,50 mil.KM. Ostali prihodi su realizovani na nivou planiranih veličina. Prihod po osnovu putarine za pravna lica ostvaren je u manjem iznosu od planiranog za 0,13 mil.KM. Sredstva Službe pomoć informacije na cestama, zatim naknada za reklamne znakove (panoi) u cestovnom pojasu i kamate su realizovani u manjem iznosu od planiranog, za 0,06 mil.KM. Planirani naknadno utvrđeni prihodi u iznosu od 0,40 mil.KM, realizovani su sa 0,68 mil.KM, što je 0,26 mil.KM više, zbog ukidanja rezerviranja po sudskim sporovima.

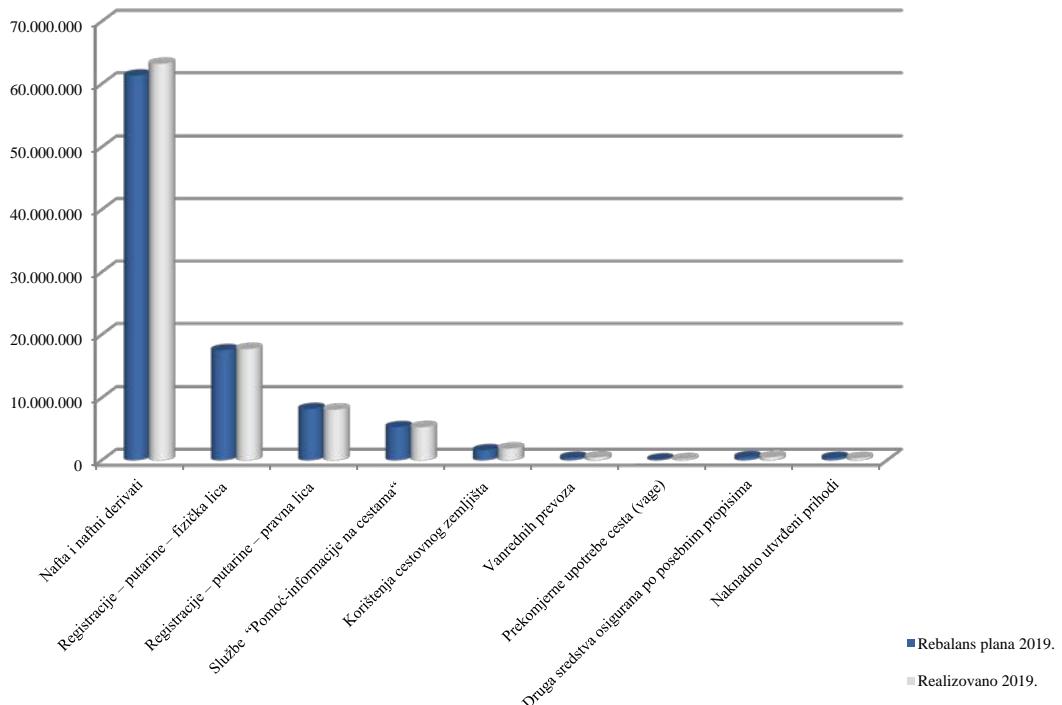

Grafikon prikazuje visinu Rebalaansom planiranih prihoda i ostvarenih u 2019.godini.


1. Naknade – učešće u strukturi javnih prihoda **98,80 %**

1.1. od nafta i naftnih derivata – Na osnovu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama u BiH („Službeni glasnik BiH“, br.91/17.) putarina, kao vrsta indirektnog poreza, plaća se na naftne derive u iznosu od 0,20 KM/ l. za izgradnju i rekonstrukciju magistralnih, regionalnih i lokalnih cesta. Nakon što Uprava za indirektno oporezivanje na osnovu Pravilnika o određivanju iznosa rezerve na Jedinstvenom računu, koji omogućava Upravi da podmiri svoje obaveze u vezi sa prihodima, Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje usvaja privremenu odluku, po kojoj se vrši raspodjela sredstava na entitete i Distrikt Brčko.

Na osnovu Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o akcizama u BiH i Zakona o uplatama na Jedinstveni račun i raspodjeli dio prihoda prihod od putarine u iznosu od 0,05 KM/l, Uprava za indirektno oporezivanje prenosi na poseban podračun otvoren kod Centralne banke BiH. U Federaciji BiH se rasporedjuje na osnovu Zakona o cestama F BiH, po kome JP Ceste F BiH pripada 40% od dobijenih sredstava. Po ovom osnovu realizovan je iznos u izveštajnom periodu od 17,08 mil.KM ili 98% od planiranih 17,43 mil.KM


JP CESTE FEDERACIJE BIH

Ostatak prihoda iz naknade od nafte i naftnih derivata u iznosu od 0,15 KM/l, se uplaćuje na Jedinstveni račun Uprave. Na osnovu Pravilnika o izračunavanju koeficijenta doznačavanja sredstava entitetima i Distriktu Brčko, te Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH, propisana je raspodjela i pripadnost javnih prihoda. JP Ceste F BiH, zajedno sa kantonalnim direkcijama za puteve u F BiH, pripada iznos od 3,9 % u odnosu na visinu predviđenih sredstava od čega, na osnovu Zakona o cestama u F BiH, JP Ceste F BiH pripada 40%. Na osnovu Projekcije prihoda od indirektnih poreza sa Jedinstvenog računa korisnicima u Federaciji BiH za 2019. godinu, prihod iz naknade od nafte i naftnih derivata planiran je u iznosu od 43,60 mil.KM, od čega je realizovano 46,12 mil.KM ili 5 % više od planiranih sredstava.

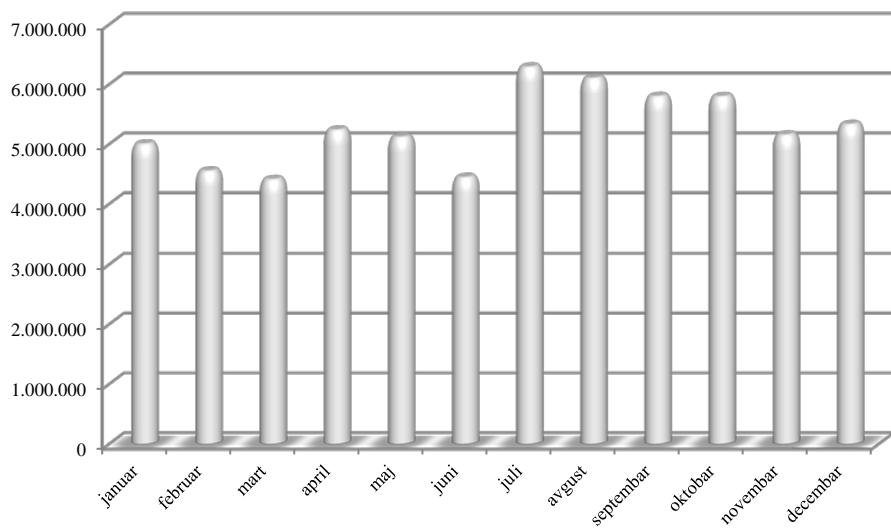

Grafički prikaz visine ostvarenih prihoda od naknade za naftu i naftnih derivata (717131 i 717114) po mjesecima

1.2. i 1.3 putarne za fizička i pravna lica – realizovane su u iznosu od 25,75 mil.KM od planiranih 25,80 mil.KM ili 100 %. Realizacija sredstava putarne fizičkih lica je veća u odnosu na planirana sredstva, i u odnosu na realizaciju iz prethodne godine za 1,04 mil.KM. Međutim, realizacija putarina za pravna lica je manje realizovana u odnosu na planirana sredstva i u odnosu na prethodnu godinu za 0,14 mil.KM.. Naknada se uplaćuje se na osnovu „Uredbe o visini godišnje naknade za javne ceste koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila“, V broj: 202/2015.

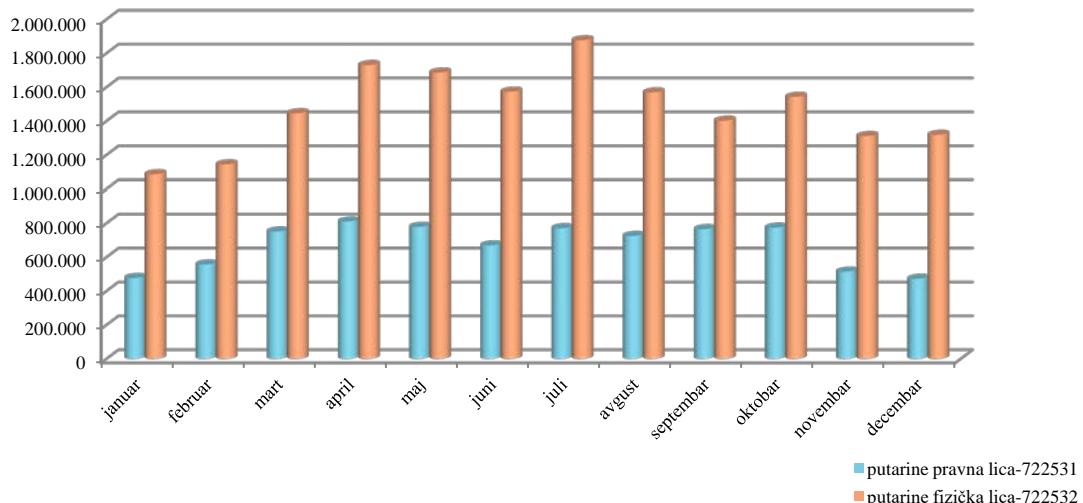

Grafički prikaz visine ostvarenih prihoda od putarina po mjesecima

1.4 služba “Pomoć-informacije na cestama Naknada je definisana članom 88. i 100. Zakona o cestama Federacije BiH i Odluke Vlade Federacije BiH V broj: 45/11 („Službene novine Federacije BiH“, br: 5/11.). Od planiranih 5,30 mil.KM, realizovan je prihod od 5,27 mil.KM ili 99% planiranih sredstava.

1.5. za korištenje cestovnog zemljišta – Pravilnikom o naknadama za korištenje cestovnog zemljišta („Službene novine F BiH“ broj: 75/10) i Uredbom o izmjeni i dopuni visine naknade za korištenje zemljišta uz javni pojas V broj: 956/2015, usvojenom od strane Vlade F BiH, regulisana je visina naknade. Realizovan je prihod po ovom osnovu u iznosu od 1,85 mil.KM, što je 15% više u odnosu na 1,60 mil.KM planiranih sredstava.

1.6. i 1.7. od vanrednih prevoza i prekomjerne upotrebe cesta (vage) – Na osnovu Zakona o cestama u F BiH, Pravilnika o utvrđivanju uslova za obavljanje javnih prevoza vozila na magistralnoj cesti i Pravilnika za utvrđivanje prekomjerne upotrebe javnih cesta, vrši se naplata ovih vrsta prihoda. Od planiranih 0,55 mil.KM realizovano je 0,60 mil.KM ili 10% od planiranih sredstava.

2. Druga sredstva – učešće u strukturi javnih prihoda 0,50 %

su slijedeća:

2.1 Naknada za reklamne znakove (panoi) u cestovnom pojasu – Na osnovu Zakona o cestama F BiH, Pravilnika o postavljanju reklamnih znakova na cestama i Uredbom o visini naknade za korištenje zemljišta uz javne ceste („Službene novine F BiH“, br: 58/2015) definisana je ova vrsta naknade. U izvještajnoj godini realizovan je iznos od 0,33 mil.KM, što je 94% od planiranih 0,35 mil.KM.

Treba napomenuti da potraživanja JP Ceste F BiH po osnovu zakupa zemljišta i panoa u cestovnom pojasu iznose 0,70 mil.KM, dok sumnjiva i u sporu potraživanja iznose 1,40 mil.KM. Najveći utuženi dužnici su: Media Res d.o.o. Mostar (234.399KM); Petrol d.d. Ljubuški (102.203KM); Trgo Santovac d.o.o.Srebrenik (75.325KM); Buba Commerce d.o.o.Vitez (61.048 KM); Kasumović Fuad i Mersija (33.412 KM); Zovko Oil d.o.o. Žepče


JP CESTE FEDERACIJE BIH

(31.491KM); Europlakat d.o.o.Sarajevo (30.946KM); SiskoTrade d.o.o. Gračanica (28.052KM), Ves d.o.o. Žepče (27.041KM), TGT Trag Tas d.o.o. Ilijaš (25.915KM); OS Petrol d.o.o.Srebrenik (23.178KM); D&B Transport d.o.o.Busovača (20.138KM); Općina Posušje (19.739KM); Prestiž d.o.o. Posušje (19.396KM); Hasanović Irfan, Kalesija (17.023KM); AgroDG d.o.o. Cazin (16.827KM); Autosaobraćaj d.d. Travnik (15.256KM); Begić Mustafa, Bihać (10.248KM); CMA d.o.o Posušje (14.040KM); Dizdarević Ejub Bihać (15.204KM); Đug Smail, Živinice (11.666KM); Exicon d.o.o. Bihać (10.524KM); Grad Bihać (10.546KM); Integral-SN d.o.o. Ključ (10.540KM); Kalen d.o.o.Zenica (16.626KM); Maypet d.o.o. Zenica (10.485KM); Oštraković Amir Tuzla (17.892KM); Rizvić Mehmedalija, Konjic (13.356KM); Sinbra d.o.o.Tuzla (16.941KM); TalićTank d.o.o.Sanski most (17.514KM);...


2.2, 2.3 i 2.4 – naknada od kamata, saglasnosti i tendera - planiran je u iznosu od 0,52 mil.KM, a realizovan sa 0,49mil.KM., što je 94% planiranih sredstava

3. Naknadno utvrđen prihod – učešće u strukturi javnih prihoda 0,70 %

Na osnovu odluke DAB-a, po okončanoj situaciji na projektu “Izgradnja tunela Karaula na M-18”, uprihodovan je iznos od 0,12 mil.KM, ostali dio naknadno utvrđenog prihoda čini naplata šteta od osiguravajućih kuća - nastale uslijed oštećenja na magistralnim putevima - 0,11 mil.KM, ukidanja rezerviranja po sudskim sporovima - 0,42 mil.KM, prihod od prodaje automobila, prihodi od naplate regresnih potraživanja i dr...

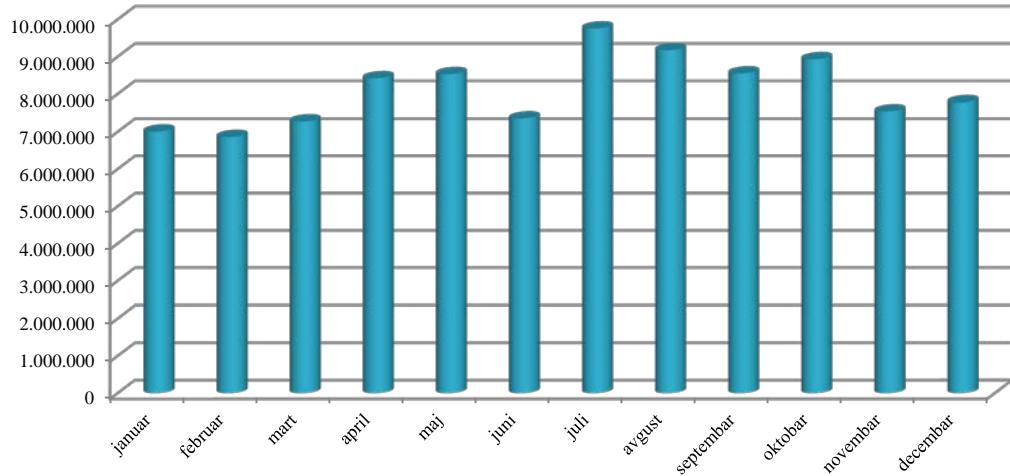

Grafički prikaz visine ostvarenih javnih prihoda po mjesecima

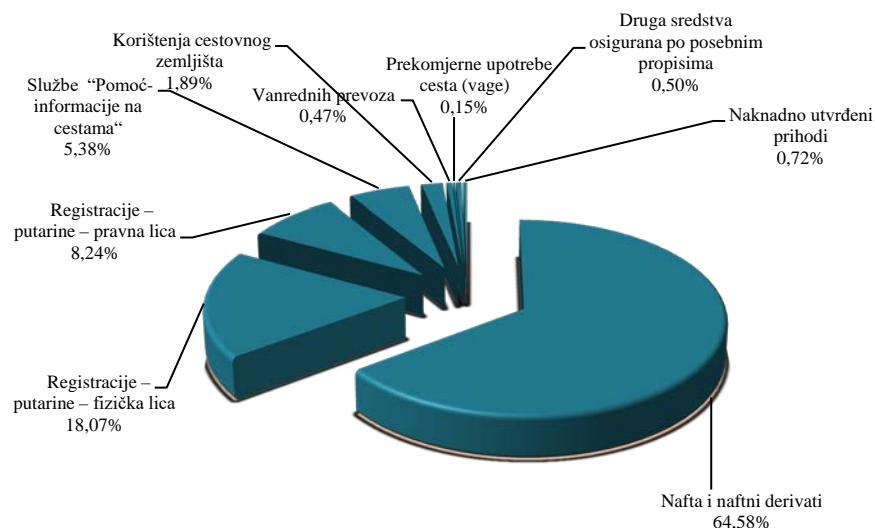

Grafički prikaz strukture ostvarenih prihoda

A.II AMORTIZACIJA


Red. Br.	O P I S	Realizovano 2018.	Plan 2019.	Rebalans plana 2019.	Realizovano 2019.	Index 6/5	Index 6/3
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Amortizacija stalnih sredstava	601.731	700.000	300.000	262.555	88	44
	UKUPNO	601.731	700.000	300.000	262.555	88	44

Napomena: Objasnenje amortizacije dato na strani 31.

B. I JAVNI RASHODI

Red Br.	O P I S	Realizovano 2018.	Plan 2019.	Rebalans plana 2019.	Realizovano 2019.	Index 6/5	Index 6/3
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Troškovi poslovanja	5.095.872	6.285.000	6.350.000	5.840.695	92	115
2.	Služba pomoć-informacije	4.803.260	4.929.000	4.929.000	4.983.733	101	104
3.	Redovno održavanje	34.811.010	36.125.000	37.074.000	35.127.990	95	101
4.	Rezervirana sredstva za rizike i neplanirane rashode	2.007.652	1.700.000	1.940.000	3.211.083	166	160
5.	Rezervirana sredstva za sudske presude	2.197.130	2.000.000	1.171.000	508.176	43	23
6.	Troškovi konsultantskih usluga	108.517	882.000	949.000	599.409	63	552
7.	Kamate, servisni troškovi, kursne razlike, provizije	2.063.283	3.179.000	3.002.000	3.167.997	106	154
U K U P N O		51.086.724	55.100.000	55.415.000	53.439.083	96	105

Rashodi su realizovani u iznosu od 53,44 mil.KM, što je 96% od planiranih 55,41 mil.KM Rebalansom. Kao i svake godine, najveću stavku čine troškovi redovnog održavanja, koji su realizovani sa 35,13 mil.KM, što je 95 % od planiranih 37,07 mil.KM. Sredstva za rizike i neplanirane rashode su realizovana sa 3,21 mil.KM, što je 66% više u odnosu na planirana sredstva, zbog izgradnje pomoćnih saobraćajnica pri realizaciji projekata rekonstrukcija tunela Vranduk i sanacije tunela Ormanica, zateznih kamata po osnovu arbitražnog postupka vezanog za projekat Sarajevska obilaznica, i zateznih kamata obračunatih na potraživanja nastala tokom realizacije projekta Izgradnja tunela Karaula. Ostali troškovi su realizovani na manjem ili približnom nivou planiranih sredstava.

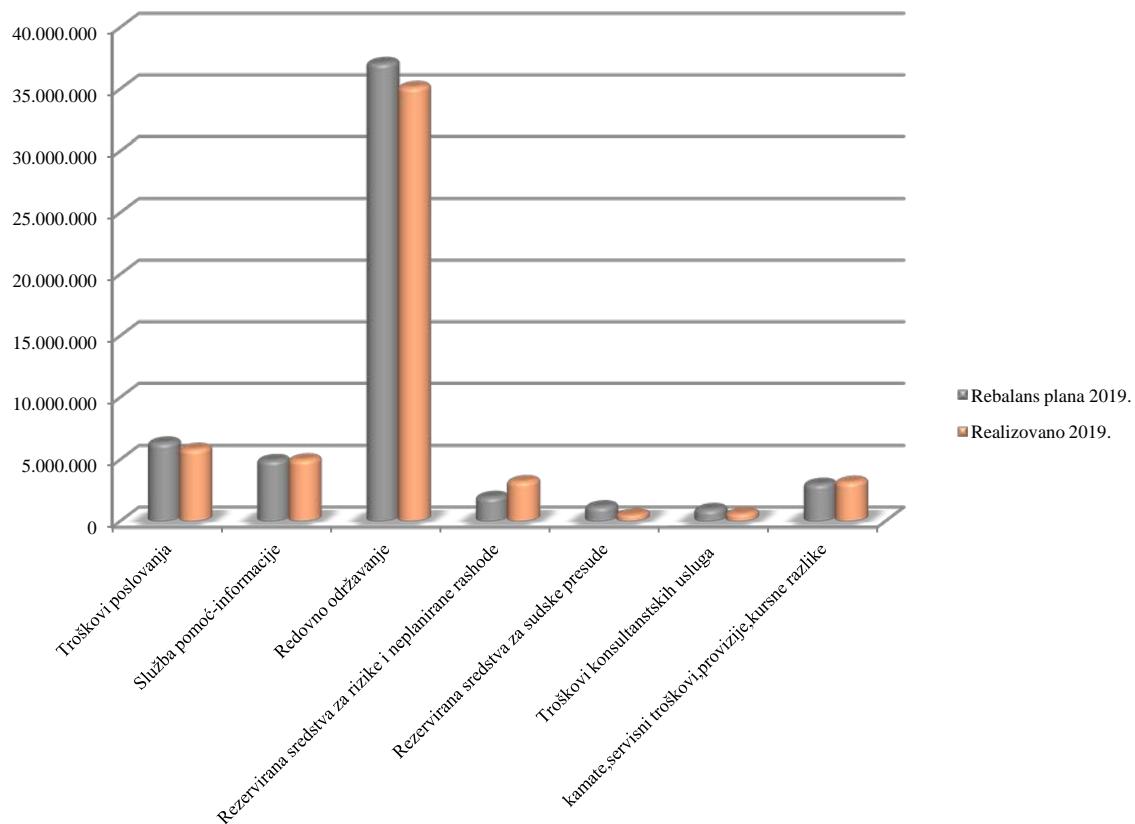

Grafički prikaz visine predviđenih i realizovanih rashoda

1.Troškovi poslovanja

Red. br.	O P I S	Realizovno 2018.	Plan 2019.	Rebalans plana 2019.	Realizovno 2019.	Index 6/5
1	2	3	4	5	6	7
I	Troškovi zaposlenih	3.965.873	4.797.000	4.797.000	4.432.419	92
II	Materijalni troškovi I usluge	1.129.999	1.488.000	1.553.000	1.408.276	91
	UKUPNO I+II	5.095.872	6.285.000	6.350.000	5.840.692	92

Od planiranih 6,35 mil.KM za troškove poslovanja, realizovano je 5,84 mil.KM ili 92%. Troškovi zaposlenih su realizovani sa 4,43 mil.KM od planiranih 4,80 mil.KM, dok su materijalni troškovi realizovani sa 1,41 mil.KM ili 91% od planiranih 1,55 mil.KM.

I Troškovi zaposlenih

Troškovi zaposlenih u izvještajnom periodu iznosili su 4,43 mil.KM, a obuhvataju: troškove bruto plaća zaposlenih, naknade propisane zakonskim i podzakonskim aktima koji regulišu ovu oblast (naknada troškova prevoza s posla i na posao, naknada za ishranu u toku rada – topli obrok, regres za godišnji odmor...).

II Materijalni troškovi i usluge

Red. br.	O P I S	Realizovano 2018.	Plan 2019.	Rebalans plana 2019.	Realizovano 2019.	Index
1	2	3	4	5	6	7
1.	kancelarijski i potrošni materijal	42.468	50.000	50.000	50.025	100
2.	električna energija	36.467	45.000	45.000	35.068	78
3.	gorivo i mazivo za automobile	78.419	100.000	100.000	86.405	86
4.	otpis sitnog inventara i auto guma	11.310	15.000	15.000	7.293	49
5.	usluge održavanja, servisiranja i registracije	151.779	210.000	210.000	184.666	88
6.	učešće na sajmovima i seminarima	58.465	55.000	80.000	84.296	105
7.	stručna literatura i časopisi	14.410	10.000	13.000	12.200	94
8.	grijanje	28.402	40.000	40.000	27.782	69
9.	zakupnina	61.602	100.000	111.000	114.795	103
10.	reklama i propaganda	-	35.000	35.000	12.169	35
11.	osiguranje imovine i lica i ljekarski pregledi	45.205	60.000	60.000	73.635	123
12.	bankarske usluge	8.925	10.000	11.000	19.778	180
13.	reprezentacija	31.046	35.000	35.000	32.378	93
14.	naknade za službena putovanja u zemlji	51.452	55.000	60.000	73.856	123
15.	naknade za službena putovanja u inostranstvu	42.481	35.000	45.000	46.143	103
16.	privremeni i povremeni poslovi, ugovori o djelu	25.068	45.000	40.000	28.691	72
17.	bruto naknade za članove Nadzornog odbora	74.941	80.000	80.000	80.159	100
18.	održavanje čistoće	44.186	50.000	40.000	40.443	101
19.	obezbjedjenje zgrade	10.557	11.000	9.000	9.079	101
20.	PTT usluge	104.364	110.000	110.000	105.580	96
21.	komunalne usluge	13.632	17.000	18.000	16.907	94
22.	stručno osposobljavanje	6.282	7.000	7.000	0	0
23.	tenderi, konkursi i oglasi	22.905	50.000	50.000	43.810	88
24.	takse	29.404	40.000	30.000	23.067	77
25.	advokatske usluge i trošk.vještačenja	11.169	50.000	40.000	9.025	23
26.	troškovi eksterne revizije	16.325	12.000	18.000	17.630	98
27.	troškovi Odbora za reviziju	33.277	35.000	35.000	34.736	99
28.	ostali troškovi poslovanja	25.031	50.000	50.000	42.700	85
29.	kamate i kursne razlike	7	1.000	1.000	759	76
30.	naknadno utvrđeni rashodi	28.062	50.000	90.000	69.986	78
31.	troškovi koji ne zavise od finansijskog rezultata	22.358	25.000	25.000	25.215	101
U K U P N O II		1.129.999	1.488.000	1.553.000	1.408.276	91

Materijalni troškovi su realizovani u iznosu od 1,41 mil.KM, što je 91 % od planiranih 1,55 mil.KM. Većina troškova je realizovana u okviru planiranih veličina, dok je zakupnina realizovana u većem iznosu od planiranog, jer obuhvata troškove zakupa ureda u Mostaru i ostalih ureda za nadzorne organe, kao i zakup licenci. Troškovi službenih putovanja su povećani zbog Programa „Modernizacija cesta u F BiH“. Troškovi osiguranja imovine lica i ljekarski pregledi su više realizovani za 23% od planiranih sredstava, zbog fakture za ljekarske preglede, koja je stigla je u izvještajnom periodu, a trebala je u 2018.godini.

2. Služba „Pomoć – informacije na cestama“

Na osnovu člana 88. Tačke 5. I člana 100. Stav 3 Zakona o cestama F BiH i Odluke o službi „Pomoć-informacije“ (Vlada F BiH, od 20. januara 2011. godine) regulisana je posebna naknada za službu „Pomoć-informacije“ na cestama.

Služba «Pomoć-informacije» na cestama F BiH (u nastavku SPI) povjerena je kao javno ovlaštenje JP Ceste F BiH po odredbama člana 100. Stav 2. Zakona o cestama F BiH, te obzirom na član 70. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine («Sl. Glasnik BiH» br. 39/14), a u skladu sa uvjetima definiranim Dokumentima ponude uz objavljeni Javni oglas za izbor najpovoljnije ponude za obavljanje poslova službe «Pomoć-informacije» na cestama F BiH i na osnovu provedenog otvorenog postupka, za period: od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine, temeljem okvirnog sporazuma i Odluke o dodjeli ugovora za obavljanje usluga Službe «Pomoć-informacije» (SPI) na javnim cestama u F BiH su sklopljeni ugovori za 2019. godinu sa:

- **Auto moto savez u Bosni i Hercegovini** (skraćeni naziv **AMS u BiH**) Mostar za obavljanje poslova «Pomoć-informacije» na području: Posavskog kantona (1 vozilo), Kanton Središnja Bosna (3 vozila), Hercegovačko-neretvanskog kanton (3 vozila), Zapadnohercegovačkog kantona (2 vozila) i Kanton 10 (2 vozila), i
- **BIHAMK** (Bosanskohercegovački auto-moto klub) Sarajevo za obavljanje poslova «Pomoć-informacije» na području: Unsko-sanskog kantona (4 vozila), Tuzlanskog kantona (5 vozila), Zeničko-Dobojskog kantona (4 vozila), Bosansko-podrinjskog kantona (1 vozilo), Srednjo-bosanskog kantona (2 vozila), Hercegovačko-neretvanskog kantona (4 vozila) i Kantona Sarajevo (5 vozila + 1 vozilo-spec.vozilo «rescue car»).

Ugovorom je definisano da se isplata vrši prema mjesečnim privremenim obračunskim situacijama nakon izvršene kontrole od strane uposlenika JP Ceste F BiH. Nadzor nad radom Službe «Pomoć-informacije» obavlja ovlašteno lice JP Ceste F BiH tako što vrši kontrolu privremenih obračunskih situacija, odnosno dnevnika informisanja i dnevnika pomoći na cesti za svaku bazu SPI. Planskim obilaskom baza SPI i putem nadzora pružanja intervencija na terenu kontroliše se na licu mesta rad uposlenika SPI (izgled izvršioca i vozila, opremljenost, urednost vođenja dnevnika, tehnika pružanja pomoći i sl.), te se zapisnički konstatiše nađeno stanje.

Za svaku akciju iz Programa prometno – preventivnih aktivnosti izdaje se odobrenje, a na osnovu zahtjeva u kojem stoji šta će se raditi, od kada do kada, gdje, koliko će sudionika i vozila biti uključeno. Nakon završetka akcije, u okviru obračunske situacije, kontroliše se izvještaj koji sadrži navedene elemente i finansijski dio (strukturu i specifikaciju svih troškova sa računima za izvršene usluge i nabavke).

Prema dostavljenim mjesečnim obračunskim situacijama tokom 2019. godine ostvaren je sljedeći obim poslova i prihod po osnovi naknade za poslove SPI:

R. br.	Izvršitelj usluga SPI	Prispjela sredstva (KM)	% umanjenje po osnovu člana 5. Ugovora **	Obaveza Razlika (2-3)	Vrijednost situiranih radova	Razlika (4-5) *
1	2	3	4	5	6	
1.	BIHAMK Sarajevo	4.187.679	226.000	3.961.679	3.894.542	67.137
2.	AMS U BIH Mostar	1.080.358	58.305	1.022.053	1.003.562	18.492
	UKUPNO	5.268.037	284.305	4.983.733	4.898.104	85.629

Pregled obima poslova i prihoda po osnovi naknade za poslove SPI za 2019. godinu

* Po osnovu godišnjeg obračuna vrijednost situiranih radova u 2019. godini za SPI je bio manji za :

- 67.137 KM kod BIHAMK-a, i
- 18.492 KM kod AMS u BiH
-

pa će taj dio razlike novčanih sredstava biti uvećan AMK-a u situaciji za februar 2020. godine.

** Procentualno umanjenje iz kolone 4 se vrši na osnovu Odluke o visini naknade za troškove implementacije iz sredstava za poslove „Pomoć – informacije“ na cestama (odлука Nadzornog odbora broj : 01-03.2-NO-6835-6/07 od 17.12.2007. godine), a po godišnjem obračunu za 2018. Godinu, u iznosu od 5,7164 % (ovaj procenat predstavlja udio SPI u ukupnim prihodima po konačnom obračunu JP Ceste F BiH).

Za navedene i izvršene poslove SPI u F BiH, tokom 2019. godine, utrošena su ukupna sredstva kako slijedi:

Pomoć na cesti	3.477.098 KM
Informiranje	692.518 KM
<u>Prometno-preventivne aktivnosti</u>	<u>728.488 KM</u>
U K U P N O	4.898.104 KM

U izvještajnom periodu znatno smo unaprijedili poslove informiranja javnosti o stanju prohodnosti cesta u BiH putem postavljanja „live“ kamera za videonadzor saobraćajnica na specifičnim lokacijama (prevojima, graničnim prijelazima ...) gdje građani mogu direktno vidjeti putem posjete „web stranica“: BIHAMK –a (76 lokacija) i AMS u BIH (22 lokacije) kakvo je stanje na cesti. Zaključno, BIHAMK (Bosanskohercegovački auto-moto klub, Sarajevo) i AMS u BIH (Auto-moto savez u Bosni i Hercegovini, Mostar) su poslove pomoći na cesti, informisanja i prometno-preventivnih aktivnosti izvršili u potpunosti s obzirom na priliv finansijskih sredstava.

3. Redovno održavanje cesta

Prema Zakonu o cestama u F BiH i Pravilniku o održavanju javnih cesta, održavanje cesta čini skup mjera i radnji koje se obavljaju tokom većeg dijela godine ili cijele godine na cestama, uključujući i sve objekte i instalacije sa svrhom održavanja prohodnosti, tehničke ispravnosti i sigurnosti prometa na cestama. U redovno održavanje cesta uključeni su i radovi održavanja cesta i objekata u zimskim uslovima.

Obim i vrsta radova redovnog održavanja za period 16.3. - 14.11.2019. godine procijenjena

JP CESTE FEDERACIJE BIH

je na osnovu praćenja statističkih podataka iz prethodnih godina, vodeći računa da se prioritetno izvršavaju radovi na čišćenju i sanaciji kolovoza, ophodnji cesta, obnavljanju horizontalne i vertikalne prometne signalizacije i cestovne opreme, regulisanju odvodnje, košenju cestovnog pojasa i poboljšanju preglednosti, održavanju bankina, bermi, kosina usjeka i nasipa, održavanju objekata, potpornih i obložnih zidova, sve u skladu sa potrebama cesta i Pravilnikom o održavanju javnih cesta. Vrijednost planiranih radova je procijenjena na osnovu važećih jediničnih cijena u postojećim ugovorima redovnog održavanja, uzimajući u obzir i ažurirane podatke o dužinama pojedinih dionica magistralnih cesta.

U periodu od 01.01.2019. - 15.03.2019. godine odnosno od 15.11-31.12.2019 godine kad se prema Pravilniku uspostavlja zimska služba na mreži magistralnih cesta u FBiH, formirano je dežurstvo na punktovima zimske službe, te izvršavani poslovi prema Operativnom planu zimske službe: čišćenje snijega i sprječavanje poledice na kolovozu, ulazno-izlaznim trakama, objektima i proširenjima kolovoza, obilježavanje širine planuma ceste rubnim motkama, nabavka, preuzimanje i deponovanje posipnog materijala (sol i abrazivni materijal), uklanjanje osulinskog i drugog materijala sa kolovoza, uklanjanje vozila koja ometaju promet, osiguranje odvodnje u vrijeme padanja kiše i otapanja snijega, sprječavanje izljevanja vode na kolovoz, održavanje kolovoza i prometne signalizacije u ispravnom stanju, postavljanje znakova II-46 „obavezna upotreba zimske opreme“ na pogodnim mjestima na ulazu u područje F BiH i pred usponima, informiranje o stanju pruhodnosti cesta i druge mjere i aktivnosti u cilju stvaranja uslova za sigurno odvijanje prometa.

Da bi se nastavio kontinuitet radova redovnog održavanja i nakon isteka važećih okvirnih sporazuma, pripremljena je nova tender dokumentacija za ugovaranje radova redovnog održavanja za naredni četverogodišnji period: 2018-2022 godina, a postupak nabavke je pokrenut 06.07.2018 godine. Zbog poništenja postupka od strane Ureda za razmatranje žalbi BiH, Vlada FBiH je Zaključkom broj 972/2018 od 24.07.2018. dala saglasnost za produženje postojećih Okvirnih sporazuma sa izvođačima radova, pa su svi Sporazumi sa izvođačima radova produženi do 30.06.2019. godine odnosno do okončanja novog postupka nabavke.

U ponovljenom postupku javne nabavke, za 10 od 12 tenderisanih LOTova je okončan postupak javne nabavke, i sa odabranim izvođačima radova sklopljeni Okvirni sporazumi za period 01.07.2019-30.06.2023 godine, i jednogodišnji ugovori. Sklapanjem novih ugovora, povećana je i ukupna dužina magistralnih cesta koje su predmet redovnog održavanja, pošto su uključene i neke nove dionice cesta u izgradnji, te preciznije definisane dužine postojećih dionica.

Postupak nabavke za LOT 5 i LOT 7 nije okončan do 30.06.2019. g. zbog žalbenog postupka, pa su sa postojećim izvođačima radova produženi postojeći ugovori do 14.11.2019. godine, odnosno do završetka postupka nabavke.

Pošto postupci nabavke za ova dva LOTa nisu okončani ni do 14.11.2019. g., zimsko održavanje cesta na LOTu 5 i LOTu 7 za 2019/2020 godinu je ustupljeno izvođačima radova koji su već sklopili okvirne sporazume za period 01.07.2019-30.06.2023 godine,

Zbog prekategorizacije regionalnih cesta R-401 u M-4.3, te R-419 i R-420 u M-17.5 pokrenuti su postupci nabavke za radove redovnog održavanja na ovim dionicama. Postupak javne nabavke radova redovnog održavanja za LOT 14 (cesta M-4.3) je završen, pa je sa odabranim izvođačem sklopljen Okvirni sporazum za period 15.11.2019-15.11.2023 godine, i jednogodišnji ugovor.

Postupak javne nabavke radova redovnog održavanja za LOT 13 (cesta M-17.5) nije završen u 2019. godini, zbog žalbenog postupka.

JP CESTE FEDERACIJE BIH

Prema sklopljenim novim ugovorima su povećani budžeti za radove redovnog održavanja i na postojećim dionicama cesta, uslijed čega su Rebalansom ukupna sredstva za redovno održavanje uvećana za cca 936.000 KM.

Rebalansom Plana, predviđene su manje preraspodjеле te izvršeno usklajivanje planiranih sredstava na pojedinim LOTovima sa dosadašnjom realizacijom redovnog održavanja i novim ugovorima.

Prema potpisanim Sporazumu, učešće JP Ceste F BiH u održavanju pružnih prelaza na cesti M-14 Bihać – Bosanska Krupa iznosi 50% vrijednosti radova, a učešće JP Željeznice F BiH 50%. U toku 2019. godine nije bilo realizacije po ovoj stavci.

Troškovi redovnog održavanja mostova i održavanje elektroopreme za rasvjetu tunela i prilaznih zona tunelima, rasvjete raskrsnica, semafora i trafostanica su realizovani prema potpisanim ugovorima sa izvođačima radova, a troškovi električne energije za rasvjetu tunela, raskrsnica i mostova, te semafora i brojača prometa su realizovani prema stvarnom utrošku odnosno prema fakturama Elektrodistribucije.

Pregled Sporazuma i ugovora redovnog održavanja magistralnih cesta za period naveden u tabeli

Red.br	LOT	Izvođač	Vrijednost Okvirnog sporazuma za period 01.09.2014.- 15.03.2019.	Vrijednost Izmjene okvirnog sporazuma za period 01.09.2014.- 30.06.2019. odnosno okončanja nabavki	broj Okvirnog sporazuma	Vrijednost ugovora potpisanoj za period 01.09.2018.- 15.03.2019.	broj ugovora	Aneks ugovora potpisanoj za period 01-09-2018- 15.03.2019. Odnosno do okončanja postupka nabavke
1.	LOT1	Rad-putevi Bihać	9.551.922	Do 10.596.723	01-02.2-7462/18.	1.259.466	01-02.2-3337/19	1.167.742
2.	LOT2	Kov-grad Bužim	7.537.036	Do 8.629.318	01-02.2-7463/18.	1.049.638	01-02.2-3340/19	1.219.081
3.	LOT3	Konz: Jata-group, Srebrenik,HIH Živinice,	14.624.982	Do 15.857.520	01-02.2-7464/18.	1.785.756	01-02.2-3341/19	1.448.367
4.	LOT4	Dobojputevi Doboj jug	7.868.100	Do 8.865.322	01-02.2-7465/18.	879.258	01-02.2-3343/19.	1.167.166
5.	LOT5	Rudnici gipsa Donji Vakuf	7.299.910	Do 8.035.377	01-02.2-7466/18.	889.343	01-02.2-3345/19.	852.672
6.	LOT6	Goraždeputevi Goražde	4.983.332	Do 5.588.709	01-02.2-7467/18.	589.821	01-02.2-3347/19.	848.402
7.	LOT7*	PZP Mostar			01-02.2-7479/18.	716.841	01-02.2-3349/19	759.134
8.	LOT8	Sarajevoputevi Sarajevo	8.461.968	Do 9.900.415	01-02.2-7468/18.	1.366.227	01-02.2-3350/19.	1.364.150
9.	LOT 9**	Ceste Mostar	2.802.890	Do 3.192.512	01-02.2-7469/18.	387.426	01-02.2-3352/19.	455.081
10.	LOT10	Ceste Mostar	9.207.698	Do 10.714.320	01-02.2-7470/18.	1.319.772	01-02.2-3353/19.	1.570.237
11.	LOT11	Ceste Mostar	20.148.894	Do 21.510.978	01-02.2-7471/18.	2.608.857	01-02.2-3357/19.	1.553.387
12.	LOT12	Ceste Mostar	13.295.115	Do 14.620.946	01-02.2-7472/18.	1.189.375	01-02.2-3358/19.	1.518.976
UKUPNO			105.781.847			14.041.780		13.924.395

Napomena: U gore navedene vrijednosti Aneksa ugovora, uključen je i iznos od 1.102.350 KM, potreban za nabavku soli za posipanje cesta, koju su nabavili izvođači radova.

**Pregled Sporazuma i ugovora redovnog održavanja magistralnih cesta po okončanju
postupka nabavke za period naveden u tebeli**

Red.br	LOT	Izvođač	Vrijednost Okvirnog sporazuma (sa PDVom) za period 01.07.2019.- 30.06.2023.	broj Okvirnog sporazuma	Vrijednost ugovora sa PDVom potpisanoj za period 01-07.2019- 30.06.2020.	broj ugovora
1.	LOT 1	Rad-putevi Bihać, Behić Sanny Boy d.o.o.Bihać i Divel d.o.o.Sanski Most	12.565.800	01-02.2-7787/19	2.924.720	01-02.2-7797/19
2.	LOT 2	Kov-grad Bužim i I-Selimović d.o.o.Cazin	11.243.700	01-02.2-7788/19	2.632.497	01-02.2-7798/19
3.	LOT 3	Konz: Jata-group, Srebrenik,HIH Živinice,	19.691.100	01-02.2-7789/19	4.574.697	01-02.2-7799/19
4.	LOT 4	Dobojputevi d.d. Doboj jug	10.073.700	01-02.2-7790/19	2.337.218	01-02.2-7800/19.
5.	LOT 6	Goraždeputevi Goražde	6.493.500	01-02.2-7791/19	1.517.556	01-02.2-7801/19.
6.	LOT 8	Sarajevoputevi Sarajevo	12.506.250	01-02.2-7792/19.	2.901.598	01-02.2-7802/19.
7.	LOT 9	Ceste Mostar	4.538.560	01-02.2-7793/19.	1.053.000	01-02.2-7803/19.
8.	LOT 10	Ceste Mostar	11.447.261	01-02.2-7794/19.	2.655.900	01-02.2-7804/19.
9.	LOT 11	Ceste Mostar	24.205.658	01-02.2-7795/19.	5.615.999	01-02.2-7805/19.
10.	LOT 12	Ceste Mostar	17.877.596	01-02.2-7796/19.	4.147.814	01-02.2-7806/19.
			Okvirni sporazum (sa PDVom) za period 15.11.2019.- 14.11.2023.	Ugovor potpisana za period:	Vrijednost ugovora sa PDVom	broj ugovora
1.	LOT 13					
2.	LOT 14	Kov-grad d.o.o.Bužim	4.282.200	15.11.2019.- 14.11.2020	994.499	01-02.2-12929/19
3.	LOT 7	Sarajevoputevi d.d. Sarajevo		15.11.2019.- 15.03.2020.	242.949	01-02.2-13293/19.
4.	LOT 7	Ceste Mostar TI Mostar		15.11.2019.- 15.03.2020.	234.882	01-02.2-13292/19.
5.	LOT 7	Ceste Mostar TI Kiseljak		15.11.2019.- 15.03.2020.	233.614	01-02.2-13291/19.
6.	LOT 5	Dobojputevi Doboj jug		20.11.2019.- 15.03.2020.	716.922	01-02.2-13485/19.
7.	LOT 5	Konz: Jata-group, Srebrenik,HIH Živinice,		20.11.2019.- 15.03.2020.	363.791	01-02.2-13486/19.
	UKUPNO		134.925.325		33.147.656	

Nabavka soli za zimu 2018/2019:

- LOT 2 - Solana d.d. Tuzla, ugovor broj:01-02.2-8904/18, od 16.10.2018. godine na iznos 1.446.325 KM. Količina 6.000 tona, na osnovu ugovora broj:01-02.2-1924/19. od 13.02.2019. od firme „Solana d.d. Tuzla“ je nabavljen još 600 tona soli NaCl granulacije 0/1 mm.
- LOT 3 - Macot Sol d.o.o.Mostar, ugovor broj: 01-02.2-8905/18, od 16.10.2018. godine, na iznos 349.128 KM, za količinu: 400 tona soli CaCl₂.

Napomena: Nabavka morske soli 0/4 nije realizovana u 2018. godini zbog žalbenog postupka pred Uredom za žalbe BiH. Zbog toga je izdat nalog izvođačima radova da nabave određenu količinu morske soli 0/4, te je za te svrhe u 2018 godini putem ugovora za redovno održavanje utrošeno: 213.355 KM, a u 2019 godini 849.653 KM, za nabavku ukupno: 5.938 tona soli NaCl.

Nabavka soli za zimu 2019/2020:

Ugovorena ja nabavka 1.000 tona industrijske soli NaCl granulacije 0/1 (LOT 2) sa firmom Bom Impex po ugovoru 01-02.2-13893/19. u ukupnoj vrijednosti 162.630 KM. U 2019 godini je realizovana isporuka 300 tona, vrijednost 48.789 KM.

Ugovorena je nabavka 22 tone CaCl₂ u vrijednosti 19.048 KM po ugovoru 01-02.2-13992/19. Od 06.12.2019. sa firmom Macot Sol Mostar isporuka okončana u 2019 godini.

Nabavka 925 tona morske soli 0/4 (LOT 1) nije realizovana u 2019. godini zbog žalbenog postupka pred Uredom za žalbe BiH.

- Redovno održavanje mostova

Naziv	Plan 2019.	Rebalans Plana 2019.	Konsultant /Izvođač	Ugovoreno	Realizovano 2019.	Napomena
Redovno održavanje mostova			HP Investing d.o.o. Mostar 01-02.1-11499/17. 28.12.2017.	564.584 (preneseno 160.737)	35.000	U toku
- antikorozivna zaštita (AKZ) čelične pješačke ograda, vrućim cinčanjem			Sikra d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-11162/18. 12.12.2018.	34.254	34.127	Okončano
- Glavni (detaljan) pregled Prudskog mosta preko rijekе Bosne na M-14.2, dionica 006:Odžak-Gornja Dubica-Gr.entiteta km 14+705	500.000	500.000	Strabag d.o.o.Sarajevo 01-02.1-376/19. 10.01.2019. 01-02.1-11506/19. 30.09.2019.	94.812 5.991	103.031	Okončano
- Most M-4.2 001-3-preko rijekе Kladišnici, Velika Kladuša, - Most M-4.2-001-585- preko nepoznatog potoka, Vejinac,Purići - Most M-4.2-002-506, preko radetina potoka, Coralici, - Most M-4.2-002- 589,preko lokalne ceste, Cazin - Most M-4.2-002-7 preko rijekе Une,Sedra, Ostrožac, - Most M-5-001-9, preko potok a Garavice, - Most M-5-003-17,preko potoka jaruga, Ripač, PLP 15-004-478, pločasti propust preko potoka Sokolovo			INK Constructor d.o.o.Banja luka,01- 02.1-6085/19. 20.05..2019.	12.753	12.753	Okončano
UKUPNO	500.000	500.000	BC Gradnja d.o.o.Bosanska Otoka 01-02.1-14740/19 26.12.2019.	242.440	-	Ugovoreno u decembru 2019. godine
					184.911	

-Poboljšanje sigurnosti prometa – izrada noveliranih projekata sigurnosnih odbojnih ograda

Naziv	Plan 2019.	Rebalans 2019.	Konsultant /Izvođač	Ugovoren	Realizovano 2019.
Izrada noveliranih projekata sigurnosnih odbojnih ograda na M-17, od Tarčina do Potoka (Mostar)	46.000	46.000	Divel d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-5039/19. 26.04.2019.	19.480	19.480
UKUPNO	46.000	46.000			19.480

-Obilježavanje pješačkih prijelaza sa plastikom optičko-vibracionim trakama kod škola

Naziv	Plan 2019.	Rebalans 2019.	Konsultant /Izvođač	Ugovoren	Realizovano 2019.
Sanacija postojećih i izgradnja novih svjetlosnih prometnih znakova kod škola na magistralnim cestama			Sacom d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-9115/19. 29.07.2019.	42.500	39.051
Izrada pješačkih prijelaza sa optičko/zvučnim trakama od plastike u blizini škola na magistralnim cestama	50.000	43.000	Colorex d.o.o.Mostar, 01-02.3-11903/19. 10.10.2019.	42.448	-
Trškovi treptača na cesti			Elektrodistribucija Tuzla, Bihać, Goražde, JP EP HZHB Mostar	2.232	2.233
UKUPNO	50.000	43.000			41.284

- Održavanje i nadzor elektroopreme (rasvjeta tunela i prilaznih zona tunelima, rasvjeta raskrsnica, semafori i trafo stanice)

Okvirni sporazumi, za period 2017.- 2021.godina su potpisani dana: 22.09.2017. (01-02.4-8590/17.) sa Step d.d. Sarajevo, a regulišu okvirna pitanja vezana za nabavku radova redovnog održavanja javne rasvjete raskrsnica, tunela i prilaznih zona tunelima na magistralnim cestama u F BiH (vrijednost 712.104 KM) i Okvirni sporazum za održavanje semaforskih uređaja i opreme na magistralnim cestama vrijednosti 981.122 KM.

Naziv i opis projekta	Plan 2019.	Rebalans Plana 2019.	Konsultant /Izvođač	Ugovoren	Realizovano 2019.
Izvođenje radova redovnog održavanja semaforskih uređaja i opreme i svjetlosnih oznaka pješačkih prijelaza na magistralnim cestama u F BiH			Step d.d.Sarajevo, 01-02.2-6219/18. 31.07.2018. Za period 03.08.2018.- 02.08.2019.	245.281 (preneseno 173.942)	173.777
	450.000	450.000	Step d.d.Sarajevo, 01-02.2-9342/19 01.08.2019. Za period 03.08.2019.- 02.08.2020.	245.281	74.372
Izvođenje radova redovnog održavanja elektroopreme javne rasvjete raskrsnica, tunela i prilaznih zona tunelima na magistralnim cestama u F BiH			Step d.d.Sarajevo, 01-02.2-7682/18. 07.09.2018. Za period 01.09.2018.- 31.08.2019.	178.025 (preneseno 163.017)	162.730

JP CESTE FEDERACIJE BIH

			Step d.d.Sarajevo, 01-02.2-10826/19. 11.09.2019. Za period 01.09.2019.- 31.08.2020.	178.025	14.162
Nadzor nad radovima redovnog održavanja semaforskih uređaja i opreme i postojećih oznaka pješačkih prelaza			Aber Design d.o.o. Sarajevo, 01-01.1-3186/19. 19.03.2019.	7.000	-
Nadzor nad radovima redovnog održavanja javne rasvjete raskrsnica, tunela i prilaznih zona tunelima na magistralnim cestama			Aber Design d.o.o. Sarajevo, 01-01.1- 2871/19.12.03.2019.	7.000	-
UKUPNO	450.000	450.000			425.041

Ugovori za usluge (nadzor) na radovima redovnog održavanja semaforskih uređaja i opreme i svijetlećih oznaka pješačkih prelaza na magistralnim cestama u F BiH i nadzora na radovima redovnog održavanja javne rasvjete raskrsnica, tunela i prilaznih zona tunelima su potpisani sa Aber Design d.o.o. Sarajevo, koji su navedeni u gornjoj tabeli. Također, u tabeli su navedeni i ugovori i njihova realizacija za izvođenje sa Step-om d.d. Sarajevo.

REKAPITULACIJA ULAGANJA ZA REDOVNO ODRŽAVANJE

O P I S	Realizovano 2018.	Plan 2019.	Rebalans plana 2019.	Realizovano 2019.	Index 5/4
1	2	3	4	5	6
REDOVNO ODRŽAVANJE I ZIMSKA SLUŽBA	30.508.442	32.184.000	33.120.000	32.164.570	97
Redovno održavanje mostova	403.847	500.000	500.000	184.911	37
Glavni pregledi objekata (složenih)	12.929	80.000	80.000	-	-
Troškovi električne energije za rasvjetu tunela, raskrsnica, mostova, semafora i brojača prometa	495.118	500.000	500.000	468.677	94
Osiguranje pružnih prelaza u USK (sufinansiranje)	3.424	100.000	20.000	-	-
Poboljšanje sigurnosti prometa – izrada noveliranih prometnih projekata	13.646	46.000	46.000	19.480	42
Održavanje i nadzor elektro-opreme (rasvjeta tunela i prilaznih zona tunelima, rasvjeta raskrsnica, semafori i trafo stанице, te zamjena rasvjetnih tijela LED svjetiljkama)	442.022	450.000	450.000	425.041	94
Sanacija postojećih i izgradnja novih svjetlosnih prometnih znakova kod škola		50.000	50.000	41.284	83
Redovno održavanje brojača prometa	39.312	10.000	10.000	11.358	114
Monitoring vozila redovnog održavanja GPS-om	14.335	30.000	30.000	6.845	23
Obilježavanje pješačkih prijelaza sa plastikom optičko-vibracionim trakama kod škola	40.341	50.000	43.000	-	-
Tehničko izviđanje i čišćenje površine rizične od mina		300.000	100.000	21.987	22
Rekalibracija uređaja za mjerjenje refleksije horizontalne i vertikalne signalizacije		25.000	25.000	-	-
Utrošak soli NaCl i CaCl ₂	2.837.594	1.800.000	2.100.000	1.783.837	85
UKUPNO REDOVNO ODRŽAVANJE	34.811.010	36.125.000	37.074.000	35.127.990	95

4. Rezervirana sredstva za rizike i neplanirane rashode

N A Z I V	Realizovano 2018.	Plan 2019.	Rebalans plana 2019.	Realizovano 2019.	Napomena
Rezervirana sredstva za rizike i neplanirane rashode -Izgradnja tunela Karaula na dionici:Potpaklenik-Kladanj - obračunate zatezne kamate na potraživanja od strane izvođača, nastala tokom realizacije projekta - 1/2 troškova jednočlane komisije za rješavanje sporova				746.713 13.387	
Zatezne kamate po Odluci Međunarodnog arbitražnog suda za projekt Sarajevsak obilaznica	2.007.652	1.700.000	1.940.000	348.903 966.425	
Sanacija tunela Ormanica- sanacija lokalne ceste				449.338	Finansirano iz sredstava kredita
Sanacija tunela Vranduk				686.317	Finansirano iz sredstava kredita
U K U P N O	2.007.652	1.700.000	1.940.000	3.211.083	

Ugovor za radove na projektu „Izgradnja tunela Karaula na magistralnoj cesti M-18“, na osnovu procedure za nabavke EIB, zaključen je u aprilu 2014. godine između JP Ceste F BiH i STRABAG AG na iznos 24,26 mil.KM (sa PDV-om). Za projekat su bila osigurana sredstva GSM licence u iznosu 10,00 mil.KM, kao vlastito učešće FBIH i sredstva kredita EIB u okviru programa „Modernizacija cesta u F BiH“. Sredstva osigurana iz GSM licence su utrošena tokom 2014. i 2015. godine, finansijski ugovor sa EIB je potpisani u 2016 godini, a povlačenje I tanše kredita (oktobar 2017.) je uslijedilo po ispunjenju uvjeta iz finansijskog ugovora sa EIB-om. U međuvremenu pristigle situacije su realizovene iz sredstava JP Ceste F BiH, koja su nakon povlačenja I tranše kredita refundirana. Strabag AG- podružnica Sarajevo je sa 30.04.2019. godine fakturisala zatezne kamate obračunate na potraživanja nastala tokom realizacije projekta u iznosu od 746.713 KM i ½ troškova Komisije za rješavanje sporova u iznosu od 13.387 KM.

Po Odluci Međunarodnog arbitražnog suda Međunarodne privredne komore u predmetu Osijek-koteks d.d Osijek protiv JP Ceste FBIH (predmet br.22380/MHM) za projekt Sarajevska obilaznica LOT 2 obračunate su zatezne kamate koje su JP Ceste FBiH isplatile Osijek-koteks d.d. Osijek iznose 966.425 KM. Također, plaćena je naknada rada Međunarodne privredne komore u iznosu od 0,35 mil.KM.

Tokom rekonstrukcije tunela Ormanica saobraćaj kroz tunel je obustavljan, te je bilo neophodno privremeno preusmjeriti saobraćajne tokove na lokalne ceste i minimizirati negativne efekte na lokalne zajednice pogodjene projektom. Lokalne ceste Srnice Donje-Cerik (Špionica) km 0+615- 2+011 i Špionica-Ormanica bilo je neophodno sanirati/ rekonstruirati na pojedinim dijelovima kako bi mogle prihvatiti povećani saobraćaj tokom rekonstrukcije tunela Ormanica. Lokalna cesta Srnice Donje-Cerik (Špionica) se koristila za saobraćaj vozila do 7.5 t, dok se

JP CESTE FEDERACIJE BIH

lokalna cesta Špionica-Ormanica koristila za saobraćaj teških vozila. Za navedene radeve je kreditor odobrio amandman Ugovora na iznos 416.848 KM.

Tokom rekonstrukcije tunela Vranduk II bilo je potrebno privremeno preusmjeriti saobraćaj na regionalnu cestu R 445 Nemila-Tetovo-Zenica i minimizirati negativne efekte na lokalne zajednice pogođene projektom. Regionalna cesta R 445 dužine 24 km se koristila samo za saobraćaj vozila do 7.5 t. Regionlna cesta je sanirana/ na pojedinim dijelovima rekonstruisana da bi mogla prihvatiti povećani saobraćaj i da bi se smanjili rizici u pogledu sigurnosti prometa.

5. Rezervirana sredstva za sudske presude

N A Z I V	Realizovano 2018.	Plan 2019.	Rebalans plana 2019.	Realizovano 2019.	Napomena
Rezervirana sredstva za sudske presude	2.197.130	2.000.000	1.171.000	75.379 99.206 76.579 257.012	Troškovi po sudskim presudama nerezervisani sudski sporovi – 99.206 KM, te zetezne kamate po osnovu sudskih presuda Troškovi arbitraže vezani za Sarajevsku obilaznicu
U K U P N O	2.197.130	2.000.000	1.171.000	508.176	

Iznosi koji terete rashode perioda su: troškovi po sudskim presudama u iznosu od 75.379KM, nerezervisani sudski sporovi – 99.206 KM, te zetezne kamate po osnovu sudskih presuda u iznosu od 76.579 KM.

Pred Međunarodnim arbitražnim sudom Međunarodne privredne komore okončan je predmet br.22380/MHM Osijek-koteks d.d Osijek protiv JP Ceste F BiH. Za usluge pravne pomoći, savjetovanja i zastupanja pred Međunarodnim arbitražnim sudom JP Ceste F BiH su zaključile ugovor sa advokatskim kancelarijama Knoetzl Haugeneder Metal, Beč, Sead Miljković, Sarajevo i Tarja Krehić Zagreb. Projekat Sarajevska obilaznica u poslovnim knjigama JP Ceste F BiH se vodi vanbilansno, obzirom da je projekat Vlade F BiH. Iako je upućen zahtjev Vladi F BiH za obezbjeđenje neophodnih sredstava, da se ne bi stvarale i povećavale neizmirene obaveze, JP Ceste F BiH su iz vlastitih sredstava izmirile nastale obaveze koje se tiču pravne pomoći i zastupanja pred Međunarodnim arbitražnim sudom Međunarodne privredne komore (predmet br.22380/MHM). U izvještajnom periodu za ovu namjenu realizovan je iznos od 221.911 KM.

Također, u vezi istog projekta Izgradnja sarajevske obilaznice LOT 1za advokatske usluge u predmetu Triglav Osiguranja protiv JP Ceste F BiH realizovana su sredstva u iznosu od 35.100 KM.

6. Troškovi konsultantskih usluga

Red br.	N A Z I V	Plan 2019.	Rebalans plana 2019.	Konsulant	Ugovorenio	Realizovano 2019.
1.	Obrada podataka i izrada Publikacije o prometu Za 2017 godinu	15.000	15.000	GP IG d.o.o.Banja luka i INK Constructor d.o.o.Banja luka 01-02.1-13066/19. 08.11.2019.	12.986	-

JP CESTE FEDERACIJE BIH

	Za 2018.			NTSI-Institut d.o.o.Sarajevo 01-02.1-13064/19. 08.11.2019.	11.115	
2.	Troškovi izrade projekta izvedenog stanja magistralnih cesta			Design &QC d.o.o.Sarajevo, 01-02.5-10585/18, 28.11.2018	11.700	11.700
	- za dionicu Blažuj-Tarčin i obilaznica Pazarić			Geo feld d.o.o. Bihać, 01-01.1-4980/19. 25.04.2019.	7.008	7.008
	- izrada projekta izvedenog stanja dionica: Spahići-Jezero-Grmuša poddionica: Srbljani-Tabla	150.000	150.000			
	- M-15 dionica Sanski most - Kamičak			Ugovor o djelu, 01-02.2-8984/19.	1.186	1186
	- M-4 dionica:Simin Han-Donje Caparde			Ugovor o djelu, 01-02.2-9717/19. 14.08.2019.	949	949
3.	Troškovi konsultantskih usluga za potrebe neovisne kontrole kvalitete radova	20.000	20.000	DTQ d.o.o. Sarajevo 01-02.2-853/17. 31.01.2017.	46.063 (preneseno 17.322)	17.275
4.	Troškovi održavanja sustava gospodarenja cestama – SUGOC	106.000	106.000	TEB Informatika d.o.o.Zagreb,01-02.2-10068/19.22.08.2019.	105.791	92.968
5.	ISO Standard (grant od EBRD-a)	15.000	15.000		-	-
6.	IRAP – snimanje cestovne mreže za potrebe Programa „Modernizacije cesta u F BiH“ (kreditna sredstva IBRD) i novih dionica	391.000	410.000	Fakultet prometnih znanosti, Zagreb 01-02.3-6337/19. 24.05.2019. Anex 01-02.3-6337/19. 23.12.2019.	383.349 Anex-26.208	409.557
7.	Konsultantske usluge vezane za nabavku radova i usluga po med. procedurama	50.000	20.000	Ugovor o djelu, 01-11825.2018.	29.649	29.649
8.	Izrada studije analize prometa na magistralnim prvcima	15.000	15.000		-	-
9.	Izrada plana posebnog obilježja mreže magistralnih cesta	20.000	20.000		-	-
10.	Tehnička i finansijska revizija(samo za projekte finansirane iz WB i EIB) – (vezana za Program Modernizacija cesta u F BiH – kreditna sredstva)	100.000	3.000	Ministarstvo finansija i trezora BiH	2.574	2.574
11.	Izrada Akcionalih planova preseljenja za potrebe međunarodnih institucija	-	51.000	Enova d.o.o. Sarajevo, 01-02.5-4965/19. 22.05.2019.	20.943	20.943
12.	Izrada projektnog zadatka za elaborat snimanja i uplanjenja mreže magistralnih cesta u F BiH	-	7.000	Geoplan d.o.o.Cazin, 01-02.3-13344/19	5.600	5.600
13.	Prikupljanje, obrada podataka i izrada georeferencijalnog panoramskog video zapisa magistralnih cesta M-4.3 i M-17.5, cca 157 km	-	110.000		-	-
14.	Izrada elaborata: Analiza implementacije predloženih mjera i očekivanih efekata za racionalnu potrošnju električne energije u JP Ceste F BiH prema studijskom istraživanju iz 2016. godine	-	7.000		-	-
UKUPNO		882.000	949.000			599.409

Rb.1 - Obzirom da nije rađena obradu podataka i izrada godišnjeg biltena o intenzitetu prometa na magistralnim cestama za 2017 i 2018.godinu, nakon obavljenog natječaja, sklopljeni su ugovori GP IG d.o.o.Banja luka i INK Constructor d.o.o.Banja luka za 2017.godinu i NTSI-Institut d.o.o.Sarajevo za 2018.godinu. Realizacija ugovora je u toku

Rb.2 - U cilju uknjižbe nekretnina okončano je izvedeno stanje magistralnih cesta za dionicu: Blažuj-Tarčin, Obilaznica Pazarića, dionica: Spahići-Jezero-Grmuša poddionica: Srbljani-Tabla, dionica Sanski most –Kamičak, 4 dionica: Simin Han-Donje Caparde

Rb.3 - Okončan je ugovor kontrolе kvalitete materijala na redovnom i investicionom ulaganju sa DTQ d.o.o. Sarajevo.

Rb.4 - Održavanje, stručna podrška i unapređenje rada u programskim rješenjima SUGOC (e-

Rb.1.- Program „Rehabilitacija cesta u F BiH“ je okončan 2013. godine, a finansiran je međunarodnim kreditnim sredstvima i to:

- Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) – po ugovoru br. 37543 u iznosu 45 mil. EUR. Kamatna stopa je varijabilna (6 mjesечni EURIBOR +1% marža), a plaća se polugodišnje. Otplata kredita je u 24 jednakne polugodišnje rate, počev od 5.12.2010. godine.
- Evropska investicijska banka (EIB), kredit broj: 23924 po finansijskom ugovoru br. 2005-0455 u iznosu 50 mil. EUR. Kamatna stopa je varijabilna (6 mjesечni EURIBOR + fiksni raspon). Povlačenje kredita je bilo po tranšama (šest tranši). Period otplate kredita je do 18 godina, uključujući 6 godina perioda odgode otplate, a otplata se vrši u jednakim polugodišnjim ratama. Prvi datum otplate svake tranše je ne kasnije od 6 godina od datuma povlačenja tranše, a krajnji rok otplate posljednje rate je ne ranije od 4 godine i ne kasnije od 18 godina od datuma povlačenja. Otplata prve tranše počela je 2014 godine.
- kredit Svjetske banke (WB) – IDA 43710, u iznosu 8,20 mil.SDR. Kamata na kredit je 0,75% na povučeni iznos kredita, a naknada za održavanje kredita iznosi 0,5% godišnje na nepovučeni iznos kredita. Obzirom da je originalna valuta kredita SDR, zavisno od kretanja valuta koje čine SDR pojavljuju se pozitivne ili negativne kursne razlike. Otplata kredita je u jednakim polugodišnjim ratama, u periodu od 20 godina, uključujući period odgode od 10 godina. Period otplate kredita počeo je 15.12.2017. do 15.06.2027 godine. Kreditna sredstva su povučena do 30.06.2012. godine.

U izvještajnom periodu pristigle su kamate, koje terete rashode perioda za kredit EBRD-a u iznosu od 191.700 KM, kredit EIB-a 307.855 KM, te kamate i negativne kursne razlike WB u iznosu od 427.083 KM, što sveukupno iznosi 926.638 KM.

Iz finansijskog rezultata izmirene su pristigle obaveze za kredite i to: dvije polugodišnje EBRD-ove rate u ukupnom iznosu od 8.036.008KM, EIB-a I tranša – 529.280 KM, II tranša – 782.332 KM, III tranša – 938.798 KM, IV tranša – 704.099 KM, V tranša – 1.251.731 KM i VI tranša – 2.346.996 KM i kredit WB-IDA – 1.960.534 KM, što ukupno iznosi 16.549.779 KM. Za otplate kredita planirana su sredstva u iznosu od 16,50 mil.KM.


Rb.2 – U skladu sa Ugovorom o zajmu za projekt „Sanacija cesta od poplava i modernizacija“ zaključenim između JP Ceste F BiH i EBRD jednokratna provizija iznosi 1% na glavnicu zajma i ista je plativa po efektivnosti kredita. EBRD je, u ime Zajmoprimca, povukao iz kredita i sam sebi platio jednokratnu proviziju u iznosu 1.271.290 KM nakon proglašenja efektivnosti kredita;

Na povučenu tranšu kredita EIB-a, u skladu sa Ugovorom, realizovana je provizija u iznosu od 5.000 KM.

Rb.3 – U skladu sa Ugovorom o zajmu između Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i BiH, provizija na nepovučena sredstva zajma iznosi 0,5% godišnje na nepovučeni saldo zajma. Grejs period za obračun provizije na nepovučena sredstva zajma je za I Tranšu 60 dana i za II Tranšu 120 dana od datuma potpisivanja Ugovora o zajmu. Provizija na neiskorištena sredstva je plativa na svaki datum plaćanja kamate (15 februar i 15 august). U izvještajnom periodu provizija na nepovučena sredstva zajma iznosi 682.223 KM, kamata po kreditu 2.507 KM

JP CESTE FEDERACIJE BIH

U skladu sa Sporazumom o zajmu između BiH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD), troškovi održavanja kredita (provizija na nepovučena sredstva kredita) obračunavaju se po stopi 0,25 % na nepovučeni iznos zajma. Naknada za održavanje kredita se zaračunava od datuma koji pada šezdeset dana nakon datuma Sporazuma o zajmu do odnosnih datuma na koje Zajmoprimac iznose zajma povuče s Računa zajma ili otkaže. Naknada za održavanje kredita se plaća polugodišnje unazad na svaki datum plaćanja (15 februar i 15 august). Navedena naknada je plativa nakon efektivnosti zajma. U izvještajnom periodu troškovi održavanja kredita iznose 280.340 KM.

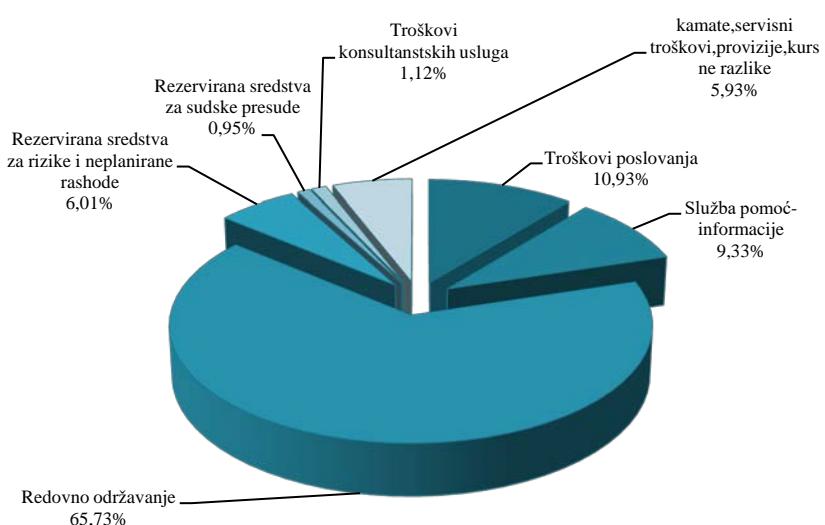

Grafički prikaz strukture ostvarenih rashoda

B. II TROŠKOVI AMORTIZACIJE

Naziv	Realizovano 2018.	Plan 2019.	Rebalans plana 2019.	Realizovano 2019.
Amortizacija stalnih sredstava	601.731	700.000	300.000	262.555
UKUPNO	601.731	700.000	300.000	262.555

U skladu sa MRS 20, vrijednost nematerijalne i materijalne imovine neophodne za obavljanje osnovne djelatnosti sistematski se otpisuje tokom procijenjenog vijeka trajanja i sučeljava sa pripadajućim dijelom odloženih prihoda (izvora) do momenta otpisa. Amortizacija se obračunava linearnom metodom otpisa, tokom procijenjenog korisnog vijeka trajanja stalnih sredstava. Amortizacija se odnosi na nematerijalna stalna sredstva, opremu i transportna sredstva, te je u prihodovnoj i u rashodovnoj ostvarena u iznosu od 0,26 mil.KM.

JP CESTE FEDERACIJE BIH

d.o.o.Sarajevo i Kamer commerc d.o.o.Sarajevo.

R.br.4. - Konzorcij:TeleGroup d.o.o. Sarajevo, TeleGroup d.o.o. Banja luka i Audio Video

Consulting d.o.o.Sarajevo, na osnovu ugovora broj:01-03.2-1050/19. od 22.01.2019. je isporučio opremu za konferencijski sistem, uradio montažu, povezivanje, programiranje i puštanje u rad navedenog sistema, vrijednosti 84.982 KM.

Ovom stavkom obuhvaćena je isporuka GPS uređaja za monitoring vozila JP Ceste F BiH (TIM System d.o.o. Sarajevo).

R.br.5. - Sa Euro Prost-om d.o.o. Gračanica krajem godine, je potpisana ugovor, broj: 01-01.1-

11779/18. za ugradnju jednog lifta u poslovnoj zgradi vrijednosti 49.959 KM. Realizacija ugovora je okončana u izvještajnom periodu.

R.br.6. - Realizovan je ugovor trajne licence za korištenje OWIS sistema za upravljanje dokumentima (75 komada) sa Orkom d.o.o. Sarajevo i urađena nabavka printer-a neophodnog za rad DMS-a.

R.br.7, 8, i 9. – nije bilo realizacije u izvještajnom periodu.

R.br.10. - Drugim neophodnim nabavkama obuhvaćena je dogradnja softvera za protivpožarni sistem nabavka stolica za radnike, police za ured u Mostaru, ormara u poslovnoj zgradi i drugo neophodno za odvijanje aktivnosti..

2. Zajednički projekti sa međunarodnim finansijskim institucijama

Program „Modernizacija cesta u F BiH“

Do sada je potpisano pet najznačajnijih ugovora za radove (okončanje radova na dionici Kladanj-Podpaklenik preko prevoja Karaula i četiri Lot-a za izgradnju ceste Neum-Stolac, dionica Stari Neum-Drenovac), dok je za jedan LOT za cestu Neum-Stolac (dionica Broćanac – prapratnica) okončana nabavka, pribavljena saglasnost Banke za dodjelu ugovora. Pored navedenog, potpisani su i brojni ugovori srednje veličine za rekonstrukcije/rehabilitacije mostova, izgradnju traka za spora vozila, rekonstrukcije/ rehabilitacije crnih tačaka i sanacije kolovoza i korekcije osovine.

Radovi na prva dva LOT-a na izgradnji ceste Neum-Stolac, dionica Stari Neum-Broćanac i kompletiranje radova na cesti Šički Brod-Sarajevo, dionica Kladanj-Podpaklenik preko prevoja Karaula završeni. Nabavka roba koje će doprinijeti poboljšanju upravljanja mrežom magistralnih cesta je okončana u 2019, ali se potpisivanje ugovora očekuje početkom 2020 godine.

S druge strane, aktivnosti na unaprijeđenju kapaciteta za upravljanje cestama zabilježile su napredak i očekuje se da će većina predviđenih usluga i nabavka roba biti ugovorene u toku 2020. godine.

Najznačajnije stavke vezano za nabavke u 2019 su:

- U aprilu 2019 započeta je nabavka radova za sanaciju kolovoza i korekciju osovine na dionici Jajce jug - Donji Vakuf i za izgradnju trake za spora vozila na dionici Donji Vakuf - Turbe (Komar)za sa rokom dostave ponuda 15.05.2019. Rok za dostavu ponuda je produžen do 27.05.

JP CESTE FEDERACIJE BIH

2019. Obavjeti o namjeri dodjele ugovora za radove za sanaciju kolovoza i korekciju osovine na dionici Jajce jug - Donji Vakuf JV Euroasfalt d.o.o. Sarajevo / BBM d.o.o. Sarajevo, BiH i ugovora za radove izgradnju trake za spora vozila na dionici Donji Vakuf - Turbe (Komar) JATA Group d.o.o. Srebrenik, BiH izdate su 24.06. 2019. Rok za podnošenje žalbi istekao je početkom jula 2019;

- U maju 2019 pribavljena je ponuda od Dynatest za direktno ugovaranje za zamjenu/popoljšanje postojeće opreme na mjernom vozilu u vlasništvu JP Ceste FBIH;
 - U junu 2019 započeta je nabavka radova za izgradnju ceste Stari Neum-Drenovac LOT 3 (Broćanac-Prapratnica);
 - U junu 2019 otvorene su ponude za nekonsultantske usluge za vanjsku kontrolu za poboljšanje/rehabilitaciju cesta i poboljšanje sigurnosti prometa;
 - U junu 2019 započeta je nabavka opreme za razvoj sistema upravljanja cestovnom imovinom (RAMS);
 - U junu 2019 započet je proces predkvalifikacije za (i) tehničku pomoć za procjenu osjetljivosti cestovne mreže i (ii) tehničku reviziju.
- U aprilu 2019 objavljen je poziv za dostavu ponuda za Tender paket 2-Sanacija/rekonstrukcija 15 mostova na magistralnim cestama koji se finansiraju iz kredita EBRD. Nabavka radova podjeljena je u 5 Lot-ova i to: Lot 1 Sanacija mostova na M-1.8 Srebrenik –Šički Brod 3 most preko potoka Urvenica,Srebrenik, most preko rijeke Tinje, Drenik, most preko željezničke pruge Brčko-Banovići, Pelagićevo –Srebrenik most preko rijeke Velika Tinja Špionica Gornja, most preko Špioničkog potoka Špionica Donja; Lot 2 rekonstrukcija mostova na M-4 Teslić (Barić) –Karuše most preko potoka Radušica i M-17 Nemila 0 –Lašva 1 most preko rijeke Bosne, petlja Zenica;Lot 3 rehabilitacija mosta na M-20 Obilaznica Goražde most preko rijeke Drine; Lot 4 sanacija mostova na M-5 Jajce jug-Donji Vakuf 1 most preko potoka Rika, Skela, most preko Sandžačke rijeke; Nević polje-kaonik sanacija mosta preko rijeke Bile, Stara Bila i granica BiH/HR (Izačić) –Bihać 4 most preko potoka Mrižnica,Kamenica; Lot 5 sanacija mostova na M 5 Vitalj-Olovo most preko rijeke Drinjače u Kladnju i M-18 Olovo –Semizovac most preko rijeke Ljubine ,autoput Jošanica 1-Stup 1 most preko rijeke Bosne u Reljevu. Rok za podnošenje ponuda bio je 31.05.2019, ali je isti produžen do 17.06.2019.
- U januaru 2019 dostavljen je zahtjev za dostavu ponuda pretkvalificiranim Konsultantima za usluge nadzora I tranša kredita. Krajnji rok za dostavu ponuda bio je 12.04.2019. Sačinjen je izvještaj o procjeni ponuda sa prijedlogom za dodjelu Ugovora, te pribavljena saglasnost EBRD za dodjelu Ugovora.

JP CESTE FEDERACIJE BIH

2. Izgradnja traka za spora vozila									
2.1	M-5	003	Ripač – Dubovsko	Izvođenje	2.934.000	-	-	-	-
				Nadzor	131.000		JV Divel d.o.o. Sarajevo, IG d.o.o. Banja luka IGH d.o.o.Mostar, 01-02-3-5708/18, 17.07.2018.	218.755	
				Ukupno					
2.2	M-5	006	Bosanski Petrovac - Ključ – prevoj Lanište	Izvođenje	4.647.000	1.534.000	Euro-Asfalt d.o.o.Sarajevo, 01-02-3-3180/19. 19.03.2019.	4.468.663	833.467
				Nadzor	189.900	64.000	JV Divel d.o.o. Sarajevo, IG d.o.o. Banja luka IGH d.o.o.Mostar, 01-02-3-5708/18, 17.07.2018.	189.879	47.588
				Kamata					8.383
				Ukupno					889.438
2.3	M-5	010	Donji Vakuf-Turbe (Komar)	Izvođenje	2.934.000	-	Jata Group d.o.o.Srebrenik, 01-02-3-10112/19. 26.08.2019.	3.835.791	-
				Nadzor	146.000	-	JV Divel d.o.o. Sarajevo, IG d.o.o. Banja luka IGH d.o.o.Mostar, 01-02-3-5708/18, 17.07.2018.	243.061	-
2.4	M-6.1		Posušje –Grude-Široki Brijeg	Izvođenje	3.755.000	-			
				Nadzor	168.000	-	JV Divel d.o.o. Sarajevo, IG d.o.o. Banja luka IGH d.o.o.Mostar, 01-02-3-5708/18, 17.07.2018.	280.006	-
2.5	M-14.2	003	Bos.Petrovac-Drvar	Izvođenje	978.000	-			
				Nadzor	43.800	-	JV Divel d.o.o. Sarajevo, IG d.o.o. Banja luka IGH d.o.o.Mostar, 01-02-3-5708/18, 17.07.2018.	87.502	-
2.6	M-14.2	004	Drvar-Resanovci	Izvođenje	782.000	-			
				Nadzor	35.000	-	JV Divel d.o.o. Sarajevo, IG d.o.o. Banja luka IGH d.o.o.Mostar, 01-02-3-5708/18, 17.07.2018.	70.002	-
2.8	M-15	008 i 010	Livno-Šuica-Kupres, Borova Glava+ Trivunove krivine	Izvođenje	3.300.000	-			
				Nadzor	147.000	-	JV Divel d.o.o. Sarajevo, IG d.o.o. Banja luka IGH d.o.o.Mostar, 01-02-3-5708/18, 17.07.2018.	245.005	-
3. Rekonstrukcije ceste i kolovozne konstrukcije, korekcija osovine									
3.2	M-5	009	Jajce jug-Donji Vakuf , presvlačenje i ispravka osovine	Izvođenje	4.834.000	1.000.000	JVEuro Asfalt d.o.o.Sarajevo i BBM d.o.o.Sarajevo, 01-02-3-9997/19. 21.08.2019.	7.092.070	-
				Nadzor	216.000	37.000	JV Divel d.o.o. Sarajevo, IG d.o.o. Banja luka IGH d.o.o.Mostar, 01-02-3-5708/18,	308.882	4.253

2.2.1 Tehnička pomoć pri implementaciji projekta

Roughton International Ltd. je angažovan za pružanje konsultantskih usluga tehničke pomoći PIMT-u. Opšti cilj pomoći za JP Ceste FBiH i njegovom PIMT-u je da se obezbijedi stručno savjetovanje i pomoć, efikasna i optimalna koordinacija aktivnosti u okviru Projekta, posebno u oblasti nabavki radova, roba i usluga u skladu sa procedurama nabavki Banaka, a nakon toga i pomoć u realizaciji ugovora, administraciji i nadzoru u periodu 2017-2021. godina.

Usluge se realizuju putem svakodnevne komunikacije i kroz blisku saradnju između dugoročno angažovanog stručnjaka i PIMT-a. Konsultant je takođe obezbijedio dostupnost kratkoročno angažovanih eksperta koji će biti angažovani u toku Projekta ukoliko bude neophodno.

2.2.2 Tehnička pomoć za procjenu osjetljivosti cestovne mreže na klimatske promjene

Ciljevi ovog zadatka su:

- izvršiti procjenu rizika na magistralnoj cestovnoj mreži FBiH i dostaviti JP Ceste FBiH informacije o mogućem budućem riziku od oštećenja i poremećaja od strane različitih vrsta klimatskih opasnosti, uključujući poplave, klizišta, odrone, požare i sniježne padavine;
- proceniti kritičnost svake lokacije pod rizikom;
- integrisati procjenu rizika u sistem upravljanja cestovnom imovinom (RAMS);
- predložiti spisak intervencija (npr. održavanje, rehabilitacija, itd.) koje će biti uključene u godišnje programe radova JP Ceste FBiH.

Poziv za izjavu interesa objavljen je 28.06.2019. godine sa rokom podnošenja izjava interesa ponuda 22.07.2019. godine. Do roka za podnošenje, dostavljeno je 9 izjava interesa. Komisija je sačinila izvještaj sa kratkom listom konsultanata. U cilju pribavljanja većeg broja zainteresovanih konsultanata i ostvarenja konkurentnosti, WB je preporučila da se ponovno objavi poziv za izjavu interesa.

2.2.3 Instalacija inklinometara i monitoring za tunel Crnaja M-17

Konsultant je u avgustu 2018.godine instalirao 7 inklinometara. Nulta mjerena za sve inklinometre su obavljena u septembru 2018. godine, a nakon toga uslijedila su mjesecna mjerena. Dosada su zabilježena samo manja pomjeranja tla (samo nekoliko milimetara) i prema mišljenju stručnjaka za praćenje, ne pokazuju značajne promjene osim onih koje se odnose na sezonske promjene toka podzemnih voda i vlažnosti/zasićenosti tla.

4.2.4 Vanjska kontrola kvalitete za radove izgradnje ceste Stari Neum-Drenovac

Ugovor za ove usluge je potpisana 22.04.2019. godine sa JV IGMAT d.o.o. Ljubljana, Slovenija/DTQ d.o.o. Sarajevo, BiH/IGH d.o.o. Mostar, BiH za iznos od 705.015,00 KM (bez PDV-a).

Konsultant je mobilisao svoje osoblje i opremu i ugovor je u implementaciji. Svi rezultati vanjske kontrole kvalitete se dostavljaju konsultantu za nadzor i čuvaju se na gradilištu.

2.2.5 Vanjska kontrola kvalitete – ostali projekti obuhvaćeni modernizacijom

Zahtjev za dostavu ponuda je izrađen i poslat Bankama 12.03.2019. godine na pregled i odobrenje, a nakon toga je Zahtjev za dostavu ponuda izdat 16.04.2019. godine. Do roka za podnošenje ponuda (3.06.2019. godine) dostavljene su dvije ponude.

Nakon konsultacija sa WB sačinjen je prijedlog za odbacivanje svih ponuda i raspisivanje novog oglasa koji čeka odobrenje WB, kako bi se krenulo u dalju proceduru.

2.3. Robe

Red. Br.	N A Z I V	Plan 2019.	Rebalans Plana 2019.	Realizovano 2019.	Napomena
1.	Nabavka opreme za unapređenje prikupljanja podataka o stanju kolovoza	685.000	99.800	-	
2.	Nabavka hardvera i softvera za sistem upravljanja cestovnom imovinom	660.000	-	-	Finansiranje 100% WB
3.	Nabavka opreme za praćenje klimatskih promjena	782.000	-	-	
U K U P N O		2.127.000	99.800		

2.3.1 Nabavka opreme za prikupljanje podataka o kolovozima

Planirana je zamjena i/ili nabavka opreme za poboljšanja postojeće opreme na vozilu za snimanje stanja kolovoza u vlasništvu JP Ceste FBiH u cilju postizanja pune funkcionalnosti.

U saradnji sa Svjetskom bankom dogovoreno je da se nabavka podijeli u dvije faze – jedna faza odnosi se na zamjenu/poboljšanje postojeće opreme, a druga na nabavku nove opreme za mjerjenja hrapavosti i defleksija kolovoza.

Tokom prvog kvartala 2019.godine, JP Ceste FBiH je bilo u komunikaciji sa dobavljačem postojeće opreme Dynatest u cilju definiranja aranžmana za direktno ugovaranje, obzirom da kompanija najbolje poznaje specifične elemente za koje je neophodna popravka/zamjena i/ili nadogradnja.Nakon izdavanja Poziva za ponudu 21.05.2019. godine, JP Ceste FBiH je zaprimilo ponudu od Dynatest. PIMT je finalizirao ugovor za ovu isporuku i poslao ga na potpis dobavljaču 17.09.2019. godine. Međutim, tokom oktobra 2019. godine Dynatest je obavijestio PIMT da potpisivanje ugovora mora biti odloženo zbog finansijskih okolnosti (bankrot). U međuvremenu je kompanija dobila novog vlasnika i sredinom decembra 2019. godine je potvrđila da će moći da ispunji uslove definisane u ugovoru. Očekuje se potpisivanje ugovora u prvom kvartalu 2020.

Poziv za ponude za nabavku nove opreme objavljen je 24.10.2019. godine sa rokom za podnošenje ponuda 5.12.2019. godine. Do roka za podnošenje ponuda dostavljena samo jedna ponuda. U toku procjena ponude u cilju utvrđivanja prihvatljivosti ponude Očekuje se da će ugovor za ovu nabavku biti potписан u prvom kvartalu 2020. godine.

2.3.2 Razvoj sistema za upravljanje cestovnom imovinom (kupovina i instalacija hardvera i softvera)

Poziv za dostavljanje ponuda je objavljen 27.06.2019. godine, sa rokom podnošenja ponuda 8.08.2019. godine. Do roka za podnošenje, dostavljene su dvije ponude. Tokom procjene ponuda utvrđeno je da jedna ponuda ne ispunjavaju postkvalifikacione zahtjeve i Komisija za procjenu ponuda sačinila je prijedlog za dodjelu ugovora JV TeleGroup d.o.o. Banja Luka, BiH/Deighton Ltd., Whitby, USA za korigovani iznos od 784.963,17 EUR. U zadnjem kvartalu 2019 vođeni su pregovori sa odabranim ponuđačem, obzirom da je ponuđač tražio promjenu uvjeta plaćanja u odnosu na prijedlog ugovora za koji je dobijena saglasnost Svjetske banke.

2.3.3 Nabavka opreme za praćenje klimatskih promjena

Nabavka opreme je pokrenuta 22.07.2019. godine sa rokom podnošenja ponuda 2.09.2019. godine. Do roka za podnošenje ponuda dostavljene su dvije ponude. Komisija za procjenu ponuda je utvrdila da obje ponude ispunjavaju zahtjeve iz dokumenata ponude i sačinila prijedlog da se ugovor dodjeli Alem system d.o.o. Sarajevo, BiH u iznosu od 722.225 KM. Očekuje se da ugovor za ovu isporuku bude potpisana u prvom kvartalu 2020. godine.

Kamate na međunarodne kredite

Red. Br.	N A Z I V	Plan 2019.	Rebalans Plana 2019.	Realizovano 2019.	Napomena
1.	Kamate i servisni troškovi za program „Modernizacija cesta u FBIH“	975.000	520.000	530.855	Vlastita sredstva
U K U P N O		975.000	520.000	530.855	

U skladu sa Ugovorom o zajmu između Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i BiH zajam je podložan promjenljivoj kamatnoj stopi EURIBOR + 1% marže. Datumi plaćanja kamate 15. mart i 15. septembar svake godine.

U skladu sa kreditnim sporazumom između Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) i BiH koji je efektivan od 4.10.2017. kredit podliježe promjenljivoj kamatnoj stopi plus varijabilni raspon. Datumi plaćanja kamate 15. februar i 15. august svake godine.

Za povlačenje I i II tranše kredita EIB-a, u koordinaciji sa Federalnim ministarstvom finansija, odabrana je fiksna kamatna stopa (I tranša 1,558 %; II tranša 1,507%).

Revolving sredstva za PDV

U skladu sa odredbama člana 29. Zakona o porezu na dodanu vrijednost i instrukcijom Uprave za indirektno oporezivanje o uslovima i načinu povrata PDV-a po osnovu uvoza i isporuke dobara, nabavke radova i usluga za međunarodne projekte, može se ostvariti povrat PDV-a uz podnošenje propisane dokumentacije i dokaza o uplati PDV-a. Obzirom da se radi o povratnim sredstvima, plaćanje istih će se vršiti iz tekućeg priliva sredstava, a nadopunjavati povratom sredstava od Uprave za indirektno oporezivanje.

**REKAPITULACIJA PLANIRANIH ULAGANJA ZA
PROGRAM „MODERNIZACIJA CESTA U FBIH“**

Red br.	OPIS	Plan 2019.						Rebalans Plana 2019.						Realizovano 2019.				
		EIB	EIB + WB	EBRD	WB	EIB+WB +EBRD	UKUPNO	EIB	EIB + WB	EBRD	WB	UKUPNO	EIB	EIB + WB	EBRD	WB	UKUPNO	
I	Radovi	3.759.000	75.733.000	25.750.800			105.242.800	3.871.000	41.137.300	7.936.000		52.944.300	4.220.986	36.005.811	4.220.986		44.521.505	
1.	Troškovi nadzora	215.000	3.563.100	637.900			4.416.000	463.000	2.355.400	81.000		2.899.400	459.596	2.714.572			3.174.168	
2.	Vanjska kontrola		300.000			350.000	650.000		128.000			128.000		137.102			137.102	
3.	Monitoring tunela Crnaja				43.000		43.000				41.600	41.600				45.360	45.360	
4.	Tehnička pomoć pri implementaciji projekta	85.000					85.000	101.000				101.000	100.085				100.085	
5.	Tehnička pomoć za procjenu osjetljivosti cestovne mreže na klimatske promjene				235.000		235.000				46.500	46.500						
II	Konsultantske usluge – ukupno	300.000	3.863.100	637.900	278.000	350.000	5.429.000	564.000	2.483.400	81.000	88.100	3.216.500	559.681	2.851.674			3.456.715	
III	Robe				2.127.000		2.127.000				99.800	99.800						
IV	SVEUKUPNO (I+II+III)	4.059.000	79.596.100	26.388.700	2.405.000	350.000	112.798.800	4.435.000	43.620.700	8.017.000	187.900	56.260.600	4.854.389	38.857.485	4.220.986	45.360	47.978.220	

3. Projekti JP Ceste F BiH
3.1. Projekti iz prethodnog perioda
3.1.1. Projekti rekonstrukcije i izgradnje

Red Br.	Mag. Cesta	Naziv i opis projekta	Aktivnosti na projektu	Plan 2019.	Rebalans Plana 2019.	Izvođač/ Konsultant - ugovor	Ugovorenog	Realizovano 2019.	Napomena
1.	M-14	Obilaznica Bihaća: - Glavni projekat za dionicu: Jablanska ulica – čvor Mali Lug – veza na M-14	Projektovanje	18.700	18.700	Institut za grad. IG d.o.o. Banja Luka, 01-02.1-876/18. 02.02.2018.	18.498	-	Čeka saglasnost JP Željeznice FBiH
			Revizija	4.500	5.500	Trasa d.o.o. Sarajevo 01-02.1-7451/16, 24.08.2016. i 01-02.1-8353/18 TF 03.10.2018.	4.446 889	5.335	
			Ukupno					5.335	
2.	M-4.2	Obilaznica Cazina - Glavni projekti objekata	Projektovanje	50.000	50.000	Divel d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-2002/18. 13.03.2018.			
			Potputnjak Osrednjak				25.177 (preneseno 607)	-	
			Natputnjak				35.967 (preneseno 867)	-	
			Vijadukt 1				65.339 (preneseno 10.583)	8.424	Okončano (nije situirano)
			Vijadukt 2				65.339 (preneseno 26.362)	25.373	
			Revizija	6.200	6.200	Trasa d.o.o. Sarajevo 01-02.1-5909/18, 25.07.2018.	6.201	6.201	
3.	M-5	Obilaznica Kiseljaka - Glavni projekt trase i mosta preko rijeke Lepenice	Ukupno					39.998	
			Projektovanje	8.000	40.000	Trasa d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-3500/18. 03.05.2018.	39.727	39.727	Okončano
			Revizija	4.700	4.700	Ipsa Institut d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-7599/18. 06.09.2018.	4.680	4.680	
4.	M-5	Obilaznica Donjeg Vakufa - Gl. Projekt rekonstrukcije mosta preko Oboračkog potoka (u raskrsnicu)	Ukupno					44.407	
			Projektiranje	11.800	-			-	Okončano u 2018.
			Revizija	1.200	-			-	
5.	M-17.3	Izrada idejnog rješenja Obilaznice Stoca Obilaznica Stoca L=cca 11 km - Priprema geotehnička studija (Misija G1) - Izrada idejnog rješenja, dionica Masline- Potplat L=cca 7km - Izrada idejnog projekta, dionica Potplat-Stolac istok L=cca 4km	Konsultantske usluge	6.500	6.500				
			Projektovanje	7.000	7.000	Integra d.o.o. Mostar, 01-02.1-2124/19. 19.02.2019.	6.904	-	Okončano Nije situirano
			Projektovanje	6.500	7.000	Design & QC d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-2123/1-19. 19.02.2019.	6.903	6.903	
			Ukupno					6.903	
			Projektovanje	115.000	215.000			-	Projektni zadatak i Tender u pripremi
6.	M-4.2	Izrada idejnog i glavnog projekta izgradnje veze obilaznica Cazina(Mihaljevac) i Bihaća (Kamenica) L= cca14km	Revizija	10.000	15.000			-	
			Projektovanje	7.000	6.800	Design & QC d.o.o. Sarajevo. 01-02.1-10335/18, 21.11.2018.	6.786	6.786	Okončano
7.	M-14	Idejno rješenje obilaznice Bosanska Otoka (veza cesta M-14 i R 401)	Projektovanje	40.000	34.000	Saraj inženjering d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-11583/19. 02.10.2019.	33.895	-	U toku
8.	M-15	Idejni -projekat izgradnje ceste M-15, dionica Vrhpolje – Donje Sokolovo – Crjeni,	Projektovanje						

JP CESTE FEDERACIJE BIH

9.	M-4	Izrada elabota zaštite od buke na M-4, dionica: Šiški brod- Tuzla	Konsult. Usluge	3.000	3.500	Dvokut Pro d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-835/19. 18.01.2019.	3.510	3.510	Okončano
10.	M-17.3	Izgradnja ceste Neum-Stolac, dionica Broćanac – Cerovica – Drenovac	Konsult. usluge	6.500	6.500				Ugovoreno u okviru kredita
-		Vanska kontrola ugrađenih materijala i izvedenih radova na LOT-u 2							
-		Glavni projekat ukrštanja lokalne ceste i ceste M17.3, u mjestu Oštrovac , dionica Kišev-Broćanac	Revizija	1.500	1.500				
11.	M-6.1	Obilaznica Mostara, - Glavni projekti objekata-mostova na dionici Miljkovići-Rodoč-veza na M-17 (vijadukt Rodoč L=2x168m, podvožnjak Bulevar L=107m, podvožnjak Aluminij L=2x16,2m, Avijatičarski 2-novi L=133m, Avijatičarski –rekonstrukcija L=133m, nadvožnjak M17 L=122m, nadvožnjak iznad željezničke pruge L=2x30,32m)	Projektiranje	500.000	490.000	Integra d.o.o. Mostar, 01-02.1-6732/19. 05.06.2019.		U toku	
			- vijadukt Rodoč				99.719	76.196	
			avijatičarski most				95.735	22.117	
			podvožnjak Bulevar				73.958	32.395	
			podvožnjak Aluminij				46.017	18.533	
			nadvožnjak M-17				75.564	25.725	
			nadvožnjak iznad želj.pruge				55.421	15.958	
			aviačitarski 1				41.029	15.004	
			Revizija	35.000	35.000			-	Žalba u toku
			Ukupno					205.928	
12.	M-6.1	Obilaznica Mostara - Glavni projekat trase na dionici Miljkovići-Rodoč-veza na M17 - Prilagodavanje projektogn rješenju faznoj gradnji na potezu ulaz u tunel Privorac do čvora Rodoč u dužini L=cca 1,3km,	Projektiranje	40.000	40.000	Integra d.o.o. Mostar, 01-02.1-2863/19. 13.03.2019.	39.903	39.903	Okončano
			Revizija	2.000	2.000				
			Ukupno					39.903	
13.	M-5	Rekonstrukcija ceste Jajce-Donji Vakuf - Glavni projekat tunela („Cvirkovac“- L=cca 300m, „Vrbas“ – L=cca 212m i „Tortakovac“ L=cca 163m)	Projektiranje	100.000	100.000			-	**Evropska komisija tenderisala izradu gl. projekta
			Revizija	7.000	7.000			-	
14.	M-5	Obilaznica Kiseljaka - Glavni projekat trase (II faza), tunela (L=cca500m) i mosta preko ceste R443 (L=cca 75m) ,Ukupna dužina dionice L=cca 1.100m	Projektiranje	120.000	120.000	Trasa d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-521/19. 14.01.2019	6.350 (projekat trase)	6.350	Projektni zadatak i Tender u pripremi
			Revizija	10.000	10.000				
			Ukupno					6.350	
15.	M-18.1	Rekonstrukcija dijelova ceste M18.1 Ustikolina-Garež,	Izvođenje	250.000	250.000			-	Sufinansir.
			Nadzor	7.000	7.000			-	
16.	M-6	Izgradnja sjeverne obilaznice Gruda - Izmjještanje elektro-energetskih objekata duž trase	Projektiranje	6.000	-			-	Rebalansom nije planirano
			Revizija	1.000	-			-	
17.	M-14.1	Glavni projekat izgradnje dionice ceste Grmuša – Mali Radić, L=8km, uključujući Misiju G21	Projektovanje	-	57.000	Institut za građevinsrštvo IG d.o.o. Banja luka, 01-02.1-5678/18, 17.07.2018.	56.833	Čeka se podloga od BH MAC-a	
			Revizija	-	3.000				
			Ukupno			Trasa d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-10254/18. 20.11.2018.	2.925		
U K U P N O				1.386.100	1.548.900			359.120	

R.br 13- Evropska Komisija tenderisala izradu glavnog projekta Rekonstrukcije ceste Jajce-Donji Vakuf

3.1.2. Rasvjeta i semaforizacija raskrsnica

Red br.	Mag. Cesta	Naziv i opis projekta	Aktivnosti na projektu	Plan 2019.	Rebalans Plana 2019.	Izvodač/ Konsultant - ugovor	Ugovoreno	Realizovano 2019.	Napomena
1.	M-4.2	Rasvjeta raskrsnice cesta M-4.2 i M-14 u Srbnjanim	Projektovanje	7.000	7.000			-	Okončano
			Revizija	1.700	-			-	
			Izvođenje	70.000	69.000	Elektrovod d.o.o. Cazin, 01-02.4-5463/19. 08.05.2019.	68.721	68.614	
			Nadzor	2.000	2.000	Aber Design d.o.o. Sarajevo, 01-01.1-4717/19. 19.04.2019.	2.000	2.000	
			Ukupno					70.614	
2.	M-17	Rasvjeta mosta Begića i Begovića na M-17	Projektovanje	4.000	4.000	Projecta d.o.o. Mostar, 01-02.4-1344/19. 29.01.2019.	3.978	3.978	Projektovanje i revizija okončano Nabavka radova i nadzora u toku
			Revizija	1.700	1.700	Habitat d.o.o. Mostar 01-01-1-10151/19, 26.08.2019.	1.696	1.696	
			Izvođenje	40.000	80.000		-	-	
			Nadzor	1.000	2.000		-	-	
			Ukupno					5.674	
3.	M-17	Rasvjeta raskrsnice u Žitomislićima na M-17	Projektovanje	4.000	4.000	Projecta d.o.o. Mostar, 01-02.4-1343/19. 29.01.2019.	3.978	3.978	Projektovanje i revizija okončano Nabavka radova i nadzora u toku
			Izvođenje	40.000	80.000		-	-	
			Nadzor	1.000	2.000		-	-	
			Revizija	1.700	1.700	Habitat d.o.o. Mostar, 01-01-1-10151/19, 26.08.2019.	1.696	1.697	
			Ukupno					5.675	
UKUPNO				174.100	253.400			81.963	

3.1.3. Poboljšanje sigurnosti prometa na magistralnim cestama izgradnjom traka za lijeva skretanja, pješačkih staza sa odvodnjom kišne kanalizacije, odmorišta i sanacija crnih tačaka

Red Br.	Mag. Cesta	Naziv i opis projekta	Aktivnosti na projektu	Plan 2019.	Rebalans Plana 2019.	Izvodač/ Konsultant - ugovor	Ugovoreno	Realizovano 2019.	Napomena
1.	M-5	Saglasnosti i takse na projekte	Ostalo	50.000	50.000				
						Saglasnost, takse	209	209	
						Design & QC d.o.o. Sarajevo, 2019-0100 19.07.2019.	936	936	
						Taksa	30	30	
		M-17.4 Izgradnja pješačke staze u Ljubuškom				Saglasnost	110	110	

JP CESTE FEDERACIJE BIH

			Ukupno				58.283	
2.	M-15	Rekonstrukcija raskrsnice Gorica u Livnu u kružni tok	Izvođenje	287.000	400.000		-	
			Nadzor	7.000	7.000	Integra d.o.o.Mostar 01-02.1-11589/16, 30.12.2016.	6.903	
			Ukupno				-	Tender za radove u toku
3.	M-14	Rekonstrukcija raskrsnice na cesti M-14_001, (dionica: Bihać – Srbljani) i lokalne ceste za naselje Brekovica sa izgradnjom-mosta preko rijeke Une, km7+830	Izvođenje	1.300.000	1.300.000		-	
			Nadzor	31.000	31.000	Konzorcij: Divel d.o.o. Sarajevo, Ipsa Institut d.o.o. Sarajevo i IG Institut d.o.o. Banja luka, 01-02.2-5967/16, 11.07.2016.	-	U toku ishodovanje saglasnosti za gradnju
			Ukupno				-	
4.	M-5	Rekonstrukcija raskrsnice na obilaznici Viteza	Izvođenje	267.000	267.000	Ceste-Company d.o.o. Kiseljak, 01-02.2-7232/18, 23.08.2018.	266.565	245.167
			Nadzor	15.000	15.000	Konzorcij: Divel d.o.o. Sarajevo, Ipsa Institut d.o.o. Sarajevo i IG Institut d.o.o. Banja luka, 01-02.2-5967/16, 11.07.2016.	14.625	14.625
			Ukupno					259.792
5.	M-14.1	Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok Odžak	Revizija	-	3.000	Aber Design d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-2370/19, 27.02.2019.	2.984	2.984
			Izvođenje	240.000	240.000	Balegem d.o.o. Gradačac, 01-02.2-10404/16, 22.11.2016.	239.547	239.547
			Nadzor	17.000	17.000	Konzorcij: Divel d.o.o. Sarajevo, Ipsa Institut d.o.o. Sarajevo i IG Institut d.o.o. Banja luka, 01-02.2-5967/16, 11.07.2016.	16.731	
			Ukupno					242.531
6.	M-18	Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok na Šipu, sa izmještanjem dijela Ulice Alipašina, općina Centar, Sarajevo	Izvođenje	500.000	500.000		-	
			Nadzor	30.000	30.000		-	U toku ishodovanje saglasnosti za gradnju
7.	M-5 012	Rekonstrukcija raskrsnice sa M-5 i R-441 (Vjetrenica), općina Vitez	Projektovanje	6.500	4.700	GP:IPSA Institut d.o.o.Sarajevo, Divel d.o.o.Sarajevo, INK Constructor d.o.o. Banja luka,Geoput d.o.o. Banja luka, 01-02.2-6795/17, 26.07.2017.	9.272 (preneseno 4.636)	4.636
			Revizija	1.000	1.000	Design & QC d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-651/19, 15.01.2019.	936	936
			Ukupno					5.572
8.	M-17.3 003	Hutovo – Neum, potez prolaz kroz Neum, rješavanje oborinske kanalizacije na postojećoj cesti, L=1,2km (Ifaza)	Izvođenje	300.000	347.500	HP Investing d.o.o. Mostar 01-02.4-8543/18, 05.10.2018. Anex 01-02.4-9917/19. 19.08.2019	323.052 24.453	347.505
			Nadzor	7.000	6.200	Integra d.o.o.Mostar, 01-02.4-3528/18. 03.05.2018.	6.786	6.786

JP CESTE FEDERACIJE BIH

			Ukupno				354.291	
9.	M-6.1	Rekonstrukcija raskrsnice na M6.1 sa lokalnom cestom za Blagaj, km 2+000 - Izrada geotehničkog elaborata (misija G1 i G21)	Projektovanje	7.400	7.400	GP:IPSA Institut d.o.o.Sarajevo, Divel d.o.o.Sarajevo, INK Constructor d.o.o. Banja luka,Geoput d.o.o. Banja luka, 01-02.2-6795/17, 26.07.2017.	14.800 (preneseno 7.440)	7.400
			Revizija	1.800	1.800	IG d.o.o. Banja luka, 01-02.2-7945/18, 14.09.2018	1.778	-
			Konsult usluge	-	3.000	Inteprojekt d.o.o. Mostar, 01-02.4-13206/19. 13.11.2019.	2.808	2.808
			Izvođenje	300.000	300.000			-
			Nadzor	7.000	7.000			-
			Ukupno					10.208
						GP:IPSA Institut d.o.o.Sarajevo, Divel d.o.o.Sarajevo, INK Constructor d.o.o. Banja luka,Geoput d.o.o. Banja luka, 01-02.2-6795/17, 26.07.2017.	14.683 (preneseno 7.342)	-
10.	M-5 M-15	Rekonstrukcija raskrsnica cesta M-5 i M15 izlaz iz Ključa	Projektovanje	7.400	7.400	IG d.o.o. Banja luka, 01-02.2-7945/18, 14.09.2018	1.779	-
			Ukupno					-
11.	M-4	Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok na M-4, ulaz u Lukavac	Projektovanje	11.600	9.700	GP:IPSA Institut d.o.o.Sarajevo, Divel d.o.o.Sarajevo, INK Constructor d.o.o. Banja luka,Geoput d.o.o. Banja luka, 01-02.2-6795/17, 26.07.2017.	19.334 (preneseno 9.667)	9.667
			Revizija	1.800	1.800	IG d.o.o. Banja luka, 01-02.2-7945/18, 14.09.2018	1.778	-
			Ukupno					9.667
12.	M-5	Izgradnja pješačke staze uz M-5, 001 granica BiH/ RH – Izačić – Bihać u naseljenom mjestu Izačić, L=1,2km	Projektovanje	7.000	7.000	Design &QC d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-11478/18. 19.12.2018.	6.903	6.903
			Revizija	2.000	2.000	Geofeld d.o.o. Bihać, 01-02.2-3255/19. 21.03.2019.	1.989	1.989
			Ukupno					8.892
13.	M-5	Rekonstrukcija raskrsnice cesta M-14.2 i M-5 u Bosanskom Petrovcu	Projektovanje	9.700	9.700	GP:IPSA Institut d.o.o.Sarajevo, Divel d.o.o.Sarajevo, INK Constructor d.o.o. Banja luka,Geoput d.o.o. Banja luka, 01-02.2-6795/17, 26.07.2017.	19.334 (preneseno 9.667)	9.667
			Revizija	1.800	1.800	IG d.o.o. Banja luka, 01-02.2-7945/18, 14.09.2018	1.779	-
			Izvođenje	420.000	420.000			-

JP CESTE FEDERACIJE BIH

			Nadzor	10.000	10.000			-	
			Ukupno					9.667	
14.	M-5	Rekonstrukcija raskrsnice M-5 i lokalne ceste u Travniku (Plava voda)	Projektovanje	7.400	10.400	GP:IPSA Institut d.o.o.Sarajevo, Divel d.o.o.Sarajevo, INK Constructor d.o.o. Banja luka,Geoput d.o.o. Banja luka, 01-02.2-6795/17, 26.07.2017.	17.724 (preneseno 10.362)	7.362	
			Revizija	1.800	1.800	IG d.o.o. Banja luka, 01-02.2-7945/18, 14.09.2018	1.778	-	
			Ukupno					7.362	
15.	M-14	Rekonstrukcija raskrsnice M-14 i Ulice Prvomajska u Bosanskoj Krupi	Izvođenje	173.000	171.000	I-Selimović d.o.o Cazin, 01-02.2-2104/19, 19.02.2019. 01-02.2-14862/19. 31.12.2019.	170.806 17.252	190.988	
			Nadzor	5.500	5.500	Geofeld d.o.o. Bihać, 01-02.2-368/19. 10.01.2019.	5.440	5.440	Okončano
			Ukupno					196.428	
16.	M-18	Rekonstrukcija raskrsnice na M-18 010 Kobilja Glava-Sarajevo – Malta km 8+340	Projektovanje	8.500	8.500	GP:IPSA Institut d.o.o.Sarajevo, Divel d.o.o.Sarajevo, INK Constructor d.o.o. Banja luka,Geoput d.o.o. Banja luka, 01-02.2-6795/17, 26.07.2017.	14.169 (preneseno 7.084)	7.084	
			Revizija	3.000	3.000	Aber Design d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-11579/18, 24.12.2018.	2.925	2.925	Projekt. i revizija okončano, Nabavka za radove u toku
			Izvođenje	420.000	420.000			-	
			Nadzor	10.000	10.000			-	
			Ukupno					10.009	
17.	M-17	Izvođenje radova na rekonstrukciji raskrsnice sa pješačkim stazama na M-17 dionica: Jablanica – Mostar, mjesto Vrapčići	Izvođenje	400.000	290.000	HP Investing d.o.o. Mostar, 01-02.4-5335/19. 07.05.2019.	287.235	287.165	
			Nadzor	7.000	7.000	Interprojekt d.o.o. Mostar, 01-02.4-160/19. 05.02.2019.	6.903	6.903	Okončano
			Ukupno					294.068	
18.	M-15 007	Igradnja pješačke staze uz magistralnu cestu M-15 u naselju Priluka, općina Livno	Izvođenje	75.000	75.000	Livnoputevi d.o.o. Livno, 01-02.2-8204/18, 26.09.2018.	235.675 (preneseno 74.979)	74.956	
			Nadzor	3.500	2.200	Geo-data d.o.o. Mostar, 01-01.1-8357/18. 01.10.2018.	6.950 (preneseno 2.211)	2.210	Okončano
			Ukupno					77.166	
19.	M-17	Izgradnja pješačke staze Karuše – Mravići	Projektovanje	7.000	15.000			-	
			Izvođenje	190.000	250.000			-	
			Nadzor	7.000	7.000			-	
			Ukupno					-	
20.	M-18	Rekonstrukcija raskrsnice M-5 i M-18 Jošanica u kružni tok	Izvođenje	1.083.000	1.083.000	Bosman d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-9077/18, 22.10.2018.	1.082.992	1.080.516	Okončano

JP CESTE FEDERACIJE BIH

			Nadzor	17.000	17.000	IG d.o.o. Banja luka, 01-02.2-2055/19. 18.02.2019.	13.806	13.774	
			Ukupno					1.094.290	
21.	M-4	Rekonstrukcija raskrsnice u naselju Klokotnica, II faza	Projektovanje	7.000	7.000	Artinq BH d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-7541/18, 05.09.2018.	7.000	7.000	Okončano
			Revizija	1.000	1.000	Aber Design d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-650/19. 15.01.2019.	999	999	
			Izvođenje	291.000	288.000	Dobojputevi d.d. Doboj jug, 01-02.2-9370/19. 02.08.2019.	287.788	287.788	
			Nadzor	6.000	8.000	Divel d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-9371/19. 02.08.2019.	7.956	7.956	
			Ukupno					303.743	
22.	M-5	Rekonstrukcija ceste M-5, potez Kamenica – Bedem sa rekonstrukcijom raskrsnica i izgradnjom pješačkih i biciklističkih staza	Projektovanje	28.100	23.000	INK Construktur d.o.o. Banja luka 01-02.2-1767/19. 08.02.2019.	22.932	22.932	Okončano
23.	M-6.1	Rekonstrukcija raskrsnice M-6.1 i R-420 u naseljenom mjestu Vinjani, općina Posušje	Projektovanje	7.000	8.300	Geoput d.o.o.Banjaluka, 01-02.2-8996/18, 19.10.2018. Anex 01-02.2-7927/19. 03.07.2019.	6.669 1.267	6.669 1267	Projektov. i revizija okončano
			Revizija	2.000	2.000	Interprojekt d.o.o. Mostar, 01-01.1-2706/19. 11.03.2019.	1.989	1.989	Nabavka radova i nadzora u toku
			Izvođenje	350.000	400.000			-	
			Nadzor	7.000	7.000			-	
			Ukupno					9.925	
24.	M-14	Rekonstrukcija raskrsnice magistralnih cesta M-14 i M-14.2 u Bosanskoj Krupi	Projektovanje	15.000	7.000	Geoput d.o.o.Banja luka, 01-02.2-2730/19. 11.03.2019.	5.780	-	Ugovor raskinut zbog neizvršavanja obaveza
25.	M-16.2	Izgradnja pothodnika na M16.2 (skretanje za naselje Podgrađe), dionica: Prozor/Rama-G.Vakuf/Uskoklje	Izvođenje	280.000	280.000	Hering d.d. Široki Brijeg 01-02.2-11493/18. 20.12.2018.	279.089	-	Okončani imovinsko-pravni odnosi krajem 2019. godine Dobijena dozvola za gradnju
			Nadzor	6.000	7.000	Arting BH d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-1930/19. 13.02.2019.	5.522	-	
			Ukupno					-	
26.	M-4.2	Izgradnja pješačke staze na dionici Barake – Mala Kladuša – Marjanovac	Izvođenje	290.000	288.000	Kov-Grad d.o.o.Bužim, 01-02.2-8203/18, 26.09.2018.	287.820	287.702	Okončano
			Nadzor	7.000	7.000	DTQ d.o.o. Sarajevo, 01-01.1-9535/18, 01.11.2018.	6.669	6.669	
			Ukupno					294.371	
27.	M-4.2	Rekonstrukcija raskrsnice Todorovo, općina Cazin	Revizija	-	2.000	Aber Design d.o.o.Sarajevo, 01-02.4-10936/19. 13.09.2019.	1.989	-	U toku
			Izvođenje	800.000	1.000.000	BC-Gradnja d.o.o. Bosanska Krupa,01-02.4-12641/19. 29.10.1019.	999.765	303.588	
			Nadzor	15.000	15.000	DTQ d.o.o.Sarajevo, 01-02.4-12640/19. 29.10.2019.	14.567	4.428	
			Ukupno					308.016	

JP CESTE FEDERACIJE BIH

28.	M-14.1	Rekonstrukcija raskrsnice na M-14.1 i M-1.9 na ulazu u Gradačac	Projektovanje	7.000	7.000			-
			Revizija	3.000	3.000			-
			Izvođenje	400.000	400.000			-
			Nadzor	7.000	7.000			-
			Ukupno					-
29.	M-5	Rekonstrukcija raskrsnice M-5 i ulice Hanlovska u Ključu, km 18+600	Projektovanje	4.000	4.000	Geofeld d.o.o.Bihać, 01-02.2-11771/18, 27.12.2018.	4.000	4.000
30.	M-5	Izgradnja pješačke staze (Rakovica) sa sanacijom kolovoza i rješavanjem odvodnje (I faza)	Izvođenje	400.000	472.000	Braća Mujić,d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-7829/19. 01.07.2019.	392.739	392.729
			Nadzor	7.000	7.000	Pronasa d.o.o. Sarajevo, 01-01.1-2707/19. 11.03.2019.	6.903	6.903
			Ukupno					399.632
31.	M-6	Izgradnja pješačke staze u naselju Ružići, općina Grude, L = 1,0 km	Izvođenje	150.000	101.600	Putovi d.o.o. Grude, 01-02.2-8182/18, 25.09.2018.	272.477 (preneseno 101.936)	101.558
			Nadzor	3.500	2.600	Integra d.o.o. Mostar, 01-02.4-6985/18, 15.08.2018.	6.903 (preneseno 2.582)	2.582
			Ukupno					104.140
32.	M-14	Izgradnja pješačkih staza uz M-14_001: Bihać – Srbljani u naselju Kostela	Izvođenje	200.000	199.000	Behić Sanny Boy d.o.o.Bihać, 01-02.2-11292/18, 14.12.2018.	198.990	198.669
			Nadzor	7.000	6.900	DTQ d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-11830/18. 28.12.2018	6.845	6.845
			Ukupno					205.514
33.	M-14.2	Izgradnja pješačke staze u Orašju, L = 1,0 km	Izvođenje	305.000	305.000	Galax-Niskogradnja d.d. Brčko, 01-02.2-8193/18, 26.09.2018.	304.083	282.579
			Nadzor	7.000	6.900	AIK-Inžinjering d.o.o. Banovići, 01-02.2-8257/18, 27.09.2018.	6.845	6.845
			Ukupno					289.424
34.	M-15	Rekonstrukcija raskrsnice u Sanskom mostu na M-15	Projektovanje	15.000	6.900	Urbis centar d.o.o. Banja luka, 01-02.2-1776/19. 08.02.2019.	6.888	6.888
			Revizija	2.000	2.000	Geofeld d.o.o.Bihać, 01-02.2-12312/19. 18.10.2019.	1.989	1.989
			Izvođenje	350.000	350.000			-
			Nadzor	7.000	7.000			-
			Ukupno					8.877
35.	M-17	Izgradnja isključne trake za lijevo skretanje za naselje Trzanj, općina Hadžići	Izvođenje	300.000	312.000	Sarajevoputevi d.d. Sarajevo, 01-02.2-6980/19. 10.06.2019.	311.752	311.749
			Nadzor	7.000	6.400	Ipsa Institut d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-5147/19. 29.04.2019.	6.330	6.330
			Ukupno					318.079
36.	M-17	Rekonstrukcija raskrsnice ceste M-17 i	Izvođenje	250.000	250.000			-

JP CESTE FEDERACIJE BIH

		R-435a u naseljenom mjestu Potoci, dionica Potoci – Mostar	Nadzor	7.000	7.000	-	-	
			Ukupno					
37.	M-17.4	Izgradnja pješačke staze u Ljubuškom. L = 0,8 km	Izvođenje	100.000	186.000	Putovi d.o.o.Gruđe, 01-02.2-8181/18. 25.09.2018.	185.875	148.635
			Nadzor	3.500	7.000	Interprojekt d.o.o. Mostar, 01-02.4-6984/18, 15.08.2018.	6.921	6.921
			Ukupno					155.556
38.	M-14.2	Izgradnja pješačke staze unaselju Novo Selo, općina Odžak,	Izvođenje	220.000	220.000	Balegem d.o.o. Gradačac, 01-02.2-2051/19. 18.02.2019.	219.532	219.367
			Nadzor	5.000	5.000	NNM Inženjering d.o.o. Tuzla, 01-02.2-8364/18, 02.10.2018.	4.850	4.850
			Ukupno					224.217
39.	M-15	Rekonstrukcija raskrsnice na obilaznicai Livna u kružni tok – križanje M-15 i ul. Blajburških žrtava	Projektiranje	25.000	11.000	Urbis centar d.o.o. Banja luka, 01-01.4-6078/19. 17.05.2019.	10.869	10.869
			Revizija	2.500	2.000	Integra d.o.o.Mostar, 01-02.2-11254/19. 24.09.2019.	2.000	2.000
			Ukupno					12.869
40.	M-18.1	Rekonstrukcija magistralne ceste M18.1 Ustikolina – Trnovo,	Projektovanje	5.000	5.800	Arting d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-6611/19. 30.05.2019.	5.733	5.733
			Izvođenje	250.000	250.000	Goraždeputevi d.o.o. Goražde, 01-02.1-12593/19. 28.10.2019.	249.963	94.532
			Nadzor	7.000	7.000	Smajić-Inženjering d.o.o.Goražde, 01-02.1-13923/19. 04.12.2019.	2.589	977
			Ukupno					101.242
41.	M-6	Izrada idejnog rješenja izmjehštanja magistralne ceste u Grudama, dužine 0,5 km	Projektovanje	7.000	7.000	-	-	
42.	M-14	Izgradnja pješačke komunikacije preko magistralne ceste M-17 u općini Jablanica	Projektovanje	7.000	14.000	Design &QC d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-1434/19. 31.01.2019. 01-02.2-7669/19. 25.06.2019.	6.844 6.727	6.727
			Izvođenje	150.000	350.000	-	-	
			Nadzor	7.000	7.000	-	-	
			Ukupno					6.727
43.	M-4	Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok, Tešanjka, općina Tešanj	Projektovanje	15.000	9.000	IG d.o.o. Banja luka, 01-02.2-3474/19. 25.03.2019.	9.009	-
			Revizija	2.500	3.000	Design &QC d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-9723/19. 14.08.2019.	2.925	-
			Ukupno					-
44.	M-17	Izgradnja pješačke staze u naselju Šije, općina Doboј – Jug	Projektovanje	7.000	7.000	-	-	
45.	M-4	Rekonstrukcija raskrsnice na ulazu u Jelah, općina Tešanj (Sufinansiranje sa Općinom Tešanj)	Projektovanje	-	7.000	-	-	
			Izvođenje	550.000	550.000	-	-	
			Nadzor	7.000	7.000	-	-	
			Ukupno					-

JP CESTE FEDERACIJE BIH

46.	M-18	Rekonstrukcija raskrsnice "Hotel Sunce", općina Vogošća	Izvođenje	500.000	500.000			-
			Nadzor	15.000	15.000			-
			Ukupno					-
								Rješavanje imovinsko-pravnih poslova u toku Nabavka radova u toku
47.	M-18	Izgradnja privremenog kružnog toka, skretanje Energopetrol-industrijska zona, km 4+600, općina Vogošća	Projektovanje	7.000	6.800	Design &QC d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-3254/19. 21.03.2019.	6.786	6.786 Okončano
48.	M-4	Rekonstrukcija raskrsnice M-4 i lokalne ceste u naselju Bjelave, općina Srebrenik	Projektovanje	7.000	7.000	Pronasa d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-11773/18, 27.12.2018.	6.952	6.952 Okončano
49.	M-16.2	Gornji Vakuf-Bugojno, izgradnja pješačke staze	Projektovanje	7.000	7.000	Geodata d.o.o. Mostar, 01-01.1-612/19. 14.01.2019.	6.903	6.903
			Izvođenje	200.000	200.000			-
			Nadzor	7.000	7.000			-
			Ukupno					6.903
50.	M-17	Glavni projekat rekonstrukcije raskrsnice sa M-17 i lokalne ceste za naselje Papratnica dionica M-17_006: Ozimica-Topčić Polje, km 9+180, općina Žepče	Projektovanje	20.000	20.000	GP Trafficom d.o.o.Odžak i Trafficon d.o.o.Zagreb, 01-02.1-13615/19. 26.11.2019.	19.943	
			Revizija	2.000	2.000			-
			Ukupno					-
51.	M-17	Izgradnja odmorišta na dionici: Jablanica-Mostar,	Projektovanje	2.000	2.000	Geo-data d.o.o.Mostar, 01-02.4-379/19. 10.01.2019.	1.995	1.995
			Izvođenje	48.000	85.000			-
			Nadzor	2.000	2.000	Interprojekt d.o.o.Mostar, 01-02.4-10940/19. 13.09.2019.	1.948	
			Ukupno					1.995
52.	M-6.1	Rekonstrukcija raskrsnice u naseljenom mjestu Bobara, dionica: Kolo-Posušje, II faza	Izvođenje	30.000	36.900	KTM Brina d.o.o. Posušje, 01-02.1-8458/18, 03.10.2018. Anex 01-02.1-9455/19. 05.08.2019.	106.636 (preneseno 29.149 6.912-anex)	36.032
			Nadzor	2.000	1.000	Integra d.o.o. Mostar, 01-02.1-6976/18, 14.08.2018.	4.914 (preneseno 983)	983
			Ukupno					37.015
53.	M-5	Izmjena projektne dokumentacije-projekt rekonstrukcije raskrsnica na M-5 Bihać4-Ripač (put AVNOJ-a)	Projektovanje	-	21.000	Geo feld d.o.o. Bihać, 01-02.2-12114/19. 15.10.2019.	6.961,50	6.961 Okončano
				13.036.600	13.767.300			5.474.102

Rb.20. – Na osnovu Sporazuma, izvođenje radova u iznosu od 1,00 mil.KM finansira Kanton Sarajevo.

Rb.45 – Sufinansiranje sa Općinom Tešanj u iznosu od 0,20 mil.KM.

JP CESTE FEDERACIJE BIH

3.1.4. Vanredno održavanje

3.1.4.1. Sanacija cestovnih objekata

Red br.	Mag. Cesta	Naziv i opis projekta	Aktivnosti na projektu	Plan 2019.	Rebalans Plana 2019.	Izvodač/ Konsultant - ugovor	Ugovoreno	Realizovano 2019.	Napomena
1.	M-17	Glavni projekat rekonstrukcije tunela Karaula, G. Goliješnica, Tupanovac (T17-006-42), dionica Ozimica – Topčić polje, km 2+699	Projektovanje	20.000	19.800	Divel d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-10677/17, 29.11.2017.	98.184 (preneseno 19.782)	19.782	Projektiranje okončano Revizija treba dostaviti Završni izvještaj
			Revizija	4.500	4.500	IG d.o.o. Banja luka, 01-02.1-3083/18. 13.04.2018.	4.551	-	
			Ukupno					19.782	
2.	M-18.1	Rušenje postojećeg i izgradnja novog mosta preko Crne rijeke u Bašcima (M-18.1-001-446), dionica Ustikolina – Grebak – Deljaš – Trnovo, km 42+720	Izvođenje	510.000	320.000	Konzorcij: MGBH d.o.o. Sarajevo i Euroasfalt d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-7257/18. 23.08.2018.	603.259 (preneseno 487.083)	437.623	Okončano
			Nadzor	8.500	5.300	Ipsa Institut d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-7241/18, 23.08.2018.	8.483 (preneseno 6.143)	6.142	
			Ukupno					443.765	
3.	M-18	Zamjena dilatacione naprave mosta preko rijeke Drinjače u Kladnju (M-18-008-68), dionica Vitalj – Olovo, km 1+186	Izvođenje	38.000	2.000	Sikra d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-7876/18, 13.09.2018.	37.762 (preneseno 1.847)	-	Radovi okončani u 2018.godini
			Nadzor	3.000	1.200	Trasa d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-7532/18, 04.09.2018.	2.867 (preneseno 1.241)	1.241	
			Ukupno					1.241	
4.	M-17	Zamjena dilatacione naprave mosta preko bujičastog potoka lokacija Bagrem (M-17-012-305), dionica Konjic–Jablanica 1, km 16+311	Izvođenje	71.000	45.100	Sikra d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-7876/18, 13.09.2018.	70.700 (preneseno 45.102)	44.679	Okončano
			Nadzor	3.000	1.200	Trasa d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-7532/18, 04.09.2018.	2.866 (preneseno 1.240)	1.241	
			Ukupno					45.920	
5.	M-18	Glavni projekat sanacije mosta preko rijeke Bioštice u Olovu (M-18-009-187), dionica Olovo – Semizovac, km 0+404	Projektovanje	21.800	21.800	IG d.o.o.Banja luka, 01-02.1-6979/18, 14.08.2018.	21.762	17.082	U toku
			Revizija	3.100	3.100	Trasa d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-8139/18, 24.09.2018.	3.100	-	
			Ukupno					17.082	
6.	M-15	Glavni projekat sanacije mosta preko rijeke Sane, Krkojevačko polje, Čaplje (M-15-003-42), dionica Sanski Most 1 – Kamičak, km 4+283	Projektovanje	22.500	22.500	IG d.o.o.Banja luka, 01-02.1-6979/18, 14.08.2018.	22.523	14.918	U toku
			Revizija	3.100	3.100	Trasa d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-8139/18, 24.09.2018.	3.101	-	
			Ukupno					14.918	
7.	M-18	Rekonstrukcija mosta preko rijeke Ljubine u Semizovcu (M-18-010-398), dionica Semizovac-Sarajevo – Malta, km 0+048	Izvođenje	590.000	590.000			-	Tenderska dokument u pripremi
			Nadzor	15.000	15.000			-	
			Ukupno					-	
8.	M-1.8	Rekonstrukcija tunela Drenik (T1.8-004-48) l=80m, dionica Srebrenik – Šiški Brod 3, km 2+655	Projektovanje	25.000	25.000	Divel d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-11849/18. 28.12.2018.	24.570	24.570	Okončano
			Revizija	3.000	3.500	Trasa d.o.o.Sarajevo,	3.510	3.510	

JP CESTE FEDERACIJE BIH

					01-01.1-4719/19. 19.04.2019.			
			Ukupno					28.080
9.	M-18	Sanacija mosta preko rijeke Bioštice u Olovu (M-18-009-187), dionica Olovo – Semizovac, km 0+404	Izvođenje	250.000	520.000			-
			Nadzor	7.000	15.000			-
			Ukupno					-
10.	M-17	Zaštita temelja mosta (M-17-001-342) preko nepoznatog potoka, lokacija Zukića kosa, dionica: Tarčin-Konjic, km 13+736	Izvođenje	20.000	14.500	HP Investing d.o.o. Mostar 01-02.1-7251/18, 23.08.2018.	188.121 (preneseno 14.486)	14.453
			Nadzor	1.000	300	IGH d.o.o. Mostar, 01-02.1-7217/18. 22.08.2018.	5.800 (preneseno 290)	290
			Ukupno					14.743
11.	M-1.8	Sanacija kolovozne ploče mosta preko rijeke Tinje, Orlova klisura (M-1.8-004-113), dionica Srebrenik – Šiški Brod 3, km 9+279	Izvođenje	100.000	102.000	Jata group, d.o.o.Srebrenik,01 -02.1-10725/19. 09.09.2019.	101.845	-
			Nadzor	5.200	5.200	Design &QC d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-8799/18, 11.10.2018.	5.200	-
			Ukupno					-
12.	M-5	Zamjena dilatacionih naprava na mostu Babin zub preko strme padine (M-05.0-5-02), dionica Malta – Vijećnica – Korija	Izvođenje	110.000	110.000	Sikra d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-1345/19. 29.01.2019.	109.899	-
			Nadzor	4.000	4.000	Structura d.o.o.Sarajevo. 01-02.1-10144/18. 15.11.2018.	3.920	-
			Ukupno					-
13.	M-5	Rekonstrukcija mosta preko Sokolinskog potoka u Torlakovcu (M-5-009-598), dionica Jajce Jug – Donji Vakuf 1, km 18+298	Projektiranje	8.000	8.000	INK Construktur d.o.o. Banjaluka, 01-02.1-11576/18. 21.12.2018.	7.956	7.956
			Revizija	2.000	1.800	Design &QC d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-377/19. 10.01.2019.	1.755	-
			Ukupno					7.956
14.	M-4	Sanacija mosta preko rijeke Soline u Tuzli (M-04.0-4-05), dionica Šiški Brod – Kalesija – Gr. Ent (Memići), km 9+555	Projektiranje	13.000	15.000	Institut za građevinsrstvo IG d.o.o. Banja luka, 01-02.1-11575/18. 21.12.2018.	14.976	14.976
			Revizija	2.000	1.800	Design &QC d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-377/19. 10.01.2019.	1.755	-
			Ukupno					14.976
15.	M-6.1	Rekonstrukcija mosta preko nepoznatog potoka (M-6.1-002-518), dionica Resanovci – Bosansko Grahovo 1, km 14+132	Projektiranje	17.000	13.000	Design &QC d.o.o. Sarajevo, 01-02.1- 4908/19.24.04.201 9.	12.870	12.870
			Revizija	2.000	2.400	Infra d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-7428/19. 18.06.2019	2.340	2.340
			Ukupno					15.210
16.	M-15	Rekonstrukcija mosta preko rijeke Sane, Krkojevačko polje, Čapljie (M15-003-42), dionica Sanski most 1-Kamičak, km 4+283	Izvođenje	500.000	1.150.000	-	-	-
			Nadzor	15.000	11.400	IG d.o.o. Banja luka, 01-02.1-7427/19. 18.06.2019	11.361	-
			Ukupno					-
17.	M-1.8	Zamjena dilatacije na stubnom mjestu S14, mosta preko rijeke Save u Orašju (M1.8-001-62), na cesti M1.8, dionica RH/BiH (Županja)-Lončari, km 0+320	Izvođenje	105.600	105.600	Sikra d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-11161/18, 12.12.2018.	105.583	104.908
			Nadzor	5.300	5.300	Trasa d.o.o.Sarajevo,	5.265	5.265

JP CESTE FEDERACIJE BIH

					01.02.1-8970/18, 18.10.2018.			
			Ukupno					110.173
18.	M-5	Zamjena dilatacionih naprava na mostu preko rijeke Vrbas u Jajcu (M5-008-268) dionica Rogolji-Jajce Jug, km 27+717	Izvođenje	120.000	117.500	Sikra d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-7663/19. 24.06.2019.	117.340	-
			Nadzor	5.000	4.700	Trasa d.o.o.Sarajevo, 01-01-1-7222/19. 27.06.2019.	4.680	-
			Ukupno					-
19.	M17	Zamjena dilatacione naprave na obalnom stubu broj 6 na mostu preko strme padine, klizište u Prapraskom (M17-012-306) dionica Konjic-Jablanica 1, km 17+674	Izvođenje	50.000	108.000			-
			Nadzor	2.000	4.000			-
			Ukupno					-
20.	M16	Zamjena dilatacione naprave na obalnom stubu broj 5 na mostu preko jezera Bočac na ušću rijeke Ugar u rijeku Vrbas, Bregovi (M16-006-522) dionica Crna Rijeka – Jajce Jug , km 6+364	Izvođenje	60.000	67.000			-
			Nadzor	2.000	3.000			-
			Ukupno					-
21.	M17	Zaštita temelja mosta preko duboke uvalje, Gradište kod Crnaje (M17-012-303), dionica Konjic- Jablanica 1, km 14+661	Izvođenje	150.000	190.000			-
			Nadzor	5.000	5.000			-
			Ukupno					-
22.	M-18	Rekonstrukcija mosta preko suhe prepreke u Stanovima (M18-007-86), dionica Živinice 1 – Vitalj, km 25+886	Izvođenje	530.000	492.000	HP Investing d.o.o.Mostar, 01-02.1-6084/19. 20.05.2019.	491.782	491.331
			Nadzor	15.000	7.100	IG d.o.o. Banja luka, 01-02.1-7427/19. 18.06.2019	7.101	7.101
			Ukupno					498.432
23.	M-16	Rekonstrukcija tunela Barevo III (T16-006-29) L=38m, dionica Crna Rijeka –Jajce Jug, km16+077	Projektovanje	-	5.600	Divel d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-9454/19. 05.08.2019.	5.557	-
			Izvođenje	800.000	1.560.000			-
			Nadzor	30.000	45.000			-
			Ukupno					-
24.	M-5	Rušenje postojećeg i izgradnja novog mosta preko potoka Bravnice u Bravnicama (M5-009-508), dionica: Jajce Jug – Donji Vakuf 1, km 3+746	Projektiranje	-	14.000	Infra d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-11148/19. 20.09.2019.	6.903	6.903
			Izvođenje	300.000	300.000			
			Nadzor	10.000	8.500	IG d.o.o. Banja luka, 01-02.1-7427/19. 18.06.2019	8.521	-
			Ukupno					6.903
25.	M-19.2	Rušenje postojećeg i izgradnja novog mosta preko potoka Jezernica u Turalićima (M19.2-001-101), dionica Kladanj – Vlasenica, km 9+809	Izvođenje	350.000	395.000	HP Investing d.o.o.Mostar, 01-02.1-6748/19. 05.06.2019.	394.608	-
			Nadzor	12.000	7.100	IG d.o.o. Banja luka, 01-02.1-7427/19. 18.06.2019	7.101	-
			Ukupno					-
26.	M-16.2	Sanacija mosta preko rijeke Bunte u Gračanici (M16.2-001-280) dionica Bugojno 2 – Gornji Vakuf, km 8+152	Izvođenje	240.000	330.000	GP: Struktura d.o.o. Jajce i MG Mind d.o.o.Mrkonjić	329.888	-
								Ugovoreno 27.12.2019.

JP CESTE FEDERACIJE BIH

					Grad, 01-02.1-14786/19. 27.12.2019.			
			Nadzor	7.000	7.000	IG d.o.o.Banja luka 01-02.1-7427/19. 18.06.2019.	8.521	-
			Ukupno					-
27.	M-18	Sanacije mosta preko nepoznatog potoka, Poturovići (M18-009-604) dionica Olovo – Semizovac, km 31+567	Projektiranje	15.000	11.700	Design &QC d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-4907/19. 24.04.2019.	11.700	5.850
			Revizija	2.000	2.300	Infra d.o.o. Sarajevo, 01-02.1- 7451/19, 18.06.2019.	2.340	
			Ukupno					5.850
28.	M-5	Rekonstrukcije mosta preko Koševskog potoka u Sarajevu, Skenderija (M 05.0-5-01-a) dionica Stup-Vijećnica-Gr Ent ... Gr Ent Prača-Renovica-Gr Ent Kaljani, km 7+310	Projektiranje	15.000	17.500	Design &QC d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-4907/19. 24.04.2019.	17.550	-
			Revizija	2.000	2.300	Infra d.o.o. Sarajevo, 01-02.1- 7451/19, 18.06.2019.	2.340	
			Ukupno					-
29.	M-4	Rekonstrukcije mosta preko Čajinog potoka u Cazinu (M4.2-002-588) dionica: Skokovi – Srbljani, km 11+296	Projektiranje	15.000	-			-
			Revizija	2.000	-			-
30.	M-14	Rekonstrukcija mosta preko željezničke pruge Bihać-Bosanski Novi, Kostela (M14-002-51) dionica Srbljani-Bos. Krupa 1, km 5+171	Projektiranje	15.000	17.000	GP Trasa d.o.o. Sarajevo i Divel d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-13063/19. 08.11.2019.	16.408	-
			Revizija	2.000	2.000			-
			Ukupno					-
31.	M-18	Sanacije mosta preko rijeke Suha u Stuparima (M18-007-83) dionica Živinice 1 – Vitalj, km 16+426	Projektiranje	22.000	20.000	GP Trasa d.o.o. Sarajevo i Divel d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-13063/19. 08.11.2019.	19.123	-
			Revizija	2.500	2.500			-
			Ukupno					-
32.	M-18	Sanacija mosta preko Ujića rijeke u Kladnju (M18-008-71) dionica Vitalja-Olovo, km 2+405	Projektiranje	17.000	20.000	GP Trasa d.o.o. Sarajevo i Divel d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-13063/19. 08.11.2019.	20.058	-
			Revizija	2.000	2.500			-
			Ukupno					-
33.	M-5	Sanacija mosta preko suhe doline, Mjedenica, obilaznica Sarajevo (M5-016-426) dionica A.Šaćirbegović-Korija-Ljubogošta, km 3+511	Projektiranje	17.000	17.000	GP Trasa d.o.o. Sarajevo i Divel d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-13063/19. 08.11.2019.	17.082	-
			Revizija	2.000	2.000			-
			Ukupno					-
34.	M-1.8	Sanacija mosta preko rijeke Tinje u Donjoj Potpeći (M1.8-004-114) dionica Srebrenik – Šiđki Brod 3, km 10+709	Projektiranje	17.000	15.000	GP Trasa d.o.o. Sarajevo i Divel d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-13063/19. 08.11.2019.	15.032	-
			Revizija	2.000	2.000			-
			Ukupno					-
				5.346.100	6.972.700			1.245.031

* Radovi zamjene dilatacija na mostovima – generalno- radovi specifični, na tržištu BiH postoji samo jedan izvođač koji izvodi ovu vrstu radova (Sikra d.o.o.) što značajno utječe i na cijene

3.1.4.2. Sanacija klizišta, odrona, sanacija slijeganja trupa puta, kosina, usjeka i zasjeka

Red. Br.	Mag. Cesta	Naziv i opis projekta	Aktivnosti na projektu	Plan 2019.	Rebalans Plana 2019.	Izvodač/ Konsultant - ugovor	Ugovorenog	Realizovano 2019.	Napomena
1.	M-5	Rješavanje odvodnje, cesta M-5_018, Prača – Hrenovica, dionica Podgrab – Sastavci, km 11+800	Projektovanje	7.000	6.900	INK Construktur d.o.o. Banja luka, 01-02.2-7162/18, 17.08.2018.	6.903	6.903	Okončano
			Revizija	2.000	2.000	Design „QC“ d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-1339/19. 29.01.2019.	1.989	1.989	
			Ukupno					8.892	
2.	M-14	Sanacija škarpi i kosina, dionica Srbljani – Bos.Krupa, na najugroženijim mjestima	Projektovanje	12.500	12.500	Konzorcij: Divel d.o.o.Sarajevo, IGH d.o.o.Mostar Trasa d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-6987/17. 01.08.2017.	24.921 (preneseno 12.460)	12.460	Okončano Revizija nije situirana
			Revizija	1.900	1.900	Design &QC d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-11352/17. 21.12.2017.	1.872	-	
			Ukupno					12.460	
3.	M-16 006	Dionica Crna Rijeka – Jajce, km 6+500 do km 10+600 (više lokacija), sanacija škarpi i nestabilnih kosina	Projektovanje	-	11.500	Konzorcij: Divel d.o.o.Sarajevo, IGH d.o.o.Mostar Trasa d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-6987/17. 01.08.2017.	23.166 (preneseno 11.583)	11.583	Okončano Revizija nije situirana
			Revizija	-	3.300	Design &QC d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-11352/17. 21.12.2017.	3.276	-	
			Izvođenje	200.000	200.000	Komotin d.o.o.Jajce, 01-02.2-13006/19. 07.11.2019.	197.462	197.249	
			Nadzor	7.000	6.800	Arting BH d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-1338/19. 29.01.2019.	6.760	6.760	
			Ukupno					215.592	
4.	M-18	Izrada glavnog projekta sanacije klizišta ispod nivelete i slijeganje trupa ceste dionica: Živinice 1-Vitalj, km 29+350	Projektovanje	25.000	19.700	Design &QC d.o.o.Sarajevo 01-02.2-8221/18, 26.09.2018.	19.656	19.656	Okončano projektovanje i revizija Tender u toku za izvođenje
			Revizija	5.000	4.600	Pronasa d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-727/19. 16.01.2019.	4.630	4.630	
			Izvođenje	450.000	780.000			-	
			Nadzor	20.000	4.600	Arting BH d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-8661/19. 19.07.2019.	4.581	-	
			Ukupno					24.286	
5.	M-14	Sanacija slijeganja trupa ceste M-14: Bihać – Grmuša (Prnjosor) – Mali Radić,dionica Čavkići – Spahići, od P45 do P50, od km 0+870,74 do km 0+959,51	Projektovanje	-	9.700	Konzorcij: Divel d.o.o.Sarajevo, IGH d.o.o.Mostar Trasa d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-6987/17. 01.08.2017.	19.422 (preneseno 9.711)	9.711	Okončano Revizija nije situirana

JP CESTE FEDERACIJE BIH

			Revizija	-	1.900	Design &QC d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-11352/17. 21.12.2017.	1.872	-	
			Ukupno					9.711	
		U K U P N O		730.400	1.065.400			270.941	

3.1.4.3. Sanacija oštećenih asfaltnih kolovoza

Red br.	Mag. Cesta	Naziv i opis projekta	Aktivnosti na projektu	Plan 2019.	Rebalans Plana 2019.	Izvodač/ Konsultant - ugovor	Ugovoreno	Realizovano 2019.	Napomena
1.	M-14 002	Sanacija asfaltnog kolovoza M-14_002: Srbljani – Bosanska Krupa sa uređenjem i zaštitom škarpi zasjeka cca = 8,0 km	Projektovanje	12.500	12.500	Konzorcij: Divel d.o.o.Sarajevo,IG H d.o.o.Mostar Trasa d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-6987/17. 01.08.2017.	24.921 (preneseno 12.461)	12.461	Okončano, Revizija nije situirana
			Revizija	2.400	2.400	Design &QC d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-11352/17. 21.12.2017.	2.340	-	
			Izvođenje	200.000	215.000	Kov-grad d.o.o. Buzim, 01-02.2-3842/19. 03.04.2019.	214.780	214.317	
			Nadzor	6.000	7.000	Geofeld d.o.o.Bihać, 01-02.2-367/19. 10.01.2019.	6.903	6.903	
			Ukupno					233.681	
2.	M-16	Sanacija asfaltnog kolovoza, dionica: Crna Rijeka – Jajce Jug, L=2,5 km	Izvođenje	220.000	220.000	Mrkonjićputevi d.o.o. Mrkonjić grad,01-02.2-12034/19. 14.10.2019.	219.932	219.044	Okončano
			Nadzor	4.000	4.000	Konzorcij: Divel d.o.o. Sarajevo, Ipsa Institut d.o.o. Sarajevo i IG Institut d.o.o. Banja luka, 01-02.2-5967/16, 11.07.2016.	4.721	-	
			Ukupno					219.044	
3.	M-5	Sanacija asfaltnog kolovoza, dionica: Bosanski Petrovac – Ključ, L=3 km	Izvođenje	500.000	429.000	Divel d.o.o. Sanski most, 01-02.2-5111/19. 29.04.2019.	428.782	428.776	Okončano
			Nadzor	7.000	7.400	Institut za grad. IG d.o.o. Banja Luka,	7.371	7.371	
			Ukupno					436.147	
4.	M-4.2	Sanacija asfaltnog kolovoza, dionica: Skokovi – Srbljani sa izgradnjom pješačke staze	Izvođenje	600.000	600.000	Kov-grad d.o.o. Buzim, 01-02.2-3841/19. 03.04.2019.	599.578	429.215	U toku
			Nadzor	7.000	7.000	DTQ d.o.o. Sarajevo, 01-01.1-4763. 19.04.2019.	6.669	4.535	
			Ukupno					433.750	
5.	M-17.3	Sanacija asfaltnog kolovoza, dionica: Buna – Masline, L=1.0 km	Izvođenje	260.000	220.000	Putovi d.o.o. Grude, 01-02.2-2590/19. 07.03.2019.	220.252	220.088	Okončano
			Nadzor	6.000	6.900	Integra d.o.o. Mostar, 01-02.2-2255/19. 22.02.2019.	6.903	6.903	
			Ukupno					226.991	
6.	M-17	Sanacija asfaltnog kolovoza dionica:	Izvođenje	250.000	317.300	HP Investing d.o.o. Mostar,	317.285	317.270	Okončano

JP CESTE FEDERACIJE BIH

		Čapljina- Doljani, od GP BiH do GP RH, cca0,80 km			01-02.4-6347/19. 24.05.5201			
			Nadzor	5.000	3.000	Integra d.o.o. Mostar, 01-01.1-3185/19. 19.03.2019.	2.983	2.984
			Ukupno					320.254
7.	M-14.2	Sanacija asfaltnog kolovoza dionica: granica entiteta –Domaljevac	Izvođenje	200.000	198.200	Jata Group d.o.o. Srebrenik,01-02.2- 2335/19. 26.02.2019.	198.191	198.191
			Nadzor	4.000	2.700	Aik Inžinjering d.o.o. Banovići, 01-02.2-2376/19. 28.02.2019.	2.691	2.691
			Ukupno					200.882
8.	M-17.4	Sanacija asfaltnog kolovoza, dionica: Čitluk-Ljubuški	Izvođenje	150.000	128.500	KTM-Brina d.o.o. Posušje, 01-02.22589/19. 07.03.2019.	128.464	128.421
			Nadzor	3.000	2.400	IGH d.o.o. Mostar, 01-02.2-2254/19. 22.02.2019.	2.340	2.340
			Ukupno					130.761
		U K U P N O		2.436.900	2.383.300			2.201.510

3.2. Planirani projekti

3.2.1. Projekti rekonstrukcije i izgradnje

Red br.	Mag. Cesta	Naziv i opis projekta	Aktivnosti na projektu	Plan 2019.	Rebalans Plana 2019.	Izvodač/ Konsultant - ugovor	Ugovoreno	Realizovano 2019.	Napomena
1.	M-17.3	Rekonstrukcija ceste M-17.3, dionica: Drenovac-Stolac, L=cca 8 km - Glavni projekat	Projektovanje	60.000	40.000	Integra d.o.o.Mostar, 01-02.1-12269/19. 18.10.2019.	39.817	-	U toku Projektov. Tender za reviziju u pripremi
			Revizija	5.000	5.000			-	
2.	M-5	Izgradnja ceste (izmještanje) M-5, dionica: Jezero-Jajce - Glavni projekat	Projektovanje	60.000	60.000			-	Čeka se prethodna vodna suglasnost za projektni zadatak
			Revizija	5.000	5.000			-	
3.	M-14	Izgradnja obilaznice Bosanska Otoka (veza cesta M-14 i R 401) - Glavni projekat trase i mosta preko rijeke Une	Projektovanje	60.000	60.000			-	Tender u toku
			Revizija	5.000	5.000			-	
4.	M-4	Izgradnja ceste Tuzla (Drežnik) – Šiški Brod, dovršetak izgradnje kružne raskrsnice Lipnica	Izvođenje	500.000	500.000			-	Eksproprij.
			Nadzor	15.000	15.000			-	
5.	M-4.3	Izgradnja obilaznice Bužim	Izvođenje	1.000.000	1.000.000			-	Tender u toku
			Nadzor	30.000	30.000			-	
6.	M-6	Izgradnja kružnog toka u Ljubuškom, dionica: Vitina-Tasovčići, na spoju obilaznice Ljubuški sa cestom M-6, sa izgradnjom nogostupa uz cestu M-6, L=cca 800m	Izvođenje	370.000	500.000	Putovi d.o.o.Grude, 01-02.1-13561/19. 22.11.2019.	498.420	-	Radovi u toku
			Nadzor	10.000	10.000	IGH d.o.o.Mostar, 01-02.1-13710/19. 28.11.2019.	9.302	-	
			Ukupno					-	
7.	M-4.2	Rekonstrukcija/izgradnja mosta preko potoka Buhaca (M-4.1-01-1) na graničnom prijelazu Maljevac, dionica:Granica BH/RH-Skokovi, sa rekonstrukcijom raskrsnice na obilaznici Velike Kladuše	Izvođenje	300.000	300.000			-	Most je na granici sa RH Čeka potpisivanje medudržavnog sporazuma
			Nadzor	6.000	6.000			-	

JP CESTE FEDERACIJE BIH

Redni broj	M-14	Opis projekta	Kategorija	Preduzeće	Ukupno	Taksa	Tender za glavni projekat u pripremi
					Projektovanje	Revizija	
8.	M-14	Izrada Glavnog projekta izgradnje mosta preko rijeke Une, lokaliteti rekonstrukcije raskrsnica ceste M-14_001 i lokalne ceste za naselje Brekovica, km 7+830	Izvođenje	343.000	590.000		
9.	M-6	Izgradnja kružnog toka na izlazu Prispa, na dionici: Gorica-Vitina, općina Grude, I faza	Nadzor	7.000	15.000	Integra d.o.o.Mostar, 01-02.1-13711/19. 28.11.2019.	6.552
10.	M-5	Izrada trake za spora vozila na M-5 dionica:Gromljak-Blažuj, potez Kobiljača (elaborat) -Izrada Studije za okoliš	Konsult. usluge	-	4.700	ASI Inženjering d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-10455/19. 02.09.2019.	4.680
			Konsult. usluge	-	6.500	Sendo d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-11619/19. 03.10.2019.	6.435
			Ukupno				11.115
11.	M-5	Izrada projektnog rješenja novog priključka sa ceste M-5 na obilaznici Donji Vakuf	Projektovanje	-	3.400		
12.	M-17	Rekonstrukcija tunela Vranduk II- odvijanje prometa u toku izvođenja radova: -Misija G41,-revizija Misije G31 - Idejni projekat obilaznice M-17 u toku rekonstrukcije tunela Vranduk, prolaz kroz Nemilu, L = 2,3 km -Idejni projekat obilaznice M-17 u toku rekonstrukcije tunela Vranduk, dionica Banlozi – Tetovo, L = 3,4 km -Glavni projekat rješenja pješačkog saobraćaja obilaznice M-17 u toku rekonstrukcije tunela Vranduk, dionica Banlozi – Tetovo, L = 3,4 km -Glavni projekat rekonstrukcije obilaznice magistralne ceste M-17 u toku rekonstrukcije tunela Vranduk, L = 2,3 km - Glavni projekat rekonstrukcije obilaznice magistralne ceste M-17 u toku rekonstrukcije tunela Vranduk, L = 3,4 km	Konsult. usluge	-	42.900	Divel d.o.o.Sarajevo, 01-02.3-14772/19. 27.12.2019. Nemila) Trasa d.o.o.Sarajevo, 01-02.3-14791/19. 27.12.2019. (Banlozi-Tetovo)	7.020
13.		Izmjena (prilagodba) glavnog projekta izgradnje traka za spora vozila,dionica:Olov-Semizovac, poddionica:Čevljjanovići-Nišići	Projektovanje	-	3.500		
14.	M-1.8	Izmjena glavnog projekata: M-18_005 dionica: Priboj 2-Simin Han 1, poddionica:Banj brdo_Simin Han, traka za spora vozila	Projektovanje	-	3.500		
15.		Sanacija tunela Ormanica – Izrada idejnog i glavnog rješenja privremene obilaznice za odvijanje saobraćaja u tunelu Ormanica	Projektovanje	-	5.300	Divel d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-9705/19. 13.08.2019.	5.265
16.	M-5	Rekonstrukcija ceste M-5 dionica Gromljak-Blažuj, podionica: Kiseljak -Han ploča, L=cca 8 km	Projektovanje	-	60.000		
			Revizija	-	5.000		
17.	M-18	Pribavljanje saglasnosti, eleborata i dozvola za projekte iz Programa „Modernizacija cesta u F BiH“; Usklajivanja sa Smjernicama i provođenje dokumentacije na engleski jezik	Ostalo	200.000	250.000		
		Izmjena glavnog projekata: M-18_005 dionica: Priboj 2-Simin Han 1, poddionica:Banj brdo_Simin Han, traka za spora vozila				Pronasa d.o.o. Sarajevo, 01-01.1-3811/19. 02.04.2019.	3.510
	M-18	Izmjena (prilagodba) glavnog projekta izgradnje traka za spora vozila,dionica:Olov-Semizovac, poddionica:Čevljjanovići-Nišići				Aber Design d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-4017/19. 05.04.2019.	3.510
		Izgradnja obilaznice Goražde- izrada elaborata za prethodnu vodnu saglasnost				Sendo d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-1198/19, 24.01.2019.	6.318
	M-20					Taksa	80
							80

JP CESTE FEDERACIJE BIH

					Design &QC d.o.o.Sarajevo 01-02.1-378/19. 15.01.2019.	1.755	1.755	
M-17	Rekonstrukcija tunela Vranduk II- Misija G41(revizija Misije G31)				Ugovor o djelu, 01-03.2-9147/18, 24.10.2018.	12.097 (preneseno 11.089)	12.867	
					Ipsa d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-6620/19. 31.05.2019.	6.084	6.084	
					Naknada, taksa,	2.291	2.291	
					Divel.d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-2326/19. 26.02.2019.	7.020	-	
M-5	Izmjena projektnje dokumentacije-Idejni projekt rekonstrukcije raskrsnice na M-5 Bihać4-Ripač (put AVNOJ-a)				Oglas,taksa	476	476	
M17.3	Neum-Stolac(Broćanac-Papratnica)				Oglas saglasn, kon.usl	1.882	1.882	
M-14.2	Izgradnja trake Bos.Petrovsc-Drvar				Taksa	37.623	37.623	
	Izgradnja trake Gornje Bravsko-Kluč (Lanište)				InfraPlan d.o.o.Sarajevo, 01-05.1-13815/19. 02.12.2019.	1.989	1.989	
M-5	-stručno mišljenje prekategorizacije stijenske mase				Naknada, oglas	16.693	16.693	
M-5	Izgradnja trake za spora vozila Gromljak-Blažuj (Kobiljača)				AMG d.o.oVisoko 01-02.1-13614/19. 26.11.2019.	6.903	6.903	
M-5	Izgradnja Obilaznice Donji Vakuf				Naknada, oglas, saglasnost	10.164	10.164	
M-4.2	Izgradnja Obilaznice Cazin				Geoput d.o.o. Banja luka, 01-02.1-9704/19. 13.08.2019.	3.335	3.335	
M-14	Obilaznica Bihaća: Glavni projekat za dionicu: Jablanska ulica - čvor Mali Lug - veza na M-14				Naknada, taksa	580	580	
M-6	Izgradnja Obilaznice Gruda				Naknada, saglasnost,taksa	1.345	1.345	
M-5	Izgradnja Obilaznice Kiseljaka				Taksa	250	250	
	Izgradnja Obilaznice Ljubuški -zapadna				Saglasnost	9.600	9.600	
M-4.2	Skokovi – Srbljani, rekonstrukcija crne tačke "Mala Lisa" km 11+230				Saglasnost,taksa	690	690	
M-20	Rekonstrukcija raskrsnice u Vittkovićima				Integra d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-12689/19. 30.10.2019.	3.487	-	
M-18	Rekonstrukcija raskrsnice ceste M-18 "Olovске Luke" dionica (008), km 20+600				Design &QC d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-6144/FT	1053	1053	
M-5	Rekonst.ceste potez tunel Skela, Jajce Jug- Donji Vakuf Elaborat za vodnu saglasnost				Taksa	1.308	1.308	
M-5	Rekonstrukcija cesta-devijacija Robot- Bihać				Saglasnost	700	700	
	Rekonstrukcija ceste –devijacija puta V korpusa- put AVNOJ-a				Saglasnost, naknada, oglas,konsul elaborat	9.780	9.780	
	Izgradnja treće trake Donji Vakuf-Turbe				Naknada, taksa	1.817	1.817	
	Izgradnja treće trake Pasjak-Resanovci				Edi ing d.o.o.Donji Vakuf, 01-02.1-12680/19. 30.10.2019.	2.925	2.925	
	Rekonstrukcija ceste Crljeni-Zgon				Naknada	5.030	5.030	

JP CESTE FEDERACIJE BIH

	Jajce jug-Donji Vakuf , presvlačenje i ispravka osovine				Trasa d.o.o. Sarajevo, 01-01.1-9891/19. 19.08.2019.	1.170	1.170	
	Izgradnja tunela Karaula				Saglasnost,taksa, Naknada, oglas	1.490	1.490	
M-17	Sanacija mosta petlja Zenica				Naknada	1.629	1.629	
M-20	Obilaznica Goražda-most na Drini				Oglas	571	571	
M-5	Sanacija mosta preko Sandžačke rijeke,Jajce jug-Donji Vakuf				Naknada	4.140	4.140	
M-1.8	Sanacija mosta preko potoka Urvenica, dionica:Srebrenik-Šćiki brod				Eleborat, saglasnost, taksa	1.120	1.120	
M-17	Sanacija tunela Crnaja				Oglas	518	518	
	Rekonstrukcija tunela Barevo III (T16-006-29) L=38m, dionica Crna Rijeka –Jajce Jug, km16+077				Oglas, taksa	777	777	
M-5	Rekonstrukcija cesta Kaonik-Bukovci/Delfine krivine				ZT Tehnozaštita d.o.o. Sarajevo	1.112	1.112	
M-1.8	Sanacija asfaltnog kolovoza Srebrenik-Šćiki brod, -uskladivanje sa Smjernicama, prevod na engleski				Elaborat 01-02.1-1-11581/19. 01.10.2019	3.854	3.854	
M-1.8	Rekonstrukcija raskrsnice u Čehajama, općina Srebrenik- uskladivanje sa Smjernicama, prevod na engleski				Divel d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-1720/19NH	1.112	1.112	
M-1.8	Rekonstrukcija raskrsnice u Šrionici , općina Srebrenik				Oglas	288	288	
M	Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok općina Odžak-elabirat zaštite od požara				AIK Inženjering d.o.o. Banovići, 01-01.1-10312/19. 28.08.2019.	936	936	
	Sanacija asfaltnog kolovoza Pelagićevo-Srebrenik i Orašje-Lončari-uskladivanje sa Smjernicama i prevod na engleski				Pronasa d.o.o. Sarajevo, 01-01.1-10314/19. 28.08.2019.	936	936	
M-1.8	Rekonstrukcija raskresnice „Bingo“ Srebrenik- uskladivanje sa Smjernicama				Naknada	2.948	2.948	
	Obilaznica Stoca - vizualizacija idejnog projekta: dionica: Poplat-Stolac Istok dionica: Masline-Poplat-Zapad				Design &QC d.o.o.Sarajevo, 01-01.1-10316/19, 28.08.2019.	936	936	
	Izgradnja Obilaznice Bosanska Otoka-izrada -elaborata za prethodnu vodnu saglasnost.				ZT Tehnozaštita d.o.o. Sarajevo, 01-01.1-10311/19. 28.08.2019.	702	702	
	Izmjena projektne dokumentacije rekonstrukcije raskrsnice u kružni tok i spajanje sa M-17 Buhać 4-Srbljani (Put AVNOJ-a)				Arting d.o.o.Sarajevo, 01-01.1-10315/19. 28.08.2019.	1.755	1.755	
	Izmještanje ceste M-5, Dionica Jezero-Jajce				Trasa d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-10804/19. 10.09.2019.	936	936	
	Izrada elaborata o promjeni uvjeta temeljenja mosta preko rijeke save u Bos.Šamcu km0+00				Design &QC d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-12678/19. 30.10.2019.	4.680	4.680	
					Integra d.o.o.Mostar, 01-02.1-12679/19. 30.10.2019.	5.265	5.265	
					ASI Inženjering d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-12734/19. 31.10.2019.	2.925	2.925	
					Naknada, saglasnost,taksa	668	668	
					Geo Feld d.o.o. Sarajevo,01-02.2-13506/19. 21.11.2019.	6.962	6.962	
					TZI Inženjering d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-13612/19, 26.11.2019.	3.276	3.276	
					Infra d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-13613/19. 26.11.2019.	6.903	6.903	

JP CESTE FEDERACIJE BIH

		Neum-Stolac			Oglas	288	288	
		Bihać 4-Ripač, sanacija kolovoza i korekcija osovine			Taksa	300	300	
M-17		Izgradnja Južne Obilaznice Mostara			IGH d.o.o.Mostar, 01-02.1-11217/18. 13.12.2018.	144.612	138.266	
		Izgradnja obilaznice Bugojno			Naknada, saglasnost	18.877	18.877	
		Izgradnja Južne obilaznice Gruda II			Geodet,d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-12682/19. 30.10.2019.	7.002	7.002	
		Izgradnja Obilaznice Bužim			Naknada	6.270	6.270	
		Rekonstrukcija raskrsnice Goražde-Ustiprača 0+550			Naknada, taksa	16.035	16.035	
		Rekonstrukcija raskrsnice „Husino“			Naknada	3.776	3.776	
		Skokovi – Srbljani, rekonstrukcija crne tačke „Mala Lisa“ km 11+230			Naknada , taksa	492	492	
		Rekonstrukcija raskrsnice M-5 i lokalne ceste Dolac na Lašvi, dionica (011), km 10+200-9+950			Ipsa Institut d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-6795/17 26.07.2017.	15.122 (preneseno 7.561)	7.561	
		Pelagićevac – Srebrenik, sanacija tunela Ormanica km 16+210			Naknada	1.779	1.779	
		Rekonstr. raskrsnice na M5 i R403, naseljeno mjesto Kamenica, Bihać			Saglasnost	292	292	
					Saglasnost	1.107	1.107	
					Ukupno			421.517
18.	M-17.5	Sanacija magistralnog puta M-17.5, dionica:Sovićka Vrata –Potok Zec	Izvođenje	-	766.000			
		U K U P N O		2.987.000	4.378.800			437.897

R.br.18- Odlukom Vlade F BiH: V broj: 232/19 o kategorizaciji regionalna cesta R-419 Jablanica-Posušje i R-420 Posušje-Grude-Privalj su razvrstane u magistralnu cestu M-17.5. Odlukom o odobravanju realizacije projekta „Sanacije magistralnog puta M-17.5, dionica Sovićka vrata – Potok Zec“, V broj:910/2019 od 31.07.2019. i dopunama Odluke za isti projekat: V broj:1040/2019 od 12.09.2019. JP Ceste F BiH su zadužene da obezbjede iz svojih sredstava iznos od 765.572,22 KM.

3.2.2. Rasvjeta i semaforizacija raskrsnica i tunel

Red br.	Mag. Cesta	Naziv i opis projekta	Aktivnosti na projektu	Plan 2019.	Rebalans Plana 2019.	Izvodač/Konsultant - ugovor	Ugovorenog	Realizovano 2019.	Napomena
1.	M-14	Glavni projekat rasvjete raskrsnice i mosta na cesti M-14_001, (dionica: Bihać – Srbljani) i lokalne ceste	Projektovanje	7.000	-			-	
2.	M-14.2	Semaforizacija magistralne ceste M14.2 i lokalne ceste (11. Ulica), općina Orašje	Projektovanje	7.000	7.000			-	
			Izvođenje	60.000	60.000			-	
			Nadzor	7.000	7.000			-	
3.	M-14.2	Semaforizacija mosta na M14.2/006 Odžak – Bosanski Šamac, km 14+800 (naizmjenično propuštanje vozila)	Projektovanje	-	7.000			-	
4.	M-5	Glavni projekat rasvjete raskrsnice na magistralnoj cesti M-5 u naselju Pudin Han	Projektovanje	-	6.000			-	
5.	M-5	Glavni projekat rasvjete raskrsnice na magistralnoj cesti M-5 i M-11 u naselju Ripač	Projektovanje	-	6.000			-	
		U K U P N O		81.000	93.000			-	

3.2.3. Poboljšanje sigurnosti prometa na magistralnim cestama izgradnjom traka za lijeva skretanja, pješačkih staza sa odvodnjom kišne kanalizacije, odmorišta i sanacija crnih tačaka

Red br.	Mag. Cesta	Naziv i opis projekta	Aktivnosti na projektu	Plan 2019.	Rebalans Plana 2019.	Izvodač/ Konsultant - ugovor	Ugovorenog	Realizovano 2019.	Napomena
1.	M-16	Izgradnja pješačke staze (Podgaj-Lug), općina Bugojno	Projektovanje	7.000	7.000				Nabavka projektovanja u toku
			Izvođenje	290.000	290.000				
			Nadzor	7.000	7.000				
2.	M-17	Izgradnja pješačke staze i rasvjete u Kosovi, općina Maglaj	Izvođenje	340.000	342.000	Dobojputevi d.d. Doboj, 01-02.2-12275/19. 29.10.2019.	341.981	180.859	U toku
			Nadzor	7.000	7.000	Artin BH d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-12276/19. 27.10.2019.	6.845	3.422	
			Ukupno					184.281	
3.	M-18	Izgradnja privremenog kružnog toka, skretanje Energopetrol-industrijska zona, km 4+600, općina Vogošća	Izvođenje	250.000	334.000	MGBH d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-12276/19. 18.10.2019.	333.797		Ugovorenog
			Nadzor	7.000	7.000	AB Plan d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-12278/19. 18.10.2019.	6.999		
			Ukupno						
4.	M-1.8	Rekonstrukcija raskrsnice M-1.8 i lokalne ceste u naselju Bjelave, općina Srebrenik	Izvođenje	270.000	420.000				Nabavka radova u toku
			Nadzor	7.000	7.000				
			Ukupno						
5.	M-17	Rekonstrukcija raskrsnice magistralne ceste i lokalne ceste, općina Konjic	Projektovanje	12.000	12.000	Integra d.o.o. Mostar, 01-01.1-10484/19. 03.09.2019.	5.900	5.900	
			Revizija	2.000	2.000				
			Izvođenje	250.000	300.000				
			Nadzor	6.000	6.000				
			Ukupno					5.900	
6.	M-16.2	Rekonstrukcija raskrsnice u Gornjem Vakufu	Projektovanje	13.000	13.000	Design & QC d.o.o.Sarajevo, 01-01.1-9892/19. 19.08.2019.	6.786	6.786	Idejni projekt završen, glavni projekt nabavka u toku
			Revizija	2.000	2.000				
			Ukupno					6.786	
7.	M-16.2	Izgradnja pješačke staze Bugojno – Gornji Vakuf	Projektovanje	7.000	7.000				
			Izvođenje	200.000	200.000				
			Nadzor	7.000	7.000				
8.	M-14.1	Izgradnja pješačke staze u naselju Posavska Mahala, općina Odžak	Projektovanje	7.000	4.700	Trafficcon d.o.o.Odžak, 01-02.2-14576/19. 20.12.2019.	4.622		Ugovoren projektovanje
			Izvođenje	250.000	250.000				
			Nadzor	7.000	7.000				
			Ukupno						
9.	M-17	Sanacija crne tačke Misurići, dionica	Projektovanje	13.000	13.000				

JP CESTE FEDERACIJE BIH

		(005) općina Maglaj, km 19+000	Revizija	2.000	2.000			-	
10.	M-17	Sanacija crne tačke Tatarbudžak, dionica (006), općina Žepče km 3+500	Projektovanje	13.000	13.000			-	
			Revizija	2.000	2.000			-	
11.	M-15	Sanacija crne tačke Milin Birt, dionica (002), Sanski most km 25+750	Projektovanje	13.000	13.000			-	
			Revizija	2.000	2.000			-	
12.	M-18	Izgradnja pješačke staze u naselju Olovske Luke, općina Olov	Projektovanje	7.000	15.000			-	Poništen tender za nabavku usluga projektovanje -Niko se nije javio
			Izvođenje	200.000	200.000			-	
			Nadzor	7.000	7.000			-	
13.	M-1.8	Izgradnja pješačke staze na dionici Ježinac-Cehaje-Srebrenik-skretanje za Ljenobud, L=3179 m(Ifaza)	Projektovanje	7.000	7.000			-	
			Izvođenje	200.000	200.000			-	
			Nadzor	7.000	7.000			-	
14.	M-4	Rekonstrukcija raskrsnice cesta M4 i R469, općina Kalesija, km 8+860	Izvođenje	260.000	260.000			-	
			Nadzor	7.000	7.000			-	
15.	M-6.1	Izgradnja pješačke staze u naseljenom mjestu Vranić, općina Posušje	Projektovanje	5.000	5.000	Geo-Data d.o.o.Mostar, 01-02.2-13261/19. 14.11.2019.	4.973	4.973	
			Izvođenje	100.000	100.000			-	
			Nadzor	2.000	2.000			-	
			Ukupno					4.973	
16.	M-17	Rekonstrukcija raskrsnice na M-17 u naselju Janjići (veza za naselja Drivuša i Dolača), općina Zenica	Izvođenje	390.000	390.000			-	
			Nadzor	7.000	7.000			-	
17.	M-4	Rekonstrukcija raskrsnice za poslovnu zonu Glinište na M-4	Projektovanje	11.000	11.000			-	
			Revizija	2.000	2.000			-	
18.	M-14.2	Rekonstrukcija raskrsnice u Bosanskom Petrovcu na M-14.2	Projektovanje	11.000	11.000			-	
			Revizija	2.000	2.000			-	
19.	M-4	Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok na M-4 – ulaz u Lukavac	Izvođenje	600.000	600.000			-	
			Nadzor	7.000	7.000			-	
20.	M-5	Izgradnja pješačke staze kroz MZ Pritoka (Put Armije BiH)	Izvođenje	200.000	245.000			-	
			Nadzor	6.000	6.000			-	
21.	M-5	Raskrsnica sa R-441 (Vjetrenica), rekonstrukcija postojeće (postoji projekt) sa djelimičnom sanacijom kolovoza ispred iiza raskrsnice	Izvođenje	500.000	500.000			-	
			Nadzor	7.000	7.000			-	
22.	M-5	Izgradnja pješačke staze u naseljenom mjestu Polje, općina Busovača II faza	Izvođenje	150.000	165.000	Ceste-Company d.o.o. Kiseljak, 01-02.2-13251/19. 14.11.2019.	164.854	-	
			Nadzor	5.000	5.000	AB Plan d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-11933/19. 10.10.2019.	4.996	-	
			Ukupno					-	
23.	M-5	Izgradnja pješačke staze u naseljenom mjestu Han Ploča, općina Kiseljak II faza	Izvođenje	100.000	100.000			-	
			Nadzor	3.000	3.000			-	
24.	M-14	Izgradnja pješačke staze na ulazu u Bosansku Krupu, I faza	Izvođenje	200.000	200.000	Kov-grad d.o.o. Bužim, 01-02.2-14681/19. 24.12.2019.	191.513	-	Ugovor za radove potpisani
			Nadzor	6.000	6.000			-	

JP CESTE FEDERACIJE BIH

			Ukupno						
-25.	M-18	Rekonstrukcija krivine kod autobusnog stajališta Crijevići – prema Tuzli	Projektovanje	13.000	13.000				-
			Revizija	2.000	2.000				-
26.	M-17	Postavljanje odbojnih ograda nivoa zaštite H1	Projektovanje	30.000	30.000				-
			Izvođenje	863.000	863.000				-
			Nadzor	7.000	7.000				-
27.	M-17	Rekonstrukcija raskrsnice cesta M-17 i M-16.2 općina Jablanica	Projektovanje	12.000	12.000	Inetprojekt d.o.o.Mostar, 01-01.1-10448/19. 02.09.2019. 01-02.4-13095/19. 08.11.2019.	5.850-idejni projekt 5.967-idejni projekat	11.817	Projektov. okončano
			Revizija	2.000	2.000				
			Izvođenje	300.000	300.000				
			Nadzor	7.000	7.000				
			Ukupno					11.817	
28.	M-14	Rekonstrukcija raskrsnice na cesti M-14_001 (dionica: Bihać-Srbljani) i lokalne ceste za naselje Brekovica,	Projektovanje	7.000	-				
			Revizija	2.000	-				
29.	M-6	Rekonstrukcija raskrsnice na M-6 i R-427, općina Stolac	Projektovanje	6.000	6.000	Trafficcon d.o.o.Odžak, 01-02.2-12471/19. 23.10.2019.			U toku
			Revizija	2.000	2.000	Integra d.o.o.Mostar, 01-02.2-13750/19. 29.11.2019.	2.000	-	
			Izvođenje	200.000	350.000				
			Nadzor	6.000	6.000				
			Ukupno						
30.	M-17	Izgradnja pješačkog prelaza izvan nivoa kolovoza za naselje Nemila, km 4+700	Izvođenje	400.000	400.000				Neriješeni imovinsko pravni - odnosi
			Nadzor	7.000	7.000				
31.	M-15	Rekonstrukcija raskrsnice na obilaznicai Livna u kružni tok – križanje M-15 i ul. Blajburških žrtava,	Izvođenje	350.000	450.000				Nabavka radova u toku
			Nadzor	7.000	7.000	Integra d.o.o.Mostar, 01-02.2-14800/19. 30.12.2019.	6.962	-	
			Ukupno						
32.	M-5	Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok na cesti M5 u naseljenom mjestu Kalibunar, općina Travnik	Projektovanje	14.000	8.200	Geoput d.o.o. Banja luka, 01-02.2-11054/19. 17.09.2019.	8.189	-	U toku projektovanje i revizija
			Revizija	3.000	3.000	Pronasa d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-12824/19. 04.11.2019.	2.925	-	
			Izvođenje	400.000	400.000				
			Nadzor	7.000	7.000				
			Ukupno						
33.	M-17	Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok na cesti M-17, ulaz u industrijsku zonu Pećuj, grad Zenica	Projektovanje	14.000	14.000				
			Revizija	2.000	2.000				
34.	M-18	Nastavak izgradnje servisne saobraćajnice u općini Živinice	Izvođenje	350.000	350.000				
			Nadzor	7.000	7.000				
35.	M-6	Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok	Projektovanje	14.000	-				

JP CESTE FEDERACIJE BIH

		na cesti M-6_002, općina Čapljina	Izvođenje	300.000	-			-	
			Nadzor	7.000	-			-	
36.	M-16.2	Izgradnja pješačke staze u naselju Gračac, općina Prozor	Projektovanje	7.000	7.000	Trafficcon d.o.o.Odžak, 01-02.2-12470/19. 23.10.2019.	5.967	-	Projektov. u toku
			Izvođenje	200.000	200.000			-	
			Nadzor	7.000	7.000			-	
			Ukupno					-	
37.	M16.2	Rekonstrukcija raskrsnice za naselje Duge, općina Prozor	Projektovanje	14.000	14.000	VP- CPK d.o.o. Banja luka i HKP Consulting d.o.o.Banja luka, 01-02.2-13751/19. 29.11.2019.	5.148	-	Projetov. u toku
			Izvođenje	200.000	300.000			-	
			Nadzor	7.000	7.000			-	
			Ukupno					-	
38.	M-15	Izgradnja pješačke staze Mesihovina-Bukovica-Mrkodol, općina Tomislavgrad	Izvođenje	200.000	200.000			-	Nabavka radova u toku
			Nadzor	6.000	6.000	Geo Data d.o.o.Mostar, 01-02.4-10938/19. 13.09.2019.	5.908,50	-	
			Ukupno					-	
			Projektovanje	6.000	6.000	Pronasa d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-11867/19. 09.10.2019.	5.967	5.967	Projektov. okončano
39.	M-17	Izgradnja pješačke staze Goliješnica-Brankovići, općina Žepče	Izvođenje	150.000	150.000			-	
			Nadzor	5.000	5.000			-	
			Ukupno					5.967	
			Projektovanje	6.000	6.000	Geo feld d.o.o. Bihać, 01-02.2-12611/19. 27.10.2019.	6.903	6.903	Projektov. okončano
40.	M-14	Izgradnja pješačke staze kroz naselje Srbljani, grad Bihać	Izvođenje	200.000	200.000			-	
			Nadzor	6.000	6.000			-	
			Ukupno					6.903	
			Izvođenje	400.000	400.000			-	
41.	M-5	Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok, cesta M5-obilaznica Bihaća i skretanje za poslovnu zonu	Nadzor	7.000	7.000			-	
			Izvođenje	200.000	200.000	Divel d.o.o. Sanski most, 01-02.2-12578/19 .25.10.2019.	165.979	165.833	U toku
42.	M-5	Izgradnja pješačke staze na cesti M5: Ključ – Rogolji (II faza)	Nadzor	7.000	7.000	Trasa d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-12656/19. 29.10.2019.	6.786	5.742	
			Ukupno					171.575	
			Projektovanje	7.000	7.000	Geo-Data d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-13097/19. 08.11.2019.	6.973	6.973	Okončano projektovanje
43.	M-15	Izgradnja pješačke staze na cesti M15 ispred OŠ i SŠC, općina Glamoč	Izvođenje	250.000	250.000			-	
			Nadzor	7.000	7.000			-	
			Ukupno					6.973	
44.	M-15	Izgradnja pješačke staze na cesti M15, prolaz kroz naselje Tomina, općina	Projektovanje	7.000	7.000	Edi-ing d.o.o.Donji Vakuf,	4.563	4.563	Okončano projektovanje

JP CESTE FEDERACIJE BIH

		Sanski Most			01-02.2-12141/19. 15.10.2019.			Nabavka radova u toku
45.	M-17	Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok, cesta M17-skretanje Hadžići	Izvođenje	150.000	250.000			-
			Nadzor	5.000	5.000			-
			Ukupno				4.563	
46.	M-1.9	Rekonstrukcija ceste M1.9, Slatina (gr.entiteta) – Gradačac – izgradnja kružnog toka na križanju za industrijsku zonu, općina Gradačac	Projektovanje	14.000	14.000	Divel d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-12657/19. 29.10.2019. 01-02.2-200	6.903	6.903
			Izvođenje	400.000	650.000			-
			Nadzor	7.000	7.000			-
			Ukupno				6.903	Idejni projekat uraden U toku nabavka za glavni projekat
47.	M-4.2	Rekonstrukcija raskrsnice na M-4.2, izlaz iz Velike Klaše, dionica_001 (spoj Obilaznice i magistralne ceste)	Izvođenje	343.000	343.000			-
			Nadzor	7.000	7.000			-
48.	M-16.4	Izgradnja pješačke staze u naseljenom mjestu Stojkovići, općina Novi Travnik	Projektovanje	14.000	14.000			-
			Revizija	2.000	2.000			-
			Izvođenje	100.000	150.000			-
49.	M-16.2	Izgradnja pješačke staze u naselju Gračanica, općina Prozor/Rama	Nadzor	3.000	3.000			-
			Projektovanje	6.000	6.000	Geo data d.o.o.Mostar, 01-02.4-9722/19. 14.08.2019.	6.926	6.926
			Izvođenje	188.000	188.000	HP Investing d.o.o.Mostar, 01-02.2-13749/19. 29.11.2019.	184.761	-
			Nadzor	6.000	6.000	Inteprojekt d.o.o. Mostar, 01-02.2-13094/19. 08.11.2019.	5.967	-
50.	M-18	Ažuriranje projekta rekonstrukcije raskrsnice magistralne ceste M-18 i R-468 u Olovskim lukama	Ukupno				6.926	
			Projektovanje	-	3.000			-
51.	M-17 M-5	Uređenje slijedećih lokacija za vaganje: - „Tatarbudžak“ na M -17, 006, dionica Ozimice – Topčić Polje, km. 4 +680 L - „Rakovica“ na cesti M - 5, 014, dionica Gromiljak – Blažuj, km.19 +660 D - „Pudin Han“ na rask. M- 5 i R410 A, 006, dionica Gornje Bravsko – Ključ, km 14+990 L	Projektovanje	-	12.000			
52.		Ažuriranje projekta rekonstrukcije raskrsnice – crne tačke „Nula“, Vitalj-Olovo, km 20+600 sa izradom geotehničkog elaborata	Projektovanje	-	6.000	Pronasa d.o.o.Sarajevo, 01-02.3-14617/19. 23.12.2019.	6.786	6.786
53.	M-6	Rekonstrukcija raskrsnice cesta M-6.1 i lokalne ceste za Industrijsku zonu - naselje Knežpolje, općina Široki Brijeg	Projektovanje	-	10.000			-
			Revizija	-	2.000			-
54.	M-17	Rekonstrukcija raskrsnice magistralne ceste M17, dionica: 008 HW (Jošanica) 1 - Stup 1, km 3+500 sa ulicom Reljevska, općina Novi grad Sarajevo	Projektovanje	-	7.000			-
			Revizija	-	2.000			-
55.	M-17	Rekonstrukcija sa semaforizacijom raskrsnice magistralne ceste M17, dionica: 008 HW (Jošanica) 1 - Stup 1, km 5+000 sa ulicom Rajlovačka cesta, općina Novi grad Sarajevo	Projektovanje	-	12.000			-
			Revizija	-	4.000			-

JP CESTE FEDERACIJE BIH

56.	M-18	Rekonstrukcija pješačkih staza sa rješavanjem odvodnje, magistralna cesta M18, dionica 010 Semizovac - Sarajevo – Malta, km 8+400 km – km 10+400 (Kobilja glava – Šip)	Projektovanje	-	10.000				-	
			Revizija	-	4.000				-	
57.	M-5	Idejni projekt rekonstrukcije raskrsnice na M-5 A. Šaćirbegović _Korija_Ljubogoša km1+350	Projektovanje	-	7.000				-	
58.	M-5	Izmjena projekta izgradnje pješačke staze (Rakovica) sa sanacijom kolovoza i rješavanjem odvodnje na potezu km 23+400 –km 23+700	Projektovanje	-	1.000				-	
59.	M-4	Rekonstrukcija raskrsnice u Gornjoj Kalesiji, općina Kelesija	Projektovanje	-	7.000				-	
60.	M-17	Rekonstrukcija raskrsnice na magistralnoj cesti M-17, općina Ilijadža	Projektovanje	-	14.000				-	
61.	M-5	Izgradnja pješačke staze Gromljak-Blažuj (Rakovica) II faza	Projektovanje	-	-	Arting d.o.o.Sarajevo, 01-02.3-11956/19. 29.10.2019.	1.170	1.170	Okončano projektovanje	
			Izvođenje	-	350.000					
			Nadzor	-	7.000					
62.	M-16	Rekonstrukcija raskrsnice na magistralnoj cesti M-16, općina Karadže, općina Bugojno	Projektovanje	-	14.000				-	
63.	M-18	Izgradnja pješačke staze dionica: Priboj 2-Simin Han 1	Projektovanje	-	7.000				-	
64.	M-5	Izgradnja pješačke staze na magistralnoj cesti M-5 u naselju Izačić	Projektovanje	-	7.000				-	
65.	M-1.8	Izgradnja servisne saobraćajnic uz magistralnu cestu , općina Srebrenik	Projektovanje	-	7.000				-	
U K U P N O				11.487.000	12.745.900				431.523	

R.br.35- Na osnovu Sporazuma o zajedničkom sufinsaniranju projekta JP Ceste F BiH su Gradu Čapljina doznačile sredstva u iznosu od 319.000 KM, gdje će po okonačnju Grad Čapljina predati projekt sa dokumentacijom JP Ceste F BiH na upravljanje.

3.2.4. Vanredno održavanje

3.2.4.1. Sanacija i rekonstrukcija cestovnih objekata

Red br.	Mag. Cesta	Naziv i opis projekta	Aktivnosti na projektu	Plan 2019.	Rebalans Plana 2019.	Izvodač/ Konsultant - ugovor	Ugovorenog	Realizovano 2019.	Napomena
1.	M-17	Rekonstrukcija/sanacija tunela „Ivan“ (T17-011-46) l=646m, Ivan sedlo, dionica Tarčin-Konjic, km 7+750	Projektiranje	100.000	100.000			-	Tender za projektiranje u toku
			Revizija	7.000	7.000			-	
2.	M-5	Rekonstrukcija mosta preko rijeke Ivančice u Busovači M5-013-233), dionica Kaonik-Gromiljak, km 3+695	Projektiranje	15.000	13.000	Design & QC d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-11811/19. 08.10.2019.	12.753	-	Projektiranje u toku
			Revizija	1.500	2.000	Infra d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-14603/19. 20.12.2019.	1.755	-	
			Izvođenje	250.000	250.000			-	
			Nadzor	7.000	7.000			-	
			Ukupno						
3.	M-17	Sanacija mosta (M-17-011-342), preko nepoznatog potoka, lokacija Zukića kosa, dionica Tarčin - Konjic, km 13+736	Izvođenje	400.000	500.000			-	Tender za izvođenje u toku
			Nadzor	12.000	15.000			-	

JP CESTE FEDERACIJE BIH

4.	M-18	Sanacija mosta) preko rijeke Stupčanice u Olovskim Lukama (M18-008-165) dionica Vitalj - Olovo, km 20+400	Izvođenje	460.000	460.000				-	Tender za izvođenje u toku
			Nadzor	14.000	14.000				-	
5.	M-17	Sanacije mosta preko rijeke Željeznice na Ildži (M17-009-405) dionica Stup 3-Blažuj, km 2+635	Projektiranje	30.000	30.000				-	Tender za projektiranje u toku
			Revizija	3.000	3.000				-	
6.	M-5	Rekonstrukcija mosta preko Babinog potoka u Babinom Potoku (M5-009-288) dionica Jajce Jug - Donji Vakuf 1, km 23+025	Projektiranje	12.000	12.000				-	Tender za projektiranje u toku
			Revizija	1.500	1.500				-	
7.	M-16	Rekonstrukcija mosta preko potoka Komotin u Podmilaču (M16-006-246) dionica Crna Rijeka - Jajce Jug , km 18+285	Projektiranje	12.000	12.000				-	Tender za projektiranje u toku
			Revizija	1.500	1.500				-	
8.	M-4	Rekonstrukcija mosta preko Lohinjske rijeke u Donjoj Lohinji (M4-009-504) dionica Dobojski - Donja Orahovica, km 23+498	Projektiranje	12.000	12.000				-	Tender za projektiranje u toku
			Revizija	1.500	1.500				-	
9.	M-18.1	Rekonstrukcija mosta preko Crne rijeke, Garež (M18.1-001-448) dionica Ustikolina-Grebak-Delijaš-Trnovo, km 46+237	Projektiranje	15.000	15.000				-	Tender za projektiranje u toku
			Revizija	1.500	1.500				-	
10.	M-19	Sanacija mosta preko rijeke Drinjača, Gojsalići (M19.2-001-97) dionica Kladanj – Vlasenica, km 2+323	Projektiranje	15.000	15.000				-	Tender za projektiranje u toku
			Revizija	1.500	1.500				-	
11.	M-5	Sanacija mosta preko Duboke doline na Komaru (M-5-3-15) dionica: Donji Vakuf- Turbe, km 17+093	Projektiranje	7.000	7.000				-	Tender za projektiranje u toku
			Revizija	1.000	1.000				-	
12.	M-18	Rekonstrukcija/Sanacija mosta preko rijeke Suha u Stuparima (M18-007-83) dionica Živinice 1 - Vitalj, km 16+426	Izvođenje	-	400.000				-	Čeka završetak projekta
			Nadzor	-	12.000				-	
13.	M-5	Rekonstrukcija mosta (M-5-012-227) preko r. Bile, na cesti M-5, dionica Nević Polje- Kaonik, km 4+988 - Izrada projekta privremene obilaznice	Izvođenje	-	650.000				-	Tender u pripremi
			Nadzor	-	15.000				-	
			Projektovanje	-	7.000				-	
14.	M-16	Izrada idejnog i glavnog projekta rekonstrukcije priključka lokalne ceste za Zdaljevac na cestu M-16, dionica 006 Crna rijeka –Jajce Jug u km 13+900 i izgradnje mosta preko rijeke Vrbas (akumulacija hidroelektrane Jajce II)	Projektiranje	-	35.000				-	Tender u pripremi
			Revizija	-	4.000				-	
15.	M-17	Zamjena dilatacionih naprava na natputnjaku Ildži (M-17-009-422) kod Energoinvesta, na cesti M-17, dionica 009 Stup 3 – Blažuj, u km 0+321	Izvođenje	-	170.000				-	Tender u pripremi
			Nadzor	-	5.000				-	
		U K U P N O		1.381.000	2.780.500				0	

3.2.4.2. Sanacija oštećenih asfaltnih kolovoza

JP CESTE FEDERACIJE BIH

Red br.	Mag. Cesta	Naziv i opis projekta	Aktivnosti na projektu	Plan 2019.	Rebalans Plana 2019.	Izvodač/ Konsultant - ugovor	Ugovoreno	Realizovano 2019.	Napomena
1.	M-5	Sanacija asfaltnog kolovoza M-5: Gromiljak – Blažuj	Izvođenje	350.000	350.200	GP Ceste company d.o.o.Kiseljak i Sarajevoputevi d.d. Sarajevo, 01-02.2-12400/19. 22.10.2019.	350.169	-	Ugovoreno
			Nadzor	7.000	7.000	Ipsa institut d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-12277/19. 18.10.2019.	6.669	-	
			Ukupno					-	
2.	M-14	Sanacija asfaltnog kolovoza M- 14_002: Srbljani – Bosanska Krupa sa uređenjem i zaštitom škarpi zasjeka L = 8,0 km	Izvođenje	400.000	400.000			-	
			Nadzor	7.000	7.000			-	
3.	M-16	Sanacija asfaltnog kolovoza Crna Rijeka – Jajce Jug, L=2,5 km	Izvođenje	250.000	250.000	Mrkonjićputevi d.o.o. Mrkonjić grad, 01-02.2-12035/19. 14.10.2019.	249.599	246.282	Okončano
			Nadzor	7.000	7.000	Arting BH d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-12615/19. 27.10.2019.	5.714	5.714	
			Ukupno					251.996	
4.	M-1.9	Sanacija asfaltnog kolovoza Ormanica – Gradačac, L=2,0 km	Projektovanje	7.000	7.000	Design &QC d.o.o Sarajevo 01-02.2-7926/19. 03.07.2019.	11.700	11.700	Ugovoreno 23.12.2019.
			Izvođenje	300.000	300.000	Balegem d.o.o.Gradačac, 01-02.2-14610/19. 23.12.2019.	299.800	-	
			Nadzor	7.000	7.000	AIK Inžinjering d.o.o.Banovići, 01-02.2-14611/19. 23.12.2019.	3.346	-	
			Ukupno					11.700	
5.	M-17	Sanacija asfaltnog kolovoza (017) Buna-Tasovčići	Izvođenje	500.000	520.000			-	
			Nadzor	7.000	7.000			-	
6.	M-17	Sanacija asfaltnog kolovoza M-17 dionica Konjic –Jablanica, dužine cca 3km	Izvođenje	400.000	400.000	HP Investing d.o.o.Mostar, 01-02.4-14826/19. 30.12.2019.	479.345	-	Ugovoreno 30.12.2019.
			Nadzor	7.000	7.000	Arting d.o.o.Sarajevo, 01-02.4-14319/19. 13.12.2019.	5.791,50	-	
			Ukupno					-	
7.	M-4	Sanacija asfaltnog kolovoza (crne tačke Sarači), dionica :Simin HanI - Donje Caparde(012), km 11+600- 12+000	Projektovanje	7.000	7.000			-	
			Izvođenje	250.000	250.000			-	
			Nadzor	5.000	5.000			-	
8.	M- 17.4	Sanacija asfaltnog kolovoza (crne tačke "Potpolje"), dionica: (002) Čitluk-Medjugorje-Ljubuški, km 2+100-2+400	Projektovanje	7.000	7.000	Integra d.o.o.Mostar, 01-02.4-13096/19. 08.11.2019.	6.903	6.903	Projekt. okončano
			Izvođenje	200.000	250.000			-	
			Nadzor	5.000	5.000			-	
			Ukupno					6.903	
9.	M-4.2	Sanacija crne tačke na magistralnoj cesti M4.2, dionica (002)	Projektovanje	7.000	7.000			-	
			Izvođenje	250.000	250.000			-	
			Nadzor	7.000	7.000			-	
10.	M-17	Sanacija asfaltnog kolovoza (005) na	Izvođenje	650.000	650.000			-	

JP CESTE FEDERACIJE BIH

		poddionici: Poljice-Misurići, L=2,5 km, općina Maglaj	Nadzor	7.000	7.000	-	-	
11.	M-4	Sanacija asfaltnog kolovoza(010) Donja Orahovica – Šiški Brod, L=2,0 km (Miričina)	Izvođenje	400.000	600.000	-	-	Nabavka radova u toku
			Nadzor	7.000	7.000	-	-	
12.	M-14.2	Sanacija oštećenog asfaltnog kolovoza Bosanski Petrovac – Pasjak – Resanovci	Projektovanje	7.000	7.000	Geo feld d.o.o.Bihać, 01-02.4-14757/19. 27.12.2019.	6.844	Projekt. ugovoreno 27.12.2019.
			Izvođenje	236.000	300.000	-	-	
			Nadzor	7.000	7.000	-	-	
			Ukupno					
13.	M-14	Sanacija oštećenog asfaltnog kolovoza Otoka – Novi Grad	Projektovanje	7.000	7.000	-	-	
			Izvođenje	400.000	400.000	-	-	
			Nadzor	7.000	7.000	-	-	
14.	M-16.2	Sanacija oštećenog asfaltnog kolovoza Bugojno 2 – Gornji Vakuf	Projektovanje	6.000	6.000	Arting d.o.o Sarajevo, 01-01.1-10385/19. 29.08.2019.	5.967	Projekt. okončano
			Izvođenje	250.000	250.000	-	-	
			Nadzor	6.000	6.000	-	-	
			Ukupno				5.967	
15.	M-4	Sanacija oštećenog asfaltnog kolovoza Teslić – Karuše	Projektovanje	7.000	7.000	-	-	
			Izvođenje	350.000	350.000	Dobojputevi d.d.Doboj jug, 01-02.2-14856/19. 31.12.2019.	348.096	Ugovoreno 31.12.2019.
			Nadzor	7.000	7.000	AIK Inženjering d.o.o.Banovići,01-02.2-14857/19. 31.12.2019.	3.791	
			Ukupno					
16.	M-14	Sanacija kolovozne konstrukcije na cesti M-14_001, (dionica: Bihać - Srbljani) u dužina cca 1,6 km (zaštita od visokih voda rijeke Une)	Projektovanje	7.000	7.000	-	-	Radit će se u sklopu Brekovice
17.	M-6	Sanacija oštećenog asfaltnog kolovoza Masline-Stolac,	Projektovanje	5.000	5.000	Aber Design d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-12612/19. 27.10.2019.	5.000	Nabavka radova u toku
			Izvođenje	150.000	150.000	-	-	
			Nadzor	4.000	4.000	-	-	
			Ukupno				5.000	
18.	M-5	Sanacija asfaltnog kolovoza: Nević Polje – Kaonik	Izvođenje	800.000	800.000	-	-	Izmjena projektne dokument.
			Nadzor	25.000	25.000	-	-	
19.	M-17.4	Sanacija asfaltnog kolovoza: Čitluk – Ljubuški	Projektovanje	6.000	6.000	-	-	
			Izvođenje	300.000	300.000	Putovi d.o.o.Grude, 01-02.2-12140/19. 15.10.2019.	296.262	Okončano
			Nadzor	6.000	6.000	Integra d.o.o.Mostar, 01-02.2-12275/19. 18.10.2019.	6.903	
			Ukupno				303.100	
			Projektovanje	7.000	7.000	Jata Group d.o.o. Srebrenik, 01-02.2-12671/19. 30.10.2019.	-	
20.	M-14.2	Sanacija asfaltnog kolovoza dionica: granica entiteta -Domaljevac	Izvođenje	300.000	250.000	-	182.998	Okončano
			Nadzor	7.000	7.000	AIK Inženjering d.o.o.Banovići, 01-02.2-14315/19.	5.265	

JP CESTE FEDERACIJE BIH

					13.12.2019.		
			Ukupno				188.114
21.	M-6.1	Sanacija asfaltnog kolovoza M-6.1_010: Široki Brijeg-Mostar, ulaz u Mostar	Projektovanje	7.000	7.000	Integra d.o.o. Mostar, 01-01.1-10313/19. 28.08.2019.	6.903
			Izvođenje	300.000	300.000		-
			Nadzor	7.000	7.000		-
			Ukupno				6.903
22.	M-4.2	Sanacija asfaltnog kolovoza na cesti M-4.2_002: Skokovi – Srbljani	Izvođenje	600.000	600.000		-
			Nadzor	7.000	7.000	DTQ d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-14531/19. 19.12.2019.	6.845
			Ukupno				-
23.	M-4.2	Sanacija asfaltnog kolovoza na cesti M-4.2, dionica: Skokovi – Srbljani, km 5+950 –km 9+950	Projektovanje	-	7.000		-
		U K U P N O		7.879.000	8.170.200		779.683

3.2.4.3. Sanacija klizišta, odrona, sanacija slijeganja trupa puta, kosina, usjeka i zasjeka

Red br.	Mag. Cesta	Naziv i opis projekta	Aktivnosti na projektu	Plan 2019.	Rebalans Plana 2019.	Izvođač/ Konsultant - ugovor	Ugovoreno	Realizovano 2019.	Napomena
1.	M-16.4	Sanacija slijeganja trupa ceste, dionica: Bugojno – Nević polje, km 22+900	Izvođenje	150.000	150.000			-	
			Nadzor	6.000	6.000			-	
2.	M-5	Sanacija slijeganja trupa ceste, dionica: (007) Ključ – Rogolji, km 4+000	Projektovanje	14.000	11.700	Design &QC d.o.o Sarajevo, 01-02.2-10820/19. 11.09.2019.	11.700	-	Projekt. okončano, siturano u 2020.
			Revizija	2.000	2.000			-	
			Izvođenje	330.000	330.000			-	
			Nadzor	6.000	6.000			-	
			Ukupno					-	
3.	M-16	Crna Rijeka – Jajce, (006) km 6+500 do km 10+600 (više lokacija), sanacija škarpi i nestabilnih kosina	Izvođenje	310.000	310.000	Komotin d.o.o.Jajce, 01-02.2-13505/19. 21.11.2019.	265.239	-	U toku
			Nadzor	6.000	5.900	Arting d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-11058/19. 17.09.2019.	5.850	-	
			Ukupno					-	
4.	M-16.2	Sanacija slijeganja trupa ceste i potpornog zida ispod nivelete, cesta M-16.2_003, dionica Prozor – Jablanica 1, km 3+850	Izvođenje	260.000	273.000	HP Investing d.o.o. Mostar, 01-02.2-12672/19. 30.10.2019.	273.286	-	U toku
			Nadzor	6.000	5.900	Arting d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-11057/19. 17.09.2019.	5.850	-	
			Ukupno					-	

JP CESTE FEDERACIJE BIH

5.	M-14	Sanacija škarpi i kosina, dionica Srbljani – Bos.Krupa, na najugroženijim mjestima	Izvođenje	300.000	300.000			-	
			Nadzor	6.000	6.000			-	
6.	M-14	Sanacija slijeganja trupa ceste, cesta M14, dionica: Bihać – Grmuša (Prnjosor) – Mali Radić, dionica: Čavkići – Spahići, od P45 do P50, km 0+870 – km 0+959,51	Izvođenje	200.000	200.000	I-Selimović d.o.o.Cazin, 01-02.2-11558/19. 02.10.2019.	199.760	152.787	U toku
			Nadzor	6.000	6.000	Geofeld d.o.o. Bihać, 01-02.2-11055/19. 17.09.2019.	5.990	-	
			Ukupno					152.787	
7.	M-17	Sanacija slijeganja i izdizanja trupa ceste petlja Blatuša, Zenica	Projektovanje	-	30.000			-	
8.	M-5	Sanacija škarpi i kosina, dionica: Kaonik-Lašva, cesta M-5_D13, km 3+100 do km 3+250 i km 3+600 do km 3+850	Projektovanje	-	15.000			-	
9.	M-1.9	Sanacija klizišta i asfaltnog kolovoza cesta M-1.9_002, dionica:Gradačac-Ormanica od km 2+000 do km 2+400	Projektovanje	-	23.400	Design &QC d.o.o Sarajevo, 01-02.2-7926/19. 03.07.2019.	23.400	23.400	Projekt. okončano Aktivnosti u narednom periodu
			Izvođenje	-	300.000			-	
			Nadzor	-	7.000			-	
			Ukupno					23.400	
10.	M-1.9	Sanacija klizišta i asfaltnog kolovoza cesta M1.9_002, dionica:Gradačac-Ormanica od km 6+600 do km 7+000	Projektovanje	-	11.700			-	
			Izvođenje	-	280.000			-	
			Nadzor	-	7.000			-	
11.		Izrada projektnе dokumentacije za novonastale sanacije slijeganja, klizišta i škarpi	Projektovanje	100.000	100.000			-	
		U K U P N O		1.702.000	2.386.600			176.187	

4. Eksproprijacija i elaborati eksproprijacije

U okviru Programa „Modernizacija cesta u FBiH“ koji se finansira iz sredstava kredita međunarodnih finansijskih institucija osnovni preduslov, za početak radova, je okončanje postupka eksproprijacije. Za projekte gdje su neophodne pripreme za eksproprijaciju, elaborati eksproprijacije, vještačenja i konsultantske usluge (pravna pomoć) JP Ceste F BiH su u izvještajnom periodu realizovale 1,23 mil.KM, a za eksproprijaciju 4,90 mil.KM.

Red. br.	O P I S	Plan 2019.	Rebalans Plana 2019.	Izvođač/ Konsultant - ugovor	Ugovoreno	Realizovano 2019.	Napomena
1.	Elaborati eksproprijacije i pripremne faze za eksproprijaciju (vještačenja, pretvorbe zemljišta..i sl.)	300.000	300.000	GP: Sarajinžinering d.o.o. Sarajevo, Zedis d.o.o. Zenica,GeoFeld d.o.o. Bihać i AMG d.o.o. Visoko, 01-02.2-7162/17, 07.08.2017. Anex broj: 01-02.2-6333/18. 02.08.2018.	21.180 (preneseno 6.354)	6.354	Okončano
	Elaborati eksproprijacije:				14.341	14.341	
	Izgradnje trake za spora vozila na dionici:				23.661 (preneseno 18.929)	18.929	
	- Ripač – Dubovsko				16.334	16.334	
	- Dionica Priboj 2-Simin Han 1, Poddionica Banj Brdo - Simin Han				24.286 (preneseno 7.286)	7.286	
	- Tomislavgrad-Široki						
	- Donj Vakuf-Turbe						
	- Bosanski petrovac-Pasjak						

JP CESTE FEDERACIJE BIH

<ul style="list-style-type: none"> - Pasjak-Resanovci - Izgradnja Obilaznice Cazin - Sanacija crne tačke Trivunove krivine dionica: Kupres-Šujica - Rekonstrukcija raskrsnice na M5 i R403, naseljeno mjesto Kamenica, Bihać - Rekonstrukcija raskrsnice cesta M-5 i M-14.2 u Bosanskom Petrovcu - Rekonstrukcija raskrsnice M-6.1 i R-420 u naseljenom mjestu Vinjani, općina Posušje - Jajce jug-Donji Vakuf 1, presvlačenje i ispravka osovine - Rekonstrukcija ceste Crnjeni-Zgon <p>Pripremne faze za eksproprijaciju (vještačenja, pretvorbe zemljišta..i sl.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Neum-Stolac - Neum Stolac(Broćanac-Papratnica) - Neum Stolac(Hutovo-Cerovica) - Neum Stolac(Cerovica-Stolovi-Drenovac) - Izgradnje trake za spora vozila na dionici: Ripač – Dubovsko - Izgradnja Južne obilaznice Mostara - Obilaznica Bihaća: Glavni projekat za dionicu: Jablanska ulica - čvor Mali Lug - veza na M-14 - Rekonstrukcija raskrsnice ceste M-4.2 i R-400 na M-4.2, dionice Skokovi – Srbljani (Todorovo) - Rekonstrukcija raskrsnice Brekovica na M-14, Bihać-Srbljani - Rekonstrukcija raskrsnice ceste M-18 "Olovске Luke" dionica: (008), km 20+600 - Rekonstrukcija ceste –devijacija puta V korpusa- put AVNOJ-a - Rekonstrukcija raskrsnice u naselju Klokočnica, II faza - Donji Vakuf-Turbe - - Izgradnja trake za spora vozila Tomislavgrad - Široki - Šiški Brod 3 – Živinice 1, rekonstrukcija crne tačke "Husino" km 2+500 - Izgradnja trake za spora vozila Gromljak-Blažuj (Kobiljača) - Izgradnja Obilaznice Donji Vakuf - Rekonstr. raskrsnice na M5 i R403, naseljeno mjesto Kamenica, Bihać - Rekonstrukcija raskrsnice M-5 i lokalne ceste Dolac na Lađvi, dionica (011), km 10+200-9+950 - Rekonstrukcija raskrsnice cesta M-5 i M-14.2 u Bosanskom Petrovcu - Sanacija mosta preko rijeke Bunte u Gračanici - Sanacija ceste Bihać 4-Ripač <p>Konsultantske usluge –pravna pomoć</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rekonstrukcija raskrsnice ceste M-4.2 i R-400 na M-4.2, dionice Skokovi – Srbljani (Todorovo) - Sanacija ceste Bihać 4-Ripač 	<p>Vještačenje</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr><td></td><td>7.286)</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>17.018 (preneseno 5.105)</td><td>5.105</td></tr> <tr><td></td><td>24.912 (Preneseno 7.473)</td><td>7.473</td></tr> <tr><td></td><td>25.302</td><td>25.302</td></tr> <tr><td>Geo Feld d.o.o. Bihać, 01-02.1-6286/19. 10.07.2013.</td><td>1.755</td><td>1.755</td></tr> <tr><td>GeoFeld d.o.o. Bihać, 01-01.1-3461/19. 25.03.2019.</td><td>2.340</td><td>2.340</td></tr> <tr><td>Geo data d.o.o. Mostar, 01-01.1-3184/19. 19.03.2019.</td><td>1.930</td><td>1.930</td></tr> <tr><td>Ugovor o djelu 01-02.1-1431/19, 31.01.2019.</td><td>8.064</td><td>8.064</td></tr> <tr><td>Ipsa</td><td>6.435</td><td>6.435</td></tr> <tr><td>Ugovor o djelu</td><td>1.779</td><td>1.779</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Vještačenja, naknade ,</td><td>35.714 62.783</td><td>35.714 62.783</td></tr> <tr><td>Vještačenja</td><td>66.881</td><td>66.881</td></tr> <tr><td>Vještačenja, naknade ,</td><td>60.128 12.065</td><td>60.128 12.065</td></tr> <tr><td>"</td><td>33.689 663.974</td><td>33.689 663.974</td></tr> <tr><td></td><td>3.736</td><td>3.736</td></tr> <tr><td></td><td>7.081</td><td>7.081</td></tr> <tr><td></td><td>3.558</td><td>3.558</td></tr> <tr><td></td><td>2.490</td><td>2.490</td></tr> <tr><td></td><td>1.779</td><td>1.779</td></tr> <tr><td></td><td>7.427</td><td>7.427</td></tr> <tr><td></td><td>18.499</td><td>18.499</td></tr> <tr><td></td><td>1.186</td><td>1.186</td></tr> <tr><td></td><td>5.693</td><td>5.693</td></tr> <tr><td></td><td>14.859</td><td>14.859</td></tr> <tr><td></td><td>4.386</td><td>4.386</td></tr> <tr><td></td><td>25.041</td><td>25.041</td></tr> <tr><td></td><td>3.157</td><td>3.157</td></tr> <tr><td></td><td>5.337</td><td>5.337</td></tr> <tr><td></td><td>1.898</td><td>1.898</td></tr> <tr><td></td><td>2.469</td><td>2.469</td></tr> <tr><td></td><td>237</td><td>237</td></tr> <tr><td></td><td>3.558</td><td>3.558</td></tr> <tr><td>Ugovor o djelu</td><td>1.860</td><td>1.860</td></tr> <tr><td>"</td><td>1.779 1.779</td><td>3.558</td></tr> </tbody> </table>		7.286)			17.018 (preneseno 5.105)	5.105		24.912 (Preneseno 7.473)	7.473		25.302	25.302	Geo Feld d.o.o. Bihać, 01-02.1-6286/19. 10.07.2013.	1.755	1.755	GeoFeld d.o.o. Bihać, 01-01.1-3461/19. 25.03.2019.	2.340	2.340	Geo data d.o.o. Mostar, 01-01.1-3184/19. 19.03.2019.	1.930	1.930	Ugovor o djelu 01-02.1-1431/19, 31.01.2019.	8.064	8.064	Ipsa	6.435	6.435	Ugovor o djelu	1.779	1.779				Vještačenja, naknade ,	35.714 62.783	35.714 62.783	Vještačenja	66.881	66.881	Vještačenja, naknade ,	60.128 12.065	60.128 12.065	"	33.689 663.974	33.689 663.974		3.736	3.736		7.081	7.081		3.558	3.558		2.490	2.490		1.779	1.779		7.427	7.427		18.499	18.499		1.186	1.186		5.693	5.693		14.859	14.859		4.386	4.386		25.041	25.041		3.157	3.157		5.337	5.337		1.898	1.898		2.469	2.469		237	237		3.558	3.558	Ugovor o djelu	1.860	1.860	"	1.779 1.779	3.558	
	7.286)																																																																																																										
	17.018 (preneseno 5.105)	5.105																																																																																																									
	24.912 (Preneseno 7.473)	7.473																																																																																																									
	25.302	25.302																																																																																																									
Geo Feld d.o.o. Bihać, 01-02.1-6286/19. 10.07.2013.	1.755	1.755																																																																																																									
GeoFeld d.o.o. Bihać, 01-01.1-3461/19. 25.03.2019.	2.340	2.340																																																																																																									
Geo data d.o.o. Mostar, 01-01.1-3184/19. 19.03.2019.	1.930	1.930																																																																																																									
Ugovor o djelu 01-02.1-1431/19, 31.01.2019.	8.064	8.064																																																																																																									
Ipsa	6.435	6.435																																																																																																									
Ugovor o djelu	1.779	1.779																																																																																																									
Vještačenja, naknade ,	35.714 62.783	35.714 62.783																																																																																																									
Vještačenja	66.881	66.881																																																																																																									
Vještačenja, naknade ,	60.128 12.065	60.128 12.065																																																																																																									
"	33.689 663.974	33.689 663.974																																																																																																									
	3.736	3.736																																																																																																									
	7.081	7.081																																																																																																									
	3.558	3.558																																																																																																									
	2.490	2.490																																																																																																									
	1.779	1.779																																																																																																									
	7.427	7.427																																																																																																									
	18.499	18.499																																																																																																									
	1.186	1.186																																																																																																									
	5.693	5.693																																																																																																									
	14.859	14.859																																																																																																									
	4.386	4.386																																																																																																									
	25.041	25.041																																																																																																									
	3.157	3.157																																																																																																									
	5.337	5.337																																																																																																									
	1.898	1.898																																																																																																									
	2.469	2.469																																																																																																									
	237	237																																																																																																									
	3.558	3.558																																																																																																									
Ugovor o djelu	1.860	1.860																																																																																																									
"	1.779 1.779	3.558																																																																																																									

JP CESTE FEDERACIJE BIH

- Neum-Stolac, rekonstrukcija raskrsnice Babin Do			“	24.833	24.833	
- Izgradnja treće trake Bos.Petrovac-Ključ			“	1.779	1.779	
- Izgradnja trake za spora vozila Gromljak-Blažuj (Kobiljača)			“	5.989	5.989	
- Izgradnja Obilaznice Bužin			“	3.558	3.558	
- Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok na Šipu, općina Centar, Sarajevo			“	7.116	7.116	
- Šiški Brod 3 – Živinice 1, rekonstrukcija crne tačke "Husino" km 2+500			Grad Tuzla	1.681	1.681	
- Rekonstrukcija ceste -devijacija puta V korpusa- put AVNOJ-a			“	480	480	
- Rekonstrukcija ceste Crnjeni-Zgon			“	4.058	4.058	
UKUPNO	300.000	300.000				1.228.301

U slijedećoj tabeli navedeni su projekti gdje je potrebno uraditi eksproprijaciju:

Red. br.	Mag. Cesta	NAZIV PROJEKTA	Plan 2019.	Rebalans Plana 2019.	Realizovano 2019.
1.	M-17.3	Neum – Stolac, dionica Broćanac – Drenovac			3.053.745
2.	M-6.1	Južna Obilaznica Mostara, servisna saobraćajnica na dionici Medine - Miljkovići i dionoci Miljkovići – Rodoč - veza na M-17			18.518
3.	M-14	Obilaznica Bihaća, dionica Izačić - Kamenica, cca 3 km			
4.	M-16.4	Obilaznica Bugojna			
5.	M-4.2	Obilaznica Cazina			
6.	M-6	Južna obilaznica Gruda (I faza)			
7.	M-14.1	Izgradnja magistralne ceste Bihać - Bosanska Krupa, Srbljansko – Grmuški plato, L= 25 km			15.708
8.	M-5	Rekonstrukcija raskrsnice cesta M-5 i R-403 u Kamenici			
9.	M-5	Bihać: Devijacija pored Robota i Doma zdravlja Bihać			
10.	M-1.8	Rekonstrukcija raskrsnice ceste M-1.8 u Špionici dionica (003), km 21+200			
11.	M-18	Rekonstrukcija raskrsnice ceste M-18 "Husino" dionica (006), km 2+500			
12.	M-4	Rekonstr. raskrsnice ceste M-4 i lokane ceste za Bistarac, dionica (010): Donja Orahovica- Šiški Brod, km 23+500			
13.	M-6.1	Rekonstrukcija ceste M-6.1, dionica (010), km 9+000 do 10+000 Dobrič			
14.	M-5	Rekonstrukcija raskrsnice M-5 i lokalne ceste Dolac na Lašvi, dionica (011), km 10+200- 9+950			55.328
15.	M-5	Izgradnja pješačke staze u neslu Izačić, M5_001, km 2+450 – km 3+000	4.600.000	4.600.000	
16.	M-4.2	Rekonstrukcija raskrsnice ceste M-4.2 i R-400 na M-4.2, dionice Skokovi – Srbljani (Todorovo)			103.520
17.	M-18	Rekonstrukcija raskrsnice ceste M-18 "Olovske Luke" dionica (008), km 20+600			115.651
18.	M-1.8	Rekonstrukcija raskrsnice u naselju Čehaje			138.187
19.	M-20	Rekonstrukcija raskrsnice Vitkovići u kružni tok			
20.	M-17	Topčić Polje – Lašva 0, km 1+600 i km 3+880			
21.	M-18	Priboj 2 – Simin Han 0, km 9+100 – km 9+200			
22.	M-18	Priboj 2 – Simin Han 1, km 11+050 do km 21+300			
23.	M-5	Rekonstrukcija ceste dionica: Kaonik - Gromljak, potez „Delfine krivine“			111.206
24.	M-15	Kamičak – Ključ, km 17+000			
25.	M-4	Magistralna cesta Doboj - Tuzla, dionica Drežnik (bolnica „Kreka“) - petlja Šiški Brod			
26.	M-6	Rekonstrukcija raskrsnice za Kravice, dionica: 002; km 12+400			
27.	M-6.1	Izgradnja pješačke staze na dionici: Mostar - Široki brijeg, kroz naseljeno mjesto Medine			
28.	M-4.2	Rekonst. rask. ceste M4.2, Ul. Žrtava domov. rata i 25. novembra u Cazinu (002), km 11+230 (Mala Lisa)			
29.	M-15	Rekonstrukcija raskrsnice Gorica u Livnu u kružni tok			

JP CESTE FEDERACIJE BIH

30.	M-6	Rješenje odvodnje magistralne ceste na ulazu u Stolac, II faza			
31.	M-4.2	Sanacija klizišta, cesta M-4.2_002, dionica 002: Skokovi - Srbljani, km 13+350			
32.	M-18	Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok na Šipu, općina Centar, Sarajevo			
33.	M-14	Izgradnja kružnog toka u Bosanskoj Krupi (kolodvor) dionica 002			
34.	M-15	Izgradnja kružnog toka u Sanskom Mostu na spoju cesta M-15 i R-405 dionica 003			
35.	M-5	Rekonstr. raskrsn. cesta M-5 i M-16.4 u kružni tok, M-5, (012), km 0+000 (Nević Polje)			
36.	M-18	Rekonstruk. raskrsnice cesta M-17 i ulice Safeta Zajke u kružni tok, M-17, (008), km 7+350			
37.	M-5	Rekonstrukcija raskrsnica na obilaznici Viteza			
38.	M-18	Rekonst. ceste i pločastog propusta preko Crne rijeke, u Delijašu, dion. Ustikolina – Trnovo, km 37+257			
39.	M-18	Rekonstrukcija raskrsnica na cesti M-18 u kružne tokove (prolaz kroz Vogošću)			
40.	M-17	Izgradnja potpunjaka za naselje Nemila, M-17			
41.	M-17	Rekonstrukcija crne tačke M-6 i M-17 Tasovčići - Čapljina, km 0 + 000			
42.	M-17	Rekonstrukcija crne tačke Bulajića krivina na M-17 013, km 35+80 do 36+800			
43.	M-6	Rekonstrukcija raskrsnice cesta M-6 i R-425 u naselju Trebižat (spoj na AC) dionica_ 002 Vitina-Tasovčići km 20+400			14.443
44.	M-5	Izgradnja traka za spora vozila, dionica: Bos. Petrovac - Ključ, prevoj Lanište			
45.	M-5	Izgradnja traka za spora vozila, Bihać - Bos.Petrovac, dionica: Ripač - Dubovsko			
46.	M-6.1	Izgradnja traka za spora vozila, Posušje – Široki brijeg,			
47.	M-14.1	Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok Odžak			4.900
48.	M-18	Izgradnja ceste Potpaklenik - Kladanj, Karaula			
49.	M-17	Izgradnja pješačkog prelaza izvan nivoa kolovoza za naselje Nemila, km 4+700			
50.		Izgradnja Obilaznice Bužim			43.277
51.	M-5	Izgradnja trake za spora vozila Gromljak-Blažuj (Kobiljača)			596.797
52.		Izgradnja trake za spora vozila Tomislavgrad-Široki			8.645
53.		Izgradnja Obilaznice Donji Vakuf			45.637
54.		Izgradnja pothodnika na M16.2 (skretanje za naselje Podgrađe), dionica: Prozor/Rama-G.Vakuf/Uskoplje			3.376
55.		Rekonstrukcija raskrsnice u naselju Klokotnica, II faza			13.613
56.		Rekonstrukcija ceste – devijacija puta V korpusa- put AVNOJ-a			463.205
57.		Rekonstrukcija tunela Vranduk			90.000
58.		Drugi projekti za koje neophodna eksproprijacija, a nisu obuhvaćeni tabelom			
U K U P N O			4.600.000	4.600.000	4.895.756

5. Projekti iz Budžeta Federacije BiH i GSM licence

- Odlukom o usvajanju Programa utroška dijela sredstava „Kapitalni transferi javnim preduzećima - transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta, utvrđenih Budžetom F BiH za 2018 godinu, Vlada F BiH je Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija, V broj: 966/18 utvrdila projekte, među kojima je i projekt „Izgradnja južne obilaznice Mostara“. Za projekt je namijenjeno 7,00 mil.KM. Izmjenom, navedene Odluke, V broj:1525/2018. Vlada F BiH je za izgradnju „Brze ceste Lašva-Nević polje - prolaz kroz poslovnu zonu Vitez“ obezbjedila 34,00 mil.KM i odredila JP Ceste F BiH za implementatora sredstava.

- Odlukom o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška dijela sredstava „Kapitalni transferi javnim preduzećima – transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta“ u iznosu od 153,00 mil.KM utvrđenih Budžetom F BiH za 2018. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija V broj: 665/2019. od 10.06.2019. („Službene novine F BiH“ broj:41/19.) Vlada je odobrila sredstva za projekt Izgradnja i rješavanje spoja magistralnih cesta M-6.1 i M-17, te

JP CESTE FEDERACIJE BIH

sanacija i rekonstrukcija magistralnih cesta u gradu Mostaru u iznosu od 13,00 mil.KM, od čega se odnosi na projektovanje -0,50 mil.KM, eksproprijaciju – 0,80 mil.KM, građevinske radove - 11,00 mil.KM i nadzor - 0,70 mil.KM.

- Također, Odlukom o usvajanju Programa utroška dijela sredstava „Kapitalni transferi javnim preduzećima – transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta“ utvrđenih Budžetom F BiH za 2019 godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija, V broj: 1155/2019. od 10.10.2019. JP Ceste F BiH su implementator sredstava za slijedeće projekte:

- Izgradnja brze ceste Lašva-Nević polje - prolaz kroz zonu Vitez u iznosu od 34,00 mil.KM,
- Izgradnja Južne obilaznice Mostara u iznosu od 7,00 mil.KM,
- projekat izgradnje i rješavanja spoja magistralnih cesta M-6.1 i M-17, te sanacija i rekonstrukcija magistralnih cesta u gradu Mostaru 13,00 mil.KM i
- poddionica: Šćiki Brod - Đurđevik na trasi ceste Tuzla-Sarajevo u iznosu od 40,00 mil.KM.i to za radove 35,00 mil.KM, nadzor 3,00 mil.KM i studijsko tehničku dokumentaciju 2,00 mil.KM.

Realizacija projekata finansiranih iz Budžeta F BiH Rebalansom nije planirana, jer su se vodile aktivnosti vezane za eksproprijaciju, pribavljanje dozvola, saglasnosti, pripremi tenderske dokumentacije i dr.

Red br.	Mag. Cesta	Naziv i opis projekta	Aktivnosti na projektu	Plan 2019.	Rebalans Plana 2019.
1.	M-6.1	Izgradnja južne obilaznice Mostara	Eksproprijacija	1.500.000	-
			Izvođenje	5.500.000	-
			Nadzor		-
2.	M-5	Izgradnja brze ceste Lašva-Nević polje –prolaz kroz poslovnu zonu Vitez	Eksproprijacija	3.000.000	-
3.	M-17 M-6.1	Izgradnja i rješavanje spoja magistralnih cesta M-6.1 i M-17, te sanacija i rekonstrukcija magistralnih cesta u gradu Mostaru	Eksproprijacija	-	-
4.	M-18	Tuzla – Sarajevo,poddionica: Šćiki Brod-Đurđevik	Konsult.usluge	-	-
U K U P N O				10.000.000	-

- Projekti finansirani iz GSM licence


Vlada F BiH je usvojila „Odluku o usvajanju programa investiranja kapitalnog transfera JP Ceste F BiH iz sredstava podračun-sredstava od GSM licence utvrđenog izmjenom i dopunom Budžeta F BiH za 2017. godinu za Federalno ministarstvo prometa i komunikacija“ V broj 1665/2017. Spomenutom Odlukom, obuhvaćen je projekat, „Izgradnja i rekonstrukcija kružnog toka na Šipu u Sarajevu“ za čiju implementaciju je zaduženo JP Ceste F BiH. Zbog problema sa eksproprijacijom, sredstva su Odlukom V broj:1512/18. preusmjereni na druge projekte.

Red br.	Mag. Cesta	Naziv i opis projekta	Aktivnosti na projektu	Plan 2019.	Rebalans Plana 2019.
1.	M-18	Izgradnja kružnog toka na Šipu u Sarajevu	Izvođenje	500.000	-
		U K U P N O		500.000	-

6.Sufinansiranja/donacije

Red br.	Mag. Cesta	Naziv i opis projekta	
1.	M-18.1	Rekonstrukcija ceste Ustokilina –Garež /Azilantski centar	253.479
		U K U P N O	253.479

Na osnovu Sporazuma o zajedničkom finansiranju JP Ceste F BiH sa Općinom Trnovo broj:01-02.1-11253/18 od 13.12.2018. godine, urađena je Rekonstrukcija ceste M-18.1 Ustikolina - Garež, podionica Azilantski centar-Garež, čija je ukupna vrijednost izvršenih usluga 509.979 KM. Implementator sredstava je bila Općina Trnovo. JP Ceste F BiH su osigurale i uplatile Općini Trnovo iznos 256.500 KM, a ostatak sredstava je finansirala Općina Trnovo. Projekat je na osnovu Izvještaja o konačnoj inspekciji broj:01-02.1-14859/19 BS od 31.12.2019. godine predat JP Ceste F BiH.

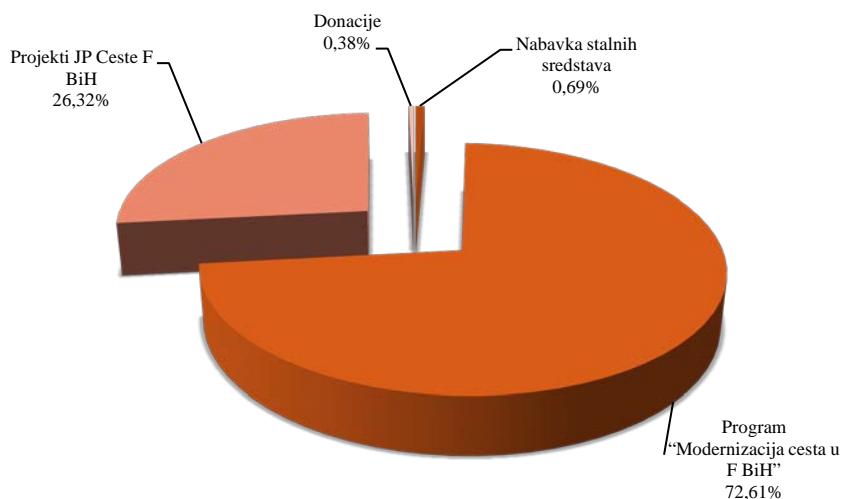

Grafički prikaz strukture investicija

D. ODJEL ZA JAVNE NABAVKE

Izvještaj o radu je urađen na bazi raspoloživih podataka i obuhvata :

Pregled provedenih postupaka javnih nabavki JP Ceste F BiH u promatranom periodu.

Nabavke za navedeni period su realizovane u skladu sa Privremenim planom nabavki za 2019.godinu, koji je usvojen i objavljen 7.1.2019.godine, i sa Planom nabavki za 2019.godinu koji je usvojen i objavljen 8.7.2019.godine.

Za navedeni period na osnovu provedenih postupaka nabavki ugovorena su 285 ugovora u iznosu od 53.188.839 KM. U izvještaj su uključeni i ugovori za postupke nabavke koji su pokrenuti po Planu nabavki iz 2018 godine, a potpisani u 2019.godini.

- Ugovorene nabavke po vrstama postupaka uključujući vrijednosti

Vrsta postupka nabavke	Iznosi u KM (sa PDV-om)	Broj ugovora
Ukupno	53.188.839,48	285
Otvoreni	18.074.719	63
Ograničeni	32.127.762	2
Konkurenčki	506.528,90	39
Pregovarački	1.707.566	12
Direktni sporazumi	743.632	167
Neprioritetne usluge	28.632	2

U toku 2019.godine poništeno je 29 postupaka nabavki, iz razloga da nije dostavljena nijedna ponuda ili su dostavljene ponude bile preko budžeta i

- Žalbe

U navedenom periodu od 1.1.2019.godine do 31.12.2019.godine podnesene su 24 žalbe. Dvadeset (23) žalbi je rješeno i postupci nastavljeni/ponovljeni. Jedna (1) žalba je na rješavanju u Uredu za žalbe BiH.

Od navedenih žalbi 2 (dvije) žalbe su povučene, 13 (trinaest) žalbi je odbijeno/odbačeno i 8 (osam) žalbi je usvojeno.

E. PRAVNI I KADROVSKI POSLOVI

Aktivnosti Sektora pravnih, kadrovskih i općih poslova u periodu 01.01.- 31.12.2019. godina mogu se podijeliti na sljedeće oblasti:

- pravne, normativne
- imovinsko-pravne
- kadrovske poslove i
- opće poslove

Pravni i normativno-pravni poslovi

Sektor pravnih, kadrovskih i općih poslova JP Cesta F BiH sve svoje poslove i aktivnosti bazira na primjeni svih pozitivnih zakonskih propisa koji su doneseni i važe u F BiH, odnosno u državi BiH kao i svih izmjena i dopuna koje se donesu u planiranoj godini.

U periodu 01.01.- 31.12.2019. godina obavljane su aktivnosti koje se odnose na sve stručne i administrativne poslove vezane za rad i funkcionisanje organa JP Ceste F BiH i to: Uprave, Odbora za reviziju, Nadzornog odbora i Skupštine društva.

Vršene su pripreme sjednica organa JP Ceste F BiH, pripremanje i distribucija materijala za iste kao i aktivnosti vezane za realizaciju odluka i zaključaka sa sjednicama Skupštine JP Ceste F BiH, Nadzornog odbora i Uprave ovog preduzeća.

U izvještajnom periodu održane su 3 sjednice Skupštine, 7 redovnih i jedna vanredna sjednica Nadzornog odbora, 13 sjednica Odbora za reviziju i 30 sjednica Uprave JP Ceste F BiH.

Svi pravni poslovi se dijele na sve oblasti prava i to prvenstveno na oblast privrednog prava, gdje se reguliše rad privrednih društava, javnih preduzeća itd., kao i oblast parničnih, vanparničnih, prekršajnih, izvršnih i upravnih postupaka i imovinsko-pravnih poslova.

Najveća aktivnost ovog pravnog Sektora usmjerena je na organizaciju i zastupanje JP Ceste F BiH pred nadležnim sudovima u F BiH, u BiH i u pojedinim predmetima i u regionu.

Vođene su aktivnosti na pokretanju tužbi, gdje se kao tužilac pojavljuje JP Ceste F BiH, kao i pokretanje izvršnih prijedloga na temelju pravosnažnih i izvršnih presuda protiv korisnika koji redovno ne plaćaju svoje obaveze, te pokretanje tužbi za naknadu štete na cestovnoj opremi i sl.

Izdvajamo također i aktivnosti na regresnim tužbama gdje za to postoje zakonski uslovi.

U sudskim postupcima gdje se JP Ceste F BiH pojavljuje u ulozi tužitelja, broj aktivnih tužbi JP Ceste F BiH protiv trećih lica na dan 31.12.2019.god. iznosi 32 predmeta (naplata za cestovno zemljište, regresne tužbe i oštećenje cestovne opreme), gdje su u izvještajnom periodu podnesene 2 tužbe.

U predmetima gdje je JP Ceste F BiH tužena strana stanje aktivnih predmeta na dan 31.12.2019.god. iznosi 252 predmeta, uzimajući u obzir da je u izvještajnom periodu podneseno 50 novih tužbi.

U oblasti imovinsko-pravnih poslova provodile su se aktivnosti na podnošenju prijedloga za eksproprijaciju, zaključivanju sporazuma o naknadi na planiranim projektima kao i onim već otpočetim te zastupanje pred općinskim i drugim organima u okviru rješavanja imovinsko-pravnih poslova.

U izvještajnom periodu su obavljane aktivnosti na usklađivanju akata JP Ceste F BiH sa izmjenama i dopunama pozitivnih propisa, kao i aktivnosti na izradi nacrta i prijedloga opštih akata preduzeća za usvajanje od strane nadležnih organa JP Ceste F BiH. Potrebno je naglasiti da su u izvještajnom periodu usvojeni Pravilnik o radu JP Ceste F BiH broj: 01-3799/19 od 01.04.2019.godine i Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji JP Ceste F BiH broj: 01-03.2NO-3335-2/19 od 02.04.2019.god. kao i Etički kodeks JP Ceste F BiH broj: 01-03.2 SK-6657/19 od 03.06.2019.god.

U oblasti općih poslova provodile su se aktivnosti na održavanju voznog parka, održavanju sistema mašinskih instalacija-grijanje i hlađenje, održavanju elektro i vodoinstalacija, održavanju radnih prostorija i poslovi protivpožarne zaštite te poslovi digitalnog protokola.

Takođe, u izvještajnom periodu su se obavljali poslovi iz oblasti radnih odnosa i kadrovski poslovi u skladu sa zakonom i opštim aktima.

Kadrovske poslovi

Na dan 31.12.2019.god. obrazovna struktura radnika JP Ceste F BiH je sljedeća:

Red.br.	Vrsta školske spreme	Stanje 31.12.2019.
1.	Magistri nauka (grad. saob, ecc, komunikologije.)	4
2.	Magistri struke (saob, grad.ecc. arh; geografije)	15
3.	VSS građevinske struke	28
4.	VSS saobraćajne struke	2
5.	VSS ekonomske struke	6
6.	VSS pravne struke	13
7.	VSS geodetske struke	1
8.	VSS mašinske struke	1
9.	VSS infor.struke	2
10.	VSS društ.smjera	1
11.	VSS tehn.smjera	2
12.	VS (ing.grad.)	4
13.	VS (becheler ecc.)	2
14.	SSS građevinski tehničari	4
15.	SSS mašinske struke	1
16.	SSS saobraćajne struke	4
17.	SSS ekonomske struke	3
18.	SSS ostale struke (društ.,prir., tehn)	4
U K U P N O		97

U Izvještajnom periodu jedan radnik je otišao u penziju, jedan radnik je umro, jedan radnik je na neplaćenom odsustvu dok je zasnovan radni odnos na neodređeno vrijeme sa 12 radnika.

Na dan 31.12.2019.god. četiri radnika su u radnom odnosu na određeno vrijeme.

Direktor
Ljubo Pravdić, dipl.ing.grad.
