



**IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI
PLANA POSLOVANJA ZA PERIOD
01.01.-31.12.2022. GODINA**

Sarajevo, februar/veljača 2023.

SADRŽAJ

	Strana
U V O D	3
A. I JAVNI PRIHODI	5
A. II AMORTIZACIJA	10
B. I JAVNI RASHODI	11
1. Troškovi poslovanja	12
2. Služba „Pomoć-informacije na cestama“	13
3. Redovno održavanje	16
4. Rezervirana sredstva za rizike, neplanirane rashode i rashode koji ne terete projekte	26
5. Rezervirana sredstva za sudske presude	28
6. Troškovi konsultantskih usluga	28
7. Kamate	32
B. II TROŠKOVI AMORTIZACIJE	34
C. INVESTICIJE	35
1. Nabavka stalnih sredstava	36
2. Program „Modernizacija cesta u F BiH“	37
3. Projekti JP Ceste F BiH	47
4. Eksproprijacija i elaborati eksproprijacije	76
5. Projekti iz Budžeta F BiH i sufinansiranja iz drugih nivoa vlasti	78
D. ODJEL JAVNE NABAVKE	83
E. PRAVNI I KADROVSKI POSLOVI	83

U V O D

Na osnovu Zakona o cestama u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH broj: 6/02. i 18/02.) i Rješenja Kantonalnog suda upisana je u sudski registar Direkcija cesta Federacije Bosne i Hercegovine, a sukladno Zakonom o javnim preduzećima F BiH („Službene novine F BiH“ broj: 8/05.) provedena je pravna procedura i Direkcija cesta Federacije BiH je nastavila sa radom pod nazivom: Javno preduzeće Direkcija cesta Federacije BiH društvo sa ograničenom odgovornošću, Sarajevo.

Vlada Federacije BiH je donijela Odluku V broj:562/10.), kojom je JP Direkcija cesta F BiH uskladila naziv, organizaciju poslova i zadataka, način upravljanja i rukovođenja i način transformisanja u „Javno preduzeće Ceste Federacije BiH d.o.o.“ („JP Ceste F BiH“). Zakonom o cestama F BiH („Službene novine F BiH br. 12/10., 16/12 i 66/13) registrovana je navedena promjena kod Općinskog suda Sarajevo Rješenjem o registraciji broj: 065-0-Reg-11-000713 marta 2011. godine. Sjedište Društva je u Sarajevu, na adresi Terezije 54.

Plan poslovanja JP Ceste F BiH za 2022. godinu (u daljem tekstu: „Plan“) sačinjen je u skladu sa Zakonom o cestama F BiH, Zakonom o javnim preduzećima u F BiH, Statuta Javnog preduzeća Ceste F BiH i usvojen 24.01.2022. godine na Nadzornom odboru JP Ceste F BiH. Vlada F BiH, u svojstvu osnivača, dala je saglasnost na isti 09.06.2022. godine Odlukom V broj:1000/2022, dok je Skupština donijela Odluku o potvrđivanju Odluke o davanju saglasnosti na Plan poslovanja 22.07.2022. godine. Usvajanje Plana poslovanja predstavlja osnov za aktivnosti preduzeća, a obzirom da je za njegovo usvajanje bilo potrebno više od pola godine, navedeno se odrazilo kako na nabavke roba i usluga za projekte finansirane iz sredstava JP Ceste F BiH, tako i na njihovu realizaciju.

Usljed značajnog povećanja cijena repromaterijala koje su uticale na planirane budžete projekata, povećanja javnog prihoda, najviše u dijelu naknada od nafte i naftnih derivata, povećanja rashoda, te izmjene na aktivnostima i planiranim budžetima pojedinih projekata u investicijama, Uprava JP Cesta F BiH u sastavu:

1. Ljubo Pravdić, direktor,
2. Nijaz Hadžikadunić, izvršni direktor za tehnička pitanja i
3. Bekir Isaković, izvršni direktor za ekonomske i pravne poslove

se odlučila na izradu Rebalansa Plana poslovanja za 2022. godinu (u daljem tekstu: „Rebalans Plana“) usvojenog od strane Nadzornog odbora JP Ceste F BiH Odlukom broj:01-03-2NO-9104-1/22 dana 31.10.2022. godine, a Vlada F BiH je Odlukom V broj:1876/2022 od 29.12.2022. dala saglasnost, a Skupština Odlukom 01-03.2SK 685-1/23. potvrdila navedenu Odluku Vlade F BiH.

U proteklom periodu, JP Ceste F BiH su svoje planirane aktivnosti usmjerile na održavanje magistralnih cesta koje uključuje radove redovnog i zimskog održavanja cesta i objekata, dok su investiciona ulaganja usmjerena na aktivnosti vezane za završetak ranije započetih projekata, eliminaciju najoštećenijih dijelova kolovoza, sanaciju klizišta i crnih tačaka, sistema za odvodnju, sanaciju cestovnih objekata i sanaciju cestovnih škarpi, kosina i zasjeka, projekte sigurnosti na magistralnim cestama (semaforizacija raskrsnica, izrada traka za lijeva skretanja), projekte izgradnje na magistralnim cestama, eksproprijaciju, poboljšanje građevinskih elemenata na složenim čvorištima i priključcima i izradu projektne dokumentacije.

JP CESTE FEDERACIJE BIH

Program „Modernizacija cesta u FBiH“ prva je faza modernizacije cesta u FBiH. Program se najvećim dijelom finansira iz kredita međunarodnih razvojnih banaka, a dijelom i vlastitim sredstvima JP Ceste FBiH. Odobreni iznosi kredita za podršku Programu „Modernizacija cesta u FBiH“ su sljedeći:

1. Evropska investicijska banka (EIB), kredit br. 82137 – 50 mil.EUR
2. Svjetska banka (WB) Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD), kredit br. 8640 –58 mil.EUR
3. Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD), kredit br. 47461– 65 mil.EUR.

Potrebno je napomenuti da je u 2022 godini došlo do porasta EURIBOR-a, tako da isti više nije negativan, što ima utjecaja na rast kamatnih stopa na odobrene kredite međunarodnih razvojnih banaka kod kojih je ugovorena promjenljiva kamatna stopa.

U 2022. nastavljen je napredak na implementaciji Programa, međutim zaključeni ugovori za radove (Ulaz u Stolac -Vidovo Polje- veza na M 6, Bihać 4 -Ripač), još uvijek imaju probleme zbog nezavršene eksproprijacije i nemogućnosti osiguranja odobrenja za građenje, što uzrokuje kašnjenje u implementaciji projekata. Kod zaključenih ugovora za radove Ripač –Dubovsko i Jajce jug- Donji Vakuf izvođenje asfalterških radova pada u zimski period kada su nepovoljni vremenski uvjeti, te će se ovi radovi moći izvoditi tek u 2023 kada se steknu povoljni uvjeti za njihovo izvođenje. Realizacija projekata iz Programa koji zajednički finansiraju EIB i IBRD je u završnoj fazi, jer je revidirani datum raspolaganja sredstvima EIB kredita 23.02.2023. a IBRD kredita 30.09.2023.

EBRD je produžio krajnji rok raspolaganja sredstvima kredita do 13.01.2024. godine, jer je I tranša kredita efektivna tek od 30.06 2019, a II tranša kredita koja obuhvata izgradnju novih dionica magistralnih cesta i obilaznica oko gradova koje zahtijevaju duži period izgradnje, je efektivna tek od prvog kvartala 2022 godine.

Poslovne knjige i druge evidencije JP Ceste F BiH vodi u skladu sa zakonima i Međunarodnim računovodstvenim standardima i Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja, kojima se uređuje materijalno-finansijsko poslovanje i računovodstvene politike.

Na osnovu Odluka: V broj: 610/2022. i V Broj:1564/2022. - „Kapitalni transferi javnim preduzećima - transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta“, JP Ceste F BiH su zadužene za implementaciju sljedećih projekata iz Budžeta F BiH za 2022. godinu: Izgradnja brze ceste Lašva-Nević polje –prolaz kroz poslovnu zonu Vitez, Izgradnja Južne obilaznice Mostara, Spoj magistralnih cesta M17 i M17.4, te sanacija i rekonstrukcija magistralnih cesta i rasyjeta na M17 Ortiješ u gradu Mostaru, Poddionica: Šićki Brod-Đurđevik na trasi ceste Tuzla –Sarajevo i Izgradnja gradskog autoputa u Sarajevu, dionica: Stup-Buća potok-Pofalići-Velešići-Bentbaša. Realizacija navedenih projekata je u toku.

JP Ceste F BiH su bile angažovane na LOT – 2C projekta Sarajevska obilaznica, na osnovu Odluke Vlade F BiH broj: 233/05, koji se u poslovnim knjigama JP Ceste F BiH vodi vanbilansno. Nakon donošenja odluke, od strane Vlade F BiH, izvršit će se prenos na krajnje korisnike, odnosno upravitelje.


U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, JP Ceste F BiH obavljaju nabavke roba, usluga i radova, finansirane iz vlastitih sredstava, a nabavke iz međunarodnih kreditnih sredstava po međunarodnim procedurama kreditora.

U nastavku su prikazani javni prihodi, rashodi, investicije, kao i druge aktivnosti koje su JP Ceste F BiH obavljale tokom godine.


1.1 JAVNI PRIHODI

Red Br.	O P I S	Šifra naknade	Realizovano 2021.	Plan 2022.	Rebalans Plana 2022.	Realizovano 2022.	Index 7/6	Index 7/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Naknade od:		99.434.953	100.900.000	106.050.000	107.754.007	102	108
1.1	Nafta i naftnih derivata	717131 717114	47.784.796 17.279.764	48.200.000 18.100.000	53.000.000 17.800.000	55.406.886 16.689.871	105 94	116 97
1.2	Registracije – putarine – fizička lica	722532	18.252.402	18.300.000	18.500.000	18.512.940	100	101
1.3	Registracije – putarine – pravna lica	722531	8.411.636	8.600.000	8.800.000	8.769.190	100	101
1.4	Službe “Pomoć-informacije na cestama”	722535	5.401.701	5.400.000	5.600.000	5.523.591	99	102
1.5	Korištenja cestovnog zemljišta	722538	1.646.658	1.700.000	1.400.000	1.466.689	105	89
1.6	Vanrednih prevoza	722536 722534	467.126	350.000	700.000	1.211.572	173	259
1.7	Prekomjerne upotrebe cesta (vage)	722537	190.870	250.000	250.000	173.268	69	91
2.	Druga sredstva osigurana po posebnim propisima		527.833	450.000	350.000	400.895	115	76
2.1	Reklamni panoi	722539	370.938	300.000	200.000	200.897	100	54
2.2	Kamate	722565	36.943	50.000	50.000	86.556	173	234
2.3	Saglasnosti	722565	119.952	100.000	100.000	113.442	113	95
3.	Naknadno utvrđeni prihodi		3.396.929	200.000	400.000	4.173.688	1043	123
U K U P N O			103.359.715	101.550.000	106.800.000	112.328.590	105	109

JP Ceste F BiH su ostvarile prihod u iznosu od 112,33 mil.KM, što je 5 % ili 5,53 mil.KM više u odnosu na Rebalansom planiranih 106,80 mil.KM. Najveći prihod je ostvaren od naknada iz nafte i naftnih derivata sa 72,10 mil.KM, što je za 1,30 mil.KM više u odnosu na planiranih 70,80 mil.KM. Drugi po veličini je prihod od naknada za putarine fizička i pravna lica sa realizacijom od 27,28 mil.KM ili 100% od planiranih 27,30 mil.KM. Prihod od „Službe pomoć i informacije“ je realizovan u iznosu od 5,52 mil.KM, što je 99% od planiranih 5,60 mil.KM. Naknade za korištenje cestovnog zemljišta i reklamnih panoa u cestovnom pojasu, vanrednih prevoza, saglasnosti i kamata ostvarene su za 0,63 mil.KM više od planiranih 2,45 mil.KM, dok je naknada od prekomjerne upotrebe cesta (vage) realizovana u iznosu od 0,17 mil.KM, što je za 0,08 mil.KM manje realizovano od planiranih 0,25 mil.KM. Naknadno utvrđeni prihod je veći od planiranog iznosa za 3,77 mil.KM, a 0,78 mil.KM je viši u odnosu na 2021 godinu. Do ovog povećanja je došlo zbog ukidanja rezerviranja po započetim sudskim sporovima iz prethodnog perioda (3,74 mil.KM), koje je urađeno na osnovu preporuka i mišljenja vanjskog revizora, da se rezerviranja po započetim sudskim sporovima knjiže po bruto principu, a ukupno nerealizovana rezerviranjima prethodnog perioda se moraju tretirati kao prihod.

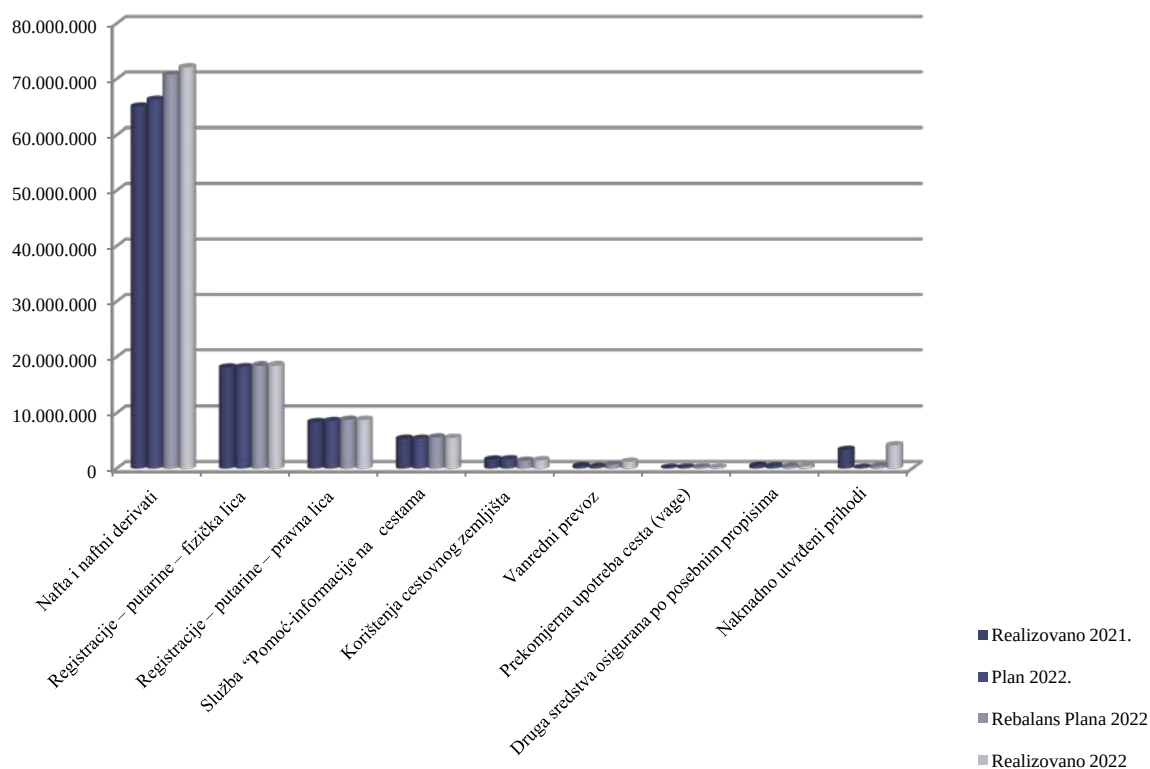


Grafikon prikazuje visinu planiranih i realizovanih prihoda

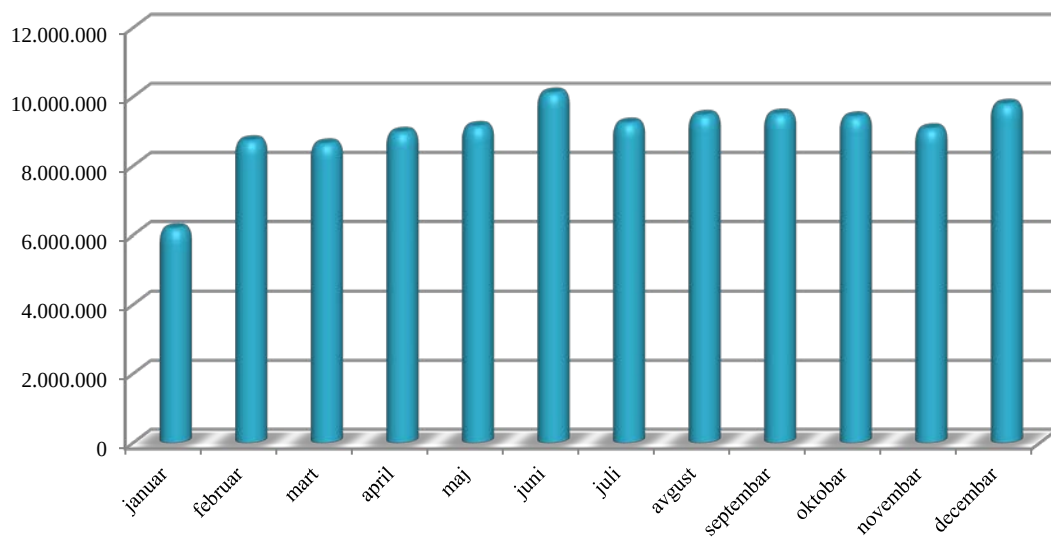

Visina ostvarenih prihoda u izvještajnoj godini

1. Naknada od:

1.1. - nafte i naftnih derivata se realizuju na osnovu Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, br. 49/09, 49/14 i 60/14) i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama u BiH („Službeni glasnik BiH“, br.91/17.). Putarina, kao vrsta indirektnog poreza, plaća se na naftne derivate u iznosu od 0,15 KM/ l za puteve na Jedinstven račun Uprave za indirektno oporezivanje. Na osnovu Pravilnika o izračunavanju koeficijenta doznačavanja sredstava entitetima i Distriktu Brčko, te Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH, propisana je raspodjela i pripadnost javnih prihoda. JP Ceste F BiH, zajedno sa kantonalnim direkcijama za puteve u F BiH, pripada iznos od 3,9 % u odnosu na visinu predviđenih sredstava od čega, na osnovu Zakona o cestama u F BiH, JP Ceste F BiH pripada 40%. Prihod od naknade 717131 je realizovan u iznosu od 55,41 mil.KM što je za 5% ili 2,41 mil.KM više u odnosu na Rebalansom planiran 53,00 mil.KM.

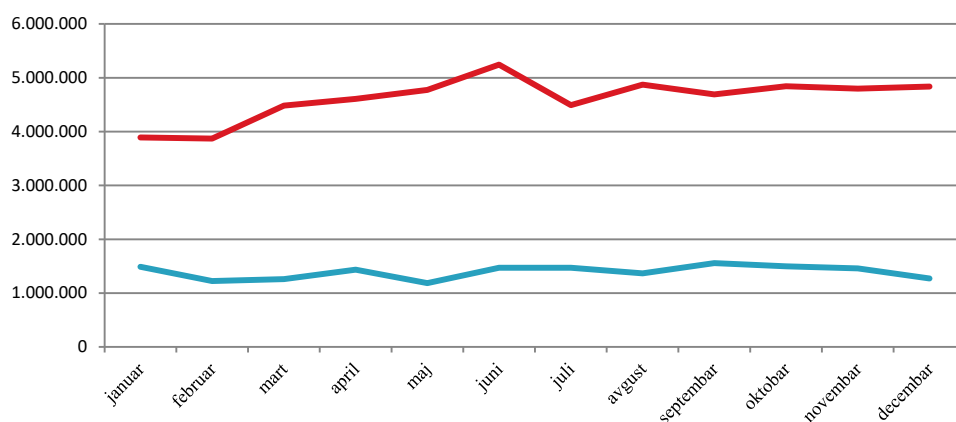

Grafički prikaz ostvarenog prihoda naknade 717114 (-) i 717131 (-) po mjesecima

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj: 91/2017.), putarina je povećana na 0,25 KM/l, od čega 0,05 KM/l za druge puteve, a namijenjena je za izgradnju autoputeva i izgradnju i rekonstrukciju drugih puteva. Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje usvojio je Odluku o privremenoj raspodjeli prihoda, kojom je utvrđeno da od ukupnih prihoda od putarine za izgradnju autoputeva i izgradnju i rekonstrukciju drugih puteva 10% ostaje na podračunu kod Centralne banke BiH i služi za poravnanje prihoda po utvrđivanju konačne metodologije raspodjele, a preostalih 90% prihoda podijeljeno je između entiteta i Brčko Distrikta. U Federaciji BiH prihod se raspoređuje na osnovu Zakona o cestama F BiH, po kome JP Ceste F BiH pripada 40 % od dobijenih sredstava. U izvještajnoj godini prihod od naknade 717114 realizovan je u iznosu od 16,69 mil.KM, što je 94% od planiranih 17,80 mil.KM.

1.2.i 1.3 putarine za fizička i pravna lica – Na osnovu „Uredbe o visini godišnje naknade za javne ceste koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila“, V broj: 202/2015, donesenom na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, a usvojene od strane Vlade F BiH, obračunava se naknada putarine za fizička i pravna lica. Prihod putarina za fizička lica ostvaren je u iznosu od 18,51 mil.KM, a prihod od putarina za pravna lica 8,77 mil.KM, što ukupno iznosi 27,28 mil.KM. Inače prihod od ovih naknada je drugi po veličini i učestvuje u ukupnom prihodu sa 25,13 mil.KM.

1.4 Službe “Pomoć-informacije na cestama” - definisane članom 88. i 100. Zakona o cestama F BiH i Odlukom Vlade F BiH V broj: 45/11 („Službene novine Federacije BiH“, br: 5/11.), a predstavlja pružanje tehničke pomoći motorizovanim učesnicima u saobraćaju na javnim cestama, uklanjanje sa javnih cesta oštećenih vozila i vozila u kvaru, davanje informacija o stanju prohodnosti cesta i pružanje druge pomoći. Prihod od ove naknade je realizovan u visini od 5,52 mil.KM, koji se na osnovu Odluke raspoređuje BIHAMK-u i AMK-u.

1.5. korištenja cestovnog zemljišta – regulisanom Uredbom o izmjeni i dopuni visine naknade za korištenje zemljišta uz javni pojas, V broj: 956/2015, donesenom od strane Vlade F BiH. Iako je obnavljanje rješenja, u skladu sa revidiranim PDGS –om, otpočelo u drugoj polovini godine, prihod po ovom osnovu je ostvaren u iznosu od 1,47 mil.KM.


1.6. i 1.7. vanrednih prevoza i prekomjerne upotrebe cesta (vage) – se ostvaruju po osnovu Zakona o cestama u F BiH, Pravilnika o utvrđivanju uslova za obavljanje javnih prevoza vozila na magistralnoj cesti i Pravilnika za utvrđivanje prekomjerne upotrebe javnih cesta. Prihod od vanrednog prevoza je realizovan u iznosu od 1,21 mil.KM, a najviše zbog prevoza gabaritne opreme neophodne za izgradnja vjetroparka „Ivovik“ u Kantonu 10.

2. Druga sredstva čine:

2.1 Naknada za reklamne znakove (panoi) u cestovnom pojasu – se obračunava na osnovu Zakona o cestama F BiH, Pravilnika o postavljanju reklamnih znakova na cestama i Uredbom o visini naknade za korištenje zemljišta uz javne ceste („Službene novine F BiH“, br: 58/2015.). Kao i prihod od naknada za korištenje cestovnog zemljišta, izdavanje rješenja i fakturisanje je urađeno u drugoj polovini godine u skladu sa revidiranim PDGS-om. Naplaćen prihod po ovom osnovu isnosi 0,20 mil.KM.

2.2 i 2.3 – kamata i saglasnosti – se odnosi na kamate ostvarene po transakcijskim računima, kao i prihod po osnovu izdatih saglasnosti za radove u cestovnom pojasu. Ostvaren je u ukupnom iznosu od 0,20 mil.KM, od čega je prihod u iznosu od 0,11 mil.KM od saglasnosti, a 0,09 mil.KM od kamata

3.Naknadno utvrđen prihod – realizovan je u iznosu od 4,17 mil.KM što je za 3,77 mil.KM više u odnosu na planiranih 0,40 mil.KM. U strukturi naknadno utvrđenih prihoda najveću stavku čini prihod od ukidanja rezerviranja po započetim sudskim sporovima (3,74mil.KM), koje urađeno na osnovu mišljenja i preporuka vanjske revizije, zatim prihod od naknade štete od osiguravajućih kuća, po osnovu oštećenja na magistralnim pravcima (0,17mil.KM), prihod od prodaje motornih vozila (0,09mil.KM), prihod od naplaćenog (refundiranog) porodiljnog bolovanja, bolovanja preko 42 dana i Covid-a (0,04 mil.KM), te prihod od sudskih sporova i dr (0,10 mil.KM).

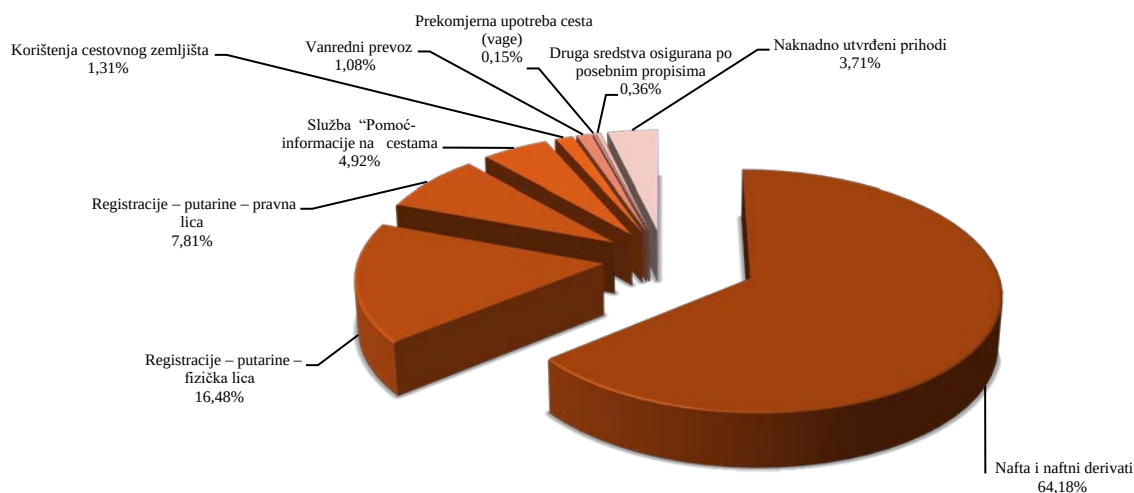

Grafik prikazuje ostvarenu strukturu prihoda

- Preknjižavanje javnih prihoda u skladu sa MRS 15

JP Ceste F BiH su postupile u skladu sa mišljenjem i preporukom Ureda za reviziju institucija u F BiH, iskazanim u Izvještaju o finansijskoj reviziji za 2019. godinu, da prikupljena novčana sredstva po osnovu naknada od nafte i naftnih derivata i naknada za upotrebu cesta koje se plaćaju pri registraciji motornih vozila (pravna i fizička lica), nisu poslovni već javni prihodi namijenjeni za održavanje, zaštitu, obnovu, rekonstrukciju i izgradnju javnih cesta i da iste treba iskazivati na poziciji dugoročnih razgraničenja od momenta uplate do njihove realizacije (ne podliježu primjeni MRS 15). Od navedenih naknada, naplaćena finansijska sredstva do momenta realizacije (datum bilansiranja) se raspoređuju, na sljedeći način:

Javni prihodi		Za pokriće rashoda (655500)	Otplata kredita (409400)	Izvori-Investicije u toku (419860)	Ukupno
Naknada od:	Šifra naknade				
Nafte i naftnih derivata	717 131	20.502.745	18.600.308	16.303.833	55.406.886
Nafte i naftnih derivata	717 114	0	0	16.689.871	16.689.871
Registracija/putarine pravna lica	722 531	8.769.190	0	0	8.769.190
Registracija putarine/ fizička lica	722 532	18.512.940	0	0	18.512.940
UKUPNO		47.784.875*	18.600.308	32.993.704	99.378.887

- Naknade od nafte i naftnih derivata (717131 – 55.406.886KM) – na pokriće otplate kredita (18.600.308KM), razliku do visine ukupnih rashoda poslovanja (20.502.745KM) i ostatak – (16.303.833 KM) na izvore sredstava rezervisane za investicije u toku.
- Naknade od nafte i naftnih derivata (717114 – 16.689.871 KM) – na izvore sredstava rezervisane za investicije u toku

JP CESTE FEDERACIJE BIH

- Naknade za upotrebu cesta/registracije za fizička (722532 – 18.512.940 KM) i pravna lica (722531 – 8.769.190KM) – za pokriće dijela troškova redovnog održavanja - (18.512.940KM + 8.769.190KM = 27.282.130KM),

Napomena*- Iznos za pokriće rashoda od 47.784.875KM se dobije kada se od ukupnih javnih rashoda (sa amortizacijom) u iznosu od 63.194.020KM oduzmu javni prihodi u iznosu od 15.409.145 KM. Ovim iznosom su obuhvaćene naknade od:

- „SPI“(šifra 722535), - korištenja cestovnog pojasa i reklamnih panoa u cestovnom pojasu (šifra 722538 i 722539), vanrednih prevoza u zemlji i inostranstvu (šifra 722536 i 722534), prekomjerne upotreba cesta –vage (šifra 722537) i saglasnosti (šifra 722565) u iznosu od 8.776.015 KM (po MRS 15)
- ostali prihodi (4.173.688KM), te
- prihodi po osnovu usklađivanja vrijednosti stalnih sredstava (2.459.441KM).

A.II AMORTIZACIJA


Red. Br.	O P I S	Realizovano 2021.	Plan 2022.	Rebalans Plana 2022.	Realizovano 2022.	Index 6/5	Index 6/3
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Amortizacija stalnih sredstava	529.778	700.000	1.000.000	2.459.441	246	464
U K U P N O		529.778	700.000	1.000.000	2.459.441	246	464

Napomena: Objašnjenje amortizacije dato na strani 34.

B. I JAVNI RASHODI

Red Br.	O P I S	Realizovano 2021.	Plan 2022.	Rebalans Plana 2022.	Realizovano 2022.	Index 6/5	Index 6/3
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Troškovi poslovanja	6.743.968	7.457.000	7.579.700	7.338.941	97	109
2.	Služba pomoć-informacije	5.109.701	5.022.000	5.208.000	5.137.065	99	101
3.	Redovno održavanje	38.919.669	41.335.500	43.126.525	39.463.461	92	101
4.	Rezervirana sredstva za rizike, neplanirane rashode i rashode koji ne terete projekte	1.683.801	1.000.000	800.000	404.445	51	24
5.	Rezervirana sredstva za sudske presude	4.254.590	800.000	800.000	4.399.363	550	103
6.	Troškovi konsultantskih usluga	1.788.484	2.776.000	3.045.000	2.370.817	78	133
7.	Kamate, servisni troškovi, kursne razlike, provizije	1.443.942	1.086.000	1.286.000	1.620.487	126	112
	U K U P N O	59.944.155	59.476.500	61.845.225	60.734.579	98	101

Javni rashodi su realizovani u iznosu od 60,73 mil.KM, što je 98% planiranih 61,84 mil.KM. Najveću realizaciju su imala sredstva redovnog održavanja sa 39,46 mil.KM ili 92% od planiranih 43,13 mil.KM. Inače, sredstva redovnog održavanja čine najveći stavku rashoda, a obuhvataju zimsku službu, glavne preglede objekata, troškove električne energije za rasvjetu tunela, raskrsnica, mostova, semafora i brojača prometa, osiguranje pružnih pralaza u USK, održavanje i nadzor elektroopreme, poboljšanje sigurnosti prometa – izradu noveliranih prometnih projekata, sanaciju postojećih i izgradnju novih svjetlosnih prometnih znakova kod škola, redovno održavanje brojača prometa, monitoring vozila redovnog održavanja GPS-om, obilježavanje pješačkih prijelaza sa plastikom optičko-vibracionim trakama kod škola. Troškovi poslovanja su realizovani sa 7,34 mil.KM ili 97% od planiranih 7,58 mil.KM. Istim su obuhvaćeni troškovi zaposlenih i materijalni troškovi i usluge. Troškovi „Službe pomoć - informacije“, prate prihod ostvaren po ovom osnovu, te su u skladu sa odlukom raspoređeni na krajnje korisnike tj. na Auto-moto klub Mostar i BIHAMK Sarajevo u iznosu od 5,14 mil.KM. Rezervirana sredstva za sudske presude su realizovana u iznosu od 4,40 mil.KM, od čega su rezerviranja po započetim sudskim sporovima 4,08 mil.KM, što je urađeno po preporuci i mišljenju vanjskog revizora. Troškovi konsultantskih usluga su realizovani sa 2,37 mil.KM ili 78% od planiranih 3,04 mil.KM. Za kamate, servisne troškove, kursne razlike i provizije vezane za Programe “Rehabilitacija cesta u F BiH” i “Modernizacija cesta u F BiH” utrošena su sredstva u iznosu od 1,62 mil.KM, što je za 26% više u odnosu na planiranih 1,29 mil.KM. Rezervirana sredstva za rizike, neplanirane rashode i rashode koji ne terete projekte su realizovana u iznosu od 0,40 mil.KM ili 51% od planiranih 0,80 mil.KM.

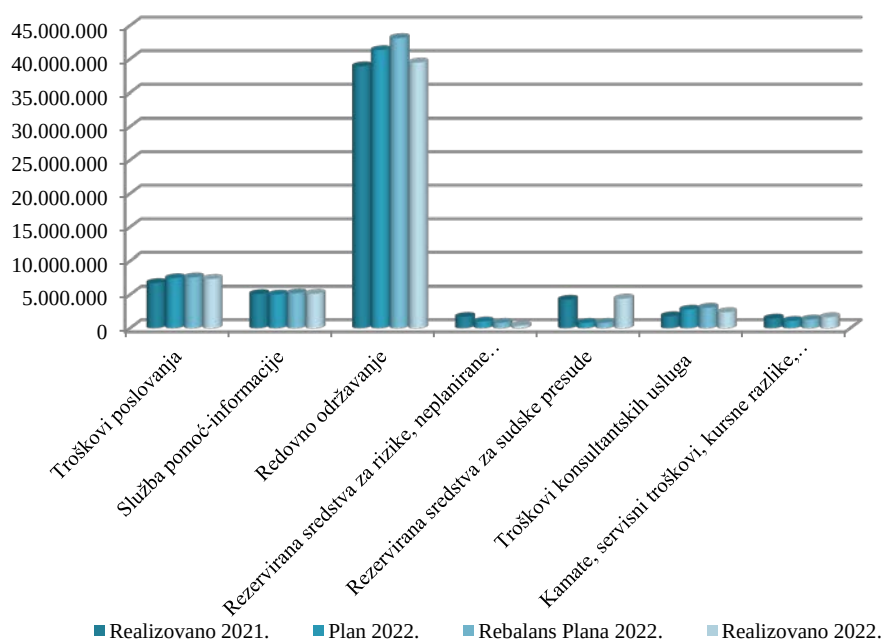

Grafički prikaz visine predviđenih i realizovanih rashoda

1. Troškovi poslovanja

Red. br.	O P I S	Plan 2022.	Rebalans Plana 2022.	Realizovano 2022.	Index 5/4
1	2	3	4	5	6
I	Troškovi zaposlenih	5.678.000	5.678.000	5.637.107	99
II	Materijalni troškovi i usluge	1.779.000	1.901.700	1.701.834	89
	UKUPNO I+II	7.457.000	7.579.700	7.338.941	97

Troškovi poslovanja su realizovani u iznosu od 7,34 mil.KM, što je 97% od planiranih 7,58 mil.KM. Za troškove zaposlenih utrošeno je 5,64 mil.KM ili 99% od 5,68 mil.KM predviđenih sredstava, a za materijalne troškove i usluge 1,70 mil.KM od planiranih 1,90 mil.KM.

I Troškovi zaposlenih

Troškovima zaposlenih obuhvaćene su bruto plaće zaposlenih sa naknadama u skladu sa Pravilnikom o radu JP Ceste F BiH.

II Materijalni troškovi i usluge

Red. br.	O P I S	Plan 2022.	Rebalans Plana 2022.	Realizovano 2022.	Index 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	kancelarijski i potrošni materijal	65.000	65.000	35.074	54
2.	električna energija	65.000	65.000	40.576	62
3.	gorivo i mazivo za automobile	120.000	120.000	120.738	101
4.	otpis sitnog inventara i auto guma	20.000	20.000	12.146	61
5.	usluge održavanja, servisiranja i registracije	250.000	250.000	171.095	68
6.	učešće na sajmovima i seminarima	65.000	70.000	83.045	119
7.	stručna literatura i časopisi	20.000	20.000	7.256	36
8.	grijanje	50.000	50.000	42.304	85
9.	zakupnina (poslovni prostori i licence)	130.000	130.000	162.589	125
10.	reklama i propaganda	40.000	40.000	16.790	42
11.	osiguranje imovine i lica i ljekarski pregledi	65.000	60.000	59.938	100
12.	bankarske usluge	50.000	175.000	166.625	95
13.	reprezentacija	40.000	40.000	40.792	102
14.	naknade za službena putovanja u zemlji	65.000	65.000	56.660	87
15.	naknade za službena putovanja u inostranstvu	45.000	45.000	37.458	83
16.	privremeni i povremeni poslovi, ugovori o djelu	40.000	20.000	-	-
17.	bruto naknade za članove Nadzornog odbora	94.000	99.000	99.676	101
18.	održavanje čistoće	55.000	61.000	66.138	108
19.	osiguranje zgrade	15.000	10.000	6.880	69
20.	PTT usluge	120.000	120.000	120.034	100
21.	komunalne usluge	25.000	25.000	22.898	92
22.	stručno osposobljavanje	10.000	10.000	854	9
23.	tenderi, konkursi i oglasi	50.000	50.000	41.662	83
24.	takse	40.000	40.000	20.497	51
25.	advokatske usluge i trošk.vještačenja	50.000	50.000	83.332	167
26.	troškovi eksterne revizije	15.000	26.700	11.700	44
27.	troškovi Odbora za reviziju	42.000	42.000	40.837	97
28.	ostali troškovi poslovanja	50.000	50.000	50.077	100
29.	kamate i kursne razlike	1.000	1.000	-	-
30.	naknadno utvrđeni rashodi	50.000	50.000	53.073	106
31.	troškovi koji ne zavise od finansijskog rezultata	32.000	32.000	31.090	97
	UKUPNO II	1.779.000	1.901.700	1.701.834	89

Materijalni troškovi su realizovani u iznosu od 1,70 mil.KM, što je 89% od planiranih 1,90 mil.KM. Iako su u strukturi materijalnih troškova i usluga, pojedine stavke realizovane više u odnosu na planirana sredstva, došlo je do alokacije sredstava sa stavki manje utrošenih sredstava, tako da su u ukupnom iznosu materijalni troškovi i usluge realizovane u manjem iznosu od planiranih sredstava.

2.Služba “Pomoć – informacije na cestama”

Na osnovu člana100. stav2. Zakona o cestama F BiH, Služba «Pomoć-informacije» na cestama F BiH (SPI) povjerena je kao javno ovlaštenje JP Ceste F BiH, a posebnu naknadu za SPI reguliše član88. tačka5. i član100. stav3 Zakona o cestama F BiH i Odluka o službi „Pomoć-informacije“ (Vlada F BiH, od 20. januara 2011. godine).

Nakon provedene procedure otvorenog postupka javne nabavke, na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH, u skladu sa uslovima definisanim Dokumentima ponude uz objavljeni Javni oglas za izbor najpovoljnije ponude za obavljanje poslova službe «Pomoć-informacije» na cestama F BiH, za period: od 01.01.2022. do 31.12.2024. godine, Okvirnog sporazuma, te na osnovu Odluke o dodjeli ugovora za obavljanje usluga Službe «Pomoć-informacije» (SPI) na javnim cestama u F BiH su sklopljeni ugovori za 2022. godinu sa:

- **Bosanskohercegovački auto-moto klub, BIHAMK** Sarajevo za obavljanje poslova «Pomoć-informacije» na području gradova i općina: Bihać, Cazin, Bosanska Krupa; Bosanski Petrovac, Ključ; Sanski Most; Velika Kladuša, Bužim; Tuzla, Kladanj; Banovići, Živinice, Kalesija, Sapna, Teočak, Čelić, Srebrenik, Gračanica, Lukavac, Doboj Istok; Olovo; Zenica, Kakanj; Zavidovići, Žepče, Maglaj; Tešanj, Usora, Doboj Jug; Goražde, Prača, Ustikolina; Bugojno, Gornji Vakuf/Uskoplje, Donji Vakuf; Travnik, Novi Travnik; Konjic; Mostar; Jablanica, Prozor/Rama; Stari Grad-Sarajevo, Centar-Sarajevo, Novo Sarajevo, Novi Grad-Sarajevo, Ilidža, Vogošća, Hadžići, Trnovo; Ilijaš, Visoko, Breza, Vareš, i
- **Auto moto savez u Bosni i Hercegovini** (skraćeni naziv **AMS u BiH**) Mostar za obavljanje poslova «Pomoć-informacije» na području gradova i općina: Mostar, Čitluk; Stolac, Čapljina, Neum, Ravno; Ljubuški, Grude; Posušje, Široki Brijeg; Drvar, Bosansko Grahovo; Livno, Glamoč, Kupres, Tomislavgrad; Vitez, Busovača; Dobretići, Jajce; Kiseljak, Kreševo, Fojnica; Domaljevac-Šamac, Orašje i Odžak.

Ugovorom je definisano da se isplata vrši prema mjesečnim privremenim obračunskim situacijama nakon izvršene kontrole od strane uposlenika JP Ceste FBiH. Nadzor nad radom Službe «Pomoć-informacije» obavlja ovlašteno lice JP Ceste FBiH tako što vrši kontrolu privremenih obračunskih situacija, odnosno dnevnika informisanja i dnevnika pomoći na cesti za svaku bazu SPI. Planskim obilaskom baza SPI i putem nadzora pružanja intervencija na terenu kontroliše se na licu mjesta rad uposlenika SPI (izgled izvršioca i vozila, opremljenost, urednost vođenja dnevnika, tehnika pružanja pomoći i sl.), te se zapisnički konstatuje nađeno stanje.

Za svaku akciju iz Programa prometno - preventivnih aktivnosti izdaje se odobrenje, a na osnovu zahtjeva u kojem stoji šta će se raditi, od kada do kada, gdje, koliko će sudionika i vozila biti uključeno... Nakon završetka akcije, u okviru obračunske situacije, kontroliše se izvještaj koji sadrži navedene elemente i finansijski dio (strukturu i specifikaciju svih troškova sa računima za izvršene usluge i nabavke).

O uslovima i načinu korištenja usluga pomoći na cesti, na osnovu tačke 1.3 iz Obima usluga BIHAMK i AMS u BiH su obavještavali javnost:

- objavom namjenske informacije u dnevnoj štampi - četiri puta mjesečno;
- putem tonskih emitovanja informacija o stanju na cestama - dva puta sedmično,
- objavom informacija na više različitih „općinskih“ portala, te

obezbjedili da sve stanice tehničkog pregleda vozila na području djelovanja imaju u pisanoj formi predmetnu informaciju u obliku afiše. Na području na kome vrše poslove SPI na pogodnim mjestima uz magistralnu cestu BIHAMK i AMS u F BiH su postavili table/znakove obavještenja sa brojem telefona na koji motorizovani građani mogu zatražiti pomoć na cesti.

Prema dostavljenim mjesečnim obračunskim situacijama tokom 2022. godine ostvaren je sljedeći obim poslova i prihod po osnovi naknade za poslove SPI:

R. br.	Izvršitelj usluga SPI	Prispjela sredstva (po obračunu)	% umanjeње po osnovu člana 5. Ugovora **	Obaveza Razlika (2-3)	Vrijednost situiranih radova	Razlika (4-5) *
	1	2	3	4	5	6
1	BIHAMK Sarajevo	4.406.490	216.724	4.189.766	4.098.036	91.730
2	AMS U BIH Mostar	1.117.235	54.949	1.062.286	1.039.029	23.257
UKUPNO		5.523.725	271.673	5.252.052	5.137.065	114.987

Pregled obima poslova i prihoda po osnovi naknade za poslove SPI

* Po osnovu godišnjeg obračuna vrijednost situiranih radova u 2022. godini za SPI je bio manji za:

- 91.730 KM kod BIHAMK-a i
- 23.257 KM kod AMS u BIH

pa će za navedenu razliku novčanih sredstava biti uvećane situacije AMK za II/2023.

** Procentualno umanjeње iz kolone 4 se vrši na osnovu Odluke o visini naknade za troškove implementacije iz sredstava za poslove „Pomoć – informacije“ na cestama (odluka Nadzornog odbora broj: 01-03.2-NO-6835-6/07 od 17.12.2007. godine), a po godišnjem obračunu za 2022. godinu, u iznosu od 4,91 % (ovaj procenat predstavlja udio SPI u ukupnim prihodima po konačnom obračunu JP Ceste F BiH za 2022. godinu).

Za navedene i izvršene poslove SPI u F BiH, tokom 2022. godine, utrošena su ukupna sredstva kako slijedi:

-	Pomoć na cesti	4.117.543 KM
-	Informiranje	675.196 KM
-	<u>Prometno-preventivne aktivnosti</u>	<u>459.313 KM</u>
U K U P N O		5.252.052 KM

U drugom kvartalu 2022. godine su znatno povećani zahtjevi i obavljeni besplatni prevozi vozila što je sa povećanjem cijene goriva i pratećih usluga prijevoza doprinijelo većem utrošku sredstava za pomoć na cesti nego je to bilo planirano, pa su automoto klubovi tražili izmjenu ugovora, u dijelu koji se odnosi na besplatan prijevoz vozila do 15 km.

U izvještajnom periodu automoto klubovi u saradnji sa JP Ceste F BiH znatno su unaprijedili poslove informiranja javnosti o stanju prohodnosti cesta u BiH putem postavljanja „live“ kamera za video nadzor saobraćajnica na specifičnim lokacijama (prevojima, graničnim prijelazima ...) gdje građani mogu direktno vidjeti putem posjete web stranica: BIHAMK –a (78 lokacija) i AMS u BIH (31 lokaciju) kakvo je stanje na cesti.

JP Ceste F BiH u saradnji sa Bosansko-hercegovačkim auto-moto klubom, Auto-moto savezom u BiH, Federalnim ministarstvom prometa i komunikacije, Udruženjem društava za osiguranje u F BiH, kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova i kantonalnim direkcijama za ceste, realizuje globalnu kampanju pod nazivom "Sigurnost pješaka u cestovnom saobraćaju". Kampanja je počela krajem oktobra 2022. godine, sa ciljem da se skrene neophodna pažnja na ovu kategoriju učesnika u saobraćaju i njihovu ranjivost, da se ukaže na opasnosti kojima su izloženi, te potencira njihova sigurnost i zaštita. Provedeno je istraživanje o poštivanju pravila kretanja pješaka i

vozila u blizini pješačkih prijelaza u 11 gradova F BiH. Pripremljeni su edukativni letci, koji se dijele građanima, putem kojih ukazujemo i apelujemo na sve građane i građanke Bosne i Hercegovine, da kao pješaci i vozači u saobraćaju poštuju pravila i propise zbog vlastite sigurnosti, ali i sigurnosti drugih učesnika u saobraćaju.

3.Redovno održavanje cesta

Prema Zakonu o cestama u F BiH i Pravilniku o održavanju javnih cesta, održavanje cesta čini skup mjera i radnji koje se obavljaju tokom većeg dijela godine ili cijele godine na cestama, uključujući i sve objekte i instalacije sa svrhom održavanja prohodnosti, tehničke ispravnosti i sigurnosti prometa na cestama. U redovno održavanje cesta uključeni su i radovi održavanja cesta i objekata u zimskim uslovima.

U postupku javne nabavke, za 10 od 12 tenderisanih LOT-ova, je okončan postupak javne nabavke u 2019.godini, i sa odabranim izvođačima radova potpisani Okvirni sporazumi za period 01.07.2019. - 30.06.2023 godine, te jednogodišnji ugovori za period 01.07.2021.-30.06.2022., a potom i za period 01.07.2022.-30.06.2023. godina. Nakon žalbenog postupka za Lot 5 sa odabranim izvođačem radova zaključen je Okvirni sporazum za period 01.09.2021.-31.08.2025.godine, te jednogodišnji ugovor za period 01.09.2021. – 31.08.2022. godine, a potom i za period 01.09.2022.-31.08.2023.godine.

Za LOT7 sa odabranim izvođačem-Konzorcij: „HP Investing d.o.o. Mostar i „Hercegovinaputevi a.d.Trebinje“, potpisan Okvirni sporazum za period 01.02.2020. - 31.01.2024. godine i jednogodišnji ugovor za period 01.02.2021.-31.01.2022.godine. Nakon presude Suda i rješenja URŽ, poništen je zaključen Okvirni sporazum i prekinut jednogodišnji ugovor na LOT-u 7, te nastavljen postupak nabavke. Na osnovu pregovaračkog postupka zaključen je ugovor za redovno i zimsko održavanje magistralnih cesta na teritoriji F BiH – LOT 7 sa Konzorcijom: HP Investing d.o.o. i Hercegovina putevi a.d. Trebinje za period 01.01.2022.-31.12.2022.godine – odnosno do okončanja pokrenutog postupka.

Potpisivanjem novih ugovora povećana je i ukupna dužina magistralnih cesta koje su predmet redovnog održavanja, obzirom da su uključene nove dionice cesta – izgrađene ili u izgradnji, preuzete dionice prekategoriizacijom, te preciznije definisane dužine postojećih dionica.

Pored navedenog, za novoproglašenu magistralnu cestu M-4.3 (LOT 14) postupak javne nabavke je okončan krajem 2019. godine, te je sa odabranim izvođačem radova – „Kovgrad“ Bužim potpisan Okvirni sporazum za period 15.11.2019.-14.11.2023. godine i jednogodišnji ugovor za period 15.11.2021. - 14.11.2022.g, a potom i za period 15.11.2022.-14.11.2023.g.

Postupak javne nabavke radova redovnog održavanja za LOT 13 (novoproglašena magistralna cesta M-17.5) je završen okončanjem žalbenog postupka početkom 2020. godine, te je sa odabranim izvođačem radova -Konzorcij „Putovi Grude, KTM Brina Posušje i HP Investing Mostar“, zaključen Okvirni sporazum za period 01.02.2020.-31.01.2024. godina, a na osnovu istog jednogodišnji ugovori za period: 01.02.2021.-31.01.2022.godina i 01.02.2022. - 31.01.2023.godina.

Prioritetno su se izvršavali radovi na čišćenju i sanaciji kolovoza, regulisanju odvodnje, održavanju bankina, bermi, kosina usjeka i nasipa, obnavljanju horizontalne i vertikalne prometne signalizacije i cestovne opreme, košenju cestovnog pojasa i poboljšanju preglednosti, ophodnji cesta, održavanje objekata, potpornih i obložnih zidova, sve u skladu sa potrebama cesta i Pravilnikom o održavanju javnih cesta.

Sa JP Željeznice F BiH potpisan je Ugovor o održavanju putnih prijelaza za 2022.godinu, na magistralnoj cesti M-14 Bihać-Bosanska Krupa. Ugovor o održavanju putnih prijelaza broj: 01-02.2-

3721/22. od 23.05.2022. u vrijednosti od 6.434 KM, se odnosi na održavanje sljedećih pružnih prijelaza: Čuvarnica br. 13,14,15,16,16a,17 i pružni prijelaz Blok III Bihać ind.

Planirani troškovi električne energije za rasvjetu tunela, raskrsnica, mostova, semafora, brojača prometa, te održavanje elektroopreme za rasvjetu tunela i prilaznih zona tunelima, rasvjete raskrsnica, semafora i i trafostanica, su realizovani u okvirima planiranih veličina

Urađeno je redovno održavanje mostova, glavni pregledi objekata, monitoring GPS-om vozila angažovanih u sklopu redovnog održavanja, te radovi iz oblasti poboljšavanja sigurnosti prometa: obilježavanje vertikalnom signalizacijom i optičko-vibracionim trakama u blizini škola.

Zimsko održavanje cesta - zimska služba

U periodu od 01.01.2022. - 15.03.2022. godine odnosno od 15.11.-31.12.2022 godine kada se, prema Pravilniku, uspostavlja zimska služba na mreži magistralnih cesta u FBiH, formirano je dežurstvo na punktovima zimske službe, te izvršavani poslovi prema Operativnom planu zimske službe: čišćenje snijega i sprječavanje poledice na kolovozu, objektima i proširenjima kolovoza, obilježavanje širine planuma ceste rubnim motkama, nabavka, preuzimanje i deponovanje posipnog materijala, uklanjanje materijala sa kolovoza, uklanjanje vozila koja ometaju saobraćaj, osiguranje odvodnje u vrijeme padanja kiše i otapanja snijega, sprječavanje izlivanja vode na kolovoz, održavanje kolovoza i saobraćajne signalizacije u ispravnom stanju, postavljanje znakova II-46 „obavezna upotreba zimske opreme“ na pogodnim mjestima na ulazu u područje F BiH i pred usponima, informisanje o stanju na cestama.

U skladu sa postojećim Okvirnim sporazumom, održavano je 2.292,10 km magistralnih cesta, od čega 64,37 km sa makadamskim kolovozom (Održavanje dijela magistralnih cesta kroz grad Sarajevo u dužini od 18,65 km organizovala Direkcija za puteve Kantona Sarajevo, a u skladu sa Ugovorom potpisanim sa JP Ceste FBiH). Prema prioritetu 1.446,60 km cesta je u prvom prioritetu, 812,50 km cesta u drugom prioritetu i 33,05 km cesta u trećem prioritetu.

Prema novim Okvirnim sporazumima, nabavku soli za posipanje cesta vrše izvođači radova, a 20% od planiranih količina za sve izvođače osigurava JP Ceste F BiH kao rezervu. Obzirom da potrebne količine soli postoje, to JP Ceste F BiH nije vršilo nabavku nove soli.

Nakon završetka zimske službe 2021/2022. i obračuna radova na zimskom održavanju, zbog povoljnih vremenskih prilika odnosno ispodprosječnih sniježnih padavina na većem dijelu FBiH, pokazalo se da su planirana ukupna sredstva za zimsku službu ostala neutrošena u visini od cca 2,5 miliona KM (oko 19 % planirane vrijednosti). Uz saglasnost Uprave JP Ceste FBiH dio neutrošenih sredstava zimske službe je iskorišten za neophodne radove redovnog održavanja cesta.

U donjoj tabeli dat je pregled Sporazuma i ugovora redovnog održavanja magistralnih cesta za period naveden u tabeli:

Red. br	LOT	Izvođač	Vrijednost Okvirnog sporazuma	broj Okvirnog sporazuma	Period važenja Okvirnog sporazuma
1.	LOT 1	Rad-putevi Bihać, Behić Sanny Boy d.o.o.Bihać i Divil d.o.o.Sanski Most	12.565.800	01-02.2-7787/19	01.07.2019.-30.06.2023
2.	LOT 2	Kov-grad Bužim i I-Selimović d.o.o.Cazin	11.243.700	01-02.2-7788/19	01.07.2019.-30.06.2023
3.	LOT 3	Konz: Jata-group, Srebrenik, HIH Živinice,	19.691.100	01-02.2-7789/19	01.07.2019.-30.06.2023
4.	LOT 4	Dobojputevi d.d. Doboj jug	10.073.700	01-02.2-7790/19	01.07.2019.-30.06.2023

JP CESTE FEDERACIJE BIH

5.	LOT 6	Goraždeputevi Goražde	6.493.500	01-02.2-7791/19	01.07.2019.-30.06.2023
6.	LOT 7	Konz. HP Investing d.o.o.Mostar i Hercegovinaputevi a.d. Trebinje	6.549.920	01-02.2-1325/20.	01.02.2020.-31.01.2024.
7.	LOT 8	Sarajevoputevi d.d. Sarajevo	12.506.250	01-02.2-7792/19.	01.07.2019.-30.06.2023
8.	LOT 9	Ceste d.d. Mostar	4.538.560	01-02.2-7793/19.	01.07.2019.-30.06.2023
9.	LOT 10	Ceste d.d.Mostar	11.447.261	01-02.2-7794/19.	01.07.2019.-30.06.2023
10.	LOT 11	Ceste d.d.Mostar	24.205.658	01-02.2-7795/19.	01.07.2019.-30.06.2023
11.	LOT 12	Ceste d.d. Mostar	17.877.596	01-02.2-7796/19.	01.07.2019.-30.06.2023
12.	LOT 13	Konz. Putovi d.o.o.Grude, KTM Brina d.o.o.Posušje HP Investing d.o.o.Mostar	5.670.853	01-02.2-1328/20.	01.02.2020.-31.01.2024.
13.	LOT 14	Kov-grad d.o.o.Bužim	4.282.200	01-02.2-12930/20	15.11.2019.-14.11.2023.
14.	LOT 5	Jata group d.o.o.Srebrenik i Balegem d.o.o. Gradačac	9.682.264	01-02.2-8846/21.	01.09.2021.-31.08.2025.
UKUPNO			156.828.362		

Ugovori 2021./2022.

Red.br	LOT	Izvođač	Vrijednost ugovora	broj ugovora	Ugovoreni period:
1.	LOT 1	Rad-putevi Bihać, Behić Sanny Boy d.o.o.Bihać i Divel d.o.o.Sanski Most	2.938.424	01-02.2-6998/21.	01.07.2021.-30.06.2022.
2.		Anex	178.718	01-02.2-6998-1/21	01.07.2021.-30.06.2022.
3.	LOT 2	Kov-grad Bužim i I-Selimović d.o.o.Cazin	2.654.543	01-02.2-6999/21.	01.07.2021.-30.06.2022.
4.		Anex	182.731	01-02.2-6999-1/21	01.07.2021.-30.06.2022.
5.	LOT 3	Konz: Jata-group, Srebrenik, HIH Živinice,	4.643.805	01-02.2-7001/21.	01.07.2021.-30.06.2022.
6.		Anex	246.282	01-02.2-7001-1/21	01.07.2021.-30.06.2022.
7.	LOT 4	Dobojputevi d.d. Doboj jug	2.339.455	01-02.2-7003/21.	01.07.2021.-30.06.2022.
8.		Anex Jata group d.o.o.Srebrenik i Balegem d.o.o.Gradačac	89.845	01-02.2-7003-1/21	01.07.2021.-30.06.2022.
9.	LOT 5	Jata group d.o.o.Srebrenik i Balegem d.o.o.Gradačac	2.246.400	01-02.2-8847/21.	01.09.2021.-31.08.2022.
10.		Anex	73.044	01-02.2-8847-1/21	01.09.2021.-31.08.2022.
11.	LOT 6	Goraždeputevi Goražde	1.517.890	01-02.2-7006/21.	01.07.2021.-30.06.2022.
12.		Anex	75.795	01-02.2-7006-1/21	01.07.2021.-30.06.2022.
13.	LOT 7	Konzorcij:HP Investing d.o.o.Mostar i Hercegovina putevi a.d. Trebinje	1.520.107	01-02.2-1037/21.	01.02.2021.-31.01.2022.
14.	LOT 8	Sarajevoputevi d.d.Sarajevo	2.976.421	01-02.2-7007/21.	01.07.2021.-30.06.2022.
15.		Anex	109.310	01-02.2-7007-1/21	01.07.2021.-30.06.2022.
16.	LOT 9	Ceste d.d. Mostar	1.052.486	01-02.2-7008/21.	01.07.2021.-30.06.2022.
17.		Anex	42.066	01.02.2-7008-1/21	01.07.2021.-30.06.2022.
18.	LOT 10	Ceste d.d. Mostar	2.655.869	01-02.2-7010/21.	01.07.2021.-30.06.2022.
19.		Anex	50.309	01-02.2-7010-1/21	01.07.2021.-30.06.2022.
20.	LOT 11	Ceste d.d. Mostar	5.616.160	01-02.2-7012/21.	01.07.2021.-30.06.2022.
21.		Anex	220.735	01-02.2-7012-1/21	01.07.2021.-30.06.2022.
22.	LOT 12	Ceste d.d. Mostar	4.148.228	01-02.2-7013/21.	01.07.2021.-30.06.2022.
22.		Anex	184.565	01-02.2-7013/22	01.07.2021.-30.06.2022.
23.	LOT 13	Konzorcij:Putovi d.o.o.Grude, KTM Brina d.o.o.Posušje i HP Investing d.o.o.Mostar	1.319.547	01-02.2-1038/21.	01.02.2021.-31.01.2022.
24.	LOT 14	Kov-grad Bužim	994.017	01-02.2-11296/21.	15.11.2021.-14.11.2022.
25.		Anex	116.803	01-02.2-12320/22	15.11.2021.-14.11.2022.
		UKUPNO	38.193.555		

Ugovori 2022./2023.

Red.br	LOT	Izvođač	Vrijednost ugovora	broj ugovora	Ugovoreni period:
1.	LOT 7	Konzorcij: HP Investing d.o.o. Mostar i Hercegovina putevi a.d. Trebinje	1.520.107	01-02.2-349/22.	01.01.2022.-31.12.2022.
2.	LOT 13	Konzorcij: Putovi d.o.o. Grude, KTM Brina d.o.o. Posušje i HP Investing d.o.o. Mostar	1.319.529	01-02.2-786/22.	01.02.2022.-31.01.2023.
3.	LOT 1	Rad-putevi Bihać, Behić Sanny Boy d.o.o. Bihać i Divel d.o.o. Sanski Most	3.173.498	01-02.2-4762/22.	01.07.2022.-30.06.2023.
4.		Anex	33.872	01-02.2-12450/22	01.07.2022.-30.06.2023.
5.	LOT 2	Kov-grad Bužim i I-Selimović d.o.o. Cazin	2.875.932	01-02.2-4763/22.	01.07.2022.-30.06.2023.
6.		Anex	31.290	01-02.2-12451/22	01.07.2022.-30.06.2023.
7.	LOT 3	Konz: Jata-group, Srebrenik, HIH Živinice,	4.479.373	01-02.2-4764/22.	01.07.2022.-31.03.2022.
8.		Anex	90.814	01-02.2-12447/22	01.07.2022.-31.03.2023.
9.	LOT 4	Dobojputevi d.d. Doboj jug	605.937	01-02.2-4765/22.	01.07.2022.-15.10.2022.
10.	LOT 4	Konzorcij: Jata grup d.o. Srebrenik i Balegem d.o.o. Gradačac	2.676.075	01-02.2-8681/22	16.10.2022.-30.06.2023.
11.	LOT 5	Jata group d.o.o. Srebrenik i Balegem d.o.o. Gradačac	2.489.614	01-02.2-7800/22	01.09.2022.-31.08.2023.
12.	LOT 6	Goraždeputevi Goražde	1.638.866	01-02.2-4766/22.	01.07.2022.-30.06.2023.
13.		Anex	31.056	01-02.2-12452/22	01.07.2022.-30.06.2023.
14.	LOT 8	Sarajevoputevi d.d. Sarajevo	3.213.642	01-02.2-4768/22.	01.07.2022.-30.06.2023.
15.		Anex	31.090	01-02.2-12453/22	01.07.2022.-30.06.2023.
16.	LOT 9	Ceste d.d. Mostar	1.118.793	01-02.2-4769/22.	01.07.2022.-30.06.2023.
17.		Anex	20.200	01-02.2-12369/22	01.07.2022.-30.06.2023.
18.	LOT 10	Ceste d.d. Mostar	2.823.186	01-02.2-4770/22.	01.07.2022.-30.06.2023.
19.		Anex	60.534	01-02.2-12368/22	01.07.2022.-30.06.2023.
20.	LOT 11	Ceste d.d. Mostar	5.968.060	01-02.2-4772/22.	01.07.2022.-30.06.2023.
21.		Anex	96.613	01-02.2-12371/22	01.07.2022.-30.06.2023.
22.	LOT 12	Ceste d.d. Mostar	4.956.745	01-02.2-4773/22.	01.07.2022.-30.06.2023.
23.		Anex	89.080	01-02.2-12372/22	01.07.2022.-30.06.2023.
24.	LOT 14	Kov-grad Bužim	1.143.230	01-02.2-10426/22	15.11.2022.-14.11.2023.
		UKUPNO	40.487.136		

Pregled redovnog održavanja po LOT-ovima

LOT	Mag. Cesta	Dužina u km	Dionice magistralnih cesta	Plan 2022.			Rebalans Plana 2022.			Realizovano 2022.		
				Redovno održavanje	Zimska služba	Ukupno	Redovno održavanje	Zimska služba	Ukupno	Redovno održavanje	Zimska služba	Ukupno
1. L=199,309 km	M-5	115,116	(gr. Hrvatske) Izačić-Bihać-Ključ-Velečevo(gr.ent)	1.814.250	1.271.000	3.085.250	1.993.000	1.271.000	3.264.000	1.963.220	1.157.915	3.121.135
	M-11	8,526	Ripač-Užljebić(gr. Hrvatske)									
	M-14.2	26,337	Bosanski Petrovac-Drvar									
	M-15	49,33	(gr.ent)-Sanski Most-Kamičak-Ključ									
2. L=166,541 km	M-4.2	51,564	(gr. Hrvatske)Velika Kladuša-Cazin-Srbljani	1.809.125	968.625	2.777.750	1.991.900	968.625	2.960.525	1.882.559	896.055	2.778.614
	M-14	49,237	Bihać-Srbljani-Bosanska otoka-(Gr.entiteta)									
	M-14.2	53,674	Bosanska Krupa-Krnjeuša-Bosanski Petrovac									
		12,066	Čavkići-Spahići (u izgradnji)									
3. L=244,400 km	M-1.8	40,849	(gr.ent)-Arizona(gr.distr) (gr.distr.)-Srebrenik-Šićki Brod	2.982.750	1.845.000	4.827.750	3.229.600	1.845.000	5.074.600	3.814.118	1.549.561	5.363.679
	M-1.9	19,846	(gr.ent)-Slatina-Gradačac-Ormanica									
	M-4	71,881	Donja Orahovica-Petlja Šićki Brod-Tuzla-Simin Han-Kalesija-Memići(gr.ent)									
	M-14.1	13,817	(gr.ent)Modriča-Gradačac-Pelagićevo(gr.ent)									
	M-18	84,38	(gr.ent.)Priboj-Simin Han Šićki Brod-Kladanj-Tunel Karaula- Olovo									
	M-19.2	11,780	Vitalj-(gr.ent)									
4. L=140,991 km	M-4	38,694	(gr. Ent) Teslić –Jelah-Karuše; (gr.ent.) Doboj-Gračanica-Donja Orahovica	1.583.625	886.625	2.470.250	1.673.500	886.625	2.560.125	1.556.935	783.241	2.340.176
	M-5	5,217	Kaonik-Lašvanska petlja									
	M-17	97,081	(gr.ent.)Karuše-Žepče-Zenica-Lašva-Bilješevo (A1)									
5. L=132,782 km	M-5	81,923	(gr.ent.) Jezero- Jajce-Travnik-Nević Polje	1.414.500	1.107.000	2.521.500	1.487.600	1.107.000	2.594.600	1.569.894	553.845	2.123.739
	M-16	50,859	(gr.ent) Crna Rijeka-Jajce; Donji Vakuf-Bugojno-tunel Koprivnica									
6. L=95,191 km	M-5	13,998	(gr.ent)Prača-Hrenovica(gr.ent.)	1.035.250	563.750	1.599.000	1.111.000	563.750	1.674.750	1.103.968	494.448	1.598.416
	M-18	5,934	(gr.ent)Bogatići-Trnovo(gr.ent.)									
	M-18.1	46,334	Ustikolina-Grebak-Trnovo									
	M-20	28,925	(gr.ent.)Foča-Ustikolina-Goražde-Ustiprača(gr.ent.)									

JP CESTE FEDERACIJE BIH

7. L=128,837 km	M-6.1	26,209	Mostar-Gnojnice-Nevesinje(gr.ent)	937.875	763.625	1.701.500	987.000	763.625	1.750.625	1.077.814	397.808	1.475.622
	M-14.2	30,147	Prozor-Jablanica									
	M-17	72,481	Konjic-Jablanica-Mostar-Gnojnice									
8. L=130,617 km	M-5	20,104	Zelena meraja-Most.raskršće,Vijećnica-Korija, Gradska obilaznica	1.968.000	1.086.500	3.054.500	2.077.000	1.086.500	3.163.500	1.695.034	924.939	2.619.973
	M-17	56,302	Jošanica-Stup; Stup-Tarčin-Konjic									
	M-18	54,211	Olovo-Semizovac-Koševsko brdo, Stup-Trnovo(gr.ent)									
9. L=64,512 km	M-1.8	7,992	(gr.Hrvatske)-Orašje-Lončari(gr.ent)	738.000	369.000	1.107.000	780.000	369.000	1.149.000	793.460	344.460	1.137.920
	M-14.1	24,670	(gr.ent)Brod-Svilaj-Odžak-Modriča(gr.ent)									
	M-14.2	31,850	Odžak-Šamac (gr.ent) (gr. ent) Šamac-Orašje									
10. L=136,385 km	M-5	58,00	Nević Polje-Kaonik-Busovača-Zelena Meraja	1.660.500	1.137.750	2.798.250	1.710.800	1.137.750	2.848.550	1.780.546	947.616	2.728.162
	M-16.2	39,6	Bugojno-Gornji Vakuf-Prozor									
	M-16.4	38,6	Bugojno-Novi Travnik-Nević Polje									
11. L=342,086km	M-6.1	158,647	(gr.Hrvatske) Kaldma-Bos.Grahovo-Livno-Kolo-Studena Vrla	3.700.250	2.326.750	6.027.000	3.920.000	2.326.750	6.246.750	3.706.823	2.008.109	5.714.932
	M-14.2	33,355	Drvar-Resanovci; Bosansko Grahovo-Strmica (gr.Hrvatske)									
	M-15	96,809	(gr.ent)-Glamoč-Priluka, Livno-Šujica-Kolo									
	M-16	56,778	Tunel K.Vrata-Kupres-Šujica Livno-Kamensko(gr.Hrvatske)									
	M-16.3	3,210	Renjići-Prisika (gr.Hrvatske)									
	M-16.5	14,07	Karlov Han-Kazaginac									
12. L=342,086 km	M-2	9,258	(gr.Hrvatske)-Neum-(gr.Hrvatske)	3.520.875	902.000	4.422.875	3.705.500	902.000	4.607.500	3.682.005	868.573	4.550.578
	M-6	86,449	(gr.Hrvatske) Gorica-Čapljina-Stolac-Ljubinje (gr.ent)									
	M-6.1	70,224	Studena vrila-Posušje-Široki brijeg-Mostar obilaznica Mostara									
	M-15	3,111	Posušje-Kutleše-Gr.Hrvatske									
	M-17	38,582	Gnojnice-Čapljina-Doljani (gr.Hrvatske)									
	M-17.3	84,167	Buna-Masline; Stolac-Hutovo –Neum,(+Neum-Babin do)									
	M-20	8,49	(gr.Hrvatske)Dubrovnik-Duži-Trebinje(gr.ent)									
	M-17.4	41,807	Mostar-Čitluk-Ljubuški-Crveni Grm(gr.Hrvatske)									

JP CESTE FEDERACIJE BIH

13. L=100,00 km	M-17.5	100,775	Jablanica-Blidinje-Posušje-Grude-Privalj	912.250	440.750	1.353.000	912.250	440.750	1.353.000	888.165	388.687	1.276.852
14. L=57,00km	M-4.3	57,00	Velika Kladuša-Bužim-Bosanska Otoka	671.375	348.500	1.019.875	728.500	348.500	1.077.000	772.099	352.385	1.124.484
		2.316,385	U K U P N O	24.748.625	14.016.875	38.765.500	26.307.650	14.016.875	40.324.525	26.286.641	11.667.641	37.954.282

- **Redovno održavanje mostova**

Naziv	Plan 2022.	Rebalans Plana 2022.	Konsultant /Izvođač	Ugovoreno	Realizovano 2022.
Redovno održavanje mostova					
- Most M-4.2-001-3-preko rijeke Kladušnice, Velika Kladuša - Most M-4.2-001-585- preko nepoznatog potoka, Vejinac,Purići - Most M-4.2-002-506, preko radetina potoka, Čoralići, - Most M-4.2-002-589,preko lokalne ceste, Cazin - Most M-4.2-002-7 preko rijeke Une,Sedra, Ostrožac, - Most M-5-001-9, preko potok a Garavice, - Most M-5-003-17,preko potoka jaruga, Ripač, PLP 15-004-478, pločasti propust preko potoka Sokolovo	400.000	600.000	BC Gradnja d.o.o. Bosanska Otoka 01-02.1-14740/19 26.12.2019.	242.440 (preneseno 143.872)	143.722
UKUPNO	400.000	600.000			143.722

Na osnovu Odluke o ratifikaciji Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o održavanju i rekonstrukciji cestovnih mostova na državnoj granici, ratifikovao se „Sporazum između Vijeća ministara BiH i Vlade RH o održavanju i rekonstrukciji mostova na državnoj granici BiH i RH („Službeni glasnik BiH broj 7/21.“ od 09.06.2021.) U vezi spomenutog Sporazuma, potpisan je 20.12.2022. „Sporazum o dodjeli sredstava iz budžeta Ministarstva Komunikacija i transporta BiH“, između navedenog ministarstva i JP Ceste F BiH sa brojem: 01-02.1-12114/22. Sredstva su namijenjena za finansiranje tekućeg održavanja sljedećih mostova, preko rijeke Save:

- Šamac/Slavonski brod - 35.000KM i
- Orašje/Županja - 35.000KM.

Realizacija Sporazuma se očekuje u narednoj godini.

- **Pregledi mostova**

Naziv	Plan 2022.	Rebalans Plana 2022.	Konsultant /Izvođač	Ugovoreno	Realizovano 2022.
Redovno održavanje pregledi mostova - Geodetsko opažanje mosta preko rijeke Bosne na M17 u Topčić polju km0+747	50.000	50.000	Geobiro d.o.o.Konjic 01-02.1-9223/21. 10.09.2021.	6.903	-
UKUPNO	50.000	50.000			-

- **Održavanje i nadzor elektroopreme (rasvjeta tunela i prilaznih zona tunelima, rasvjeta raskrsnica, semafori i trafo stanice)**

Naziv i opis aktivnosti	Plan 2022.	Rebalans Plana 2022.	Konsultant /Izvođač	Ugovoreno	Realizovano 2022.
Usluge opravke, pregleda, održavanja i instalacija sistema za upravljanje tunelom Karaula			BS Telecom Solutions d.o.o.Sarajevo, 01-02-2-10688/20. 13.11.2020.	124.018 (preneseno 10.115)	-
Redovno održavanje semaforskih uređaja, opreme i svjetlećih oznaka pješačkih prelaza na mag.cestama u F BiH	700.000	700.000	Step d.d.Sarajevo, 01-02-2-9870/21. 29.09.2021. Anex01-02-2-9870-1/21.16.11.2022.	319.643 (preneseno 283.874) 19.520	279.864 19.520

JP CESTE FEDERACIJE BIH

Redovno održavanje javne rasvjete tunela i prilaznih zona tunelima, raskrsnica i trafo stanica na mag.cestama			Step d.d.Sarajevo, 01-02.2-11666/21. 24.11.2021. Anex 01-02.2-11666-1/2116.11.2022	314.357 16.573	275.470 16.573
Nadzor nad radovima redovnog održavanja javne rasvjete tunela, prilaznih zona tunelima, raskrsnica i trafo stanica na magistralnim cestama			Aber Design d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-11564/21. 22.11.2021.	7.000	7.000
Nadzor nad radovima redovnog održavanja semaforских uređaja i opreme i svijetlećih oznaka pješačkih prelaza			Aber Design d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-11898/21. 03.12.2021.	7.000	7.000
Redovno održavanje javne rasvjete tunela i prilaznih zona tunelima, raskrsnica i trafo stanica na mag.cestama			Step d.d.Sarajevo, 01-02.2-11310/22. 30.11.2022.	314.357	92.901
Redovno održavanje semaforских uređaja, opreme i svijetlećih oznaka pješačkih prelaza na mag.cestama u F BiH			Step d.d.Sarajevo, 01-02.2-8470/22. 26.09.2022.	319.643	-
Nadzor nad radovima redovnog održavanja semaforских uređaja i opreme i svijetlećih oznaka pješačkih prelaza			Aber Design d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-12358/22. 28.12.2022.	7.000	-
Vremensko usklađivanje semafora Izvođenje radova na oštećenju elektroenergetskog priključka za javnu rasvjetu petlja Zenica			Telefonija Vidaković Tranzit Elektro d.o.o. Zenica,	936 2.086	3.022
UKUPNO	700.000	700.000			701.350

Za radove redovnog održavanja semaforских uređaja i opreme i svjetlećih oznaka pješačkih prelaza na magistralnim cestama u F BiH, za period 2021.-2025., potpisan je Okvirni sporazum broj:01-02.2-9869/21. 29.09.2021. na iznos od 1.278.570 KM.

Okvirni sporazum broj: 01-02.2-11667/21. od 24.11.2021. potpisan je za redovno održavanje javne rasvjete tunela, prilaznih zona tunelima, raskrižja i trafo stanica na magistralnim cestama u F BiH za period 2021. - 2025. na iznos od 1.257.426KM.

Okvirni sporazumi su potpisani sa Step d.d.Sarajevo.

- Redovno održavanje brojača prometa

Okvirni sporazum redovnog održavanja brojača prometa postavljenih uz magistralne ceste u F BiH za period 2022. -2026. broj: 01-02.3.1-8621/22. potpisan je 03.10.2022. godine sa GP: Alem sistem d.o.o.Sarajevo i Bogal Inženjering d.o.o. Novi Sad u iznosu od 259.997 KM.

Naziv i opis aktivnosti	Plan 2022.	Rebalans Plana 2022.	Konsultant /Izvođač	Ugovoreno	Realizovano 2022.
Redovno održavanje brojača prometa postavljenih uz magistralne ceste u F BiH	80.000	56.000	GP: Alem sistem d.o.o.Sarajevo i Bogal Inženjering d.o.o. Novi Sad 01-02.3.1-8622/22. 03.10.2022.	64.982	9.968
Usluge brojanja saobraćaja			BH Telecom i HT Etonet		13.195
UKUPNO	80.000	56.000			23.163

- Redovno održavanje cestovnih meteoroloških stanica

Za redovno održavanje cestovnih meteoroloških stanica postavljenih uz magistralne ceste u F BiH 2022. – 2026. potpisan je 03.10.2022. (01-02.3.1-8623/22) Okvirni sporazum sa Alem Sistemi d.o.o. Sarajevo, vrijednosti 259.997 KM.

Naziv i opis aktivnosti	Plan 2022.	Rebalans Plana 2022.	Konsultant /Izvođač	Ugovoreno	Realizovano 2022.
Redovno održavanje cestovnih meteoroloških stanica postavljenih uz magistralne ceste u F BiH	-	56.000	Alem Sistem d.o.o.Sarajevo 01-02.3.1-8624/22. 03.10.2022.	64.982	14.134
UKUPNO		56.000			14.134

- **Sanacija postojećih i izgradnja novih svjetlosnih prometnih znakova kod škola**

Naziv i opis aktivnosti	Plan 2022.	Rebalans Plana 2022.	Konsultant /Izvođač	Ugovoreno	Realizovano 2022.
Sanacija postojećih i izgradnja novih svjetlosnih prometnih znakova kod škola	120.000	120.000	Projekta d.o.o.Mostar, 01-02.3-11562/22. 05.12.2022	119.862	-
UKUPNO	120.000	120.000			-

- **Monitoring vozila redovnog održavanja GPS-om**

Naziv i opis aktivnosti	Plan 2022.	Rebalans Plana 2022.	Konsultant /Izvođač	Ugovoreno	Realizovano 2022.
Usluge satelitskog nadzora LOT 1- vozila zimske službe LOT 2 – ophodarskih vozila LOT 3- vozila internog voznog parka	30.000	30.000	TIM System d.o.o. Sarajevo 01-03.2-11575/22 01-03.2-11576/22 01-03.2-11577/22. 05.12.2022.	2.809 3.488 4.563	2.278
UKUPNO	30.000	30.000			2.278

REKAPITULACIJA ULAGANJA U REDOVNO ODRŽAVANJE

	O P I S	Plan 2022.	Rebalans Plana 2022.	Realizovano 2022.	Index 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	REDOVNO ODRŽAVANJE I ZIMSKA SLUŽBA	38.765.500	40.324.525	37.954.282	94
2.	Redovno održavanje mostova	400.000	600.000	143.722	24
3.	Glavni pregledi objekata (složenih)	50.000	50.000	-	-
4.	Troškovi električne energije za rasvjetu tunela, raskrsnica, mostova, semafora, brojača prometa i meteo stanica	700.000	700.000	622.809	89
5.	Osiguranje pružnih prelaza u USK (sufinansiranje)	50.000	50.000	1.723	3
6.	Poboljšanje sigurnosti prometa – izrada noveliranih prometnih projekata	65.000	65.000	-	-
7.	Održavanje i nadzor elektro-opreme (rasvjeta tunela i prilaznih zona tunelima, rasvjeta raskrsnica, semafori i trafo stanice, te zamjena rasvjetnih tijela LED svjetiljkama)	700.000	700.000	701.350	100
8.	Sanacija postojećih i izgradnja novih svjetlosnih prometnih znakova kod škola	120.000	120.000	-	-
9.	Redovno održavanje brojača prometa	80.000	56.000	23.163	41
10.	Redovno održavanje cestovnih meteoroloških stanica	-	56.000	14.134	25

JP CESTE FEDERACIJE BIH

10.	Monitoring vozila redovnog održavanja GPS-om	30.000	30.000	2.278	8
11.	Obilježavanje pješačkih prijelaza sa plastikom optičko-vibracionim trakama kod škola	50.000	50.000	-	-
12.	Usklađivanje vertikalne signalizacije sa noveliranim prometnim projektima	300.000	300.000	-	-
13.	Rekalibracija uređaja za mjerenje refleksije horizontalne i vertikalne signalizacije	25.000	25.000	-	-
UKUPNO REDOVNO ODRŽAVANJE		41.335.500	43.126.525	39.463.461	92

4. Rezervirana sredstva za rizike, neplanirane rashode i rashode koji ne terete projekte

N A Z I V	Plan 2022.	Rebalans Plana 2022.	Realizovano 2022.	Napomena
Rezervirana sredstva za rizike i neplanirane rashode				
- Rekonstrukcija tunela Vranduk- rekonstrukcija lokalne ceste R455 Nemila Tetovo-Zenica			118.703	Finansirano iz kreditnih sredstava
- Troškovi vezani za projekat Sarajevska obilaznica			16.030	
- Obračun zateznih kamata po osnovu dužničko-povjerilačkih odnosa vezanih za Program „Modernizacija cesta u F BiH“			35.997	Finansirano iz kreditnih sredstava
- Obračun negativnih tečajnih razlika na deviznim računima vezano za Program „Modernizacija cesta u F BiH“	1.000.000	800.000	73.153	Finansirano iz kreditnih sredstava
- Troškovi vezani za okončane projekte			23.109	-
- Odluka Komisije o otpisu projekata			106.350	-
- Gubici na ugovore o izgradnji i gh			5.850	-
- Troškovi rada Koordinacionog tijela TEN-T mreža			25.253	-
UKUPNO	1.000.000	800.000	404.445	

- Tokom rekonstrukcije tunela Vranduk II bilo je potrebno privremeno preusmjeriti saobraćaj na regionalnu cestu R 445 Nemila-Tetovo-Zenica i minimizirati negativne efekte na lokalne zajednice pogođene projektom. Regionalna cesta R 445 dužine 24 km se koristila samo za saobraćaj vozila do 7.5t. Regionalna cesta je sanirana, na pojedinim dijelovima rekonstruisana, da bi mogla prihvatiti povećani saobraćaj i da bi se smanjili rizici u pogledu sigurnosti prometa. Realizovan je Amandman ugovora br.2 sa JV Hering d.d. Široki brijeg&BBM d.o.o.Sarajevo - o rekonstrukciji tunela Vranduk i rekonstrukcija mostova Bosna IV i Bosna V Rehabilitacija lokalne ceste R455 Nemila - Tetovo - Zenica.

- Troškovi vezani za projekat Sarajevska obilaznica, a najviše, u predmetima zastupanja JP Ceste F BiH na osnovu Sporazuma o pružanju pravne pomoći od 27.07.2011, Anexom I i II navedenog Sporazuma, sa advokatskom kancelarijom Gavrankapetanović i ostali.

- Na osnovu ugovora BA/FBH/RFRU/W/4-1/20 iz Programa „Modernizacija cesta F BiH“, JV Hering d.d.Široki brijeg & KTM Brina d.o.o. Posušje na projektu „Izgradnja Južne obilaznice Mostara“ obračunali su zatezne kamate u iznosu od 35.997 KM, za kašnjenje, od strane EBRD-a, u izmirenju prispjelih obaveza, po ispostavljenim privremenim situacijama.

- Ugovor BA/FBH/RMP/QCBS/40/SC/19 za tehničku pomoć za procjenu osjetljivosti cestovne mreže na klimatske promjene potpisan je 02.03.2021. sa JV Finnish OC Roadroid Design&QC d.o.o.Sarajevo. Dobavljač je ispostavio po ugovorenoj valuti fakture u USD, što se pri

JP CESTE FEDERACIJE BIH

konverziji u EUR-e, pojavila kursna razlika u iznosu od 73.154 KM.

- Projekti: Rekonstrukcija raskrsnica Olovske luke, Husino, Vrški put i dr. su okončani i aktivirani u prethodnom periodu, tako da dodatna ulaganja terete rashode perioda.

- Na osnovu preporuka Ureda za reviziju institucija F BiH i eksterne revizije, a u skladu sa Računovodstvenim politikama i druga internim aktima JP Ceste F BiH, Uprava JP Ceste F BiH je po prijedlogu Komisije za popis investicija u toku, donijela Odluku o otpisu sljedećih projekata, jer se isti neće dalje realizirati:

a. Izrada glavnog projekta trake za lijevo skretanje sa M-5 na stari put za Bosanki Petrovac	6.494 KM
b. Izgradnja pješačkog prelaza izvan nivoa kolovoza za naselje Gornje Raince, dionica: Simin Han1-Donje Caparde	10.296 KM
c. Rekostrukcija raskrsnice u kružni tok Priluka – Livno	10.092 KM
d. Rekostrukcija raskrsnice u kružni tok Partizansko – Livno	7.769 KM
e. Rekostrukcija raskrsnice u kružni tok Troglav – Livno	7.769 KM
f. Rekonstrukcija raskrsnice na M4 i R469, Simin han 1 - D.Ceparde km 8+860	8.403 KM
g. Sanacija škarpe dionica:Jablanica-Potoci, km 7+200-7+750	22.698 KM
h. Sanacija asfaltnog kolovoza dionica: Ustikolina – Goražde 8, km 14+200 -19+000	24.691 KM
i. Sanacija trupa ceste Priboj 2-Simin Han na M18, km 9+100	3.498 KM
j. Pješački semafor na M16 Zastin, općina Jajce	<u>3.510 KM</u>

U K U P N O 105.220 KM

- Također, Komisija za rashodovanje materijalnih sredstava po popisu, na prijedlog Sektora ekonomsko-finansijskih poslova optisala je „Infosoft modul za fakturisanje“ (1.130 KM) koji nije stavljen u funkciju, uslijed nedorađenosti i nespojivosti sa postojećim softverom u upotrebi.

- Ugovor za izradu Studije utvrđivanja lokacija na mreži magistralnih cesta u F BiH na kojima se događaju učestale prometne nezgode (crne tačke) potpisan sa Institutom za građevinarstvo IG Banja luka, broj 01-02.3-653/21. vrijednosti 46.332 KM. Potpisniku ugovora nisu bili dostupni podaci vezani za predmet ugovora, te je isti sporazumno raskinut uz priznavanje gubitaka vrijednosti 5.850 KM.

- Na osnovu Rješenja Vlade F BiH V broj: 538/2022 od 07.04.2022. godine i V broj 1356/22. od 15.09.2022. godine („Službene novine F BiH“ broj:30/22.) imenovano je Koordinaciono tijelo za TEN-T mrežu u F BiH. Tačkom V Rješenja o imenovanju Koordinacionog tijela za TEN-T mrežu utvrđeno je da će finansijska sredstva osigurati JP Ceste F BiH.

U skladu sa navedenim, poslovi i zadaci Koordinacionog tijela su:

- Definisanje tehnički i finansijski izvodljivog scenarija za razvoj mreže prema identifikovanim prioritetima, odnosno na proširenje koridora na sveobuhvatnoj i osnovnoj mreži trans-evropske transportne mreže (TEN-T Core NetWork) uzimajući u obzir širok opseg postojećih studija o razvoju transportne infrastrukture u F BiH i BiH,
- Saradnja sa Ministarstvom transporta i komunikacija BiH u cilju predstavljanja stavova F BiH i praćenje provedbenih aktivnosti,
- Predlaganje akcija i praćenje aktivnosti u cilju usklađivanja planiranog proširenja TEN-T mreže sa drugim državama u regionu,
- Predlaganje akcija i praćenje aktivnosti u cilju usklađivanja planiranog proširenja TEN-T mreže sa Republikom srpskom i Distriktom Brčko,
- Praćenje rada Transportne Zajednice i predlaganje mjera i aktivnosti u cilju ostvarenja benefita iz članstva u Transportnoj Zajednici,

JP CESTE FEDERACIJE BIH

- Praćenje i sinhronizacija aktivnosti apliciranja za WBIF grantove u cilju poboljšanja prikupljanja grantova.

U izvještajnoj godini JP Ceste F BiH su za Koordinaciono tijelo isplatile 25.253 KM.

5. Rezervirana sredstva za sudske presude

N A Z I V	Realizovano 2021.	Plan 2022.	Rebalans Plana 2022.	Realizovano 2022.
Rezervirana sredstva za sudske presude	4.254.590	800.000	800.000	4.399.363
U K U P N O	4.254.590	800.000	800.000	4.399.363

U izvještajnom periodu realizovan je iznos od 4,40 mil.KM, dok su Rebalansom planirana sredstva 0,80 mil.KM. Zbog prometnih nezgoda na magistralnim cestama, većina sredstava se odnosi na rezerviranja za sudske sporove, vezane za naknadu štete. Od ukupnog iznosa 4,40 mil.KM rezervirana su sredstva za sudske sporove u iznosu od 4,08 mil.KM, s tim da su ukinuta i uprihodovana sredstva od ranijih rezerviranja u iznosu od 3,74 mil.KM (naknadno utvrđeni prihodi), što razliku ovih rezerviranja od 0,34 mil.KM čini rezervirana sredstva za sudske sporove 2022. godina. (4.084.274KM - 3.742.411KM = 341.863KM). Na ovaj način iskazivanja rezerviranja, je urađeno na osnovu mišljenja i preporuka vanjske revizije. Ovim troškovima obuhvaćeni su i upravni i sudski troškovi po sudskim presudama (109.983KM), nerezervirani troškovi po sudskim sporovima (49.356 KM) i zatezne kamate po sudskim presudama (155.750 KM).

6. Troškovi konsultantskih usluga

Red br.	N A Z I V	Plan 2022.	Rebalans Plana 2022.	Konsultant	Ugovoreno	Realizovano 2022.	Index 7/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Obrada podataka i izrada Publikacije o prometu	30.000	30.000	Ugovor o djelu, 01-05-2018/22 MD 01-05-2856/22-MD 01-02.3-10520/22	19.728 5.273 19.728	28.558	95
2.	Troškovi konsultantskih usluga za potrebe neovisne kontrole kvalitete radova	30.000	30.000	-	-	-	-
3.	Troškovi održavanja sustava gospodarenja cestama – SUGOC	110.000	110.000	GP TEB Informatika d.o.o. Zagreb i TEB Informatika d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-11390/22. 01.12.2022.	105.791	105.791	96
4.	ISO 9001,ISO 14001 i ISO 45001 (grant sredstva EBRD-a)	137.000	137.000	TIM Know How d.o.o.Sarajevo 01-05.2-1248/22. 15.02.2022.	136.908	87.597	94
5.	Konsultantske usluge vezane za nabavku radova i usluga po međ. procedurama - Konsultantske usluge vezane za zaštitu okoliša projekata iz Programa Modernizacija cesta u F BiH	20.000	20.000	Individualni konsultant, 01-05.2-6772-7/21 20.08.2021.	20.358	5.540	28
6.	Tehnička i finansijska revizija(samo za projekte finansirane iz WB i EIB) – (vezana za Program Modernizacija cesta u F BiH – kreditna sredstva)	490.000	440.000	EGIS International, BA/FBH/RMP/QCBS/4 9-1.1/CS/20,01-05.2- 8635/21.24.08.2021.	483.579 (preneseno 435.221)	198.058	45
7.	Izrada Akcionih planova preseljenja za potrebe međunarodnih institucija	20.000	20.000	-	-	-	-

JP CESTE FEDERACIJE BIH

8.	Snimanje i uplanjenje mreže magistralnih cesta u F BiH	800.000	100.000	-	-	-	-
9.	Ažuriranje, obrada i izrada podataka georeferenciranog panoramskog video zapisa magistralnih cesta u F BiH	800.000	800.000	ZP TEB Informatika d.o.o. Zagreb i TEB d.o.o. Sarajevo 01-02.3-8252/21. 09.08.2021. GP TEB Informatika d.o.o. Zagreb i TEB Informatika d.o.o. Sarajevo, 01-02.3-8947/22, 12.10.2022.	699.995 (preneseno 354.210) 799.340	673.990	84
10.	Izrada elaborata: Analiza implementacije predloženih mjera i očekivanih efekata za racionalnu potrošnju električne energije za JP Ceste F BiH prema studijskom istraživanju iz 2016. Godine	7.000	7.000	-	-	-	-
11.	Izrada elaborata potrošnje električne energije u poslovnoj zgradi JP Ceste F BiH	7.000	7.000	Advanced Technology and Systems d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-4623/22, 23.06.2022.	6.786	6.786	100
12.	Izrada Studije utvrđivanja lokacija na mreži magistralnih cesta u F BiH na kojima se događaju učestale prometne nezgode (crne tačke)	50.000	50.000	-	-	-	-
13.	Nadogradnja ArhCoordinator sistema za upravljanje priključcima i projektima i integracija sa protokolom putem DMS-a	40.000	-	Zeljko d.o.o. Jablanica 01-02.3-12271/21 15.12.2021.	39.996	4.999	-
14.	Izrada elaborata za uvezivanje sistema upravljanja objektima (tuneli) na magistralnim cestama-	30.000	30.000	-	-	-	-
15.	Nabavka novog računovodstvenog programa sa pratećim modulima	100.000	-	-	-	-	-
16.	Izrada elaborata procijene imovine	100.000	105.000	Ekonomski institut d.o.o. Banja luka, 01-03.1-69/22. 05.01.2022.	99.450	99.450	95
17.	Nabavka aplikacije za finansijsko upravljanje i kontrolu (FUK)	5.000	5.000	-	-	-	-
18.	Tehnička pomoć za procjenu osjetljivosti cestovne mreže na klimatske promjene (kreditna sredstva – WB 100%)	-	467.000	JV Finnish OC Roadroid Design&QC d.o.o. Sarajevo, BA/FBH/RMP/QCBS/4 0/SC/19.02.03.2021.	933.882 (preneseno 466.941)	466.941	100
19.	Savjetodavne usluge vezane za sigurnost prometa (kreditna sredstva – WB 100%)	-	687.000	Safage Sas Francuska BA/FBH/RMP/QCBS/3 9/CS/20. 28.09.2021.	762.969 (preneseno 686.672)	686.672	100
20.	Izrada elaborata zaštite štićenog prostora, procjene ugroženosti i projekta sistema tehničke zaštite poslovne zgrade JP Ceste F BiH	-	-	DSC d.o.o. Sarajevo, 01-03.2-5131/22 12.07.2022.	6.435	6.435	-
UKUPNO		2.776.000	3.045.000			2.370.817	78

Rb.1 - Ugovorom o djelu br. 01-05-2018/22-MD, od 17.03.2022. zaključena je recenzija Publikacija brojanja saobraćaja na magistralnim cestama F BiH za 2018. i 2019. godinu koje su urađene od strane NTSI – INSTITUT d.o.o. Sarajevo – Izvršena je kontrola podataka iskazanih po putnim pravcima i brojačima, kontrola faktora ekvivalencije (Fe), kontrola faktora korekcije (Fs), kontrola procenta zastupljenosti vozila po strukturi, predloženi su zaključci koji se odnose na upotrebljivost ili neupotrebljivost podataka o PGDS-u, PLDS-u, procentualnom učešću TTV i o izboru lokacija pojedinih pokretnih brojača koji su navedeni u predmetnim Publikacijama, te su date i preporuke kod budućih obrada.

Ugovorom o djelu br. 01-05-2856/22-MD, od 18.04.2022. urađena je revizija Studije lokacije brojačkih mjesta na mreži magistralnih cesta F BiH – Interno je izrađena Studija lokacija brojačkih mjesta na magistralnoj mreži cesta u Federaciji BiH. Prilikom revizije analizirano je postojeće stanja brojača i brojačkih lokacija, analizirane su predložene nove brojačke lokacije, liste prioriternih brojačkih lokacija za popunu novim brojačima, te su date i revidentske preporuke za Studiju.

Na osnovu Ugovora o djelu br. 01-02.3-10520/22. od 16.11.2022. urađena je obrada podataka i izrada publikacije o prometu na magistralnim cestama F BiH u 2021. godini – Izvršene su usluge obrade podataka i izrada publikacije o prometu na magistralnim cestama Federacije BiH u 2021. godini u skladu sa datim projektnim zadatkom: 1. Organizacija brojanja saobraćaja u FBiH u 2021.godini., 2. Uopćena analiza rezultata brojanja saobraćaja u 2021.godini, 3. Opći podaci o brojačkim mjestima sa PGDS-om i PLDS-om, 4. Brojanje vozila po danima u mjesecu PGDS i PLDS sa strukturom saobraćaja, 5. Odabrani podaci kontinuiranog automatskog saobraćaja, 6. Broj vozila po godinama na magistralnim cestama FBiH-tabelarno i grafički, 7. Ukupno godišnje ekvivalentno opterećenje 82 kN. Izrađeni su i preteći prilozi, kao i karte lokaliteta brojačkih mjesta i karta intenziteta saobraćaja na magistralnim cestama FBiH u 2021. godini.

- Rb.3 - Održavanje, stručna podrška i unapređenje rada u programskim rješenjima SUGOC (e-mailom, telefonom ili udaljenim pristupom) sistema neophodni su za održavanje i upravljanje magistralnim cestama u Federaciji BiH.
- Rb.4 - Cilj konsultantskih usluga je uspostaviti i implementirati integrirani sistem upravljanja kvalitetom (ISO 9001:2015), zaštitom okoliša (ISO 14001:2015) i zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu (ISO 45001:2018), te uspješno pripremiti i izvršiti certifikaciju preduzeća. Finansiranje konsultantskih usluga osiguran je iz granta Centralne evropske inicijative koji administrira Evropska banka za obnovu i razvoj u iznosu EUR 69.600. Konsultant je završio sve aktivnosti definirane obimom zadatka. Kao potvrda, da je integrirani menadžment sistem implementiran u potpunosti, te da su dostignuti svi ciljevi projekta uspješno je provedena certifikacija od certifikacijske kuća TUVADRIA, članice grupe TÜV Thüringen iz Njemačke, za sljedeće područje primjene IMS: Upravljanje, građenje, rekonstrukcija, održavanje i zaštita magistralnih cesta.
- Rb.5 - U cilju praćenja implementacije mjera zaštite okoliša u skladu sa ugovornim odredbama i politikama međunarodnih kreditora (Svjetska banka-Međunarodna banka za obnovu i razvoj, Evropska investicijska banka, Evropska banka za obnovu) od strane izvođača radova i konsultanta za nadzor radova kratkoročno je angažiran individualni konsultant za okoliš;
- Rb.6 - JP Ceste FBiH je obavezno kreditorima, u skladu sa kreditnim sporazumima, dostaviti reviziju finansijskih izvještaja od neovisnog revizora za svaku fiskalnu godinu. Ministarstvo finansija i trezora BiH vrši nabavku i implementaciju Ugovora za reviziju finansijskih izvještaja svih projekata finansiranih samostalno ili kofinansiranih iz kredita Svjetske banke, pa tako i projekta “Modernizacija cesta u FBiH”. Osnovni cilj tehničke revizije je naknadni pregled i verifikacija da su radovi na cestama i objektima i unapređenju sigurnosti prometa izvedeni u skladu sa ugovornim dokumentima, tehničkim specifikacijama i zahtjevanim standardima. Ugovor za usluge tehničke revizije potpisan je sa EGIS Int. i EGIS Structures and Environment, Francuska 01.09.2021 na EUR 247.250 bez PDV. Tri tipa misija je obuhvaćeno neovisnom tehničkom revizijom i to: revizija općeg upravljanja, izvođenja i nadzora radova koja je izvršena u dvije terenske misije; reviziju kvaliteta radova i reviziju sigurnosti prometa. Konsultant je obavljenim aktivnostima dostavio dva detaljna izvještaja (oktobar 2022) i osnovne preporuke.
- Rb.9 - Postojeći podaci u bazi infrastrukturnih podataka (BIP) su prikupljeni i obrađeni u 2010. godini. Kategorisanjem novih cesta u posljednjih 5 godina, te implementacijom projekta iz Programa „Modernizacija cesta F BiH“ (rekonstrukcije, izmjena trase, izgradnja obilaznica, ...) došlo je do izmjene prostornih podataka, te su postojeći postali neupotrebljivi i zastarjeli. Za funkcionisanje sistema održavanja cesta (ROC) koje se bazira na ažurnoj bazi podataka neophodno je uraditi georeferencirani video zapis svih dionica magistralnih cesta, te na

osnovu njega izvršiti prikupljanje i obradu podataka i na kraju ažurirati podatke u bazu. Realizacija projekta je u toku.

Rb.11 - Da bi se sagledala racionalna potrošnja električne energije u poslovnoj zgradi JP Ceste F BiH ugovorena i realizovana je izrada Elaborata potrošnje električne energije.

Rb.13 - Dio ugovora tereti rashode, a dio Investicije tačka 1. Redni broj 2.

Rb.15 - U Investicijama tačka 1. Redni broj 2.

Rb.16 - U skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji u F BiH („Službene novine F BiH“ 15/21.), urađen je elaborat procjene vrijednosti ukupne dugotrajne imovine JP Ceste F BiH, sa stanjem na dan 31.12.2021. Konsultant je dostavio fakturu u izvještajnoj godini.

Rb.18 - Tehnička pomoć za procjenu osjetljivosti cestovne mreže na klimatske promjene realizovana je kroz tri osnovna zadatka:

a. procjenu klimatskog rizika na kompletnoj mreži magistralnih cesta u Federaciji BiH, na način da su ocijenjeni postavljeni indikatori za svaki tip klimatske opasnosti uključujući poplave, klizišta, odrone, požare i sniježne padavine. Procjena klimatskog rizika vršena je na osnovu dostupnih podataka o opasnostima, podataka iz izvršenog snimanja cesta i analizom podataka o klimatskim promjenama. Na osnovu navedenog izdvojene su dionice koje su ocijenjene kao vrlo kritične i kritične, te su za njih vršena detaljna terenska istraživanja.

b. analiza kritičnosti svake dionice, podrazumijevala je analizu intenziteta prometa na svakoj dionici, postojanje alternativnih ruta, demografskih i socio – ekonomskih podataka, te podataka o regionalnom ekonomskom razvoju i potencijalu svakog područja. Utvrđene su dionice cesta sa strateškom važnošću, kao i postojeće usluge koje su od ključnog značaja. Rezultat ove analize je ukupni indeks kritičnosti za svaku dionicu magistralne ceste.

c. multikriterijalna analiza za svaku dionicu ceste kombiniranjem rezultata procjene klimatskog rizika i kritičnosti. Rezultat ove analize je popis prioritetnih dionica cesta za koje je urađen detaljni plan intervencija kako bi se prevenirale katastrofe uzrokovane različitim klimatskim opasnostima. Dati su planovi ulaganja sa karakterističnim radovima i njihovi jedinični troškovi za svaku prioritetnu dionicu s tačnošću na novu idejnog rješenja. Konsultant je predložio listu od 21 dionice koje zahtijevaju hitnu pažnju i procijenjena vrijednost investicije je oko EUR 44 miliona.

Pripremljene su GIS karte rezultata procjene klimatskog rizika, kritičnosti, multikriterijalne analize i predloženih planova intervencija za prioritetne dionice, a svi rezultati spremni za integraciju u postojeći RAMS sistem.

Rb 19.- Savjetodavne usluge vezane za sigurnost prometa realizovane su kroz dva osnovna zadatka i to:

- Inspekcija sigurnosti prometa (RSI) za cca.230 km magistralnih cesta sa ciljem utvrđivanja nedostataka u oblasti sigurnosti prometa na odabranim dionicama magistralnih cesta, procjena njihovih rizika po učesnike u saobraćaju i predlaganje konkretnih, nisko budžetskih i veoma učinkovitih mjera za sigurnost prometa na cestama.

- trening za certifikaciju RSI i za reviziju sigurnosti prometa (RSA) za osoblje JP Ceste FBIH. Zajednički krajnji cilj je implementacija preporuka inspekcije sigurnosti prometa i upošljavanje obučanih inspektora/revizora u cilju poboljšanja sigurnosti cestovne infrastrukture u budućnosti.

Konsultant je završio sve usluge 14.09.2022. i dostavio konačni izvještaj. Kao sažetak ukupna dužina procijenjenih dionica je 446.3 km, dok su procijenjeni troškovi za poboljšanje sigurnosti prometa oko EUR 22 miliona. Najveći dio ove procjene je posvećen poboljšanju sistema ograničenja na cestama i stanja kolovoza, kao i osiguravanju sigurnih uvjeta za ranjive učesnike u prometu.

JP CESTE FEDERACIJE BIH

Rb 20.- U skladu sa Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu F BiH realizovan je Elaborat zaštite šticeenog prostora, procjene ugroženosti i projekta sistema tehničke zaštite poslovne zgrade JP Ceste F BiH.

Rb.2,7,8, 10,12,14,17- Nije bilo realizacije u izvještajnoj godini.

7.Kamate

Red. Broj	N A Z I V	Plan 2022.	Rebalans Plana 2022	Realizovano 2022.	Napomena
1.	Kamate, servisni troškovi i kursne razlike za kredit EBRD-a, EIB-a i WB za program „Rehabilitacija cesta u F BiH“	450.000	450.000	350.748 7.879 87.164 244.087	Kamata -EIB Kamata -EBRD Taksa -WB Negativna kursna razlika SDR-ova
2.	Provizija i takse na nepovučena sredstva kredita EBRD –a i IBRD-a za Program „Modernizacija cesta u F BiH“ (vlastita sredstva)	636.000	836.000	409.857 45.403 24.812 450.537	Kamata -EIB Provizija- IBRD Jednokratna provizija -WB Provizija na nepovučena sredstva-EBRD
U K U P N O		1.086.000	1.286.000	1.620.487	

Rb.1.- Okončani Program „Rehabilitacija cesta u F BiH“ 2013. godine, finansiran je kreditnim sredstvima od sljedećih međunarodnih finansijskih institucija:

- Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) – po ugovoru br. 37543 u iznosu 45 mil. EUR. Kamatna stopa je bila varijabilna (6 mjesečni EURIBOR +1% marža), a plaćala se polugodišnje. Otplata kredita je bila u 24 jednake polugodišnje rate, počev od 5.12.2010. godine, a završila se 05.06.2022.godine.
- Evropska investicijska banka (EIB), operativni broj kredita 23924 u iznosu 50 mil. EUR. Kamatna stopa je varijabilna (6 mjesečni EURIBOR + fiksni raspon). Povlačenje kredita je bilo po tranšama (sedam tranši). Period otplate kredita je do 18 godina, uključujući 6 godina period odgode otplate, a otplata se vrši u jednakim polugodišnjim ratama. Prvi datum otplate svake tranše je ne kasnije od 6 godina od datuma povlačenja tranše, a krajnji rok otplate posljednje rate je ne ranije od 4 godine i ne kasnije od 18 godina od datuma povlačenja. Otplata za sve tranše je u toku.
- kredit Svjetske banke (WB) – IDA 43710, u iznosu 8,20 mil.SDR. Kamata na kredit je 0,75% na povučeni iznos kredita, a naknada za održavanje kredita iznosi 0,5% godišnje na nepovučeni iznos kredita. Obzirom da je originalna valuta kredita SDR, zavisno od kretanja valuta koje čine SDR pojavljuju se pozitivne ili negativne kursne razlike. Otplata kredita je u jednakim polugodišnjim ratama, u periodu od 20 godina, uključujući period odgode od 10 godina. Period otplate kredita počeo je 15.12.2017. do 15.06.2027 godine. Kreditna sredstva su povučena do 30.06.2012. godine.

Rb.2 - Program "Modernizacija cesta u FBIH" je u toku, a finansira se kreditnim sredstvima međunarodnih razvojnih banaka i to:

- Evropska investicijska banka (EIB) 50,00 mil.EUR
- Svjetska banka-Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD) 58,00 mil.EUR, i
- Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) 65,00 mil.EUR,

- Finansijskim ugovorom između BIH i EIB zaključenim 23.02.2016 definirano je da

se povlačenje kredita vrši u tranšama, a za svako povlačenje EIB, u skladu sa odredbama finansijskog ugovora, dostavlja amortizacioni plan sa otplatama i kamatama sa prvim i krajnjim datumom otplate. Rok otplate kredita je 20 godina, a odgoda otplate do 5 godina uključena je u period otplate. Kredit je postao efektivan u 2017 godini. Do sada je povučeno pet (5) tranši kredita u ukupnoj vrijednosti EUR 42,7 mil. Otplata I tranše je otpočela 05.04.2022.


- U skladu sa Ugovorom o kreditu između BiH i IBRD zaključenim 9.11.2016. godine period otplate kredita je 22 godine, a odgoda otplate od deset godina je uključena u period otplate. Kamatna stopa je 6 mjesečni EURIBOR + varijabilna marža koju utvrđuje banka u momentu isplate. Troškovi održavanja kredita (provizija na nepovučena sredstva kredita) obračunavaju se po stopi 0,25% godišnje, a plaćaju se po proglašenju efektivnosti kredita. Jednokratna provizija iznosi 0,25% na ukupni iznos kredita i plaća se iz kredita nakon efektivnosti. Kredit je postao efektivan 04.10.2017 godine.
- U skladu sa Ugovorom o kreditu između BiH i EBRD zaključenim 13.07.2016. godine kredit se sastoji od dvije tranše: transa I 32,00 mil.EUR i tranša II 33,00 mil.EUR. Period otplate kredita je 15 godina, a odgoda otplate od tri godine je uključena u period otplate. Otplata se vrši u polugodišnjim anuitetima, a ista je započela 2019 godine i završava se 2031 godine. Troškovi održavanja kredita obračunavaju se po stopi 0,5% godišnje, a plaćaju se po proglašenju efektivnosti kredita. Jednokratna provizija iznosi 1% na ukupni iznos kredita i plaća se iz kredita nakon efektivnosti. Kamatna stopa je EURIBOR + 1% marža.

U nastavku su tabelarno prikazane pristigle i izmirene otplate kredita za Programe „Rehabilitacija cesta u F BiH“ i „Modernizacija cesta u F BiH“.

Red.Br.	Naziv banke i broj kredita	Period	Otplata kredita
<i>Program „Rehabilitacija cesta u F BiH“</i>			
1.	EIB- 23924 –I tranša	13.09.2021.-14.03.2022.	264.640
2.	EIB- 23924 –I tranša	14.03.2022.-12.09.2022.	264.640
3.	EIB- 23924 –II tranša	05.08.2021. - 05.02.2022.	391.166
4.	EIB- 23924 –II tranša	05.02.2022.- 05.08.2022.	391.166
5.	EIB- 23924 –III tranša	28.08.2021.- 28.02.2022.	469.399
6.	EIB- 23924 –III tranša	28.02.2022.- 29.08.2022.	469.399
7.	EIB- 23924 –IV tranša	20.12.2021.- 20.06.2022.	352.049
8.	EIB- 23924 –IV tranša	20.06.2022.- 19.12.2022.	352.049
9.	EIB- 23924 – V tranša	09.09.2021.- 09.03.2022.	625.866
10.	EIB- 23924 – V tranša	09.03.2022.- 09.09.2022.	625.866
11.	EIB- 23924 – VI tranša	24.08.2021.- 24.02.2022.	1.173.498
12.	EIB- 23924 – VI tranša	24.02.2022.- 24.08.2022.	1.173.498
13.	EIB- 23924 – VII tranša	03.08.2021.- 03.02.2022.	430.283
14.	EIB- 23924 – VII tranša	03.02.2022.- 03.08.2022.	430.283
15.	WB – IDA 43710	15.12.2021.- 15.06.2022.	1.011.179

JP CESTE FEDERACIJE BIH

16.	WB – IDA 43710	15.06.2022.- 15.12.2022.	1.048.868
17.	EBRD – 37543	06.12.2021.- 06.06.2022.	4.018.004
A	UKUPNO		13.491.853
<i>Program „Modernizacija cesta u F BiH“</i>			
1.	EBRD - 47461	16.08.2021.-15.02.2022.	2.028.382
2.	EBRD - 47461	15.02.2022.-15.08.2022.	2.428.130
3.	EIB 82137 – I tranša	15.04.2022.-17.10.2022.	651.943
B	UKUPNO		5.108.455
	SVEUKUPNO A+B		18.600.308

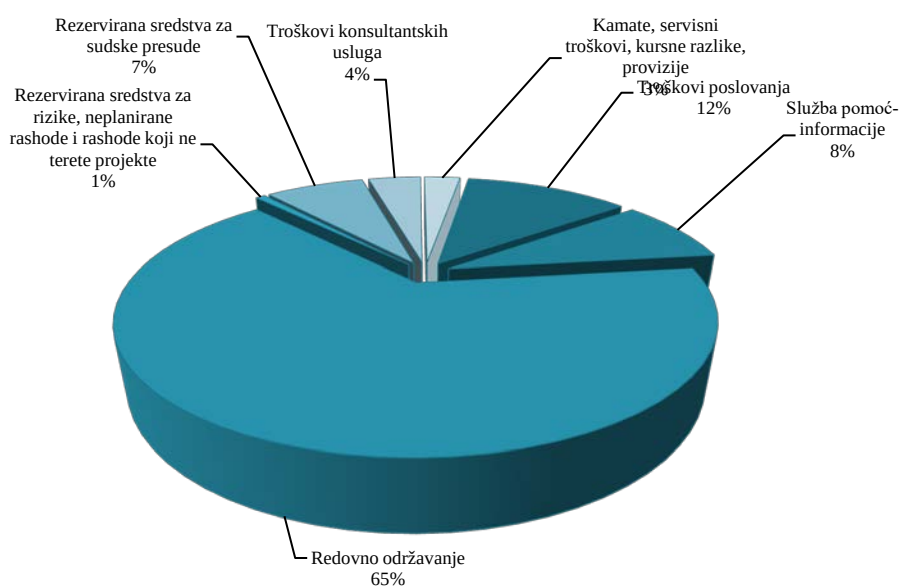

Grafički prikaz strukture realizovanih rashoda

B. II TROŠKOVI AMORTIZACIJE


Naziv	Realizovano 2021.	Plan 2022.	Rebalans Plana 2022.	Realizovano 2022.	Index 5/4	Index 5/2
1	2	3	4	5	6	7
Amortizacija stalnih sredstava	529.778	700.000	1.000.000	2.459.441	246	464
UKUPNO	529.778	700.000	1.000.000	2.459.441	246	464

Vrijednost nematerijalne i materijalne imovine neophodne za obavljanje osnovne djelatnosti sistematski se otpisuje tokom procijenjenog vijeka trajanja i sučeljava sa pripadajućim dijelom odloženih prihoda (izvora) do momenta otpisa, u skladu sa MRS 20. Amortizacija se obračunava linearnom metodom otpisa, tokom procijenjenog korisnog vijeka trajanja stalnih sredstava. Amortizacija se odnosi na nematerijalna stalna sredstva (1.396.100KM), zgradu, opremu i transportna sredstva (1.063.341 KM), te je u prihodovnoj i u rashodovnoj strani realizovan iznos amortizacije 2,46 mil.KM. Do povećanja je došlo zbog aktiviranja stalnih i nematerijalnih sredstava.

C. INVESTICIJE

Red Br.	O P I S	Realizovano 2021.	Plan 2022.	Rebalans Plana 2022.	Realizovano 2022.	Index 6/5	Index 6/3
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Nabavka stalnih sredstava	627.315	1.892.500	1.910.000	735.148	39	117
2.	Program "Modernizacija cesta u F BiH"	58.029.889	76.907.500	60.036.800	43.045.829	56	74
	2.1. Program "Modernizacija cesta u F BiH" - vlastita sredstva	1.462.743	1.605.400	1.630.000	1.245.649	78	85
	2.2. Program "Modernizacija cesta u F BiH" - kreditna sredstva	56.567.146	75.302.100	58.406.800	41.800.180	56	74
3.	Projekti JP Ceste F BiH	13.228.365	55.228.900	64.634.150	17.560.974	32	133
	3.1. Projekti iz prethodnog perioda	12.223.409	29.032.500	30.643.250	14.110.469	49	115
	3.1.1. Projekti rekonstrukcije i izgradnje	2.713.405	5.136.000	4.963.600	2.640.955	51	97
	3.1.2. Rasvjeta i semaforizacija raskrsnica i tunela	273.367	706.700	826.400	88.701	13	32
	3.1.3. Poboljšanje sigurnosti prometa	4.603.584	9.347.500	10.287.500	1.338.445	14	29
	3.1.4. Vanredno održavanje	4.633.053	13.842.300	14.565.750	10.042.368	73	217
	3.1.4.1. Sanacija cestovnih objekata	1.511.251	5.391.800	6.390.150	2.708.785	50	179
	3.1.4.2. Sanacija klizišta, odrona, sanacija slijezanja trupa puta, kosina i zasjeka	59.524	1.098.500	1.195.500	717.651	65	1206
	3.1.4.3. Sanacija oštećenih asfaltnih kolovoza	3.062.278	7.352.000	6.980.100	6.615.932	90	216
	3.2. Planirani projekti u 2022. godini	1.004.956	26.196.400	33.990.900	3.450.505	13	343
	3.2.1. Projekti rekonstrukcije i izgradnje	328.316	3.288.000	3.550.000	794.233	24	242
	3.2.2. Rasvjeta i semaforizacija raskrsnica	0	885.500	1.029.500	-	-	-
	3.2.3. Poboljšanje sigurnosti prometa	103.243	7.825.900	8.286.400	6.962	-	7
	3.2.4. Vanredno održavanje	573.397	14.197.000	21.125.000	2.649.310	19	462
	3.2.4.1. Sanacija cestovnih objekata	20.825	5.680.000	7.644.000	0	-	-
	3.2.4.2. Sanacija oštećenih asfaltnih kolovoza	502.479	6.827.000	10.839.000	2.496.082	37	497
	3.2.4.3. Sanacija klizišta, odrona, sanacija slijezanja trupa puta, kosina i zasjeka	50.093	1.690.000	2.642.000	153.228	9	306
4.	Eksproprijacija i elaborati eksproprijacije	4.179.567	7.300.000	5.800.000	5.301.992	73	127
5.	Projekti iz Budžeta F BiH i sufinansiranja iz drugih nivoa vlasti	6.400.363	52.100.000	49.100.000	9.283.291	18	145
U K U P N O		82.465.499	193.428.900	181.480.950	75.927.234	39	92

Investicije su realizovane u iznosu od 75,93 mil.KM, što je 39% od planiranih 181,48 mil.KM. Najveću realizaciju su imali projekti Programa „Modernizacija cesta u F BiH“ od 41,80 mil.KM, što je 56% od planiranih 58,41 mil.KM. Projekti finansirani samo sredstvima JP Cesta F BiH zajedno sa eksproprijacijom i nabavkom stalnih sredstava, realizovani su u iznosu od 24,84 mil.KM ili 33,58 % od planiranih 73,97 mil.KM. Projekti finansirani iz Budžeta F BiH za 2022 godinu realizovani su u iznosu od 7,73 mil.KM, dok su projekti finansirani zajedničkim sredstvima sa drugim nivoima vlasti realizovani sa 1,50 mil.KM.

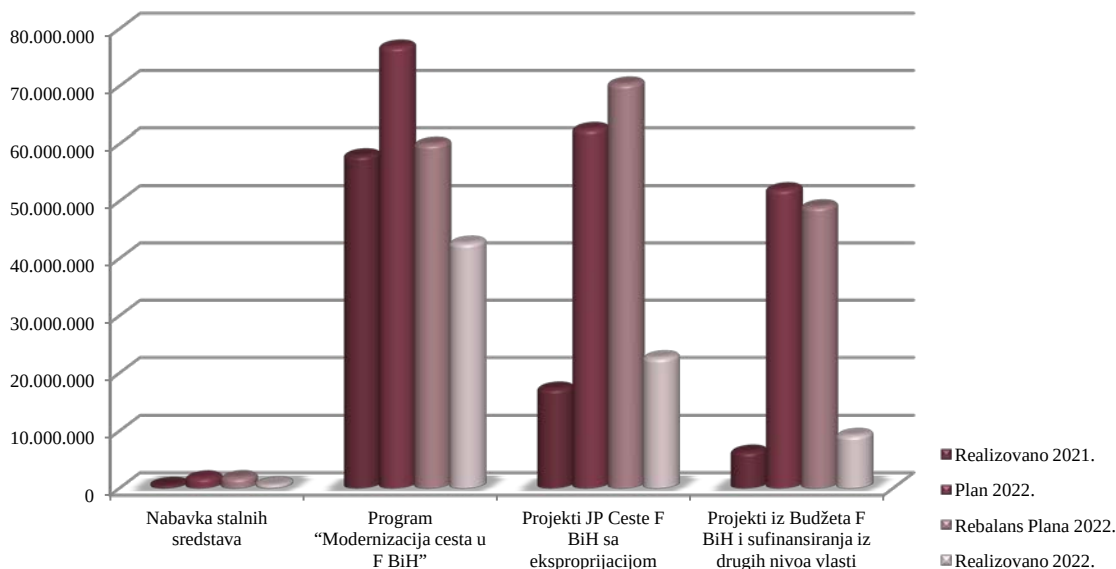

Grafički prikaz visine planiranih ulaganja

1. Nabavka stalnih sredstava

Red. Br.	O P I S	Plan 2022.	Rebalans Plana 2022.	Realizovano 2022.	Index 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	Automobili	200.000	200.000	87.983	44
2.	Oprema za poboljšanje funkcionisanja informatičkih sistema u JP Ceste F BiH	432.500	590.000	325.352	
3.	Ulaganja u poslovnu zgradu	100.000	100.000	2.485	2
4.	Nabavka brojača prometa sa uvezivanjem u postojeći QLTCNet application sistem	600.000	600.000	299.999	50
5.	Nabavka cestovnih meteo stanica sa uvezivanjem u RWIS sistem JP Ceste FBiH	140.000	190.000	-	-
6.	Nadogradnja sistema RAMS -upravljanje mostovima	250.000	-	-	-
7.	Nabavka komplet prenosne osovinske vage „za srednje točkove“	140.000	140.000	-	-
8.	Druge nabavke neophodne za izvršenje planiranih aktivnosti	30.000	30.000	19.329	
9.	Nadogradnja aplikacije pipGIS JP Ceste F BiH za upravljanje investicijama i projektima	-	60.000	-	-
UKUPNO		1.892.500	1.910.000	735.148	

Rb.1. - Od planiranih 200.000KM za automobile, realizovana je nabavka automobila u vrijednosti 87.983KM. M.R.M. export-import d.o.o. Ljubuški je dobavljač, na osnovu ugovora broj:01-03.2-8399/22. od 22.09.2022.

Rb.2. - Realizovana je nadogradnja ArhCoordinatora sistema za upravljanje priključcima i projektima i integracija sa protokolom putem DMS na osnovu potpisanog ugovora sa Zeljkom d.o.o. Jablanica, broj: 01-02.3-12271/21. od 15.12.2021. Vrijednost ugovora je 39.996 KM, s tim da dio ugovora tereti rashode, a dio koji tereti investicije realizovan je u iznosu od 29.997 KM.

Ugovor sa Konzorcijem: King ICT d.o.o.Sarajevo i King ICT d.o.o.Zagreb broj: 01-02.3-11482/21. potpisan u novembru 2021. godine, za nadogradnju serverske, mrežne i storage

infrastrukture u iznosu od 275.447 KM je realizovan tokom godine. Konika minolta poslovna rješenja d.o.o.Sarajevo dobavljač je mrežnog color printera A4/A3 po ugovoru broj:01-02.3-4753/22, Digitarija d.o.o.Sarajevo - računarske opreme, Fabing d.o.o.Sarajevo je uradio nadogradnju programa Towwer 6, a BHS Informatika d.o.o.Sarajevo je dobavljač Adobe Acrobat Standarda 2020 - sve ukupne vrijednosti 16.038 KM.

Rb.3. – Tokom obavljanja poslovnih aktivnosti zaposlenih, iskazana je potreba za prilagođavanjem prostora u poslovnoj zgradi. Realizovan je dio planiranih sredstava, jer se nastavak aktivnosti očekuje u narednom periodu.

Rb.4.- Alem sistemi d.o.o. Sarajevo i Bogal Inženjering d.o.o. Novi Sad na osnovu ugovora broj:01-02.2-4757/22, 29.06.2022. su isporučili 25 automatskih brojača prometa vrijednosti 299.999 KM. Na osnovu ugovora dobavljač je ugradio automatske brojače na 25 lokacija uz sljedeće magistralne ceste na području FBiH: Ripač - Užljebić, Bihać - Srbijani, Svilaj - Vukosavlje, Modriča1 - Gradačac0, Bosanski Petrovac - Pasjak4, Odžak - Bos.Šamac, Livno4 - Šuica, Glavica - Priluka, Kupres1 - Šuica, Gornji Vakuf - Prozor, Buna - Masline, Blidinje - Posušje, Posušje 2-Grude1, Vitalj-Olovo, Olovo-Semizovac, Vitalj-Vlasenica, Ustikolina – Goražde 8, Doboj - Donja Orahovica, Radića Mosta - Bužim, Bužim - B.Otoka, Bos.Petrovac4 - Gornje Bravsko, Rogolji - Jajce Jug, Jajce Jug - Donji Vakuf 1, Donji Vakuf 1- Turbe, Kazanci-Priluka

Rb.5. i 9.- nije bilo realizacije u tekućoj godini, planirane su aktivnosti u narednom periodu.

Rb.6.- Rebalansom nije planirano

Rb.7.- U toku je nabavka komplet prenosne osovine vage „za srednje točkove“ namijenjene je za mjerenje prekoosovinskog opterećenja vozila na magistralnim cestama. Dobavljač je Vage BiH d.o.o. Bihać, na osnovu ugovora broj: 01-02.3-12435/22, od 30.12.2022. vrijednosti 138.413 KM.

Rb.8.- Druge nabavke obuhvataju opremu neophodnu za obavljanje radnih aktivnosti.

2.Zajednički projekti sa međunarodnim finansijskim institucijama

Program „Modernizacija cesta u F BiH“

Program „Modernizacija cesta u FBiH“(Program) obuhvata više podprojekata koji se mogu podijeliti u dvije grupe i to:

- **I grupa** projekti izgradnje cestovnih dionica od strateškog značaja za FBiH/ BiH i izgradnje obilaznica oko gradova; i
- **II grupa** projekti rekonstrukcije/sanacije postojećih cesta i kolovozne konstrukcije, korekcija osovine, izgradnje trećih traka za spora vozila, rehabilitacije/ rekonstrukcije mostova i tunela, rehabilitacije/ rekonstrukcije crnih tačaka i opasnih mjesta i dr.

Za podršku Programu osigurani su dugoročni krediti međunarodnih razvojnih banaka, dok je za finansiranje troškova eksproprijacije i PDV potrebno osigurati sredstva iz Budžeta FBiH i/ili vlastita sredstva JP Ceste FBiH.

Financijski plan, zasnovan na odobrenim iznosima kredita, za podršku programu “Modernizacija cesta u FBiH“ prikazan je u niže navedenoj tabeli:

Izvor financiranja	mil.EUR
Kredit Evropske investicijske banke (EIB)	50,00
Kredit Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD)	65,00

Kredit Međunarodne banke za obnovu i razvoj (Svjetska banka)	58,00
TOTAL	173,00

Rješavanje imovinsko-pravnih pitanja ima značajan uticaj na napredak projekta i implementaciju pod projekata vezanih za izvođenje građevinskih radova. Ovo je konstantan problem od samog početka aktivnosti na Programu sa povremenim napretcima u procesu. U isto vrijeme PIMT i JP Ceste FBiH, sa svoje strane, koriste sve raspoložive kapacitete i instrumente kako bi ubrzali proces otkupa zemljišta. Međutim, zaključeni ugovori za radove (ulaz u Stolac-Vidovo polje-veza na M6, Bihać 4 –Ripač) još uvijek imaju probleme zbog nezavršene eksproprijacije i nemogućnosti osiguranja odobrenja za građenje.

Međunarodna banka za obnovu i razvoja (IBRD) je 17.11.2022. odobrila još jedno produženje krajnjeg roka raspolaganja sredstvima kredita do 30.09.2023, imajući u vidu naprijed navedeni razlog, te činjenicu da na projektima Ripač-Dubovsko i Jajce jug –Donji Vakuf izvođenje asfaltnih radova pada u zimski period kada su nepovoljni vremenski uvjeti za izvođenje ove vrste radova. Amandmanom br.1 na Finansijski ugovor između BIH i EIB krajnji rok raspolaganja sredstvima kredita EIB produžen je do 23.02.2023.

Pribavljanje neophodnih odobrenja za građenje takođe ima utjecaj na početak radova.

Pismom o odustajanju 21.10.2021., EBRD je odustao od zahtjeva da je uvjet iz podčlana 5.01 (d) Ugovora o zajmu (usvajanje legislative u FBiH koja osigurava da godišnje alokacije sredstava za JP Ceste FBiH neće biti manje od alokacija određenih u Zakonu o cestama Federacije Bosne i Hercegovine od 15. marta 2010. koje se odnose na akcize na gorivo za puteve i u skladu su sa primjenljivim zakonodavstvom Bosne i Hercegovine) bude prethodni uvjet za povlačenje sredstava u okviru Tranše 2. Druga tranša zajma EBRD uključuje izgradnju novih cesta, izgradnju obilaznica sa dužim rokom izgradnje, te je EBRD je produžio krajnji rok raspolaganja sredstvima zajma do 13.01.2024. godine.

U prvoj polovini 2022. došlo je do značajnog rasta cijena energije, građevinskog materijala, građevinskih proizvoda zbog poremećaja na tržištu što značajno utiče na poslovanje i finansijsku sposobnost Izvođača.

U periodu januar-decembar 2022. potpisano je sedam ugovora za radove, jedan koji se finansira iz kredita EIB i IBRD i šest koji se finansiraju iz EBRD kredita. Izgradnja trake za spora vozila na dionici Banj Brdo-Simin Han koji zajednički finansiraju EIB i IBRD ima značajne probleme sa rješavanjem imovinsko-pravnih pitanja i preostalo vrijeme do krajnjeg datuma raspoloživosti kredita neće biti dovoljno za nabavku i završetak radova. U istom periodu potpisan je jedan ugovor za konsultantske usluge koji se u cjelosti finansira iz IBRD kredita.

Za posmatrani izvještajni period potrebno je istaći sljedeće:

- završetak svih radova na rekonstrukciji tunela Crnaja na M17, dionica Konjic-Jablanica 1 i izgradnja trake za spora vozila na M5, dionica Donji Vakuf-Turbe (Komar);
- završeno je otklanjanje nedostataka za tri mosta (preko rijeke Sane u Ključu, preko rijeke Plive u Jajcu i Komar preko duboke prepreke) identificiranih tokom perioda za otklanjanje nedostataka;
- produžetak roka za završetak radova za dva ugovora - izgradnja trake za spora vozila na M5 dionica Ripač-Dubovsko i rehabilitacija ceste i korekcija osovine dionica Jajce jug-Donji Vakuf 1;
- spor između Izvođača i Naručioca vezano za ugovor Topčić Polje-Lašva, rekonstrukcija tunela Vranduk II i rekonstrukcija mostova preko rijeke Bosne (Bosna IV i V);
- završetak radova na rekonstrukciji ceste M 15 Kamičak-Ključ, dionica 1 Crljeni-Zgon;

JP CESTE FEDERACIJE BIH

- završetak radova na Mostarskoj obilaznici –izgradnja dionica Miljkovići-Rodoč-veza M17, poddionica kružni tok Varda-ulaz u tunel „Novi“ L=1.516 m, uključujući vijadukt „Marjanovića Draga“ L=200m;
- potpisivanje ugovora i početak izvođenje radova na obilaznicama: Bugojno, Livno i Kiseljak;
- potpisivanje ugovora za izvođenje radova na Mostarskoj obilaznici-dionica Miljkovići-Rodoč-veza M 17, tunel Novi i početak radova u oktobru 2022 godine;
- nabavka radova i potpisivanje Ugovora za LOT 1 M 18 Olovo-Semizovac, dionica Čevljanovići-Nišići, izgradnja trake za spora vozila i sanacija kosina i LOT 2 M 6 Grude (veza M6 i M420) izgradnja sjeverne obilaznice.
- na dionici Živinice-Vitalj, koja pripada cesti M18, koja je naročito pogođena klimatskim rizicima (odroni stijena, klizišta, slijeganje ceste) i odabrana za detaljnu inspekciju i projektovanje, neodgovarajuće planiranje i kvaliteta terenskih istraživanja i ispitivanja doveli su do kašnjenja u implementaciji ugovora za izradu inženjerskih projekata za tipična inženjerska rješenja;
- implementacija ugovora za nadzor i vanjsku kontrolu.

2.1. Radovi na modernizaciji magistralnih cesta i objekata i konsultantske usluge nadzora

2.1.1. Preneseni projekti iz ranijih godina

Red. Br.	Mag. Cesta	Dionica	DIONICA	Aktivnosti na projektu	Plan 2022.	Rebalans Plana 2022.	Izvođač/ konsultant	Ugovoreno	Realizovano 2022.	Napomena
1. Izgradnja cesta – Poboljšanje elemenata u postojećem koridoru										
4-2	M17.3	N	Neum-Stolac , izgradnja dionice Stolovi-Drenovac L=8.300 km	Izvođenje	538.000	538.000	JV HP Investing d.o.o. Mostar Putovi d.o.o. Grude i Euro-asfalt d.o.o.Sarajevo, 01-02.3-7426/19. 18.06.2019.	14.989.032 (preneseno 531.372)	470.254	Okončano
				Nadzor	54.000	15.000	JV iC consuelten GesmbH, Nievelt Ingenieur GmbH Wien and AIK Inženjering d.o.o. Banovići, 01-02.3-2574/18. 28.03.2018.	1.251.767 (preneseno)	21.754	
				Kamata					16.398	
				Ukupno					508.406	
3-2		N	Neum – Stolac , izgradnja dionice Hutovo-Cerovica L=4.475 km	Izvođenje	2.178.000	4.974.000	JV:Hering d.d. Široki brijeg i Cestar d.o.o.Split, 01-05.2-7176/20.BP 16.07.2020.	9.673.721 (preneseno 2.822.357)	4.996.553	Okončano
				Nadzor	173.000	150.000	JV iC consuelten GesmbH, Nievelt Ingenieur GmbH Wien and AIK Inženjering d.o.o. Banovići, 01-02.3-2574/18. 28.03.2018.	538.289 (preneseno 291.133)	156.913	
				Kamata					168.140	
				Ukupno					5.321.606	
4-1		N	Neum – Stolac , izgradnja dionice Cerovica-Stolovi L=7.00 km	Izvođenje	3.520.000	4.990.000	JV:Hering d.d. Široki brijeg i Cestar d.o.o.Split, 01-05.2-7176/20.BP 16.07.2020.	8.067.634 (preneseno 4.913.253)	4.726.871	Okončano
				Nadzor	280.000	200.000	JV iC consuelten GesmbH. Nievelt		219.960	

JP CESTE FEDERACIJE BIH

							Ingenieur GmbH Wien and AIK Inženjering d.o.o. Banovići, 01-02.3-2574/18. 28.03.2018.			
				Kamata					165.799	
				Ukupno					5.112.630	
	M6		Ulaz u Stolac (Vidovo Polje, veza na M 6) L=1,3 km	Izvođenje	4.400.000	2.800.000	JV HP Investing d.o.o. Mostar Putovi d.o.o. Grude i Euro-asfalt d.o.o. Sarajevo Anex1na ug.Lot7 Stolovi-Drenovac 01-05.2- 6997/21_BP 28.06.2021.	4.058.362	1.982.000	U toku
				Nadzor	400.000	315.000	JV iC consuelten GesmbH, Nievelt Ingenieur GmbH Wien and AIK Inženjering d.o.o. Banovići, 01-02.3-2574/18. 28.03.2018Addenda 1 01-05.2- 2123/22. 31.05.2022.	259.486	46.425	
				Kamata					23.319	
				Ukupno					2.051.744	
			Neum – Stolac, izgradnja dionice,Broćanac – Papratnica L= 3.025 km	Nadzor	-	63.000	JV iC consuelten GesmbH, Nievelt Ingenieur GmbH Wien and AIK Inženjering d.o.o. Banovići, 01-02.3-2574/18. 28.03.2018	538.289 (preneseno 84.560)	77.991	Radovi okončani 2021.
2. Izgradnja traka za spora vozila										
2.2	M5	006	Bosanski Petrovac - Ključ – prevoj Lanište	Izvođenje	667.000	471.000	Euro-Asfalt d.o.o.Sarajevo, 01-02.3-3180/19. 19.03.2019.	4.468.663 (preneseno 369.207)	-	Radovi završeni, izvođač treba da dostavi gradilišnu dokumentaci ju i okončanu situaciju
				Nadzor	51.000	20.000	JV Divil d.o.o. Sarajevo, IG d.o.o. Banja luka IGH d.o.o.Mostar, 01-02.3-5708/18, 17.07.2018.		-23.475	
				Ukupno					-23.475	
2.3	M5	010	Donji Vakuf – Turbe (Komar)	Izvođenje	2.240.000	2.240.000	Jata Group d.o.o. Srebrenik, 01-02.3-10112/19. 26.08.2019.	3.835.791 (Preneseno 2.239.127)	2.239.127	Okončano
				Nadzor	174.000	30.000	JV Divil d.o.o. Sarajevo, IG d.o.o. Banja luka IGH d.o.o.Mostar, 01-02.3-5708/18, 17.07.2018.	243.061 (preneseno 141.295)	63.896	
				Kamata					65.742	
				Ukupno					2.368.765	
2.6	M14.2	004	Drvar – Resanovci	Izvođenje	461.000	-			-	Okončano u 2021
				Nadzor	28.500	-			-	
2.8	M15	008 i 010	Livno – Šuica – Kupres, Borova Glava+ Trivunove krivine	Izvođenje	918.000	785.000	JV Livnopotovi d.o.o. Livno, Putovi d.o.o.Grude i HP Investing d.o.o.Mostar, 01-05.2- 8328/20BP. 26.08.2020.	4.819.617 (preneseno 784.658)	784.567	Okončano

JP CESTE FEDERACIJE BIH

				Nadzor	60.000	24.000	JV Divil d.o.o. Sarajevo, IG d.o.o. Banja luka IGH d.o.o. Mostar, 01-02.3-5708/18, 17.07.2018.		17.452	
				Kamata					15.567	
				Ukupno					817.586	
3. Rekonstrukcije ceste i kolovozne konstrukcije, korekcija osovine										
3.1	M5	002	Bihać 4-Ripač, sanacija kolovoza i korekcija osovine	Izvođenje	656.000	538.000	JV Kov-grad d.o.o. Bužim BC-Gradnja d.o.o.B os.Otoka 01-02.3-8459/18. 03.10.2018.	1.613.419 (preneseno 508.204)	54.554	Problem imovinsko pravnih odnosa
				Nadzor	18.000	15.000	JV Divil d.o.o. Sarajevo, IG d.o.o. Banja luka IGH d.o.o. Mostar, 01-02.3-5708/18, 17.07.2018.	25.278	-	
				Kamata					-	
				Ukupno					54.554	
3.2	M5	009	Jajce jug-Donji Vakuf , presvlačenje i ispravka osovine	Izvođenje	4.320.000	4.103.000	JVEuro Asfalt d.o.o.Sarajevo i BBM d.o.o. Sarajevo, 01-02.3-9997/19. 21.08.2019.	7.092.070 (preneseno 4.102.758)	3.432.180	0436
				Nadzor	100.000	396.000	JV Divil d.o.o. Sarajevo, IG d.o.o. Banja luka IGH d.o.o.Mostar, 01-02.3-5708/18, 17.07.2018.	308.882 (preneseno)	532.647	
				Kamata					90.396	
				Ukupno					4.055.223	
4. Rekonstrukcije/ rehabilitacije tunela										
4.4	M18	012	Konjic – Jablanica 1, rekonstrukcija tunela Crnaja km 15+082	Izvođenje	6.730.000	6.730.000	JV HP Investing d.o.o. Mostar, i Euro-Asfalt d.o.o.Sarajevo, 01-02.3-7425/19. 18.06.2019.	10.968.916 (preneseno 6.102.305)	6.038.591	Okončano
				Nadzor	451.000	400.000	JV Divil d.o.o. Sarajevo, IG d.o.o. Banja luka IGH d.o.o. Mostar, 01-02.3-5708/18. 17.07.2018.	456.954	317.181	
				Kamata					160.959	
				Ukupno					6.516.731	
	M17	007	Topčić polje – Lašva, sanacija tunela Vranduk II km 7+416	Izvođenje	-	464.100	JV Hering d.o.o. Široki Brijeg i BBM d.o.o. Sarajevo 01-02.3-7602/18, 06.09.2018. Sporazum 2 01-05.2-586/21.BP, 15.04.2021.		444.534	Okončano
				Nadzor	-	52.400	JV Divil d.o.o. Sarajevo, IG d.o.o. Banja luka IGH d.o.o. Mostar, 01-02.3-5708/18, 17.07.2018.		59.581	
				Kamata					10.867	
				Ukupno					514.982	
2. Izgradnja traka za spora vozila										

JP CESTE FEDERACIJE BIH

2.1	M5	003	Ripač – Dubovsko	Izvođenje	5.700.000	3.315.000	Jata Group d.o.o. Srebrenik, 01-05.2-220/22_BP 17.02.2022.	5.649.086	827.530	Radovi obustavljeni u toku zimskog perioda. Nastavak radova planiran u aprilu, po stvaranju povoljnih vremenskih prilika
				Nadzor	112.000	52.000	JV Divil d.o.o. Sarajevo, IG d.o.o. Banja luka IGH d.o.o. Mostar, 01-02.3-5708/18, 17.07.2018.	218.755	192.550	
				Kamata					22.388	
				Ukupno					1.042.468	

Rekonstrukcija –sanacija mostova

			Nemila 0 – Lašva 0, most preko rijeke Bosne, Bosna IV i Bosna V	Izvođenje		10.000	Amandman 2. JV Hering d.d.d Široki brijeg& BBM d.o.o. Sarajevo, 01-05.2-586/21BP 15.04.2021.		10.048	Radovi po varij.nalogu na postavljanju rasvjete na mostovima, izvođač ispostavio priv.sit.
				Nadzor			Roughton International LTD. UK, 01-05.2-511/20. 13.01.2020.		-1.991	
				Ukupno					8.057	

6. Rekonstrukcija crnih tačaka i opasnih mjesta

	M-4.2	002	Skokovi - Srbijani, rekonstrukcija crne tačke "Mala Lisa" km 11+230	Nadzor			JV Divil d.o.o.Sarajevo, IG d.o.o. Banja luka IGH d.o.o. Mostar, 01-02.3-5708/18, 17.07.2018.		-4.298	Završeno
Zajedničko finansiranje EIB +WB				Izvođenje	32.328.000	31.958.100			26.006.809	
				Nadzor	1.901.500	1.732.400			1.676.586	

2. Izgradnja traka za spora vozila

	M18		Banj Brdo –Simin Han	Izvođenje	2.543.000	-			-	Nije planirano Rebalansom
				Nadzor	65.000	-			-	
Finansiranje WB + 1% JP Ceste F BiH				Izvođenje	2.543.000	-			-	
				Nadzor	65.000	-			-	

3. Rekonstrukcija – sanacija cesta i tunela

3.4	M15	004	Kamičak – Ključ - Crljeni – Zgon	Izvođenje	666.000	1.659.000	HP Investing d.o.o.Mostar, 01-05.2-2708/20. 27.02.2020.	4.611.418 (preneseno 1.658.357)	1.654.924	Okončano
				Nadzor	67.000	67.000	Roughton International LTD. UK, 01-05.2-511/20. 13.01.2020. Amandman br.1 01-05.2-2615/22. 04.2022.	253.804 (preneseno 11.644)	39.038	
				Kamata					57.397	
				Ukupno					1.751.359	

2. Rekonstrukcija –sanacija mostova

2.3	M20		Obilaznica Goražde, most preko rijeke Drine (postojeći most)	Izvođenje	732.000	-			-	Nije planirano Rebalansom
				Nadzor	74.000	-			-	
	M17	007	Nemila 0 – Lašva 1 – most preko rijeke Bosne (Zenica)	Nadzor		12.700	Roughton International LTD. UK, 01-05.2-511/20. 13.01.2020.		12.650	

4. Izgradnja i rekonstrukcija obilaznica

JP CESTE FEDERACIJE BIH

	M 6.1	N	Mostar obilaznica – Izgradnja dionice Miljkovići – Rodoč, vijadukt Marjanovića Draga	Izvođenje	3.400.000	4.372.000	JV Hering d.d. Široki brijeg.& KTM Brina d.o.o.Posušje, 01-05.2-7204/20, 16.07.2020.	7.625.529	4.415.005	U toku
				Kamata					209.041	
				Ukupno					4.624.046	
4.2	M5		Izgradnja obilaznice Donji Vakuf – I faza	Izvođenje	2.739.000	2.470.000	JVCA Bossil d.o.o.Vitez-Point d.o.o.Sarajevo, 01-05.2-3/21.BP. 05.01.2021.	3.380.073	1.406.193	U toku
				Kamata					101.625	
				Ukupno					1.507.818	
5. Izgradnja i rekonstrukcija obilaznica										
5.1	M16.4		Izgradnja obilaznice Bugojno	Izvođenje	3.141.000	2.850.000	JV Putovi d.o.o.Grude& Dobojputevi d.d.Doboj Jug. 01-05.2-3381/22 BP,11.05.2022.	3.870.632	2.153.419	U toku
				Nadzor	314.000	196.000	Roughton International LTD. UK,Amandman br 2 01-05.2-3288/22. 06.05.2022.	264.500	156.894	
				Kamata					70.884	
				Ukupno					2.381.197	
5.2	M15		Livno obilaznica – I faza	Izvođenje	3.000.000	1.325.000	JV Livnoputovi d.o.o Livno i KTM Brina d.o.o Posušje 01-05.2-3382/22 BP 31.05.2022	3.893.768	495.679	U toku
				Nadzor	300.000	117.000	Roughton International LTD. UK, Amandman br.2 01-05.2-3288/22 06.05.2022.	343.000	82.132	
				Ukupno					577.811	
6. Izgradnja i rekonstrukcija pristupnih cesta i obilaznica										
6.1	M18	007 i 009	Olovo – Semizovac – rekonstrukcija škarpi i spora traka Čevljanovići – Nišići	Izvođenje	5.476.000	850.000	Strabag AG 01-05.2-8863/22 11.10.2022.	5.517.712	-	Radovi u toku
				Nadzor	100.000	40.000	Roughton International LTD. UK, 01-05.2-511/20.13.01.2020.		11.933	
				Ukupno					11.933	
6.2	M 6.1		Mostar obilaznica – Izgradnja dionice Miljkovići – Rodoč (Tunel Novi)	Izvođenje	7.674.000	6.550.000	JV Hering d.o.o. Široki brijeg & Azvirt LLC Baku Azerbejdžan, 01-05.2-7664/22 30.08.2022.	25.131.195	1.155.583	U toku
7. Izgradnja obilaznica										
7.1	M5		Izgradnja obilaznice Kiseljak – I faza	Izvođenje	3.100.000	1.450.000	JV HP Investing d.o.o.Mostar&Jata Group d.o.o. Srebrenik 01-05-3833/22 BP. 18.05.2022. Amandman 101-05.2-3383/22.	3.608.619	1.585.961	U toku
				Nadzor	310.000	106.000	Roughton International LTD. UK, Amandman br.2 01-05.2-3288/22 06.05.2022.	265.500	127.044	
				kamata					37.787	

JP CESTE FEDERACIJE BIH

				Ukupno					1.750.792	
3.Rehabilitacija cesta i tunela										
	M4	012	Simin Han 1 – Donje Caparde, tunel Čaklovići	Izvođenje		243.200	Hering d.d. Siroki brijeg, 05.01.2021. 01-05.2-2/21.BP	2.442.626 (preneseno 294.426)	243.220	Okončano
				Nadzor		15.400	Roughton International LTD. UK, 01-05.2-511/20. 13.01.2020.		15.359	
				Ukupno					258.579	
E B R D				Izvođenje		21.769.200			13.109.984	
				Nadzor		554.100			445.050	
SVEUKUPNO EIB +WB+EBRD+ 1% JP Ceste F BiH				Izvođenje		64.799.000	53.727.300		39.116.793	
				Nadzor		3.131.500	2.286.500		2.121.636	

Planirani projekti u 2022 godini

Red. br.	Mag. Cesta	Dionica	DIONICA	Aktivnosti na projektu	Plan 2022.	Rebalans Plana 2022.	Izvođač/ Konsult. ugovor	Ugovoreno	Realizovano 2022.	Napomena
6. Izgradnja i rekonstrukcija pristupnih cesta i obilaznica										
7.4	M6		Grude (veza M6 i R420) – Izgradnja sjeverne obilaznice	Izvođenje	3.500.000	1.750.000			-	
				Nadzor	350.000	-			-	
9. Izgradnja obilaznica										
9.2	M 4.2		Cazin-izgradnja obilaznice – I faza	Izvođenje	1.500.000	-			-	
				Nadzor	20.000	-			-	
EBRD				Izvođenje	5.000.000	1.750.000			-	
				Nadzor	370.000	-			-	

Konsultantske usluge

Red. Br.	N A Z I V	Plan 2022.	Rebalans Plana 2022.	Izvođač /Konsultant	Ugovoreno	Realizovano 2022.	Napomena
1.	Tehnička pomoć pri implementaciji projekta	109.000	90.000	Roughton International LTD. UK, 01-02.3-8736/17. 28.09.2017.	463.747 (preneseno)	72.057	Finansiranje 100% EIB
2.	Tehnička pomoć za procjenu osjetljivosti cestovne mreže na klimatske promjene	467.000	-				Rashodi - 100% WB
3.	Izrada projekta za poboljšanje otpornosti na klimatske promjene na ag.cesti M18_007, dionica: Živinice - Vitalj	391.000	196.000	JV IPSA Institut d.o.o. & Winner Project d.o.o. Sarajevo, 01-05.2-1879/22. 14.03.2022. Amandman1 01-05.2-1879-1/22.08.04.2022.	391.100	97.775	Finansiranje 100% WB
4.	Vanjska kontrola kvalitete radova izgradnje Stari Neum-Drenovac	211.000	197.000	JV Igmat d.o.o. DTQ d.o.o. IGH d.o.o. Mostar, 01-02.3-4861/19, 22.04.2019.	705.015 (preneseno 197.025)	185.451	Finansiranje EIB/WB
5.	Vanjska kontrola – ostali projekti obuhvaćeni modernizacijom	150.000	150.000	JV AIK Inženjering d.o.o. Banovići, TPA d.o.o. Zagreb,	640.887 (preneseno)	196.490	Finansiranje EIB/ WB

JP CESTE FEDERACIJE BIH

				01-05.2-8210/20. 13.08.2020.			
6.	Konsultantske usluge za sigurnost prometa	687.000	-			-	Rashodi - 100% WB
7.	Nadzor za projekte finansirane od strane EBRD iz II tranše Izgradnja obilaznice Donji Vakuf, I faza	180.000	430.000	GP: PPG d.o.o. Sarajevo i IGH d.o.o. Mostar, 01-02.1-117/21. 06.01.2021.	97.297 (preneseno 48.800)	29.340	JP Ceste F BiH
U K U P N O		2.195.000	1.063.000			581.113	

2.3 Oprema

N A Z I V	Plan 2022.	Rebalans Plana 2022.	Izvođač /Konsultant	Ugovoreno	Realizovano 2022.	Napomena
Unapređenje postojeće opreme za prikupljanja podataka o stanju kolovoza	12.000	10.000	Dynatest A/S, Danska 01-05.2-6627/20 18.06.2020.	99.782 (preneseno 28.269)	9.978	Finansiranje 100% WB
U K U P N O	12.000	10.000			9.978	

Kamate na međunarodne kredite

N A Z I V	Plan 2022.	Rebalans Plana 2022.	Realizovano 2022.	Napomena
Kamate i servisni troškovi za program „Modernizacija cesta u FBiH“	1.400.000	1.200.000	1.216.309	Vlastita sredstva
U K U P N O	1.400.000	1.200.000	1.216.309	

U skladu sa Ugovorom o zajmu između Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i BiH zajam je podložen promjenljivoj kamatnoj stopi EURIBOR + 1% marže. Datumi plaćanja kamate 15. mart i 15. septembar svake godine.

U skladu sa kreditnim sporazumom između Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) i BiH kredit podliježe promjenljivoj kamatnoj stopi plus varijabilni raspon. Datumi plaćanja kamate 15. februar i 15. august svake godine.

Za povlačenje tranši kredita EIB-a, u skladu sa kreditnim sporazumom moguće je odabrati fiksnu ili promjenljivu kamatnu stopu, dok EIB utvrđuje varijabilni raspon u momentu povlačenja tranše. Prilikom povlačenja svake tranše, u koordinaciji sa Federalnim ministarstvom finansija, vrši se odabir fiksne ili varijabilne kamatne stope, u ovisnosti koja je u momentu zahtjeva za povlačenje tranše povoljnija.

Revolving sredstva za PDV

U skladu sa odredbama člana 29. Zakona o porezu na dodanu vrijednost i instrukcijom Uprave za indirektno oporezivanje o uslovima i načinu povrata PDV-a po osnovu uvoza i isporuke dobara, nabavke radova i usluga za međunarodne projekte, može se ostvariti povrat PDV-a uz podnošenje propisane dokumentacije i dokaza o uplati PDV-a. Obzirom da se radi o povratnim sredstvima, plaćanje istih će se vršiti iz tekućeg priliva sredstava, a nadopunjavati povratom sredstava od Uprave za indirektno oporezivanje.

REKAPITULACIJA PLANIRANIH I REALIZOVANIH ULAGANJA ZA PROGRAM „MODERNIZACIJA CESTA U FBiH“

Red. Br.	O P I S	Plan 2022.					Rebalans Plana 2022.					Realizovano 2022.				
		EIB	EIB + WB	EBRD	WB	UKUPNO	EIB	EIB + WB	EBRD	WB	UKUPNO	EIB	EIB + WB	EBRD	WB	UKUPNO
I	Radovi	-	32.328.000	34.928.000	2.517.600	69.773.600	-	31.958.100	23.519.200	-	55.477.300	-	26.006.809	13.109.984	-	39.116.793
1.	Troškovi nadzora	-	1.966.500	1.535.000	-	3.501.500	-	1.732.400	554.100	-	2.286.500		1.676.586	445.050		2.121.636
2.	Vanjska kontrola	-	361.000	-	-	361.000	-	347.000	-	-	347.000		381.941			381.941
3.	Tehnička pomoć pri implementaciji projekta	109.000	-	-	-	109.000	90.000	-	-	-	90.000	72.057				72.057
4.	Tehnička pomoć za procjenu osjetljivosti cestovne mreže na klimatske promjene	-	-	-	858.000	858.000	-	196.000	-	-	196.000		97.775			97.775
5.	Konsultantske usluge za sigurnost prometa	-	-	-	687.000	687.000	-	-	-	-	-					
II	Konsultantske usluge – ukupno	109.000	2.327.500	1.535.000	1.545.000	5.516.500	90.000	2.275.400	554.100	-	2.919.500	72.057	2.156.302	445.050		2.673.409
III	Robe	-	-	-	12.000	12.000	-	-	-	10.000	10.000				9.978	9.978
IV	SVEUKUPNO (I+II+III)	109.000	34.655.500	36.463.000	4.074.600	75.302.100	90.000	34.233.500	24.073.300	10.000	58.406.800	72.057	28.163.111	13.555.034	9.978	41.800.180

3. Projekti JP Ceste F BiH

3.1. Projekti iz prethodnog perioda

3.1.1. Projekti rekonstrukcije i izgradnje

Red Br.	Mag. Cesta	Naziv i opis projekta	Aktivnosti na projektu	Plan 2022.	Rebalans Plana 2022.	Izvođač/kosultant-ugovor	Ugovoreno	Realizovano 2022.	Napomena
1.	M5	Obilaznica Kiseljaka - Glavni projekat trase (II faza), tunela (L=cca 600m) ukupna dužina dionice L=cca 1.000m	Projektiranje	100.000	100.000	Ipsa Institut d.o.o.Sarajevo 01-02.1-8987/20. 14.09.2020.	149.200 (preneseno 102.895)	-	U toku
			Revizija	10.000	10.000	GP: IG d.o.o. Banja luka i Divil d.o.o.Sarajevo 01-02.1-4549/21. 12.04.2021.	9.594	-	
			Ukupno					-	
2.	M14.1	Glavni projekat izgradnje dionice ceste Grmuša – Mali Radič, L=8km, uključujući Misiju G21	Projektovanje	76.000	76.000	Geoput d.o.o Banja luka, 01-02.1-9577/21. 22.09.2021.	75.763	-	U toku
			Revizija	3.000	3.000	Trasa d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-10254/18 20.11.2018.	2.925	-	
			Ukupno					-	
3.	M17.3	Rekonstrukcija ceste M17.3, dionica: Drenovac-Stolac, L=cca 8 km - Glavni projekat	Projektovanje	22.000	22.000	Integra d.o.o. Mostar, 01-02.1-12269/19 18.10.2019. Anex: 01-02.1-10053/20 22.10.2020.	39.817 11.944 (preneseno...)	-	U toku
			Revizija	5.000	5.000	Pronasa d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-3227/20. 12.03.2020.	4.998	-	
			Ukupno					-	
4.	M14	Izgradnja obilaznice Bosanska Otoka (veza cesta M14 i R 401) - Glavni projekat trase i mosta preko rijeke Une	Projektovanje	40.000	56.300	GP:Routing d.o.o.Banja luka i Geoput d.o.o.Banja luka, 01-02.1-5342/21. 05.05.2021.	84.800	-	U toku
			Revizija	5.000	4.700	Trasa d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-7980/21. 29.07.2021.	4.680	-	
			Ukupno					-	
5.	M6	Izgradnja kružnog toka na izlazu Prispa, na dionici: Gorica-Vitina, općina Grude, I faza	Izvođenje	500.000	583.000	Putovi d.o.o. Grude, 01-02.2.9294/20. 24.09.2020	1.086.401 (preneseno 582.996)	582.857	Okončano
			Nadzor	6.600	5.000	Integra d.o.o. Mostar, 01-02.1-9733/21. 27.09.2021.	6.997 (preneseno 4.659)	4.659	
			Ukupno					587.516	
6.	M5	Rekonstrukcija ceste M5 dionica Gromljak-Blažuj, podionica: Kiseljak –Han ploča, L=cca 8 km	Projektovanje	35.000	40.000	Design&QC d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-10968/20. 24.11.2020.	56.628 (preneseno 39.640)	39.640	Okončano
			Revizija	3.000	2.200	Artimg d.o.o Sarajevo, 01-02.1-11547/20. 14.12.2020.	2.223	2.223	

JP CESTE FEDERACIJE BIH

			Ukupno					41.863	
7.	M5	Izgradnja (izmještanje) ceste M5, dionica I Izačić –Kamenica, glavni projekat trase	Projektiranje	10.000	34.000	Ipsa Institut d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-7262/20.13.07.2020.	48.555 (preneseno 33.988)	-	Nisu dostavljeni projekti Nije dostavljena okončana situacija
			Revizija	4.700	4.700	Građevinski fakultet Univerziteta u Sarajevu, 01-02.1-4871/21.20.04.2021.	4.700	4.700	
			Ukupno					4.700	
8.	M6 M17.4	Izgradnja obilaznice Ljubuškog (spoj M6 i M17.4) –I faza	Izvođenje	50.000	85.000	Putovi d.o.o. Grude, 01-02.2-8487/20.26.08.2020.	488.279 (preneseno 85.068)	84.878	Okončano
			Nadzor	3.000	15.000	Ipsa Institut d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-9649/20.07.10.2020.	14.976	14.976	
			Ukupno					99.854	
9.	M6	Dionica:Grude-Ljubuški Izgradnja trake za lijevo skretanje, km 16+500	Izvođenje	150.000	-			-	Rebalansom nije planirano
			Nadzor	7.000	-			-	
10.	M6	Izrada glavnog projekta izmještanja trase ceste M6 na dionici Gornji Trebižat-spoj sa M17 u Klepcima (obilaznica Čapljine) (L=cca 8,7km)	Projektiranje	475.000	475.000			-	Tender u toku Žalba na tend.dok.
			Revizija	35.000	45.000			-	
11.	M4.3	Izgradnja obilaznice Bužim (II faza)	Izvođenje	312.000	348.000	KovGrad d.o.o. Bužim, 01-02.2-7177/21.30.06.2021.	1.159.997 (preneseno 348.000)	347.999	Okončano
			Nadzor	2.700	2.700	GP:Geofeld d.o.o.Bihać, PPG d.o.o.Sarajevo, Pronasa d.o.o. i Arting d.o.o. Sarajevo. 01-02.2-7277/21.05.07.2021.	10.062 (preneseno 2.702)	2.702	
			Ukupno					350.701	
12.	M18	Rekonstrukcija ceste M18, dionica Kladanj-Podpaklenik – u ukupnoj dužini cca 3,50km) – Idejni projekat LOT 1 Kladanj-Karaula, LOT 2 Karaula -Olovo	Projektiranje	43.000	43.000	IG d.o.o. Banja luka, 01-02.1-11237/21.09.11.2021.	42.588	42.588	Okončano
13.	M4	Izgradnja ceste Tuzla (Drežnik) – Šiški Brod, dovršetak izgradnje kružne raskrsnice Lipnica	Izvođenje	500.000	-			-	Rebalansom nije planirano
			Nadzor	15.000	-			-	
14.	M18	Izmještanje i zaštita dalekovoda na trasi ceste Šiški Brod-Đurđevik, dionica 1, poddionica 2, od km 5+100 do km 11+975 – Glavni projekat (dalekovodi DV 400kV TS Zvornik – TS Tuzla 4, raspon 128 – 129 i DV 220 kV RP Kakanj – TS Tuzla 4, raspon 171 – 172)	Projektiranje	40.000	35.000	Energoinvest d.d.Sarajevo, 01-02.1-2807/22.15.04.2022.	34.515	34.515	Okončano
			Revizija	4.000	7.000	IG d.o.o.Banja luka,01-02.1-4595/22.22.06.2022.	5.031	5.031	
						IG d.o.o.Banja luka, 01-02.1-02.1-4868/22, 04.07.2022.	6.903	6.903	
			Ukupno					46.449	
15.	M6 i M17.4	Izgradnja obilaznice Ljubuškog (Spoj M6 i M17.4) - II faza (završetak započetih radova do P18A) - Izvođenje radova od P61 A do P71	Izvođenje	800.000	900.000	Putovi d.o.o.Grude, 01-02.1-12373/21.17.12.2021.	399.553	397.679	Ugovoreni radovi okončani
			Nadzor	17.000	25.000	Ipsa Institut d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-12688/21.29.12.2021.	6.728	6.728	
			Ukupno					404.407	

JP CESTE FEDERACIJE BIH

16.	M17.5	Rekonstrukcije ceste M17.5, dionica Jablanica-Sovići (cca 20km) – Idejni projekat (sa geodezijom)	Projektiranje	70.000	69.000	IG d.o.o. Banjaluka, 01-02.1-12239/21. 14.12.2021.	68.445	47.911	Okončano, nije situirano
17.	M17.4	Izrada idejnog rješenja izmještanja ceste M17.4 u zoni Čitluka, dionica Sretnice – Služanj-Cerno	Projektiranje	20.000	-	-	-	-	Rebalansom nije planirano
18.	M14.1 i M14.2	Izgradnja sjevernog kraka obilaznice Odžaka („Sjeverna veza“-nastavak) – Izgradnja kružnog toka na spoju sa cestom M14.2	Izvođenje	320.000	320.000	Balegem d.o.o. Gradačac, 01-02.1-4969/22, 06.07.2022.	319.917	318.708	Okončano
			Nadzor	10.000	10.000	GP:Trafficon d.o.o.Odžak i Trafficon d.o.o.Zagreb, 01-02.1-5587/22, 26.07.2022.	9.477	9.477	
			Ukupno					328.185	
19.	M6	Izgradnja Južne obilaznice Gruda – Izlaz Prispa (Spoj kružnog toka na M6 sa izgrađenim dijelom obilaznice)	Izvođenje	300.000	500.000			-	
			Nadzor	7.000	15.000			-	
20.	M4.3	Izgradnja obilaznice Bužim (III faza)	Izvođenje	1.000.000	1.014.000	Kov-Grad d.o.o. Bužim, 01-02.2-4743/22. 28.06.2022.	1.014.302	634.189	U toku
			Nadzor	25.000	25.000	GP: PPG d.o.o. Sarajevo, Geofeld d.o.o. Bihać Arting BH d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-5137/22, 12.07.2022.	24.661	-	
			Ukupno					634.189	
21.	M4.2	Izgradnja obilaznice Cazina -Prilagođavanje i racionalizacija glavnog projekta trase	Projektiranje	100.000	-			-	Rebalansom nije planirano
			Revizija	10.000	-			-	
22.	M18	Idejno rješenje modernizacije ceste M18, dionica:Stupari-Vitalj	Projektiranje	-	36.000	IG d.o.o. Banja luka 01-02.1-7139/22, 02.08.2022.	35.568	22.640	U toku
23.	M5	Izrada glavnog projekta veze „nove“ ceste M5 Izačić – Kamenica na postojeću cestu M5 na području naselja Kamenica – I faza L=2km (Uključuje izbacivanje petlje Kamenica, projektovanje trase i 2 kružne raskrsnice)	Projektiranje	-	30.000	GP:Euroing d.o.o.Bihać, Ipsa Institut d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-12085/20. 31.12.2020.	29.952	29.952	Okončano
24.	M4.2	Izgradnja obilaznice Cazina - Izrada Glavnog projekta (izmještanja) raskrsnice Čizmići na projektu izgradnje Obilaznice Cazina	Projektiranje	-	7.000	Geo-Feld d.o.o.Bihać, 01-02.1-11407/22 01.12.2022.	6.962	-	U toku
			Revizija	-	2.000			-	
			Ukupno					-	
25.	M4.2	Izgradnja obilaznice Cazina - Izrada Glavnog projekta (izmještanja) raskrsnice Kapići na projektu izgradnje Obilaznice Cazina	Projektiranje	-	7.000			-	
			Revizija	-	2.000			-	
				5.136.000	4.963.600			2.640.955	

3.1.2. Rasvjeta i semaforizacija raskrsnica

Red br.	Mag. Cesta	Naziv i opis projekta	Aktivnosti na projektu	Plan 2022.	Rebalans Plana 2022.	Izvođač/kosultant-ugovor	Ugovoreno	Realizovano 2022.	Napomena
1.	M17	Rasvjeta mosta Begića i Begović na M17	Izvođenje	1.700	1.700	Elko-Marić d.o.o. Mostar, 01-02.2-6382/20. 12.06.2020.	58.393 (preneseno 1.631)	-	

JP CESTE FEDERACIJE BIH

			Nadzor	2.000	2.000	Habitat d.o.o. Mostar, 01-02.2-3104/20. 10.03.2020.	1.989	-	
			Ukupno					-	
2.	M16	Rasvjeta tunela Tuk na M-16, dionica: Crna Rijeka – Jajce	Projektovanje	6.000	5.900	Edeco Group d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-6965/20. 03.07.2020.	5.900	5.900	
			Revizija	4.000	3.800	Habitat d.o.o. Mostar, 01-02.2-3478/22. 13.05.2022.	3.830	-	
			Izvođenje	300.000	400.000			-	
			Nadzor	7.000	7.000			-	
			Ukupno					5.900	
3.	M14.2	Semaforizacija mosta u Prudu /Šamac na cesti M14.2	Izvođenje	40.000	60.000			-	
4.	M5	Rasvjeta raskrsnice na magistralnoj cesti M5 u naselju Pudin Han	Izvođenje	80.000	80.000	Nexen d.o.o. Banja luka i Neos d.o.o. Mostar, 01-02.2-10239/21. 12.10.2021.	79.857	79.806	Okončano
			Nadzor	3.000	3.000	Advanced Technology and System d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-9696/21. 24.09.2021.	2.995	2.995	
			Ukupno					82.801	
5.	M5	Rasvjeta tunela Vratnik*	Izvođenje	130.000	130.000			-	
6.	M1.9	Rasvjeta tunela Ormanica	Izvođenje	130.000	130.000			-	
			Nadzor	3.000	3.000			-	
		UKUPNO		706.700	826.400			88.701	

Napomena* Sa Općinom Stari grad i Sarajevo potpisan je 07.01.2022. Sporazum broj:01-02.2-185/22. o zajedničkoj saradnji projekta rasvjete tunela Vratnik na M5 dionica: Šeherehadin most-Korija, km 0+550 procijenjene vrijednosti 290.000 KM. Prema Sprazumu JP Ceste F BiH su obezbjedile 130.000 KM, Općina Stari grad 60.000 KM i Grad Sarajevo 100.000KM. Nakon okončanja i komisijskog prijema, projekat će biti predat JP Ceste F BiH na upravljanje.

3.1.3. Poboljšanje sigurnosti prometa na magistralnim cestama izgradnjom traka za lijeva skretanja, pješačkih staza sa odvodnjom kišne kanalizacije, odmorišta i sanacija crnih tačaka

Red Br.	Mag. Cesta	Naziv i opis projekta	Aktivnosti na projektu	Plan 2022.	Rebalans Plana 2022.	Izvođač/ konsultant- ugovor	Ugovoreno	Realizovano 2022.	Napomena
1.	M18	Rekonstrukcija raskrsnice na M18 010 Kobilja Glava-Sarajevo – Malta km 8+340	Izvođenje	550.000	600.000			-	Čeka se urb. saglasnost
			Nadzor	10.000	10.000			-	
2.	M6.1	Rekonstrukcija raskrsnice M6.1 i R420 u naseljenom mjestu -Čitluk, općina Posušje	Izvođenje	80.000	80.000	KTM-Brina d.o.o. Posušje, 01-02.2-1601/22.	79.999	79.999	Okončano
			Nadzor	3.000	3.000	Integra d.o.o. Mostar, 01-02.4-1500/20. 31.01.2020.	6.961 (fakturisano 2021)	-	
			Ukupno					79.999	
3.	M17	Rekonstrukcija raskrsnice magistralne ceste i lokalne ceste za Orahovicu, općina Konjic	Izvođenje	252.000	392.000	HP Investing d.o.o. Mostar, 01-02.2-11317/22, 30.11.2022.	391.561	-	U toku
			Nadzor	5.900	5.900	Interprojekt d.o.o. Mostar,	5.850	-	

JP CESTE FEDERACIJE BIH

						01-02.4-6966/20. 03.07.2020.			
			Ukupno						-
4.	M17	Sanacija crne tačke Misurići, dionica (005) općina Maglaj, km 19+000	Projektovanje	13.000	8.000	CPK d.o.o. Banja luka, 01-02.1-523/22. 18.01.2022.	7.921	-	U toku
			Revizija	2.000	2.000	Saraj Inženjering d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-1903/22. 14.03.2022.	1.950	-	
			Ukupno						
5.	M17	Sanacija crne tačke Tatarbudžak, dionica (006), općina Žepče km 3+500	Projektovanje	13.000	9.000	CPK d.o.o. Banja luka, 01-02.2-12452/21 21.12.2021.	8.927	-	U toku
			Revizija	2.000	2.000	Saraj Inženjering d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-664/22. 24.01.2022.	1.950	-	
			Ukupno						
6.	M18	Izgradnja pješačke staze u naselju Olovske Luke, općina Olovo	Izvođenje	245.500	81.500	Dobojputevi d.d. Doboj jug, 01-02.2-10214/21. 12.10.2021.	245.490 (preneseno 97.913)	97.913	Okončano
			Nadzor	3.400	2.600	Smajić-Inženjering d.o.o.Goražde, 01-02.2-9325/21. 14.09.2021.	3.381	3.381	
			Ukupno					101.294	
7.	M1.8	Izgradnja pješačke staze na dionici Ježinac-Čehaje-Srebrenik-skretanje za Ljenobud, L=3179 m(Ifaza)	Projektovanje	7.000	7.000			-	Usaglaš. projektnog zadatka sa lokalnom zajednicom
			Izvođenje	200.000	200.000			-	
			Nadzor	7.000	7.000			-	
8.	M4	Rekonstrukcija raskrsnice cesta M4 i R469, općina Kalesija, km 8+860	Izvođenje	350.000	350.000			-	Zbog imov.pr.odno sa potreban novi projekat
			Nadzor	7.000	7.000			-	
9.	M4	Rekonstrukcija raskrsnice za poslovnu zonu Glinište na M4	Projektovanje	5.000	5.000	GP FM Inženjering d.o.o. Sarajevo i Modus projekt d.o.o. Kakanj, 01-02.2-6564/21. 09.06.2021.	9.335 (preneseno 4.667)	-	
			Revizija	2.000	2.000	PPG d.o.o. Sarajevo 01-02.2-12395/21 20.12.2021.	1.950	-	
			Ukupno					-	
10.	M18	Rekonstrukcija krivine kod autobusnog stajališta Crijevčići – prema Tuzli	Revizija	2.000	-			-	Ne treba
11.	M17	Postavljanje odbojnih ograda nivoa zaštite H1 - dionica: Bilješevo-Zenica	Izvođenje	863.000	728.000	Sacom d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-9896/22. 03.11.2022.	303.760	27.126	U toku
			Nadzor	7.000	7.000			-	
			Ukupno					27.126	
12.	M6	Rekonstrukcija raskrsnice na M6 i R427, općina Stolac	Izvođenje	585.000	685.000	HP Investing d.o.o.Mostar, 01-02.1-8352/22, 21.09.2022,	684.850	80.304	U toku
			Nadzor	7.000	7.000	Interprojekt d.o.o. Mostar, 01-02.1-3489/22. 13.05.2022.	6.903	-	
			Ukupno					80.304	
13.	M5	Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok na cesti M5 u naseljenom mjestu Kalibunar, općina Travnik	Izvođenje	510.000	700.000			-	U toku ishodovanje odobrenja za građenje
			Nadzor	7.000	7.000	Arting BH d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-9736/20. 12.10.2020.	6.929	-	

JP CESTE FEDERACIJE BIH

			Ukupno					-	
14.	M17	Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok na cesti M17, ulaz u industrijsku zonu Pečuj, grad Zenica	Projektovanje	14.000	14.000			-	Usaglašav. sa Gradom Zenica
			Revizija	2.000	2.000			-	
15.	M18	Nastavak izgradnje servisne saobraćajnice u općini Živinice	Izvođenje	135.000	135.000	Jata Group d.o.o.Srebrenik, 01-02.2-8207/21. 06.08.2021.	134.280	134.267	Okončano
			Nadzor	2.200	2.200	AIK Inženjering d.o.o.Banovići, 01-02.2-8814/21. 31.08.2021.	2.165	2.164	
			Ukupno					136.431	
16.	M 16.2	Rekonstrukcija raskrsnice za naselje Duge, općina Prozor	Izvođenje	550.000	550.000			-	U toku ishodovanje potrebnih saglasnosti
			Nadzor	7.000	15.000			-	
17.	M17	Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok, cesta M17-skretanje Hadžići	Izvođenje	645.000	900.000				
			Nadzor	7.000	7.000			-	
			Ukupno					-	
18.	M1.9	Rekonstrukcija ceste M1.9. Slatina (gr.entiteta) – Gradačac – izgradnja kružnog toka na križanju za industrijsku zonu, općina Gradačac	Izvođenje	343.000	650.000			-	U toku ishodovanje potrebnih saglasnosti
			Nadzor	7.000	7.000			-	
19.	M4.2	Rekonstrukcija raskrsnice na M4.2, izlaz iz Velike Klauše, dionica_001 (spoj Obilaznice i magistralne ceste)	Projektovanje	14.000	-			-	Priprema projektnog zadatka
			Revizija	2.000	-			-	
20.	M17	Rekonstrukcija raskrsnice magistralne ceste M17, dionica: 008 HW (Jošanica) 1 – Stup 1, km 3+500 sa ulicom Reljevska, općina Novi grad Sarajevo	Projektovanje	8.700	8.700	Design&QC d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-4909/20. 24.04.2020.	8.658	-	U toku ishodovanje potrebnih saglasnosti
			Revizija	2.000	2.000			-	
			Ukupno					-	
21.	M16	Rekonstrukcija raskrsnice na magistralnoj cesti M16, općina Karadže, općina Bugojno	Projektovanje	14.000	9.300	INK Constructor d.o.o.Banja luka, 01-02.2-1500/22. 24.02.2022.	9.243	9.243	Okončano
22.	M6.1	Izgradnja nogostupa uz cestu M6.1 u naseljenom mjestu Knešpolje	Izvođenje	250.000	300.000			-	Općina treba da položi kanalizaciju prije izgradnje
			Nadzor	7.000	7.000			-	
23.	M 14.2	Izgradnja nogostupa u naseljenom mjestu D. Mahala, Dionica: Orašje- Grebnice, km 12+800 do km 14+616	Izvođenje	181.000	61.000	Balegem d.o.o. Gradačac, 01-02.2-10295/21. 14.10.2021.	180.765 (preneseno 60.918)	60.889	Okončano
			Nadzor	5.900	3.700	Arting d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-10294/21. 14.10.2021.	5.850 (preneseno 3.664)	3.663	
			Ukupno					64.552	
24.	M4	Rekonstrukcija raskrsnice u Gornjoj Kalesiji, općina Kalesija	Izvođenje	418.000	765.000	Jata group d.o.o. Srebrenik, 01-02.2-9893/22, 03.11.2022.	764.681	-	
			Nadzor	6.700	6.700	Radis d.o.o. Istočno Sarajevo, 01-02.2-9890/22, 03.11.2022.	6.669	-	
			Ukupno					-	
25.	M5	Gromiljak – Busovača, izgradnja pješačke staze kroz naselje Radanovići	Izvođenje	100.000	100.000	Orman d.o.o. Kiseljak, 01-02.2-9329/21. 14.09.2021.	245.314 (preneseno 100.023)	99.725	Okončano
			Nadzor	2.000	2.700	Modus projekt d.o.o.Kakanj, 01-02.2-9324/21. 14.09.2021.	6.434 (preneseno 2.624)	2.624	
			Ukupno					102.349	
26.	M18	Rekonstrukcija pješačkih staza sa rješavanjem odvodnje, magistralna cesta	Izvođenje	500.000	500.000			-	Očekuje se urbanistička saglasnost

JP CESTE FEDERACIJE BIH

		M18, dionica 010 Semizovac – Sarajevo – Malta, km 8+400 km – km 10+400 (Kobilja glava – Šip)	Nadzor	7.000	7.000			-	
27.	M4	Doboj – Donja Orahovica, rekonstrukcija raskrsnice u Klokotnici (zaseok Kapak)	Izvođenje	294.000	265.000	Rial-Šped d.o.o. Doboj istok, 01-02.2-10468/21. 19.10.2021.	293.670	293.351	Okončano
			Nadzor	6.000	5.300	IG d.o.o.Banja luka, 01-02.2-11786/21. 01.12.2021.	5.843	5.843	
			Ukupno					299.194	
28.	M16	Izgradnja raskrsnice ili treće trake: Donji Vakuf-Bugojno-Kupres (naselje Čipuljić-Poriće)	Projektovanje	15.000	15.000	Arting d.o.o. Sarajevo, 01-02.2.4-11238/21. 09.11.2021.	14.742	8.239	U toku
29.	M17	Rekonstrukcija isključne trake za Lokve	Projektovanje	7.000	2.900	Arting BH d.o.o.Sarajevo, 01-02.4-2673/22. 11.04.2022.	2.808	2.808	Okončano
30.	M18	Izgradnja pješačke staze Gornji Hotonj-Donji Hotonj	Izvođenje	100.000	92.000	Grakop d.o.o. Kiseljak, 01-02.2-5170/22, 13.07.2022.	91.622	90.940	Okončano
			Nadzor	7.000	4.800	Arting BH d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-652/22. 21.01.2022.	4.797	4.797	
			Ukupno					95.737	
31.	M5	Izgradnja pješačke staze na magistralnoj cesti M-5 u naselju Izačić	Izvođenje	100.000	100.000	Behić sanny Boy d.o.o.Bihać, 01-02.2-872/22. 01.02.2022.	99.999	99.830	Okončano
			Nadzor	7.000	4.000	TIM Konzalting d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-875/22. 01.02.2022.	4.000	4.000	
			Ukupno					103.830	
32.	M5	Rekonstrukcija raskrsnice sa pješačkom stazom u naselju Barice, općine Donji Vakuf	Projektovanje	-	5.600	Urbis Centar d.o.o.Banja luka, 01-02.2-9785/21 .28.09.2021	5.616	5.616	
			Izvođenje	250.000	250.000			-	
			Nadzor	7.000	7.000			-	
			Ukupno					5.616	
33.	M18	Rekonstrukcija raskrsnice cesta M18 i R455a u km 6+100, općina Živinice, naselje Maline	Revizija	2.500	2.500			-	Okončano 2021.
34.	M17	Izgradnja podhodnika za pješake u naselju Čelebići, općina Konjic	Projektovanje	11.200	11.200	IG d.o.o.Banja luka, 01-02.4-9142/20. 17.09.2020.	11.232	11.232	Okončano
			Revizija	2.400	2.400	Interprojekt d.o.o.Mostar, 01-02.4-11650/20. 16.12.2020.	2.340	2.340	
			Ukupno					13.572	
35.	M1.8	Izrada glavnog projekta podhodnika za pješake na M1.8, u naselju Bjelave, općina Srebrenik	Revizija	3.000	3.000			-	Ne treba
36.	M18	Izrada idejnog projekta rekonstrukcije raskrsnice na magistralnoj cesti M18, dionica 010 Semizovac – Sarajevo – Malta, lokalitet Zetra	Projektovanje	6.800	-			-	Rebalansom nije planirano
37.	M6.1 M17	Sjeverni ulaz u Mostar – Izrada glavnog projekta odvodnje raskrsnice i tunela	Projektovanje	7.000	7.000	Design&QC d.o.o. Sarajevo 01-02.1-821/21 22.01.2021.	7.020	-	
38.	M4	Rekonstrukcija raskrsnice na ulazu u Jelah, općina Tešanj (Sufinansiranje sa Općinom Tešanj)	Projektovanje	6.600	6.600			-	Problem imov.pravni odnosi
39.	M17	Rekonstrukcija sa semaforizacijom raskrsnice magistralne ceste M17,	Projektovanje	8.700	8.700	Design&QC d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-4909/20.	8.658	-	

JP CESTE FEDERACIJE BIH

		dionica: 008 HW (Jošanica) 1 – Stup 1, km 5+000 sa ulicom Rajlovačka cesta, općina Novi grad Sarajevo	Revizija			24.04.2020.			
			Ukupno			Trasa d.o.o. Sarajevo 01-02.2-12042/22, 19.12.2022.	1.998	-	
40.	M17	Izgradnja pješačke staze Karuše-Mravići,	Projektovanje	9.000	9.000			-	Izrada projektnog zadatka
41.	M 17.5	Poboljšanje sigurnosti prometa na M-17.5, dionica: Posušje –Jablanica	Izvođenje	200.000	200.000			-	Žalbeni postupak
			Nadzor	7.000	7.000			-	
42.	M4	Rekonstrukcija raskrsnice za naselje Gnojnice, na cesti M4, općina Lukavac	Projektovanje	7.000	4.900	Pronasa d.o.o. Sarajevo, 01-02.4-11617/21 22.11.2021.	4.901	4.901	Okončano
43.	M6	Rekonstrukcija raskrsnice za naselje Šuško, na cesti M6, općina Čapljina	Projektovanje	15.000	9.000	CPK d.o.o.Banja luka, 01-02.2-4418/22. 15.06.2022.	9.091	9.091	Okončano
44.	M6.1	Izgradnja pješačke staze u naselju Kruševo, (od Čula do Podgorja) na M6.1 dužine cca 2,5 km, grad Mostar	Izvođenje	166.000	115.100	HP Investing d.o.o. Mostar, 01-02.4-746/22. 26.01.2022.	115.830	115.109	Okončano
			Nadzor	7.000	500	Inpros d.o.o. Mostar, 01-02.4-1476/22. 24.02.2022.	468	468	
			Ukupno					115.577	
45.	M17	Izrada idejnog projekta rekonstrukcije raskrsnice na M17 u Konjicu	Projektovanje	7.000	5.000	Pronasa d.o.o. Sarajevo, 01-02.4-11619/21. 22.11.2021.	4.901	4.901	Okončano
46.	M1.8	Rekonstrukcija raskrsnice cesta M1.8 i R 461 u Srebreniku, na cesti M1.8, dionica Orašje - Tuzla	Projektiranje	20.000	20.000	-	-	-	Projektni zadatak u izradi
			Revizija	3.000	3.000	-	-	-	
47.	M1.9	Poboljšanje sigurnosti prometa na M1.9 – Industrijska zona Gradačac	Izvođenje	1.015.000	1.015.000	-	-	-	U toku
			Nadzor	23.000	23.000	-	-	-	ishodovanje saglasnosti
48.	M5	Sanacija raskrsnice na M5 Azize Šećerbegović_Korija-Ljubogošća, km 1+350	Projektovanje	7.000	7.000	-	-	-	Ranije okončano
49.	M5	Izrada projekta sanacije raskrsnice na cesti M5 –ulaz u Travnik	Projektovanje	7.000	7.000	-	-	-	Sva druga rješenja osim semaforiz. zahtjevaju eksp.
			Revizija	4.000	4.000	-	-	-	
50.	M4	Rekonstrukcija i dogradnja potputnjaka na M4 u Mravićima, općina Doboj jug	Projektovanje	7.000	7.000	-	-	-	Projektni zadatak u pripremi
			Revizija	4.000	4.000	-	-	-	
51.	M16	Sanacija raskrsnice na cesti M16 u Kupresu	Projektovanje	7.000	7.000	Trasa d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-9888/22, 03.11.2022.	6.938	-	U toku
			Revizija	4.000	4.000	-	-	-	
			Ukupno					-	
52.	M4.2	Sanacija raskrsnice cesta M4.2 i R402, grad Cazin	Projektovanje	7.000	7.000	GeoFeld d.o.o. Bihać, 01-02.2-11179/22, 29.11.2022.	6.669	-	U toku
			Revizija	4.000	4.000	-	-	-	
			Ukupno					-	
53.	M17	Izrada projektne dokumentacije – skretanje za naselje Ortiješ	Projektovanje	7.000	7.000			-	
54.	M4	Izgradnja pješačke staze L=cca. 925 m od Klokočnice (Samarića) do Brijesnice Velike	Nadzor	-	6.400	Design&QC d.o.o.Sarajevo 01-02.2-10216/21. 12.10.2021.	6.435	6.435	Okončano
55.	M17	Glavni projekat rekonstrukcije raskrsnice sa M17 i lokalne ceste za naselje	Projektovanje	-	14.000	Trafficon d.o.o.Odžak, 01-02.1-13615/19.	19.943 (preneseno 13.960)	13.960	Okončano

JP CESTE FEDERACIJE BIH

		Papratnica dionica M17_006: Ozimica-Topčić Polje, km 9+180, općina Žepče				26.11.2019.			
			Revizija	-	2.300	Design&QC d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-9854/20.14.10.2020.	2.340	2.340	
			Ukupno					16.300	
56.	M17	Izgradnja pješačke staze pored groblja Sutina, Grad Mostar	Izvođenje	-	36.500	HP Investig d.o.o.Mostar, 01-02.1-9578/21.22.09.2021.	53.820 (preneseno 36.627)	36.512	Okončano
			Nadzor	-	2.500	ProKonsIng d.o.o.Mostar, 01-02.1-8621/21.23.08.2021.	2.500	2.500	
			Ukupno					39.012	
57.		Rekonstrukcija raskrsnice na M17 općina Ilidža	Projektovanje			GP: Design& QC d.o.o i ES Hydrotehnics d.o.o. Sarajevo, 01-02.4-11618/21.22.11.2021.	9.360	9.360	Okončano
58.	M5	Izgradnja pješačke staze kroz MZ Pritoka (Put Armije BiH)	Nadzor			Industroprojekt a.d. Prijedor 01-02.2-9701/20.09.10.2020.	2.574	1.284	Okončano U 2021
59.	M14	Izgradnja pješačke staze kroz naselje Srbijani, grad Bihać						1.290	
		UKUPNO			9.347.500	10.287.500		1.338.445	

3.1.4. Vanredno održavanje

3.1.4.1. Sanacija cestovnih objekata

Red br.	Mag. Cesta	Naziv i opis projekta	Aktivnosti na projektu	Plan 2022.	Rebalans Plana 2022.	Izvođač/konsultant-ugovor	Ugovoreno	Realizovano 2022.	Napomena
1.	M18	Sanacija mosta preko rijeka Bioštica u Olovu (M18-009-187), dionica Olovo – Semizovac, km 0+404	Projektovanje	-	6.800	Instrukta d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-12771/21.31.12.2021.	6.786	6.786	Okončano
			Izvođenje	750.000	953.000	HP Investing d.o.o.Mostar, 01-02.1-3963/22.31.05.2022.	953.031	942.089	
			Nadzor	15.000	8.000	PPG d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-5070/22, 08.07.2022.	7.020	7.020	
			Ukupno					955.895	
2.	M17	Zaštita temelja mosta preko duboke uvale, Gradište kod Crnaje (M17-012-303), dionica Konjic- Jablanica 1, km 14+661	Izvođenje	274.000	274.000	Struktura d.o.o.Jajce, 01-02.1-2809/22.15.04.2022.	273.607	273.594	Okončano
			Nadzor	6.000	6.000	Design&QC d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-9572/21.22.09.2021.	5.850	5.850	
			Ukupno					279.444	
3.	M5	Rekonstrukcije mosta preko Koševskog potoka u Sarajevu, Skenderija (M 05.0-5-01-a) dionica Stup-Vijećnica-Gr Ent ... Gr Ent Prača-Renovica-Gr Ent Kaljani, km 7+310	Projektiranje	9.000	9.000	Design & QC d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-4907/19.24.04.2019.	17.550	-	U toku
			Revizija	2.300	2.300			-	
			Ukupno					-	
4.	M17	Rekonstrukcija/sanacija tunela „Ivan“ (T17-011-46) l=646m, Ivan sedlo, dionica Tarčin-Konjic, km 7+750	Projektiranje	112.000	49.000	GP PPG d.o.o. Sarajevo i Pronasa d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-5662/21.14.05.2021.	111.939 (preneseno 48.947)	-	U toku
			Revizija	7.500	7.500	GP: Divel d.o.o. Sarajevo i Instit.za	7.500	-	

JP CESTE FEDERACIJE BIH

						građev. d.o.o. Banja luka. 01-02.1-7979/21. 29.07.2021.			
			Ukupno					-	
5.	M19	Sanacija mosta preko rijeke Drinjača, Gojsalići (M19.2-001-97) dionica Kladanj – Vlasenica, km 2+323	Projektiranje	21.000	21.000	Infra d.o.o Sarajevo, 01-02.1-6560/21. 08.06.2021.	20.940	25.491	Okončano
			Revizija	1.200	1.200	PPG d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-8619/21. 23.08.2021.	1.170	1.170	
			Ukupno					26.661	
6.	M5	Sanacija mosta preko Duboke doline na Komaru (M-5-3-15) dionica: Donji Vakuf- Turbe, km 17+093	Projektiranje	24.000	24.000	Infra d.o.o Sarajevo, 01-02.1-6560/21. 08.06.2021.	23.732	19.181	Okončano
			Revizija	1.200	1.200	PPG d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-8619/21. 23.08.2021.	1.170	1.170	
			Ukupno					20.351	
7.	M18	Rekonstrukcija/Sanacija mosta preko rijeke Suha u Stuparima (M18-007-83) dionica Živinice 1 – Vitalj, km 16+426	Izvođenje	870.000	1.150.000			-	Tender u pripremi
			Nadzor	25.000	35.000			-	
			Ukupno					-	
8.	M5	Rekonstrukcija mosta (M-5-012-227) preko r. Bile, na cesti M-5, dionica Nević Polje- Kaonik, km 4+988	Izvođenje	176.000	150.000	Struktura d.o.o. Jajce, 01-02.1-8415/20. 25.08.2020. 01-02.1-8225/22,16.09.2022.	650.404 (preneseno 134.155) 8.023	133.943	Okončano, nije situirano
			Nadzor	7.500	7.400	IG d.o.o. Banja luka, 01-20.1-8630/20. 01.09.2020.	14.994 (preneseno 7.401)	7.396	
			Ukupno					141.339	
9.	M16	Izrada idejnog i glavnog projekta rekonstrukcije priključka lokalne ceste za Zdaljevac na cestu M16, dionica 006 Crna rijeka –Jajce Jug u km 13+900 i izgradnje mosta preko rijeke Vrbas (akumulacija hidroelektrane Jajce II)	Projektiranje	23.500	12.000	Design&QC d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-6905/20. 01.07.2020.	23.330 (preneseno 11.665)	11.665	Okončano
			Revizija	4.000	4.000	Trasa d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-8059/20. 10.08.2020.	3.978	3.978	
			Ukupno					15.643	
10.	M 17.3	Sanacija mosta (M17.3-002-323) preko rijeke Bregave u Stocu, na cesti M17.3, dionica Stolac 2-Hutovo, km 0+139	Projektovanje	40.000	29.500	Infra d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-4347/22. 13.06.2022.	29.507	12.285	U toku
			Revizija	5.000	-	PPG d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-12235/22, 23.12.2022.	2.867	-	
			Ukupno					12.285	
11.	M 14.2	Sanacija mosta M14.2-004-494 preko rijeke Unac u Drvaru, na cesti M14.2, dionica Pasjak-Resanovci, km 7+035	Projektovanje	4.000	7.000	Routing d.o.o. Banja luka, 01-02.1-6643/21. 11.06.2021.	19.562 (preneseno 7.488)	7.020	Okončano
			Revizija	2.400	1.200	Infra d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-8620/21. 23.08.2021.	2.340 (preneseno 1.170)	1.170	
			Ukupno					8.190	
12.	M17	Rekonstrukcija mosta (M17-017-325) preko rijeke Bune, na cesti M17, dionica Buna-Tasovčići, km 0+759	Projektovanje	7.000	10.500	Trasa d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-306/21. 08.01.2021.	36.434 (preneseno 10.554)	10.530	Okončano
			Revizija	4.700	-	-	-	-	
			Ukupno					10.530	
13.	M17	Zamjena dilatacione naprave na	Izvođenje	84.000	84.000	Sikra d.o.o. Sarajevo	102.328 (preneseno)	85.085	Okončano

JP CESTE FEDERACIJE BIH

		obalnom stubu broj 6 na mostu preko strme padine, klizište u Prapraskom (M17-012-306) dionica Konjic-Jablanica 1, km 17+674				01-02.1-8794/20. 08.09.2020.	83.957)		
			Nadzor	2.500	2.500	Insrukta d.o.o. Sarajevo 01-02.1-9853/20. 14.10.2020.	2.340	2.340	
			Ukupno					87.425	
14.	M4	Sanacija/rekonstrukcija mosta preko rijeke Jale u Siminom Hanu, dionica 012, Sinim Han-Donje Caparde 3 km 0+214	Izvođenje	410.000	410.000	Roading d.o.o.Gračanica, 01-02.1-2081/22. 21.03.2022.	409.228	409.202	Okončano
			Nadzor	10.000	5.000	AIK Inženjering d.o.o.Banovići, 01-02.1-2080/22. 21.03.2022.	3.498	3.498	
			Ukupno					412.700	
15.	M15	Rekonstrukcija mosta preko potoka Krbava (M15-004-49), dionica Kamičak-Ključ, km 9+622	Izvođenje	257.000	380.000			-	Tender u pripremi
			Nadzor	6.000	12.000			-	
16.	M18	Sanacija (rekonstrukcija) mosta preko nepoznatog potoka u Poturovićima (M18-009-604), dionica Olovo – Semizovac, km 31+567	Izvođenje	222.000	300.000			-	Tender u pripremi
			Nadzor	7.000	10.000			-	
17.	M4.3	Rekonstrukcija mosta preko rijeke Baštre (M4.3-003-626), lokacija Baštre dionica Bosanska Otoka-Bužim, km 8+882	Projektiranje	30.000	33.000	GP:Infra d.o.o. Pronasa d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-10497/22, 15.11.2022.	32.312	-	U toku
			Revizija	4.000	4.000			-	
			Ukupno					-	
18.	M4.3	Rekonstrukcija mosta preko rijeke Baštre (M4.3-003-624), lokacija Čava, dionica Bosanska Otoka-Bužim, km 7+695	Projektiranje	20.000	32.000	GP:Infra d.o.o. Pronasa d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-10497/22, 15.11.2022.	32.429	-	U toku
			Revizija	3.000	3.000			-	
			Ukupno					-	
19.	M18	Rekonstrukcija mosta preko rijeke Gostelja (M18-007-81), lokacija Tarevo –kamenolom Stupari, dionica Živinice 1 – Vitalj – sa izmještanjem trase	Projektiranje	35.000	50.000			-	Tender u pripremi
			Revizija	4.000	5.000			-	
20.	M17	Rekonstrukcija/Sanacija mosta preko rijeke Bosne (M17-007-181) na petlji Lašva, dionica Topčić polje-Lašva 0, km 32+357	Projektiranje	35.000	34.000	GP Trasa d.o.o. Sarajevo i Divel d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-12450/21. 21.12.2021.	33.567	33.567	Okončano Revident nije dostavio situaciju
			Revizija	4.000	3.000	IG d.o.o. Banja luka, 01-02.1-3638/22. 19.05.2022.	2.808	-	
			Ukupno					33.567	
21.	M17	Rekonstrukcija /Sanacija mosta preko ceste M5 (pravac za Travnik) (M17-007-180) na petlji Lašva, dionica Topčić polje – Lašva 0, km 32+261	Projektiranje	23.000	22.300	GP Trasa d.o.o. Sarajevo i Divel d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-12450/21. 21.12.2021.	22.277	22.277	Okončano Revident nije dostavio situaciju
			Revizija	3.000	2.500	IG d.o.o. Banja luka, 01-02.1-3638/22. 19.05.2022.	2.515	-	
			Ukupno					22.277	
22.	M5	Rekonstrukcija/Sanacija mosta preko rijeke Bosne (M5-D13-199), na petlji Lašva dionica Kaonik-Lašva , km 5+115	Projektiranje	30.000	28.400	GP Trasa d.o.o. Sarajevo i Divel d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-12450/21. 21.12.2021.	28.361	28.361	Okončano Revident nije dostavio situaciju
			Revizija	3.000	2.500	IG d.o.o. Banja luka, 01-02.1-3638/22. 19.05.2022.	2.515	-	

JP CESTE FEDERACIJE BIH

			Ukupno					28.361	
23.	M16	Rekonstrukcija mosta preko rijeke Vrbas (M16-007-259) u Donjem Vakufu, na cesti M16, dionica Donji Vakuf 1- Bugojno	Izvođenje	600.000	840.000			-	Tender u pripremi
			Nadzor	20.000	16.500			-	
			Ukupno					-	
24.	M5	Rekonstrukcija mosta preko potoka Rika sa rekonstrukcijom raskrsnice Skela, na cesti M5, dionica Jajce jug-D. Vakuf 1	Izvođenje	800.000	812.000	GP: Struktura d.o.o. Jajce i MG Mind d.o.o. Mrkonjić Grad, 01-02.1-4893/22. 04.07.2022.	811.919	587.790	U toku
			Nadzor	25.000	18.500	INK Constructor d.o.o. Banja luka, 01-02.1-7125/22, 02.08.2022.	18.252	10.951	
			Ukupno					598.741	
25.	M4	Zamjena dilatacija na mostu preko rijeke Spreče (M4-010-133) na cesti M4, dionica Donja Orahovica – Šiški Brod 1 km 11+083, Sižje (M 04.0-3-10)	Izvođenje	110.000	130.000	Sikra d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-6817/22, 01.08.2022.	129.438	-	U toku
			Nadzor	4.000	3.200	Trasa d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-7614/22, 23.08.2022.	3.131	-	
			Ukupno					-	
26.	M18	Zamjena dilatacija na mostu preko rijeke Stupčanice (M18-008-162), na cesti M18, dionica Vitalj – Olovo km 18+242, Olovske Luke (M 18.0-2-30-b)	Izvođenje	120.000	147.500	Sikra d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-6817/22, 01.08.2022.	147.150	-	U toku
			Nadzor	4.000	2.300	Trasa d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-7614/22, 23.08.2022.	2.237	-	
			Ukupno					-	
27.	M18	Zamjena dilatacija na mostu preko rijeke Stupčanice (M18-008-163), na cesti M18, dionica Vitalj – Olovo km 18+503, Olovske Luke (M 18.0-2-30-c)	Izvođenje	120.000	147.500	Sikra d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-6817/22, 01.08.2022.	147.150	-	U toku
			Nadzor	4.000	2.300	Trasa d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-7614/22, 23.08.2022.	2.237	-	
			Ukupno					-	
28.	M14	Rekonstrukcija mosta preko željezničke pruge Bihać-Bosanski Novi, Kostela (M14-002-51) dionica Srbijani-Bos. Krupa 1, km 5+171	Projektiranje	-	3.800	GP Trasa d.o.o. Sarajevo i Divil d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-13063/19. 08.11.2019.	16.408 (preneseno 3.744)	3.744	Okončano
			Revizija	-	2.000	Design&QC d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-7107/20. 08.07.2020.	1.989	-	
			Ukupno					3.744	
29.	M18	Sanacija mosta preko Ujića rijeke u Kladnju (M18-008-71) dionica Vitalja-Olovo, km 2+405	Projektiranje	-	4.700	GP Trasa d.o.o. Sarajevo i Divil d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-13063/19 08.11.2019.	20.058 (preneseno 4.680)	4.680	Okončano
30.	M5	Sanacija mosta preko suhe doline, Mjedenica, obilaznica Sarajevo (M5-016-426) dionica A.Šaćirbegović-Korija-Ljubogošta, km 3+511	Projektiranje	-	3.800	GP Trasa d.o.o. Sarajevo i Divil d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-13063/19 08.11.2019.	17.082 (preneseno 3.744)	3.744	Okončano
			Revizija	-	2.000	Design&QC d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-7107/20. 08.07.2020.	1.989	-	
			Ukupno					3.744	
31.	M1.8	Sanacija mosta preko rijeke Tinje u Donjoj Potpeći (M1.8-004-114) dionica Srebrenik – Šiški Brod 3, km 10+709	Projektiranje	-	3.800	GP Trasa d.o.o. Sarajevo i Divil d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-13063/19 08.11.2019.	15.032 (preneseno 3.744)	3.744	Okončano
			Revizija	-	2.000	Design&QC d.o.o. Sarajevo,	1.989	-	

JP CESTE FEDERACIJE BIH

						01-02.1-7107/20. 08.07.2020.			
			Ukupno					3.744	
32.	M16	Rekonstrukcija mosta preko potoka Komotin u Podmilačju (M16-006-246) dionica Crna Rijeka – Jajce Jug, km 18+285	Projektiranje	-	4.500	IG d.o.o.Banja luka, 01-02.1-8060/20. 10.08.2020.	9.957 (preneseno 4.446)	-	U toku
			Revizija	-	750	Infra d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-2144/21. 24.02.2021.	1.500 (preneseno 750)	-	
			Ukupno					-	
33.	M4	Rekonstrukcija mosta preko Lohinske rijeke u Donjoj Lohinji (M4-009-504) dionica Doboj - Donja Orahovica, km 23+498	Projektiranje	-	4.700	IG d.o.o.Banja luka, 01-02.1-8060/20. 10.08.2020.	11.326 (preneseno 4.680)	-	U toku
			Revizija	-	750	Infra d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-2144/21. 24.02.2021.	1.500 (preneseno 750)	-	
			Ukupno					-	
34.	M 18.1	Rekonstrukcija mosta preko Crne rijeke, Garež (M18.1-001-448) dionica Ustikolina-Grebak-Delijaš-Trnovo, km 46+237	Projektiranje	-	4.500	IG d.o.o.Banja luka, 01-02.1-8060/20. 10.08.2020.	9.957 (preneseno 4.446)	-	U toku
			Revizija	-	750	Infra d.o.o. Sarajevo 01-02.1-2144/21. 24.02.2021.	1.500 (preneseno 750)	-	
			Ukupno					-	
35.	M1.8	Zamjena dilatacione naprave na obalnom stubu broj 18 (OS18), most M1.8-001-62 preko rijeke Save u Orašju na cesti M1.8, dionica Gran. BH/HR (Županja) – Lončari, km 0+000 (M 01.8-1-01)	Nadzor	-	3.700	Ipsa Institut d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-7166/21. 30.06.2021.	3.717	3.717	Okončano u 2021. (nije situirano)
36.	M17	Zamjena dilatacionih naprava naprave na obalnim stubovima broj 1 i 5, most (M17-006-195) preko rijeke Bosne u Želečoj, Bosna I, na cesti M17, dionica Ozimica-Topčić polje, km 12+506 (M 17.0-2-14)	Nadzor	-	3.700	Ipsa Institut d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-7166/21. 30.06.2021.	3.693	3.693	Okončano u 2021. (nije situirano)
37.	M17	Zamjena dilatacionih naprava naprave obalnom stubu broj 1 i stubu 6 most M17-006-196 preko rijeke Bosne u Donjoj Golubinji, Bosna II, na cesti M17, dionica Ozimica-Topčić polje, km 13+681 (M 17.0-2-15)	Nadzor	-	3.700	Ipsa Institut d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-7166/21. 30.06.2021.	3.693	3.693	Okončano u 2021. (nije situirano)
38.	M5	Rekonstrukcija mosta (M5-010-290) preko Oboračke rijeke, na cesti M5, dionica Donji Vakuf 1 – Turbe, km 4+577	Projektiranje	-	13.000	GP: PPG d.o.o. Sarajevo i Routing d.o.o. Banja luka, 01-02.1-1939/21. 18.02.2021.	13.010	13.010	Okončano
39.	M5	Rekonstrukcija mosta (M5-010-291) preko Oboračke rijeke, na cesti M5, dionica Donji Vakuf 1 – Turbe, km 4+687	Projektiranje	-	13.000	GP: PPG d.o.o. Sarajevo i Routing d.o.o. Banja luka, 01-02.1-1939/21. 18.02.2021.	13.011	13.011	Okončano
40.	M16	Sanacija/rekonstrukcija mosta preko rijeke Vrbas (M16-007-259) u Donjem Vakufu, dionica Donji Vakuf 1- Bugojno, km 0+089	Revizija	-	2.400	Trasa d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-10016/21 05.10.2021.	2.340	2.340	Okončano
		UKUPNO		5.391.800	6.390.150			2.708.785	

Napomena: Redni broj: 28-31 i 35-40- konsultanti fakturirali usluge u 2022.godini, koje su okončane 2021.

JP CESTE FEDERACIJE BIH

3.1.4.2. Sanacija klizišta, odrona, sanacija slijeganja trupa puta, kosina, usjeka i zasjeka

Red. Br.	Mag. Cesta	Naziv i opis projekta	Aktivnosti na projektu	Plan 2022.	Rebalans Plana 2022.	Izvođač/ konsultant- ugovor	Ugovoreno	Realizovano 2022.	Napomena								
1.	M17	Sanacija slijeganja i izdizanja trupa ceste petlja Blatuša, Zenica	Projektovanje	27.500	27.500	Design&QC d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-503/21. 14.01.2021.	27.495	27.495	Okončano								
2.	M5	Sanacija slijeganja trupa ceste, M-5_016, dionica: Azize Saćirbegović – Korija, km 1+450	Revizija	3.000	-	-	-	-	Ne treba								
3.	M17	Sanacija škarpe zasjeka cesta M16.2, dionica 002 na potezu od km 13+000 – 15+150	Revizija	3.000	-	-	-	-	Ne treba								
4.	M 16.2	Sanacija slijeganja trupa ceste, cesta M17_013, dionica:Jablanica 1-Potoci, km 1+400 i km 2+600	Revizija	3.000	-	-	-	-	Ne treba								
5.	M1.8	Sanacija slijeganja trupa ceste i rješavanje odvodnje na dionici_003: Pelagićevo –Srebrenik, lokacija Blaževac	Revizija	3.000	-	-	-	-	Ne treba								
6.	M 16.4	Sanacija slijeganja trupa ceste, dionica: Bugojno – Nević polje, km 22+900	Izvođenje	200.000	200.000	-	-	-	Potrebna saglasnost za ulazak u posjed od strane ŠP								
			Nadzor	7.000	7.000	-	-	-									
			Ukupno					-									
7.	M18	Sanacija slijeganja trupa ceste na M18_010 Semizovac-Sarajevo-Malta, km 10+880	Revizija	3.000	-	-	-	-	U toku								
			Izvođenje	300.000	389.000	HP Investing d.o.o.Mostar, 01-02.2-5259/22, 15.07.2022.	388.227	215.687									
			Nadzor	15.000	8.000	GF Sarajevo, 01-02.2-3959/22. 31.05.2022.	8.073	4.440									
			Ukupno					220.127									
8.	M4.3	Sanacija klizišta cesta M4.3_001, dionica : Velika Kladuša_Radića most, km 8+130	Izvođenje	200.000	198.000	Kov-grad d.o.o. Mrzovac Bužim 01-02.2-3958/22. 31.05.2022.	197.597	197.595	Okončano								
			Nadzor	7.000	7.000	Arting BH d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-4056/22. 03.06.2022	6.962	6.961									
			Ukupno					204.556									
9.	M5	Sanacija slijeganja trupa ceste na M5_016 dionica: Azize Šećerbegović-Korija-Ljubogošća, km1+450	Izvođenje	220.000	252.000	Grakop d.o.o. Kiseljak, 01-02.2-5466/22, 25.07.2022.	251.786	251.784	Okončano								
			Nadzor	7.000	7.000	Arting BH d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-8042/22, 12.09.2022.	6.903	6.903									
			Ukupno					258.687									
10.	Izrada projektne dokumentacije za novonastale sanacije slijeganja, klizišta i škarpi		Projektovanje	100.000	100.000	Design&QC d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-1578/22. 02.03.2022.	6.786	6.786	Okončano								
	M18	- Sanacija škarpe dionica 010: Semizovac-Sarajevo-Malta, km 2+100								INK Konstruktor d.o.o. Banja luka 01-02.2-2409/22. 04.04.2022.	15.678	-	U toku				
	M1.8	- Sanacija slijeganja trupa ceste na M1.8_001, dionica Granica Republike Hrvatske-Granica entiteta, km 0+300															
	M18	- Revizija programa geološko-geotehničkih ispitivanja cesta M18_007 dionica:Živinice-Vitalj												Design & QC d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-12043/22, 19.12.2022.	6.786	-	U toku
	M16	- Sanacija potporne konstrukcije i slijeganja trupa ceste na M16 diionica: Bugojno-Kupres, km12+600															

JP CESTE FEDERACIJE BIH

			Ukupno					6.786	
		UKUPNO		1.098.500	1.195.500			717.651	

3.1.4.3. Sanacija oštećenih asfaltnih kolovoza

Red br.	Mag. Cesta	Naziv i opis projekta	Aktivnosti na projektu	Plan 2022.	Rebalans Plana 2022.	Izvođač/kosultant-ugovor	Ugovoreno	Realizovano 2022.	Napomena
1.	M14	Sanacija asfaltnog kolovoza M14_002: Srbijani – Bosanska Krupa sa uređenjem i zaštitom škarpi zasjeka L = 8,0 km	Izvođenje	400.000	358.000	Kov-Grad d.o.o. Bužim, 01-02.2-9786/21. 28.09.2021.	399.964 (preneseno 358.026)	358.002	Okončano
			Nadzor	7.000	7.000	Geofeld d.o.o. Bihać, 01-02.2-10500/21. 20.10.2021.	6.903	6.903	
			Ukupno					364.905	
2.	M4.2	Sanacija asfaltnog kolovoza M4.2 Skokovi –Srbijani, dionica 002	Izvođenje	300.000	200.000	I-Selimović d.o.o. Cazin, 01-02.2-1501/22. 24.02.2022.	198.900	198.899	Okončano
			Nadzor	7.000	7.000	Trasa d.o.o. Sarajevo, 0102.2-1981/22. 16.03.2022.	7.018	7.018	
			Ukupno					205.917	
3.	M16.2	Rehabilitacija magistralne ceste M-16.2, dionica: Gornji Vakuf-Prozor	Projektovanje	20.000	17.000	Design&QC d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-1602/22. 02.02.2022.	16.848	16.848	Okončano
4.	M4	Sanacija oštećenog asfaltnog kolovoza, dionica: Donja Orahovica-Šićki Brod I	Projektovanje	5.900	5.900	Arting d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-9282/21. 13.09.2021.	5.850	5.850	Okončano
5.	M4	Sanacija asfaltnog kolovoza na cesti M4_009 Doboj – Donja Orahovica	Izvođenje	322.000	333.000	Rial-Sped d.o.o. Klokotnica, 01-02.2-9184/22. 20.10.2022.	332.750	-	Zbog zimskih uslova prolongirani radovi za proljeće 2023.
			Nadzor	7.000	7.000	IG d.o.o.Banja luka 01-02.2-12058/21. 08.12.2021.	5.441	-	
			Ukupno					-	
6.	M18	Sanacija asfaltnog kolovoza na cesti M18_007 Živinice 1-Vitalj	Izvođenje	336.000	336.000	Jata Group d.o.o. Srebrenik, 01-02.2-8922/22, 11.10.2022.	335.999	335.999	Okončano
			Nadzor	7.000	7.000	Design&QC d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-10215/21. 12.10.2021.	6.143	6.142	
			Ukupno					342.141	
7.	M18	Sanacija asfaltnog kolovoza na cesti M18_008 Vitalj-Olovo	Izvođenje	317.000	317.000	Jata Group d.o.o. Srebrenik, 01-02.2-8923/22, 11.10.2022.	316.997	316.997	Okončano
			Nadzor	7.000	7.000	Modus Projekt d.o.o.Kakanj, 01-02.2-10680/21. 25.10.2021.	6.581	6.581	
			Ukupno					323.578	
8.	M6	Sanacija asfaltnog kolovoza na cesti M6_003 Tasovčići-Masline	Izvođenje	350.000	345.000	KTM Brina d.o.o. Posušje, 01-02.4-785/22. 28.01.2022.	344.946	343.324	Okončano
			Nadzor	7.000	1.800	Ipsa Institut d.o.o. Sarajevo, 01-02.4-1874/22. 14.03.2022.	1.743	1.743	
			Ukupno					345.068	
9.	M20	Sanacija asfaltnog kolovoza na cesti	Izvođenje	250.000	250.000	Goraždeputevi d.d. Goražde,	249.992	249.979	Okončano

JP CESTE FEDERACIJE BIH

		M20_008 Ustikolina-Goražde 8				01-02.2-11093/21. 05.11.2021.			
			Nadzor	6.000	6.000	Artimg d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-210/2022. 07.01.2022.	5.993	5.992	
			Ukupno					255.971	
10.	M14.2	Sanacija asfaltnog kolovoza na cesti M14.2 Domaljevac-Orašje	Izvođenje	61.000	61.000	Roadimg d.o.o. Gračanica, 01-02.2-9634/22, 28.10.2022.	60.637	60.586	Okončano
			Nadzor	3.100	3.100	Trafficon d.o.o. Odžak, 01-02.2-9182/22. 20.10.2022.	3.101	3.101	
			Ukupno					63.687	
11.	M4	Sanacija asfaltnog kolovoza na M4 ulaz u Lukavac	Izvođenje	600.000	600.000	Roadimg d.o.o. Gračanica, 01-02.2-6189/22, 27.08.2022.	599.614	599.561	Okončano
			Nadzor	7.000	4.000	Artimg BH d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-5686/22, 27. 07. 2022	3.737	3.737	
			Ukupno					603.298	
12.	M5	Sanacija asfaltnog kolovoza na cesti M5 Jajce jug-Donji Vakuf , Komar	Izvođenje	400.000	400.000	Jata Group d.o.o. Srebrenik, 01-02.2-4927/22, 05.07.2022.	399.992	399.992	Okončano
			Nadzor	7.000	7.000	Artimg BH d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-4723/22. 28.06.2022.	6.997	6.997	
			Ukupno					406.988	
13.	M17	Sanacija asfaltnog kolovoza na M 17, dionica:005: Karuše-Ozimica-Topčić polje	Izvođenje	400.000	316.000	Dobojputevi d.d. Doboj jug, 01-02.2-4387/22. 14.06.2022.	315.900	315.899	Okončano
			Nadzor	7.000	6.600	Modus projekt d.o.o. Kakanj, 01-02.2-5134/22, 12.07.2022.	6.552	6.552	
			Ukupno					322.451	
14.	M17.5	Sanacija asfaltnog kolovoza na cesti M17.5 Posušje –Jablanica, dionica: Jablanica – Sovićka Vrata	Izvođenje	600.000	600.000	HP Investing d.o.o. Mostar, 01-02.2-4588/22. 21.06.2022.	599.096	598.612	Okončano
			Nadzor	15.000	7.000	Artimg BH d.o.o. Sarajevo, 01-02.4-4751/22. 28.06.2022.	6.985	6.985	
			Ukupno					605.597	
15.	M17	Sanacija asfaltnog kolovoza, dionica:006: Ozimica –Topčić Polje- Lašva 0	Izvođenje	300.000	300.000	Dobojputevi d.o.o. Doboj Jug, 01-02.2-5365/22, 20.07.2022.	299.030	299.029	Okončano
			Nadzor	7.000	7.000	Aik-Inžinjeri d.o.o. Banovići, 01-02.2-5362/22, 19.07.2022.	3.276	3.276	
			Ukupno					302.305	
16.	M17.5	Sanacija asfaltnog kolovoza, dionica: Posušje-Grude	Izvođenje	350.000	383.000	KTM-Brina d.o.o. Posušje, 01-02.2-5511/22, 26.07.2022.	382.401	382.385	Okončano
			Nadzor	7.000	7.000	IGH d.o.o. Mostar 01-02.2-7339/22, 11.08.2022.	6.896	6.896	
			Ukupno					389.281	
17.	M15	Sanacija asfaltnog kolovoza, dionica: Livno-Šujica	Izvođenje	200.000	200.000	Livnopitevi d.o.o. Livno, 01-02.2-3797/22, 12.08.2022.	199.398	199.349	Okončano
			Nadzor	4.000	4.000	Edi-ing d.o.o. Donji Vakuf, 01-02.2-5212/22, 14.07.2022.	2.801	2.801	

JP CESTE FEDERACIJE BIH

			Ukupno					202.150	
18.	M17.3	Sanacija asfaltnog kolovoza, dionica:Buna-Masline	Izvođenje	400.000	220.000	Putovi d.o.o. Grude, 01-02.4-6436/22, 29.07.2022.	219.497	219.463	Okončano
			Nadzor	7.000	6.400	IGH d.o.o.Mostar 01-02.4-7367/22, 12.08.2022.	6.336	6.336	
			Ukupno					225.799	
19.	M18	Sanacija asfaltnog kolovoza, dionica: Živinice -Husino	Izvođenje	500.000	500.000	Jata group d.o.o. Srebrenik, 01-02.2-4926/22, 05.07.2022.	499.991	499.991	Okončano
			Nadzor	7.000	7.000	Arting BH d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-4720/22, 28.06.2022.	6.997	6.997	
			Ukupno					506.988	
20.	M14.2	Sanacija asfaltnog kolovoza – prolaz kroz Orašje	Izvođenje	400.000	400.000	Roading d.o.o. Gračanica, 01-02.2-4722/22, 28.06.2022.	399.563	391.568	Okončano
			Nadzor	7.000	6.300	GP: Trafficon d.o.o. Odžak i Trafficon d.o.o. Zagreb, 01-02.2-4721/22, 28.06.2022.	6.318	6.318	
			Ukupno					397.886	
21.	M6	Sanacija asfaltnog kolovoza – Obilaznica Posušja	Izvođenje	300.000	316.000	KTM-Brina d.o.o. Posušje 01-02.2-5210/22, 14.07.2022.	315.829	315.693	Okončano
			Nadzor	7.000	7.000	Integra d.o.o. Mostar, 01-02.2-5211/22, 14.07.2022.	6.997	6.997	
			Ukupno					322.690	
22.	M5	Sanacija asfaltnog kolovoza na cesti M5, Ključ –Bos.Petrovac	Izvođenje	400.000	400.000	Behić Sanny boy d.o.o. Bihać, 01-02.2-7764/22, 30.08.2022.	399.541	399.537	Okončano
			Nadzor	7.000	7.000	Arting BH d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-7313/22, 10.08.2022.	6.996	6.996	
			Ukupno					406.534	
		UKUPNO		7.352.000	6.980.100			6.615.932	

3.2. Planirani projekti

3.2.1. Projekti rekonstrukcije i izgradnje

Red. Br.	Mag. Cesta	Naziv i opis projekta	Aktivnosti na projektu	Plan 2022.	Rebalans Plana 2022.	Izvođač/ konsultant-ugovor	Ugovoreno	Realizovano 2022.	Napomena
1.	M18	Rekonstrukcija ceste M18, dionica Kladanj-Podpaklenik – u ukupnoj dužini cca 3,50km Glavni projekat trase i idejni projekat objekata -dionica 1 (LOT 1) Kladanj-Karaula, -dionica 2 (LOT 2) Karaula –Olovo	Projektiranje	100.000	120.000			-	Tender poništen, u pripremi drugi tender
			Revizija	10.000	10.000			-	
2.	M18	Izrada idejnog rješenja sa vrednovanjem varijanta za poboljšanje elemenata na cesti M18, dionica Stupari – Vitalj L=14km	Projektiranje	100.000	-			-	Rebalansom nije planirano
3.	M6	Izgradnja ceste M6 Grude –Ljubuški -Izrada idejnog rješenja trase na poddionici Grljevići-veza na M17.4 (Cerno)-most Miletina (cca 18 km) i	Projektiranje	100.000	130.000			-	Tender poništen, u pripremi drugi tende
			Revizija	5.000	10.000			-	

JP CESTE FEDERACIJE BIH

		-izrada glavnog projekta trase Cerno-most Miletina (L=cca3km)							
4.	M4.3	Izgradnja obilaznice Bužima (završetak radova)	Izvođenje	1.600.000	1.790.000	Kov-grad d.o.o.Bužim, 01-02.2-8989/22, 12.10.2022.	1.789.047	200.049	U toku
			Nadzor	45.000	45.000	GP Geo Feld d.o.o Bihać, PPG d.o.o. Sarajevo, FM Inžinjering d.o.o. Sarajevo, Geo Feld d.o.o. Bihać,	21.645	-	
			Ukupno					200.049	
5.	M6	Izgradnja Južne obilaznice Gruda – Izlaz Prispa (izgradnja kraka prema Ljubuškom)	Izvođenje	800.000	900.000	Putovi d.o.o.Grude 01-02.1-12350/22 28.12.2022.	822.510	-	Čeka ugovor za nadzor
			Nadzor	18.000	25.000			-	
			Ukupno					-	
6.	M17	Revizija glavnog projekta petlje Drivuša i izrada separata za saglasnosti i dozvole	Revizija	10.000	10.000			-	
7.	Pribavljanje saglasnosti, eleborata i dozvola za projekte iz Programa „Modernizacija cesta u F BiH“ i za druge projekte		Ostalo	500.000	500.000				
	M17	Nabavka i ugradnja stabilne opreme za gašenje požara u tunelu Vranduk II				Granulo-Re d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-7776/22, 31.08.2022.	114.210	114.209	
	M5	Elaborat o istražnim radovima Spajanje M5_002 Bihać4_Ripač sa M14 Bihać4-Srbljani				RGG Inženjering d.o.o.Velika Kladuša, 01-02.2-8489/22, 27.09.2022.	1.900	1.900	
						Naknada, Taksa	603	603	
	M17	Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok ulaz u Hadžiće				Divel d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-8451/22, 26.09.2022..	1.755	-	
						Trasa d.o.o. Sarajevo 01-02.2.4014/22, 02.06.2022.	3.510	3.510	
	M16	Studija o monitoringu rijeke Vrbas za potrebe vodne saglasnosti-most Vrbas-Zdaljevac - Dodatne konsult usluge za izradu idejnog i glavnog projekta				Sendo d.o.o Sarajevo 01-02.1-9358/22. 24.10.2022.	1.170	1.170	
						GP: Design&QC d.o.o.Sarajevo i Infra d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-11676/22, 07.12.2022.	5.909	5.908	
	M17	Tunel Vranduk II na M17, dionica:Topčić polje –Lašva,				Tehnozaštita d.o.o. Mostar 01-02.1-10741/22, 21.11.2022.	6.962	6.962	
						Teh. pregled	24.341	24.341	
		Rekonstrukcija mosta preko Koševskog potoka u Sarajevu, Skenderija				ASI Inžinjering d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-11404/22. 01.12.2022.	5.499	-	
						Taksa,	132	132	
						Euroing d.o.o. Bihać, 01-02.1-10024/22. 07.11.2022.	4.914	-	
	M14	Obilaznica Bihaća: - Elaborat za vodnu saglasnost - Elaborat zaštite od požara				ZT Tehnizaštita d.o.o.Sarajevo, 0168,10.10.2022.	468	468	
						PPG d.o.o.Sarajevo 01-02.1-12246/22. 23.12.2022.	2.574		
M18	- Izrada izvoda iz glavnog projekta „Rekonstrukcija mosta u Poturovićima, Olovo – Semozovac,km31+567	ZT Tehnizaštita d.o.o Sarajevo	948						
		Design&QC d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-12167/22. 21.12.2022.	3.510	-					
M6	Izmjene glavnog projekta- Izgradnja obilaznice Ljubuškog (spoj M6 i M17.4)	AIK Inžinjering d.o.o. Banovići, 01-02.1-11976/22. 15.12.2022.	3.510	3.510					

JP CESTE FEDERACIJE BIH

M14.2	Projektovanje rasvjete kružne kaskrsnice u Odžaku				ATS d.o.o.Sarajevo 01-02.1-12112/22, 20.12.2022.	5.733	-
M5	Treća traka Ripač-Vrtoče - Elabarat zaštite na radu - Revizija glavnog projekta saobraćajno teh.opreme				Naknada	114	114
M5	Revizija projektne dokumentacije za vodnu saglasnost, spajanje M5 Bihać-Ripač sa M14 Bihać4-Srbljani - Elabarat zaštite na radu - Prethodna procjena uticaja na okoliš				ZT Tehnozaštita d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-313/22. 12.01.2022.	585	585
M5	Rekonstrukcija raskrsnice M17 i lokalne ceste za Orahovicu, općina Konjic,-izrada saobrać.projekta i revizija hidro faze glavnog projekta				Divel d.o.o.Sarajevo 01-02.2-1231/22. 14.02.2022.	2.000	2.000
M17	Rekonstrukcija raskrsnice M17 i lokalne ceste za Orahovicu, općina Konjic,-izrada saobrać.projekta i revizija hidro faze glavnog projekta				PPG d.o.o.Sarajevo 01-02.2-314/22. 12.01.2022.	1.000	1.000
M4	Rekonstrukcija raskrsnice u Gornjoj Kalesiji - Revizija studije za dobijanje vodnje saglasnosti - Izrada studije za dobijanje prethodne vodne saglasnosti - Revizija glavnog projekta zaštite od požara i IG Elaboraata - Elabarat zaštite od požara				Tehnizaštita d.o.o. Sarajevo	585	585
M6	Rekonstrukcija raskrsnice cesta M6 i R427 ulaz u Stolac: - Izrada projekta rješenja sa elektro energetskom mrežom - Izrada hirodotehničkog i saobraćajnog dijela glavnog projekta - Revizija elaborata o inženjerskogeološkim karakteristikama - Revizija saobraćajnog dijela projekta, izmjještanja elektro i telekom instalcija - Izrada elaborata o inženjerskogeološkim i geotehničkim karakteristikama terena - Izrada glavnog projekta zaštite od požara sa kontrolom i elaborata zaštite na radu - Revizija elektrotehničkog projekta rasvjete				JV:T3 Consulting Tim d.o.o Sarajevo i Projekat a.d. Banja luka, 01-02.2-2558/22. 07.04.2022.	6.692	6.692
M14	Izrada zahtjeva za prethodnu procjenu utjecaja na okoliš za: - rekonst.mosta preko Suhe rijeke u Stuparima, km16+426 - rekonstr ceste M14 Brekovica, most Una km 7+830, - rekonst mosta M18 preko nepoznatog potokau Poturovićima, km 31+567-				Ipsa Institut d.o.o. Sarajevo, 01-02.4-1477/22. 24.02.2022.	2.106	2.106
M18	Izgradnja dionice Šićki brod-Đurđevik, na trasi Tuzla-Sarajevo -Izrada zahtjeva za prethodnu procjenu utjecaja na okoliš - Izrada eleborata o izvršenim				ZT Tehnozaštita Taksa	1.020	1.020
M18					ASI Inženjering d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-2062/22. 21.03.2022.	2.340	2.340
M18					ASI Inženjering d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-2189/22. 24.03.2022.	1.521	1.521
M18					PPG d.o.o. Sarajevo 01-02.2-1870/22. 11.03.2022.	1.170	1.170
M18					Taksa ZT Tehnozaštita	1.183	1.183
M18					Manedra-Company d.o.o.Mostar, 01-02.1-1611/22. 03.03.2022.	1.170	1.170
M18					Saraj Inženjering d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-1974/22. 15.03.2022.	995	995
M18					Integra d.o.o.Mostar, 01-02.1-1905/22. 14.03.2022.	1.147	-
M18					Habitat d.o.o.Mostar, 01-02.1-1965/22. 15.03.2022.	1.200	1.200
M18					Design&QC d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-1904/22. 14.03.2022.	3.510	3.510
M18					ZT Tehnozaštita d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-4345/22. 13.06.2022.	1.697	1.697
M18					Habitat d.o.o.Mostar, 01-02.1-4573/22.	585	-
M18					Taksa, Naknada	10.359	10.359
M18					GFUS Institut za hidrotehniku i okolišno inženjerstvo, 01-02.1-2089/22. 21.03.2022.	2.457	2.457
M18					JV:T3 Consulting TIM d.o.o.Sarajevo i Projekat a.d. Banja luka, 01-02.1-1937/22. 15.03.2022.	6.763	6.763

JP CESTE FEDERACIJE BIH

		preventivnim arheološkim istraživanjima			Ecoplan d.o.o. Mostar, 01-02.1-789/22. 28.01.2022.	6.903	6.903
	M17	Snimanje i izrada geodetske situacije na lokalitetu Gradište kod tunela Crnaje			Naknada	8.431	8.431
	M20	Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok Goražde-Ustiprača km0+550- misija G21 i plan upravljanja građevinskim otpadom			Geobiro d.o.o. Konjic 01-02.1-2719/22. 13.04.2022.	1.755	1.755
	M5	Rekonstrukcija cesta Gromiljak-Blažuj, poddionica Kiseljak-Han Ploča - Separat glavnog projekta saobraćajne opreme i signalizacije, - Separat glavnog projekta odvodnje			Design&QC d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-3212/22. 29.04.2022.	4.095	4.095
	M5	Izrada glavnog projekta korekcije kružne raskrsnice R4 Donji Vakuf			Design&QC d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-3105/22. 26.04.2022.	7.020	7.020
	M16.4	Revizioni izvještaj hidrofaze za glavni projekat Obilaznice Bugojno			Arting BH d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-2805/22. 15.04.2022.	3.744	3.744
	M5	Revizioni izvještaj hidrofaze i faze saobraćajne opreme i signalizacije za glavni projekat rekonstrukcije raskrsnice M5 Kiseljak-Han ploča			Sendo d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-2718/22. 13.04.2021.	2.574	2.574
	M16	Rekonstrukcija mosta preko rijeke Vrbas u Donjem Vakufu, km 0+089 - Izrada Studije o monitoringu rijeke Vrbas i hidrotehničke faze glavnog projekta za vodnu saglasnost			Taksa, Naknada	310	310
	M4.2	Izgradnja Obilaznice Cazin			Encos d.o.o. Sarajevo, Studija	2.048	2.048
					Ipsa Institut - Naknada	960	11.809
					Naknada	10.849	
					Saglasnost	705	705
	M18	Sanacija mosta preko nepoznatog potoka u Poturovićima, dionica: Olovo-Semizovac, km31+567 - Izrada geotehničkog elaborata misije G1 i plana upravljanja građ. otpadom			Design&QC d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-3574/22. 17.05.2022.	2.340	2.340
					Taksa	36	36
	M17.4	Rekonstrukcija raskrsnice u naselju Zalik, grad Mostar - revizija glavnog projekta Izrada idejnog rješenja rekonstrukcije raskrsnice sjeverni ulaz u Mostar - Izrada elaborata o brojanju saobraćajaca i analize saobraćajnih tokova raskrsnice Sjeverni ulaz u Mostar - Vizualizacija projekta rekonstrukcije raskrsnice Sjeverni ulaz u Mostar			Integra d.o.o. Mostar, 01-02.1-4615/22. 23.06.2022.	2.340	-
					Design & QC d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-11358/22, 30.11.2022	6.786	-
					Design & QC d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-11357/22, 30.11.2022	6.786	-
					BN PRO d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-5369/22 .20.07.2022	7.008	7.008
					Naknada, Taksa	1.465	1.465
	M20	Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok, Goražde-Ustiprača km 0+550 - Studija za prethodnu vodnu saglasnost i Elaborat zaštićena radu			Euroing d.o.o. Bihać, 01-02.1-4346/22. 13.06.2022.	2.574	2.574
					Taksa, Saglasnost	130	130
	M5	Izrada pregleda preseljenja za EBRD – revizija			Enova d.o.o. Sarajevo 01-05.2-4607/22. 22.06.2022.	6.903	6.903
	M16.4	- Izgradnja Obilaznice Bugojno, - Izgradnja Obilaznice Kiseljak - Izgradnja Obilaznice Donji Vakuf			Enova d.o.o. Sarajevo 01-05.2-3324/22 09.05.2022.	6.961	6.961
	M17.3	Neum – Stolac, izgradnja dionice Broćanac – Papratnica, L= 3.025 km			Naknada, Taksa	26.397	26.397
	M17.3	Neum-Stolac, izgradnja dionice Stolovi-Drenovac L=8.300 km			Naknada, Taksa Komisija	33.903	33.903
	M5	Izgradnja brze ceste Lašva-nević Polje			Naknada, Taksa	2.635	2.635
	M5	Traka za spora vozila Kobiljača			Saglasnost, Tehn.pregled	3.835	3.835

JP CESTE FEDERACIJE BIH

M18	Traka za spora vozila Stupari -Vitalj				Naknada, saglasnost, Taksa	502	502
M5	Donji Vakuf – Turbe (Komar)				Naknada	540	540
M6.1	Mostar obilaznica – Izgradnja dionice Miljkovići – Rodoč (Tunel Novi)				Naknada	7.378	7.378
M16.4	Izgradnja Obilaznice Bugojna				Saglasnost	479	479
M15	Izgradnja Obilaznice Livno				Taksa	44	44
M14	Izgradnja Obilaznice Bihaća				Naknada	3.163	3.163
M5	Izgradnja Obilaznice Kiseljak				Naknada, Saglasnost	24.135	24.135
M4.3	Izgradnja obilaznice Bužim (II faza)				Naknada, Taksa	37.331	37.331
M16	Izgradnja mosta na rijeci vrbas- Zgaljevac km13+900, Crna rijeka-Jajce				Taksa, Saglasnost	118	118
M6	Izgradnja kružnog toka na izlazu Prispa, na dionici: Gorica-Vitina, općina Grude, I faza				Saglasnost, Taksa, Naknada	1.546	1.546
M18	Dogradnja petlje Šiški Brod				Naknada, Oglasi	57.851	57.851
M17.3	Izgradnja tunela „Žaba“				Naknada	35	35
M4	Izgradnja kružnog toka ulaz u Lukavac				Taksa, Saglasnost	150	150
M16	Izgradnja raskrsnice ili treće trake: Donji Vakuf-Bugojno-Kupres (naselje Čipuljić-Poriće)				Taksa	268	268
M16.2	Rekonstrukcija raskrsnice Duge –općina Prozor				Saglasnost	75	75
M4	Rekonstrukcija raskrsnice- ulaz u Jelah				Naknada	35	35
M14	Rekonstr ceste M14 Brekovic,				Taksa, elaborat ZT Tehnozaštita Naknada	711	711
M6.1	Rekonstrukcija raskrsnice za Blagaj, km 2+000				Naknada	150	150
M17	Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok skretanje Hadžići				Naknada, Taksa, Saglasnost,	1.046	1.046
M18	Rekonstrukcija i dogradnja potputnjaka na M18 u Zivinicama - kompletiranje idejnog projekta za dobijanje urbanističke saglasnosti				PPG d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-1870/22. 11.03.2022.	585	585
M1.9	Rekonstrukcija raskrsnice na M1.9 sa R463				Saglasnost, Naknada	60	60
M15	Rekonstrukcija mosta Krbava, Kamičak-Ključ				Taksa, Naknada	190	190
M18	Rekonst.mosta preko Suhe rijeke u Stuparima, km16+426				Saglasnost	917	917
M6	Ulaz u Stolac (Vidovo Polje, veza na M 6) L=1,3 km				Naknada ZT Tehnozaštita	907	907
M18	Rekonstrukcija ceste Tuzla-Sarajevo,				Saglasnost, Naknada	15.621	15.621
M5	Rasvjeta raskrsnice na magistralnoj cesti M5 u naselju Pudin Han				Consulting Tim, 01-02.1-12374/21. 17.12.2022.	6.997	6.997
M17	Rasvjeta tunela Vratnik				Naknada, Saglasnost	1.587	1.587
M17	Nemila 0 – Lašva 1 – most preko rijeke Bosne, Zenica				Saglasnost	35	35
M4	Sanacija/rekonstrukcija mosta preko rijeke Jale u Siminom Hanu, dionica 012, Sinim Han-Donje Caparde 3 km 0+214				Tehnički pregled Taksa	4.818	4.818
M14.2	Sanacija mosta M14.2-004-494 preko rijeke Unac u Drvaru, na cesti M14.2, dionica Pasjak-Resanovci, km 7+035				Saglasnost	16	16
M16.2	Sanacija tunela Jasen, dionica:Bugojno-Jablanica, km 17+686				Naknada, Saglasnost	268	268
M17.3	Izgradnja ceste Neum-Stolac				Naknada, Tehnički pregled	3.293	3.293
M6	Južna obilaznica Gruda (I faza)				Naknada	1.457	1.457
M17.4	Neum – Stolac , izgradnja dionice Hutovo-Cerovica L=4.475 km				Taksa- Općina Grude	20.138	20.138
M18	Olovo – Semizovac – rekonstrukcija škarpi i spora traka Čevljanovići – Nišići				Taksa	25	25
M17	Izgradnja kružne raskrsnice Drivuša i Dolača				Naknada, taksa, troš.post.	23.522	23.522
					Saglasnost	145	145

JP CESTE FEDERACIJE BIH

	M20	Izgradnja Obilaznice Goražde				Naknada	3.144	3.144	
		Izgradnja Obilaznice Odžak				Naknada	65	65	
	M18	Rekonstrukcija raskrsnice na M18 010 Kobilja Glava-Sarajevo – Malta, km 8+340				Elaborat Tehnozaštita	702	702	
		Rekonstrukcija raskrsnice Azize Šaćirbegović- Korija				Saglasnost, Naknada	453	453	
	M18	Rekonstrukcija raskrsnice M18 i R455a Živinice				Saglasnost, Naknada	533	533	
		Rekonstrukcija raskrsnice sa pješačkom stazom u naselju Barice, općine Donji Vakuf- plan upravljanja otpadom				Saglasnost	177	177	
		Livno – Šuica – Kupres, Borova Glava-Trivunove krivine				Urbis centar d.o.o. Banja luka, 01-02.2-7779/22, 31.08.2022	819	819	
	M18	Rekonstrukcija ceste M18, dionica Kladanj- Podpaklenik –				Taksa	317	317	
	M17	Rasvjeta petlje Blatuša				Taksa	160	160	
	M4.2	Izgradnja obilaznice Cazina -Izrada idejnog projekta (izmještanja) raskrsnice Čizmići na projektu izgradnje Obilaznice Cazina				Tehnički pregled	2.992	2.992	
	M4.2	Izgradnja obilaznice Cazina -Izrada idejnog projekta (izmještanja) raskrsnice Kapići na projektu izgradnje Obilaznice Cazina				Geo-Feld d.o.o.Bihać 01-02.1-4572/22. 21.06.2022.	6.962	6.962	
						Geo-Feld d.o.o.Bihać 01-02.1-3950/22. 31.05.2022	6.961	6.961	
		Ukupno						594.184	
8.	M 17.6	Izrada idejnog rješenja rekonstrukcije (ili izgradnja) ceste M17.6, Dračevo-Hutovo_Ravno, dionica: Hutovo-Trnčina	Projektiranje	-	10.000			-	
		U K U P N O		3.288.000	3.550.000			794.233	

Napomena: red.br.2-ugovoreno u tabeli 3.1.1. tačka 22.

3.2.2. Rasvjeta i semaforizacija raskrsnica i tunela

Red. Br.	Mag. Cesta	Naziv i opis projekta	Aktivnosti na projektu	Plan 2022.	Rebalans Plana 2022.	Izvođač/ konsultant- ugovor	Ugovoreno	Realizovano 2022.	Napomena
1.	M14.1 M1.9	Rasvjeta raskrsnice cesta M14.1 i M1.9 u Gradačcu (kružni tok)	Projektovanje	4.000	4.000			-	Općina ustupila projekat prema kome je potrebno povećati budžet
			Izvođenje	120.000	250.000			-	
			Nadzor	2.500	2.500			-	
2.	M16	Rasvjeta raskrsnice cesta M16 i R413b, skretanje za Dobretiče, općina Jajce	Projektovanje	4.000	4.000	Manedra d.o.o. Mostar 01-02.2-10675/22, 18.11.2022.	3.896	-	
			Izvođenje	120.000	120.000			-	
			Nadzor	2.500	2.500			-	
			Ukupno					-	
3.	M16 M16.2	Rasvjeta raskrsnice cesta M16 i M16.2, općina Bugojno	Projektovanje	4.000	4.000	Manedra d.o.o. Mostar, 01-02.2-9003/22, 13.10.2022.	3.978	-	
			Izvođenje	120.000	120.000			-	
			Nadzor	2.500	2.500			-	
			Ukupno					-	
4.	M17	Rasvjeta raskrsnice na cesti M17, skretanje Brankovići, općina Žepče	Projektovanje	4.000	4.000	-	-	-	Ugovor za projekt. u pripremi
			Izvođenje	120.000	120.000	-	-	-	

JP CESTE FEDERACIJE BIH

			Nadzor	2.500	2.500	-	-	-	
5.	M17	Rasvjeta raskrsnice na cesti M17, skretanje Željezno polje	Projektovanje	4.000	4.000	ATS d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-9004/22, 13.10.2022.	3.966	-	U toku projekt.
			Izvođenje	120.000	120.000	-	-	-	
			Nadzor	2.500	2.500	-	-	-	
			Ukupno					-	
6.	M4.2	Rasvjeta raskrsnice na cesti M4.2, skretanje Mihaljevac, grad Cazin	Projektovanje	4.000	4.000	Manedra d.o.o. Mostar, 01-02.2-10676/22, 18.11.2022.	3.861	-	U toku projekt.
			Izvođenje	120.000	120.000	-	-	-	
			Nadzor	2.500	2.500	-	-	-	
			Ukupno					-	
7.	M6 M16.5	Rasvjeta raskrsnice cesta M6.1 i M16.5, Karlov Han, općina Livno	Projektovanje	4.000	4.000	Manedra d.o.o. Mostar, 01-02.2-9002/22, 13.10.2022.	3.896	-	U toku projekt.
			Izvođenje	120.000	120.000	-	-	-	
			Nadzor	2.500	2.500	-	-	-	
			Ukupno					-	
8.	M17	Sanacija semafora u Konjicu	Projektovanje	-	7.000	-	-	-	
9.	M17	Rasvjeta Ribičkog mosta, dionica: Konjic-Jablanica	Projektovanje	-	7.000	-	-	-	
		UKUPNO		885.500	1.029.500			-	

3.2.3. Poboljšanje sigurnosti prometa na magistralnim cestama izgradnjom traka za lijeva skretanja, pješačkih staza sa odvodnjom kišne kanalizacije, odmorišta i sanacija crnih tačaka

Red. Br.	Mag. Cesta	Naziv i opis projekta	Aktivnosti na projektu	Plan 2022.	Rebalans Plana 2022.	Izvođač/kosultant-ugovor	Ugovoreno	Realizovano 2022.	Napomena
1.	M14.1	Izgradnja pješačke staze uz cestu M14.1_008 Modriča - Gradačac 0	Izvođenje	160.000	180.000			-	Nabavka u toku
			Nadzor	4.500	4.500			-	
2.	M5	Dogradnja trake na petlji Koriya, M5: Šeherčehajin most-Koriya	Projektovanje	7.000	7.000			-	U toku ishodovanje odobranja za građenje
			Izvođenje	270.000	320.000			-	
			Nadzor	7.000	7.000			-	
3.	M6	Izgradnja i sanacija pješačke staze uz cestu M6_001 Gorica-Vitina	Izvođenje	150.000	150.000			-	Nabavka u toku
			Nadzor	4.500	-			-	
4.	M5	Izgradnja pješačke staze uz magistralnu cestu M5 u naselju Putiš	Izvođenje	140.000	160.000			-	Nabavka u toku
			Nadzor	4.000	4.000			-	
5.	M18	Rekonstrukcija raskrsnice cesta M18 i R455a u km 6+100, općina Živinice, naselje Maline	Izvođenje	400.000	400.000			-	U toku ishodovanje odobranja za građenje
			Nadzor	7.000	7.000			-	
6.	M17.3	Rješavanje odvodnje u Neumu (II faza)*	Projektovanje	5.000	-			-	Potpisan Sporazum o zajedničkoj implement. sa Općinom Neum Priprema
			Izvođenje	250.000	300.000			-	
			Nadzor	7.000	7.000			-	

JP CESTE FEDERACIJE BIH

									tend.dok.
7.	M18	Rekonstrukcija raskrsnice na cesti M18, skretanje Vogošća centar, općina Vogošća	Izvođenje	250.000	250.000			-	Potrebno rješavanje imov.pravn odnosa
			Nadzor	7.000	7.000			-	
8.	M16	Izgradnja pješačke staze u naselju Guber, općina Livno	Projektovanje	7.000	7.000			-	Priprema tend.dok.
			Izvođenje	150.000	150.000			-	
			Nadzor	7.000	7.000			-	
9.	M5	Sanacija pješačkih staza uz cestu M5 u naselju Nova Bila	Projektovanje	7.000	7.000	Arting BH d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-9889/22, 03.11.2022.	6.962	6.962	Okončano projektovanje Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi prolongirani za proljeće 2023.
			Izvođenje	250.000	180.000	Dobojputevi d.d. Doboj jug, 01-02.2-9360/22, 24.10.2022..	177.602	-	
			Nadzor	7.000	7.000	AIK Inženjering d.o.o.Banovići, 01-02.2-11839/22, 12.12.2022.	2.866	-	
			Ukupno					6.962	
10.	M5	Rekonstrukcija raskrsnice na M5.A.Šaćirbegović-Korija-Ljubogošća, km1+350	Izvođenje	400.000	400.000			-	U toku ishodovanje odobrenja za građenje
			Nadzor	7.000	7.000			-	
11.	M5	Rješavanje odvodnje, cesta M5_018, Prača –Hrenovica, dionica: Podgrab-Sastavci, km 11+800	Izvođenje	250.000	300.000			-	Priprema tend.dok.
			Nadzor	7.000	7.000			-	
12.	M6.1	Sanacija raskrsnice M6.1 i lokalne ceste u naselju Knežpolje, Grad Široki Brijeg	Projektovanje	7.000	-			-	Priprema tend.dok.
			Izvođenje	350.000	400.000			-	
			Nadzor	7.000	7.000			-	
13.	M5	Izgradnja pješačke staze uz magistralnu cestu M5 u naselju Kačuni	Projektovanje	7.000	7.000			-	Priprema tend.dok.
			Izvođenje	140.000	140.000			-	
			Nadzor	3.000	3.000			-	
14.	M4	Sanacija raskrsnice cesta M4 i R416A u mjestu Rečica, općina Gračanica	Projektovanje	7.000	7.000			-	Priprema tend.dok.
			Izvođenje	300.000	300.000			-	
			Nadzor	7.000	7.000			-	
15.	M14.2	Izgradnja pješačke staze uz cestu M14.2, općina Domaljevac	Projektovanje	7.000	-			-	Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi prolongirani za proljeće 2023.
			Izvođenje	200.000	200.000	Roading d.o.o. Gračanica, 01-02.2-11840/22, 12.12.2022.	198.438	-	
			Nadzor	5.000	5.000			-	
			Ukupno					-	
16.	M4	Idejni projekat rekonstrukcije raskrsnice na cesti M4, ulaz u Gračanicu, grad Gračanica	Projektovanje	7.000	7.000			-	Priprema tend.dok.
17.	M16	Izgradnja pješačke staze na M16, 006 Crna rijeka-Jajce jug u naselju Vidikovac-Zastinje, općina Jajce	Projektovanje	15.000	15.000			-	Priprema tend.dok.
18.	M4	Rekonstrukcija raskrsnice na cesti M4, skretanje Stanić Rijeka, općina Doboj Istok	Projektovanje	7.000	7.000			-	Priprema tend.dok.
19.	M17.4	Izgradnja trake za lijeva skretanja na cesti M17.4 u općini Čitluk	Izvođenje	380.000	380.000			-	U toku ishodovanje odobrenja za građenje
			Nadzor	7.000	7.000			-	
20.		Zamjena odbojnih ograda na	Projektovanje	30.000	30.000			-	Za jedan LOT, žalbeni

JP CESTE FEDERACIJE BIH

		magistralnim cestama minimalnog nivoa H1	Izvođenje	800.000	800.000			-	postupak u toku
			Nadzor	25.000	25.000			-	
21.	M5	Izgradnja pješačke staze uz magistralnu cestu M5 u naselju Bilalovac - II faza	Izvođenje	250.000	250.000			-	Priprema tend.dok.
			Nadzor	7.000	7.000			-	
22.	M18	Rekonstrukcija i dogradnja potputnjaka na M18 u Živinicama	Izvođenje	350.000	350.000	Jata Group d.o.o. Srebrenik, 01-02.2-12349/22, 28.12.2022.	413.914	-	Ugovori potpisani krajem godine, očekuje se početak radova u 2023.
			Nadzor	7.000	7.000	HG Inženjering d.o.o. Tuzla, 01-02.2-12348/22, 28.12.2022.	2.796	-	
			Ukupno					-	
23.	M17	Izgradnja pješačke staze petlja Žepče do ulice Zenički put	Projektovanje	3.000	3.000			-	
			Izvođenje	120.000	120.000	Dobojputevi d.o.o. Doboj jug, 01-02.2-9248/22, 21.10.2022.	119.049	-	
			Nadzor	3.500	3.500			-	
			Ukupno					-	
24.	M4	Izgradnja pješačke staze od Klokotnice (Samarica) do Velike Brijesnice, II faza	Izvođenje	200.000	200.000			-	Priprema tend.dok.
			Nadzor	7.000	7.000			-	
25.	M18	Izgradnja pješačke staze u naselju Olovske Luke, općina Olovo II faza	Izvođenje	200.000	200.000			-	Priprema tend.dok.
			Nadzor	7.000	7.000			-	
26.	M4	Rekonstrukcija raskrsnice na cesti M4, skretanje Mala Brijesnica, općina Doboj Istok	Projektovanje	7.000	7.000			-	Priprema tend.dok.
			Izvođenje	300.000	300.000			-	
			Nadzor	7.000	7.000			-	
27.	M18	Rekonstrukcija raskrsnice na cesti M18, skretanje za naselje Ugorsko, općina Vogošća	Projektovanje	7.000	7.000			-	Priprema tend.dok.
28.	M5	Sanacija kolovozne konstrukcije na cesti M5 sa izgradnjom i sanacijom pješačkih staza: Kamenica –skretanje za poslovnu zonu	Izvođenje	1.240.000	1.240.000			-	Nabavka radova i nadzora u toku
			Nadzor	34.400	34.400			-	
29.	M15	Izgradnja pješačke staze na cesti M15:Sanski Most-Tomina	Izvođenje	-	250.000			-	Planirano Rebalansom
			Nadzor	-	7.000			-	
30.	M14.1	Izrada idejnog i glavnog projekta izgradnje raskrsnice (kružnog toka) na M14.1 dionica: Odžak-Brod,(veza poslovnih zona Svilaj 1 i Svilaj 2 na M14.1)	Projektovanje	-	30.000			-	Planirano Rebalansom
			Revizija	-	3.000			-	
31.	M6.1	Izgradnja pješačke staze na M6.1 dionica 011: Gnojnice- Nevesinje 2	Projektovanje	-	7.000			-	Planirano Rebalansom
32.	M17.4	Izgradnja trake za lijevo skretanje za poslovnu zonu „Mostarska vrata“, na M17.4 002, dionica: Čitluk-Međugorje -Ljubuški, općina Ljubuški	Projektovanje	-	7.000			-	Planirano Rebalansom
			Revizija	-	1.500			-	
33.	M17.3	Sanacija crne tačke na M17.3 001,(Kukavuša), dionica: Buna –Masline, km18+400	Projektovanje	-	7.000			-	Planirano Rebalansom
			Revizija	-	1.500			-	
		UKUPNO		7.825.900	8.286.400			6.962	

Napomena:* Potpisan je Sporazum sa Općinom Neum, o zajedničkoj implementaciji projekta oborinske i fekalne odvodnje na magistralnoj cesti M17.3 ukupne dužine cca 225m (broj:01-02.2-12357/22 dana 28.12.2022). Prema navedenom Sporazumu, Općina Neum će osigurati 150.00KM za fekalnu odvodnju, a ostatak sredstava JP Ceste F BiH.

3.2.4. Vanredno održavanje
3.2.4.1. Sanacija i rekonstrukcija cestovnih objekata

Red. Br.	Mag. Cesta	Naziv i opis projekta	Aktivnosti na projektu	Plan 2022.	Rebalans Plana 2022.	Izvođač/ konsultant- ugovor	Ugovoreno	Realizovano 2022.	Napomena
1.	M17	Sanacija mosta (M17-009-405) preko rijeke Željeznice na Ilidži, dionica Stup 3 - Blažuj, km 2+635	Izvođenje	1.450.000	1.620.000	Hering d.d.Široki brijeg, 01-02.1-12352/22, 28.12.2022.	1.619.280	-	Očekuje se početak aktivnosti u narednom periodu
			Nadzor	50.000	50.000	PPG d.o.o. Sarajevo 01-02.1-12351/22, 28.12.2022.	19.792	-	
			Ukupno					-	
2.	M18	Sanacija mosta (M18-004-114) preko rijeke Tinje u Donjoj Potpeći, dionica Srebrenik-Šiški Brod 3, km 10+709	Izvođenje	300.000	380.000			-	U pripremi tender
			Nadzor	10.000	10.000			-	
3.	M18	Sanacija mosta (M18-008-71) preko Ujica rijeke u Kladnju, dionica Vitalj-Olovo, km 2+405	Izvođenje	600.000	750.000			-	U pripremi tender
			Nadzor	20.000	20.000			-	
4.	M20	Sanacija mosta (M20-008-206) preko rijeke Koline u Ustikolini, na cesti M20, dionica Foča 1-Ustikolina, km 9+916	Izvođenje	360.000	450.000			-	U pripremi tender
			Nadzor	12.000	12.000			-	
5.	M15	Sanacija mosta M15-003-42 preko rijeke Sane, Krkojevačko polje, na cesti M15, dionica Sanski Most 1-Kamičak, km 4+283	Izvođenje	1.700.000	2.300.000			-	U pripremi tender
			Nadzor	50.000	50.000			-	
6.	M18	Sanacija mosta M18-009-395 preko rijeke Ljubine, dionica Olovo – Semizovac, km 38+850	Izvođenje	360.000	450.000			-	U pripremi tender
			Nadzor	12.000	12.000			-	
7.	M20	Sanacija mosta M20-009-210 preko Odske rijeke u Mravinju, na cesti M20, dionica Ustikolina-Goražde 8, km 14+840	Izvođenje	350.000	440.000			-	U pripremi tender
			Nadzor	12.000	12.000			-	
8.	M5	Zamjena dilatacija na mostu preko duboke doline na Komaru (M5-010-221), na cesti M5, dionica Donji Vakuf 1 – Turbe, km 16+939, Komar gornji (M 05.0-3-14)	Izvođenje	80.000	-			-	Rebalansom nije planirano
			Nadzor	3.000	-			-	
9.	M18	Zamjena dilatacija na mostu preko rijeke Ljubine (M18-009-397) na cesti M18, dionica Olovo – Semizovac km 39+201, Semizovac (M 18.0-2-53)	Izvođenje	80.000	105.000			-	U pripremi tender
			Nadzor	3.000	4.000			-	
10.	M5	Sanacija mosta (M05.0-5-02) preko strme padine, Babin zub u Sarajevu, na cesti M5, dionica Stup-Vijećnica-Gr. ent. km 9+992	Projektiranje	40.000	40.000			-	U pripremi tender
			Revizija	4.000	4.000			-	
11.	M5	Sanacija mosta (M05.0-5-04) preko rijeke Miljacke, Krečane na cesti M5 dionica Stup-Vijećnica-Gr ent., km 10+390	Projektiranje	35.000	35.000			-	U pripremi tender
			Revizija	4.000	4.000			-	
12.	M5	Sanacija mosta (M05.0-5-04) preko rijeke Miljacke, Krečane na cesti M5 dionica Stup-Vijećnica-Gr.ent. km 10+610	Projektiranje	35.000	35.000			-	U pripremi tender
			Revizija	4.000	4.000			-	
13.	M5	Sanacija mosta (M5-016-433) objekat na petlji Korijana cesta M5 dionica Azize Šaćirbegović - Korija – Ljubogošta km 6+394 (M 05.0-A-11)	Projektiranje	50.000	50.000			-	U pripremi tender
			Revizija	5.000	5.000			-	
14.	M14	Rekonstrukcija mosta preko željezničke pruge Bihać-Bosanski Novi, Kostela (M14-002-51) dionica: Srbaljani-Bos. Krupa 1, km 5+171 - Projekat izmještanja stuba/ova kontaktne mreže sa opremom, - Projekat izmještanja	Projektiranje	15.000	15.000			-	U pripremi tender
			Revizija	2.000	2.000			-	

JP CESTE FEDERACIJE BIH

		železničkih telefonskih kablova.							
15.	M19.2	Sanacija tunela Ravne (T19.2-001-33) na cesti M19.2, dionica Kladanj-Vlasenica, km 7+748	Projektiranje	30.000	40.000			-	U pripremi tender
			Revizija	4.000	4.000			-	
16.	M19.2	Sanacija mosta M19.2-001-97 preko rijeke Drinjače, u Gojsalićima na cesti M19.2, dionica Kladanj-Vlasenica, km 2+323	Izvođenje	-	550.000			-	Planirano
			Nadzor	-	15.000			-	Rebalansom
17.	M17.1	Rekonstrukcija/izgradnja mosta preko rijeke Krivaje na cesti M17.1_001-643, Žepče-Zavidovići-Ribnica, lokacija Mustajbašići –Čanici, općina Zavidovići, km 15+385	Projektiranje	-	60.000			-	Planirano
			Revizija	-	6.000			-	Rebalansom
18.	M17.1	Rekonstrukcija mosta preko rijeke Gostović na cesti M17.1_001_642; Žepče-Zavidovići-Ribnica, lokacija Potkleče, km 9+650	Projektiranje	-	40.000			-	Planirano
			Revizija	-	4.000			-	Rebalansom
19.	M1.8	Sanacija mosta na M1.8_001_62, preko rijeke Save u Orašju, dionica: Granica BiH/ HR (Županja)-Lončari, km 0+000	Projektiranje	-	60.000			-	Planirano
			Revizija	-	6.000			-	Rebalansom
				5.680.000	7.644.000			-	

3.2.4.2. Sanacija oštećenih asfaltnih kolovoza

Red. Br.	Mag. Cesta	Naziv i opis projekta	Aktivnosti na projektu	Plan 2022.	Rebalans Plana 2022.	Izvođač/ konsultant- ugovor	Ugovoreno	Realizovano 2022.	Napomena
1.	M4	Sanacija asfaltnog kolovoza na cesti M4_010: Donja Orahovica-Šićki brod	Izvođenje	1.500.000	1.500.000	GP:Rial-Sped d.o.o. Doboj Istok i Roading d.o.o. Gračanica, 01-02.2-11838/22, 12.12.2022.	1.499.857	-	Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi prolongirani za proljeće 2023.
			Nadzor	30.000	30.000			-	
			Ukupno					-	
2.	M5	Sanacija asfaltnog kolovoza na cesti M5_014: Gromiljak-Blažuj	Projektovanje	7.000	-			-	Nabavka u toku
			Izvođenje	300.000	300.000			-	
			Nadzor	7.000	7.000			-	
3.	M15	Sanacija asfaltnog kolovoza na cesti M15: Šujica-Tomislavgrad	Izvođenje	300.000	300.000	KTM-Brina d.o.o. Posušje, 01-02.2-9000/22, 13.10.2022.	297.671	-	Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi prolongirani za proljeće 2023.
			Nadzor	7.000	7.000			-	
			Ukupno					-	
4.	M17	Sanacija asfaltnog kolovoza na cesti M17_005: Karuše-Ozimica	Projektovanje	7.000	-			-	Okončano
			Izvođenje	600.000	640.000	Dobojputevi d.d. Doboj jug, 01-02.2-10685/22, 18.11.2022.	640.901	640.898	
			Nadzor	7.000	7.000	AIK Inženjering d.o.o. Banovići, 01-02.2-10160/22, 09.11.2022.	6.388	6.388	
			Ukupno					647.287	
5.	M18	Sanacija asfaltnog kolovoza na cesti M18_007: Šićki brod-Živinice1-Vitalj-Olovo	Projektovanje	20.000	-			-	U toku
			Izvođenje	1.500.000	1.500.000	Jata group d.o.o.Srebrenik,	1.499.995	1.049.131	

JP CESTE FEDERACIJE BIH

						01-02.2-9635/22, 28.10.2022.			
			Nadzor	30.000	30.000	AIK Inženjering d.o.o.Banovići, 01-02.2-9894/22, 03.11.2022.	11.583	5.792	
			Ukupno					1.054.922	
6.	M17	Sanacija asfaltnog kolovoza na cesti M17: Buna-Tasovčići	Izvođenje	500.000	500.000			-	Nabavka u toku
			Nadzor	7.000	7.000			-	
7.	M17.5	Sanacija asfaltnog kolovoza na cesti M17.5: Jablanica-Blidinje	Projektovanje	7.000	-			-	Nabavka u toku
			Izvođenje	300.000	300.000			-	
			Nadzor	7.000	7.000			-	
8.	M17.4	Sanacija asfaltnog kolovoza na cesti M17.4: Mostar-Čitluk-Ljubuški	Projektovanje	7.000	-			-	Okončano
			Izvođenje	500.000	500.000	Putovi d.o.o.Grude 01-02.2-10253/22, 11.11.2022.	489.177	489.144	
			Nadzor	7.000	7.000			-	
			Ukupno					489.144	
9.	M5	Sanacija asfaltnog kolovoza na cesti M5_012: Nević polje-Kaonik	Projektovanje	7.000	-			-	Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi prolongirani za proljeće 2023.
			Izvođenje	400.000	525.000	Dobojputevi d.d. Doboj jug, 01-02.2-9360/22, 24.10.2022.	524.990	-	
			Nadzor	7.000	7.000	Aik Inženjering d.o.o. Banovići, 01-02.2-11839/22, 12.12.2022.	2.867	-	
			Ukupno					-	
10.	M15	Sanacija asfaltnog kolovoza na cesti M15: Livno-Šujica, L=800m	Izvođenje	140.000	140.000	Livnoputovi d.o.o. Livno, 01-02.2-11315/22, 30.11.2022.	146.238	-	Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi prolongirani za proljeće 2023.
			Nadzor	3.000	3.000	-	-	-	
			Ukupno					-	
11.	M16	Sanacija asfaltnog kolovoza na cesti M16: Livno-Renjići L=2,5km	Izvođenje	300.000	300.000	Livnoputovi d.o.o.Livno, 01-02.2-11989/22, 15.12.2022.	313.912	-	Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi prolongirani za proljeće 2023.
			Nadzor	7.000	7.000			-	
			Ukupno					-	
12.	M14.2	Sanacija asfaltnog kolovoza na cesti M14.2: Domaljevac-Šamac	Projektovanje	7.000	-			-	Okončano
			Izvođenje	300.000	300.000	Roading d.o.o. Gračanica, 01-02.2-9633/22, 28.10.2022.	298.971	298.949	
			Nadzor	6.000	6.000	AIK Inženjering d.o.o.Banovići, 01-02.2-10571/22, 17.11.2022.	5.780	5.780	
			Ukupno					304.729	
13.	M17.5	Sanacija asfaltnog kolovoza, dionica: Posušje-Grude	Izvođenje	-	350.000			-	Planirano Rebalansom
			Nadzor	-	7.000			-	
14.	M4	Sanacija asfaltnog kolovoza na cesti: M4_010: Donja-Orahovica – Šićki Brod	Izvođenje	-	1.000.000			-	Planirano Rebalansom
			Nadzor	-	20.000			-	
15.	M5	Sanacija asfaltnog kolovoza na cesti M5_005: Bosanski Petrovac-Gornje Bravsko	Izvođenje	-	400.000			-	Planirano Rebalansom
			Nadzor	-	7.000			-	

JP CESTE FEDERACIJE BIH

16.	M15	Sanacija asfaltnog kolovoza na cesti M15: Obilaznica Tomislavgrad-Šuica	Izvođenje	-	500.000			-	Planirano Rebalansom
			Nadzor	-	7.000			-	
17.	M5	Sanacija asfaltnog kolovoza na cesti M5: Obilaznica Sarajevo	Izvođenje	-	400.000			-	Planirano Rebalansom
			Nadzor	-	7.000			-	
18.	M17	Sanacija asfaltnog kolovoza na cesti M17 Konjic-Jablanica	Izvođenje	-	500.000			-	Planirano Rebalansom
			Nadzor	-	7.000			-	
19.	M1.9	Sanacija asfaltnog kolovoza na M1.9 Gradačac-Ormanica	Izvođenje	-	300.000			-	Planirano Rebalansom
			Nadzor	-	7.000			-	
20.	M4	Sanacija asfaltnog kolovoza na M4, dionica: Simin Han 1- Donje Caparde	Izvođenje	-	390.000			-	Planirano Rebalansom
			Nadzor	-	7.000			-	
		UKUPNO		6.827.000	10.839.000			2.496.082	

3.2.4.3. Sanacija klizišta, odrona, sanacija slijeganja trupa puta, kosina, usjeka i zasjeka

Red. Br.	Mag. Cesta	Naziv i opis projekta	Aktivnosti na projektu	Plan 2022.	Rebalans Plana 2022.	Izvođač/ konsultant-ugovor	Ugovoreno	Realizovano 2022.	Napomena
1.	M16.2	Sanacija škarpi zasjeka, cesta M16.2, dionica 002 na potezu od km 13+000 do km 15+150	Izvođenje	300.000	300.000			-	Priprema ten.dok.
			Nadzor	7.000	7.000			-	
2.	M17	Sanacija slijeganja trupa ceste, cesta M17_013, dionica: Jablanica I- Potoci, km 1+400	Izvođenje	250.000	316.000	HP Investing d.o.o. Mostar, 01-02.2-9636/22. 28.10.2022.	315.651	-	Ugovor za nadzor potpisan krajem godine, očekuje se početak radova u narednom periodu
			Nadzor	7.000	7.000	GP: AIK Inženjering d.o.o. Banovići, Arting BH d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-11756/22. 09.12.2022.	3.510	-	
			Ukupno					-	
3.	M18.1	Sanacija slijeganja trupa ceste cesta M1.8_003, dionica: Pelagićevo-Srebrenik (Blaževac)	Izvođenje	250.000	250.000			-	Zbog hitnosti, stanje pobolj. red.održ.
			Nadzor	7.000	7.000			-	
4.	M17	Sanacija slijeganja trupa ceste, cesta M17_013, dionica: Jablanica I- Potoci, km 2+600	Izvođenje	250.000	250.000	HP Investing d.o.o. Mostar, 01-02.2-8575/22. 30.09.2022.	248.688	-	Ugovor za nadzor potpisan krajem godine, očekuje se početak radova u narednom periodu
			Nadzor	7.000	7.000	GP: AIK Inženjering d.o.o. Banovići, Arting BH d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-12347/22. 28.12.2022.	5.382	-	
			Ukupno					-	
5.	M5	Sanacija škarpi i kosina, dionica: Kaonik-Lašva km 3+100 do km 3+250 i od 3+600 do km 3+850	Izvođenje	450.000	450.000			-	Priprema ten.dok.
			Nadzor	7.000	7.000			-	
6.	M16	Sanacija škarpi, cesta M16_006, dionica: Crna Rijeka-Jajce, lok 5, km 10+290 -km 10+460,	Izvođenje	150.000	200.000	Komotin d.o.o. Jajce 01-02.2-9892/22, 03.11.2022.	148.256	145.255	Okončano
			Nadzor	5.000	7.000	Artig BH d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-9891/22, 03.11.2022.	4.973	4.973	

JP CESTE FEDERACIJE BIH

			Ukupno					153.228	
7.	M17	Sanacija slijeganja i izdizanja trupa ceste petlja Blatuša, Zenica, I faza	Izvođenje	-	300.000			-	Planirano
			Nadzor	-	10.000			-	Rebalansom
8.	M16	Sanacija potpornog zida i trupa ceste M16_009, Bugojno 2- Kupres 1, km 13+000	Projektovanje	-	7.000			-	Planirano
			Izvođenje	-	200.000			-	Rebalansom
			Nadzor	-	10.000			-	
9.	M18	Sanacija škarpe na cesti M18_010 dionica: Semizovac-Sarajevo-Malta, općina Vogošća km 2+100	Izvođenje	-	300.000			-	Planirano
			Nadzor	-	7.000			-	Rebalansom
UKUPNO				1.690.000	2.642.000			153.228	

4. Eksproprijacija i elaborati eksproprijacije

Za projekte gdje su neophodne pripreme za eksproprijaciju, elaborati eksproprijacije, kao i vještačenja i konsultantske usluge (pravna pomoć) JP Ceste F BiH su realizovale vlastita sredstva u iznosu od 0,28mil.KM, a za eksproprijaciju 5,06 mil.KM.

Red. br.	O P I S	Plan 2022.	Rebalans Plana 2022.	Konsultant /ugovor	Ugovoreno	Realizovano 2022.	Napomena
1.	Elaborati eksproprijacije i pripremne faze za eksproprijaciju (vještačenja, pretvorbe zemljišta..i sl.)	300.000	300.000				Okončano
	- Rekonstrukcija raskrsnice na M1.9 sa R463			Geo feld d.o.o.Bihać, 01-02.2-1579/22, 02.03.2022.	4.095	4.095	
	- Izgradnja Obilaznice Bihaća-Geodetske usluge količenja linije eksproprijacije			Geo feld d.o.o.Bihać, 01-02.1-4507/22, 17.06.2022.	6.961	6.961	
	- Izgradnja raskrsnice na M16.2 dionica: Prozor-Jablanica , u naselju Duge			Geodet d.o.o. Sarajevo 01-02.1-12665/21, 29.12.2021.	6.435	6.435	
	- Izrad glavnog projekta potpornog zida od P55 do P59 –obilaznica Stoca-Vidovo polje			Integra d.o.o.Mostar, 01-02.1-4968/22, 06.07.2022.	5.850	5.850	
	- Izgradnja Obilaznice Cazin:Mihaljevac-Čoralići- Geodetske usluge količenja linije eksproprijacije			Geo feld d.o.o.Bihać, 01-02.1-11135/22, 28.11.2022.	6.903	6.903	
	- Nabavka ažuriranog elaborata eksproprijacije			Geo feld d.o.o.Bihać, 01-02.1-11189/22, 29.11.2022.	6.962	6.962	
	Pripremne faze za eksproprijaciju (vještačenja, pretvorbe zemljišta..i sl.)						
	- Zgradnja ceste Neum-Stolac			Ugovor o djelu	1.447	1.447	
	- Izgradnja Obilaznice Livno			“	1.601	1601	
	- Južna obilaznica Gruda (I faza)			“	38.757	38.757	
	- Izgradnja Obilaznice Kiseljaka			“	537	537	
	- Dogradnja petlje Šićki Brod			“	712	712	
	- Bihać 4-Ripač, sanac. kolovoza i korek. osovini.			“	2.180	2.180	
	- Ulaz u Stolac (Vidovo Polje, veza na M6)			“	46.142	46.142	
	- Rekonstrukcija raskrsnice u Stocu M6 sa R 427			“	10.958	10.958	
	- Izgradnja kružnog toka na izlazu Prispa, na dionici: Gorica-Vitina, općina Grude, I faza			“	688	688	
	- Izgradnja Obilaznice Cazin:			“	16.341	16.341	
	- Izgradnja Obilaznice Bihaća			“	17.989	17.989	
	- Treća traka Čevljanovići – Nišići			“	62.736	62.736	

JP CESTE FEDERACIJE BIH

	- Rekonstrukcija raskrsnice na M1.9 sa R463				356	356	
	Konsultantske usluge –pravna pomoć						
	U K U P N O	300.000	300.000			237.650	

U slijedećoj tabeli navedeni su projekti gdje je potrebno uraditi eksproprijaciju:

Red. br.	Mag. Cesta	NAZIV PROJEKTA	Plan 2022.	Rebalans Plana 2022.	Realizovano 2022.
1.	M17.3	Neum – Stolac, dionica: Broćanac - Drenovac			271.892
2.	M6.1	Južna Obilaznica Mostara, servisna saobraćajnica na dionici Međine - Miljkovići i dionici Miljkovići – Rodoč - veza na M17			
3.	M14	Obilaznica Bihaća, dionica Izačić - Kamenica, cca 3 km			3.067.756
4.	M16.4	Obilaznica Bugojna			20.250
5.	M4.2	Obilaznica Cazina			
6.	M6	Sjeverna obilaznica Gruda			1.239.079
7.	M14.1	Izgradnja magistralne ceste Bihać - Bosanska Krupa, Srbljansko – Grmuški plato, L= 25 km			
8.	M5	Rekonstrukcija raskrsnice cesta M-5 i R-403 u Kamenici			
9.	M5	Bihać: Devijacija pored Robota i Doma zdravlja Bihać			
10.	M1.8	Rekonstrukcija raskrsnice ceste M-1.8 u Špionici dionica (003), km 21+200			
11.	M18	Rekonstrukcija raskrsnice ceste M-18 "Husino" dionica (006), km 2+500			
12.	M4	Rekonstr. raskrsnice ceste M-4 i lokane ceste za Bistarac, dionica (010): Donja Orahovica-Šićki Brod, km 23+500			
13.	M6.1	Rekonstrukcija ceste M-6.1, dionica (010), km 9+000 do 10+000 Dobrič			
14.	M5	Rekonstrukcija raskrsnice M-5 i lokalne ceste Dolac na Lašvi, dionica (011), km 10+200-9+950			
15.	M5	Izgradnja pješačke staze u neslju Izačić, M5_001, km 2+450 – km 3+000			
16.	M1.8	Rekonstrukcija raskrsnice u naselju Čehaje			
17.	M17	Topčić Polje – Lašva 0, km 1+600 i km 3+880			
18.	M18	Priboj 2 – Simin Han 0, km 9+100 – km 9+200			
19.	M18	Priboj 2 – Simin Han 1, km 11+050 do km 21+300	7.000.000	5.500.000	
20.	M15	Kamičak – Ključ, km 17+000			
21.	M4	Magistralna cesta Doboj - Tuzla, dionica Drežnik (bolnica „Kreka“) - petlja Šićki Brod			
22.	M6.1	Izgradnja pješačke staze na dionici: Mostar - Široki brijeg, kroz naseljeno mjesto Međine			
23.	M18	Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok na Šipu, općina Centar, Sarajevo			
24.	M14	Izgradnja kružnog toka u Bosanskoj Krupi (kolodvor) dionica 002			
25.	M15	Izgradnja kružnog toka u Sanskom Mostu na spoju ceste M-15 i R-405 dionica 003			
26.	M5	Rekonstr. raskrsn. cesta M-5 i M-16.4 u kružni tok, M-5, (012), km 0+000 (Nević Polje)			
27.	M18	Rekonstruk. raskrsnice ceste M-17 i ulice Safeta Zajke u kružni tok, M-17, (008), km 7+350			
28.	M5	Rekonstrukcija raskrsnica na obilaznici Viteza			
29.	M18	Rekonstrukcija raskrsnica na cesti M-18 u kružne tokove (prolaz kroz Vogošću)			
30.	M17	Izgradnja potpunjaka za naselje Nemila, M-17			
31.	M17	Rekonstrukcija crne tačke Bulajića krivina na M-17 013, km 35+80 do 36+800			
32.	M5	Izgradnja traka za spora vozila, Bihać - Bos.Petrovac, dionica: Ripač - Dubovsko			
33.	M17	Izgradnja pješačkog prelaza izvan nivoa kolovoza za naselje Nemila, km 4+700			
34.	M4.3	Izgradnja Obilaznice Bužim			
35.	M6.1	Izgradnja trake Tomislavgrad-Široki			
36.	M5	Rekonstrukcija ceste devijacija puta V korpusa AVNOJ-a			

JP CESTE FEDERACIJE BIH

37.	M5	Izgradnja Obilaznice Donji Vakuf			271
38.	M20	Rekonstrukcija raskrsnice Goražde-Ustiprača km 0+550, na Obilaznici Goražda			
39.	M17.3	Izgradnja Obilaznice Stoca			
40.	M18	Treća traka Čevljanovići – Nišići			93.452
41.		Izgradnja Obilaznice Livno			77.685
42.	M6	Rekonstrukcija raskrsnice u Stocu M6 sa R 427			17.039
43.	M17.3	Ulaz u Stolac (Vidovo Polje, veza na M 6) L=1,3 km			259.438
44.		Izgradnja kružnog toka na izlazu Prispa, na dionici: Gorica-Vitina, općina Grude, I faza			17.480
45.		Drugi projekti za koje neophodna eksproprijacija, a nisu obuhvaćeni tabelom			
UKUPNO			7.000.000	5.500.000	5.064.342

5. Projekti iz Budžeta Federacije BiH i sufinansiranja iz drugih nivoa vlasti

a/ Vlada F BiH je Odlukom o usvajanju Programa utroška dijela sredstava „Kapitalni transferi javnim preduzećima – transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta“ V broj: 1155/2019. od 10.10.2019. utvrđenih Budžetom F BiH za 2019. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija, odredila JP Ceste F BiH za implementatora sredstava sljedećih projekata:

1. Izgradnja brze ceste Lašva-Nević polje - prolaz kroz zonu Vitez,
2. Izgradnja Južne obilaznice Mostara,
3. Projekat izgradnje i rješavanja spoja magistralnih cesta M6.1 i M17, te sanacija i rekonstrukcija magistralnih cesta u gradu Mostaru i
4. Poddionica: Šićki Brod - Đurđevik na trasi ceste Tuzla – Sarajevo.

Nakon usvojenog Programa, u Budžetu F BiH, svake godine se planiraju sredstva za Kapitalne transfere, te su JP Ceste F BiH na osnovu Odluka: V broj: 610/2022. i V Broj:1564/2022. implementator sljedećih projekata, finansiranih iz Budžeta F BiH 2022:

Red br.	Mag. Cesta	Naziv i opis projekta	Aktivnosti na projektu	Plan 2022.	Rebalans Plana 2022.	Izvođač/konsultant-ugovor	Ugovoreno	Realizovano 2022.	Napomena
1.	M5	Izgradnja brze ceste Lašva-Nević polje –prolaz kroz poslovnu zonu Vitez	Eksproprijacija	13.500.000	13.500.000		9.180	9.180	
			Projektovanje			-	-	-	
			Izvođenje			-	-	-	
			Nadzor			-	-	-	
			Ukupno					9.180	
2.	M6.1	Izgradnja Južne obilaznice Mostara	Eksproprijacija	5.000.000	5.000.000	Geodet d.o.o.Sarajevo 01-02.2-12165/22. 21.12.2022.	5.733	5.733	
						Naknada, vještačenje	15.622	15.622	
						-	-	-	
			Nadzor			GP:IGH d.o.o.Mostar i Institut IGH d.d.Zagreb, 01-02.1-8388/20. 24.08.2020. 01-02.1-8629/22 03.10.2022 GP:IGH d.o.o. Mostar, Integra d.o.o. Mostar i Divel d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-7720/22. 30.08.2022.	391.365 (preneseno 160.992) 847.693	265.068	

JP CESTE FEDERACIJE BIH

						Infra d.o.o.Sarajevo 01-02.1-3965/22. 31.05.2022.	6.961	6.961	
			Ukupno					293.384	
3.	M17 M 17.4	Spoj magistralnih cesta M17 i M17.4, te sanacija i rekonstrukcija magistralnih cesta i rasvjeta na M17 Ortiješ u gradu Mostaru	Projektovanje			-	-	-	
			Eksproprijacija	5.100.000	5.100.000	-	-	141.671	
			Izvođenje			-	-	2.406.471	
			Nadzor			-	-	13.455	
			Ukupno			-	-	2.561.597	
4.	M18	Poddionica: Šićki Brod-Đurđevik na trasi ceste Tuzla –Sarajevo	Eksproprijacija			-	3.076.367	3.076.367	
			Izvođenje			-	-	-	
			Nadzor			-	-	-	
			Projektovanje	22.000.000	22.000.000	GP:Ipsa d.o.o. Sarajevo, Divil d.o.o.Sarajevo, Saraj Inženjering d.o.o.Sarajevo i Design&QC d.o.o.Sarajevo 01-02.1-992/21. 28.01.2021.	1.485.640 (preneseno 327.732)	327.732	
						GP:Ipsa , Divil, SarajInženjering i Design&QC svi d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-4891/22, 04.07.2022.	69.597	69.597	
						INK Constructor d.o.o. Banja luka 01-02.1-5663/21 14.05.2021.	58.734	46.987	
						TZI-Inženjering d.o.o.Sarajevo01- 02.1-2435/21, 04.03.2021.	3.510	3.510	
						GP: PPG d.o.o.Sarajevo, Divil d.o.o.Sarajevo i Infra d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-4892/2221 .09.2022.	1.219.243	862.122	
			Ukupno					4.386.315	
5.		Izgradnja gradskog autoputa u Sarajevu, dionica:Stup- Buća potok-Pofalići-Velešići-Bentbaša	Projektovanje	3.500.000	3.500.000	GP: Divil d.o.o., Ipsa Institut d.o.o. PPG d.o.o.,Saraj inenjering d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-10265/20. 29.10.2020	1.604.105 (preneseno 1.538.805)	320.485	
			Revizija			GP: Divil d.o.o. Sarajevo, Ipsa Institut d.o.o.Sarajevo, PPG d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-3273/22. 06.05.2022.	1.084.724	122.043	
			Studije			TZI –Inženjering d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-993/21. 28.01.2021.	80.968	-	
			vještačenje			Ipsa d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-9491/21. 20.09.2021.	88.569	38.370	
			Ukupno			Ugovor o djelu	1.067	1.067	
6.		Sanacija i rekonstrukcija magistralne ceste Garež-Ustikolina	Izvođenje	3.000.000	-			-	Rebalansom nije planirano
			Nadzor						
UKUPNO				52.100.000	49.100.000			7.732.441	

Za projekat „Spoj magistralnih cesta M17.4 i M17, ta sanacija i rekonstrukcija magistralnih cesta i rasvjeta na M17 Ortiješ u gradu Mostaru“ na pojedinim dionicama je predviđena kompletna izmjena komunalnih instalacija koje su u nadležnosti Grada Mostara. U cilju efikasnije realizacije projekta zaključen je „Sporazum o implementaciji pojedinih dionica kroz grad Mostar“ na temelju

JP CESTE FEDERACIJE BIH

kojeg dionice implementira Grad Mostar.

U narednoj tabeli navedeni su podprojekti, obuhvaćeni navedenim projektom:

Red. br.	Naziv i opis projekta	Plan 2022.	Rebalans Plana 2022.	Aktivnosti na projektu	Izvođač/kosultant-ugovor	Ugovoreno	Realizovano 2022.	Napomena
3.1	Rješavanja spoja magistral. cesta M17.4 i M17 – Sjeverni ulaz u Mostar	5.100.000	5.100.000	Eksprop.	-	139.477	141.671	Eksproprijacija u toku
				Radovi	-	-	-	
				Nadzor	-	-	-	
				Ukupno			141.671	Okončano 2020 i 2021.
3.2	Sanacija dionice M6.1, od Španjolskog trga do Doma zdravlja							
3.3	Sanacija dijela prometnice od raskrižja kod Doma zdravlja do ulaza na parking Doma zdravlja							
3.4	Rekonstrukcija Ulice kralja Tomislava (Avenija) – (Vodovod i kanalizacija)			Radovi	HP Investing, d.o.o.Mostar 01-02.1-4691/20	2.951.916	500.238	Okončano Sporazum grad Mostar, FMPIK i JP Ceste FBiH
				Nadzor	Cadoro-Ing d.o.o.Mostar, 01-02.1-4691/20	28.949	-	
				Ukupno			500.238	
3.4.1	Rekonstrukcija saobraćajnice M17.4 na dijelu ulice Kralja Tomislava (Avenija) od raskrsnice kod objekta "Spajalica" do raskrsnice kod objekta "Sivrić"			Radovi	HP Investing d.o.o.Mostar, 02-11-2115/22-8	783.770	783.598	Okončano Sporazum grad Mostar, FMPIK i JP Ceste FBiH
				Nadzor	Cadoro, d.o.o. Mostar 02-11-6297/22-3	6.962	6.962	
				Ukupno			790.560	
3.5	Izgradnja rotora na križanju Ulica kralja Tomislava i Rudarska*			Radovi	HP Investing, d.o.o.Mostar 01-02.1-4691/20	713.962	35.751	Okončano Sporazum grad Mostar, FMPIK i JP Ceste FBiH
				Nadzor	Cadoro-Ing d.o.o.Mostar, 01-02.1-4691/20	7.002	526	
				Ukupno			36.277	
3.6	Rješavanje oborinskih voda sa M 17 u naselju Mazoljice			Projektiranje			-	Projekt. i revizija okončano Sporazum grad Mostar, FMPIK i JP Ceste FBiH
				Eksproprij.			-	
				Revizija			-	
				Radovi			-	Projekt. i revizija okončano
				Nadzor			-	
				Ukupno			-	
3.7	Rekonstrukcija raskrižja na Španjolskom trgu			Projektiranje			-	Projekt. i revizija okončano Sporazum grad Mostar, FMPIK i JP Ceste FBiH
				Revizija			-	
				Radovi			-	
				Nadzor			-	Projekt. u toku Sporazum grad Mostar, FMPIK i JP Ceste FBiH
				Ukupno			-	
3.9	Rekonstrukcija raskrižja kod zgrade Mostarka			Projektiranje	Routing d.o.o. Banja luka, 01-02.4-6139/20. 05.06.2020.	15.058 (preneseno 6.776)	-	
				Revizija	Interprojekt d.o.o. Mostar, 01-02.2-8490/20. 26.08.2020	2.340 (preneseno 1.170)	-	Sporazum grad Mostar, FMPIK i JP Ceste FBiH
				Ukupno			-	
3.10	Rekonstrukcija raskrižja Ilička ul. naselje Balinovac			Projektiranje			-	Sporazum grad Mostar, FMPIK i JP Ceste FBiH
				Revizija			-	
				Ukupno			-	
3.11	Izgradnja trake za uključivanje naselja Zalik			Projektiranje			-	Projekt. i

JP CESTE FEDERACIJE BIH

	na M17			Revizija			-	revizija okonačano
				Radovi			-	Sporazum
				Nadzor			-	grad Mostar, FMPIK
				Ukupno			-	i JP Ceste FBiH
3.12	Izgradnja dionice Španjolski trg – Hotel Ero			Radovi	HP Investing, d.o.o.Mostar 01-02.1-4691/20	1.553.783 (preneseno 59.889)	59.889	Okonačano Sporazum
				Nadzor	Cadoro-Ing d.o.o.Mostar, 01-02.1-4691/20	15.237	1.404	grad Mostar, FMPIK
				Ukupno			61.293	i JP Ceste FBiH
3.13	Rekonstrukcija ceste M17.4, od ulaza u naselje Zalik do spoja sa M17			Izvođenje	HP Investing d.o.o. Mostar, 02-11-4646/22 07.06.2022. Anex 02-11-18468/22-8	350.528 92.371	442.873	Sporazum grad Mostar, FMPIK
				Nadzor	Inpros d.o.o Mostar, 529/22 28.08.2022.	3.452	3.451	i JP Ceste FBiH
				Ukupno			446.324	
3.14	Sanacija i rekonstrukcija kružnog toka na M17, na južnom ulazu u Mostar			Radovi	HP Investing d.o.o.Mostar, 02-11-15328/21- 10. 04.02.2022	584.155	584.122	Sporazum grad Mostar, FMPIK
				Nadzor	Cadoro-ing d.o.o Mostar,12-24/21- 1 24.12.2021.	1.112	1.112	i JP Ceste FBiH
				Ukupno			585.234	
3.15	Rasvjeta na M17 Ortiješ			Eksproprijacija			-	
				Projektovanje	Mandera Company d.o.o. Mostar,01-02.2- 11986/22. 15.12.2022.	6.949	-	U toku projekt.
				Radovi			-	
				Nadzor			-	
				Ukupno			-	
UKUPNO		5.100.000	5.100.000				2.561.597	

b. Sufinansiranje/donacije iz drugih nivoa vlasti

Red br.	Mag. Cesta	Naziv i opis projekta	Iznos
1.	M4	Rekonstrukcija raskrsnice na cesti M4 sa lokalnom cestom za općinu Usora sa rekonstrukcijom mosta preko rijeke Usore u mjestu Tešanjka, dionica 008 Teslić (Barići)-Karuše, km 17+900	1.231.100
2.	M6	Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok na cesti M6, Grad Čapljina – raskrižje Ulice Ante Starčevića i Gojka Šuška	319.750
			1.550.850

1. Na osnovu Sporazuma o zajedničkom finansiranju JP Ceste F BiH sa Općinom Usora broj:01-02.1-11254/18.od 12.12.2018. godine, urađena je rekonstrukcija raskrsnice na cesti M4 sa lokalnom cestom za općinu Usora sa rekonstrukcijom mosta preko rijeke Usore u mjestu Tešanjka, dionica 008 Teslić (Barići)-Karuše, km 17+900. JP Ceste F BiH su Gradu Usora uplatile avans u iznosu od 612.662 KM 15.01.2019. godine, a prema Zapisniku o realizaciji Sporazuma o zajedničkom finansiranju projekta broj 01-02.1-3085/22 od 26.04.2022. ukupna vrijednost okonačanog projekta iznosi 1.591.144 KM, s tim da je JP Ceste F BiH predato na upravljanje 1.231.100 KM, a ostatak u iznosu od 360.044 KM Općini Usora.

2. JP Ceste F BiH su potpisale Sporazum o zajedničkom finansiranju projekta „Rekonstrukcija

JP CESTE FEDERACIJE BIH


raskrsnice u kružni tok na cesti M6, Grad Čapljina – raskrižje Ulice Ante Starčevića i Gojka Šuška broj: 01-02.1-8944/19. od 25.07.2019. Na osnovu potpisanog, uplaćen je avans 20.08.2019.godine Gradu Čapljina, na iznos od 319.000 KM. Po okončanju projekta sačinjen je Zapisnik o realizaciji Sporazuma o zajedničkom finansiranju projekta broj:01-02.1-3083/22 od 26.04.2022. gdje ukupna vrijednost projekta iznosi 475.296 KM, od čega je dato na upravljanje JP Cestama F BiH 314.750 KM, a 155.546 KM pripada Gradu Čapljina.

c. Potpisan je „Sporazum o zajedničkoj implementaciji projekta rekonstrukcije XII transferzale na magistralnoj cesti M-18, lokalitet Stupska petlja - Granica Entiteta“ sa Ministarstvom saobraćaja Kanton Sarajevo, broj: 01-02.1-14475/19. dana 18.12.2019. godine, gdje predviđena dogradnja još jedne kolovozne trake.

Kanton Sarajevo će obezbjediti nepovratna sredstva za izvođenje radova i eksproprijaciju, a JP Ceste F BiH će obezbjediti sredstva za izradu projektne dokumentacije, reviziju, prikupljanje neophodnih saglasnosti, odbrenje za građenje, te nadzor nad izvođenjem radova. Implementator projekta su JP Ceste F BiH.

b/ Potpisan je „Sporazum o zajedničkoj implementaciji projekta rekonstrukcije XII transferzale na magistralnoj cesti M-18, lokalitet Stupska petlja - Granica Entiteta“ sa Ministarstvom saobraćaja Kanton Sarajevo, broj: 01-02.1-14475/19. dana 18.12.2019. godine, gdje predviđena dogradnja još jedne kolovozne trake.

Kanton Sarajevo će obezbjediti nepovratna sredstva za izvođenje radova i eksproprijaciju, a JP Ceste F BiH će obezbjediti sredstva za izradu projektne dokumentacije, reviziju, prikupljanje neophodnih saglasnosti, odbrenje za građenje, te nadzor nad izvođenjem radova. Implementator projekta su JP Ceste F BiH.

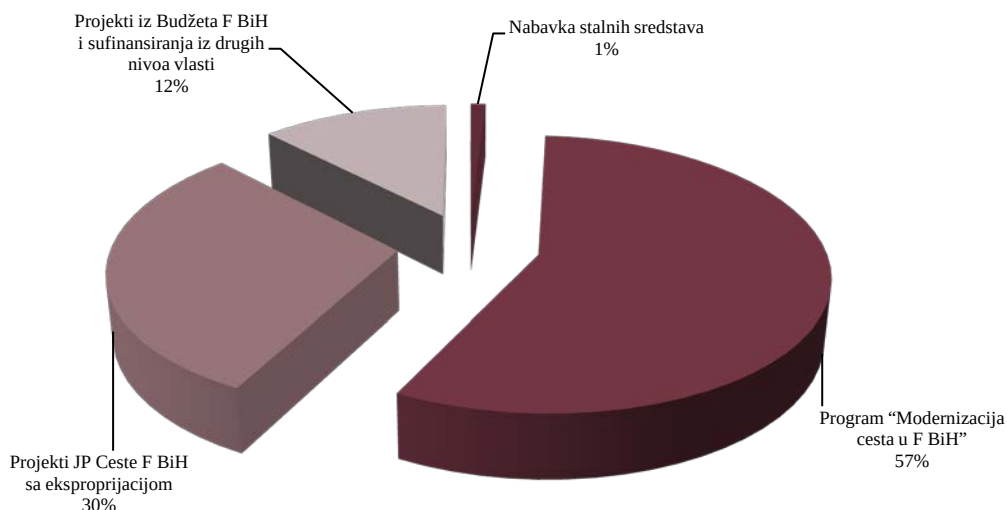

Grafički prikaz realizovane strukture investicija

Izvještaj o radu je urađen na bazi raspoloživih podataka, i odnosi se na nabavke provedene po Zakonu o javnim nabavkama BiH.

Nabavke za navedeni period su realizovane u skladu sa Odlukom o važenju plana nabavki 2021.godinu za 2022.godinu koja je donešena i objavljena 4.2.2022.godine, Privremenim planom nabavki za 2022.godinu koji je usvojen i objavljen 14.3.2022.godine koji je napravljen i usvojen na bazi Rebalansa plana poslovanja za 2021.godinu i Planom nabavki za 2022.godinu.

Za navedeni period na osnovu provedenih postupaka nabavki ugovorena su 279 ugovora u iznosu od 82.732.980 KM.

- Ugovorene nabavke po vrstama postupaka uključujući vrijednosti

Vrsta postupka nabavke	Iznosi sa PDV	Broj ugovora
Ukupno	82.732.980	279
Otvoreni	40.037.302	109
Konkurentski	169.439	14
Pregovarački	3.452.817	10
Direktni sporazumi	536.983	125
Neprioritetne usluge	53.959	7
Ograničeni postupak	38.482.480	14

b. Žalbe

Tokom godine podnesene su 52 žalbe, od kojih su do 31.12.2022.godine:

- 3 neriješene žalbe koje su na rješavanju u Uredu za žalbe BiH (URŽ).
- 27 žalbi odbijeno i odbačeno Zaključkom URŽ .
- 14 žalbi usvojeno kao osnovano
- 2 žalbe su povučene
- 6 žalbi je JP Ceste FBiH usvojio i izvršio potrebne izmjene

c. Poništeni postupci

Tokom godine poništeno je 15 postupaka nabavki.

Izmjene Zakona o javnim nabavkama (ZJN) se primjenjuju od 10.12.2022.godine, za postupke nabavki koji su pokrenuti poslije tog datuma. Pokrenuta je priprema novog Pravilnika o javnim nabavkama i ostale aktivnosti neophodnih za primjenu izmjena ZJN.

E. PRAVNI I KADROVSKI POSLOVI

Sektor pravnih, kadrovskih i općih poslova JP Cesta F BiH sve svoje poslove i aktivnosti bazira na primjeni svih pozitivnih zakonskih propisa koji su doneseni i važe u F BiH, odnosno u državi BiH kao i svih izmjena i dopuna koje se donesu u planiranoj godini.

Svi pravni poslovi se dijele na sve oblasti prava i to prvenstveno na oblast privrednog prava, gdje se reguliše rad privrednih društava, javnih preduzeća itd.. kao i oblast parničnih, vanparničnih,

prekršajnih, izvršnih i upravnih postupaka i imovinsko-pravnih poslova.

Najveća aktivnost ovog pravnog Sektora usmjerena je na organizaciju i zastupanje JP Ceste F BiH pred nadležnim sudovima u F BiH, u BiH i u pojedinim predmetima i u regionu.

Vodene su aktivnosti na pokretanju tužbi, gdje se kao tužilac pojavljuje JP Ceste F BiH, kao i pokretanje izvršnih prijedloga na temelju pravosnažnih i izvršnih presuda protiv korisnika koji redovno ne plaćaju svoje obaveze, te pokretanje tužbi za naknadu štete na cestovnoj opremi i sl. Izdajamo također i aktivnosti na regresnim tužbama gdje za to postoje zakonski uslovi.

U sudskim postupcima gdje se JP Ceste F BiH pojavljuje u ulozi tužitelja, broj aktivnih tužbi JP Ceste F BiH protiv trećih lica na dan 31.12.2022.god. iznosi 45 predmeta (naplata za cestovno zemljište, regresne tužbe i oštećenje cestovne opreme).

U predmetima gdje je JP Ceste F BiH tužena strana, u izvještajnom periodu podneseno je 75 novih tužbi. Broj aktivnih tužbi protiv JP Ceste F BiH na dan 31.12.2022.god. iznosi 257 predmeta.

U oblasti imovinsko-pravnih poslova vodile su se aktivnosti na provođenju postupka ekspropriacije nepokretnosti, zaključivanju sporazuma o naknadi na planiranim projektima kao i onim već otpočetim te zastupanje pred organima uprave-uglavnom općinskim radi sporazumnog određivanja naknada za izuzete nekretnine kao i zastupanje pred svim sudovima (vanparnični i parnični postupak) u okviru rješavanja imovinsko-pravnih poslova. Broj aktivnih predmeta imovinsko-pravne prirode na dan 31.12.2022.god. iznosi 21 predmet (parnični i vanparnični) a u izvještajnom periodu zaprimljeno je 5 novih.

U izvještajnom periodu su obavljane aktivnosti na usklađivanju akata JP Ceste F BiH sa izmjenama i dopunama pozitivnih propisa, kao i aktivnosti na izradi nacrti i prijedloga opštih akata preduzeća za usvajanje od strane nadležnih organa JP Ceste F BiH.

U periodu 01.01.- 31.12.2022. godina obavljane su aktivnosti koje se odnose na sve stručne i administrativne poslove vezane za rad i funkcionisanje organa JP Ceste F BiH i to: Uprave, Odbora za reviziju, Nadzornog odbora i Skupštine društva.

Vršene su pripreme sjednica organa JP Ceste F BiH, pripremanje i distribucija materijala za iste kao i aktivnosti vezane za realizaciju odluka i zaključaka sa sjednica Skupštine, Nadzornog odbora, Odbora za reviziju i Uprave ovog preduzeća.

U izvještajnom periodu održano je 6 sjednica Skupštine, 9 sjednica Nadzornog odbora (6 redovnih i 3 konstituirajuće), 12 sjednica Odbora za reviziju i 30 sjednica Uprave JP Ceste F BiH.

Na osnovu Odluke Vlade F BiH o davanju prethodne saglasnosti za razriješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP Ceste F BiH V.broj: 1908/2021 od 16.12.2021.god. Skupština JP Ceste F BiH svojom Odlukom broj: 01- 03.2-SK-12774-3/21 od 18.1.2022.god. razriješila vršioce dužnosti članova Nadzornog odbora JP Ceste F BiH radi isteka mandata i to: Anis Krivić (v.d.Predsjednika), Sulejman Bečirević (v.d. člana), Daliborka Marić (v.d. člana), Željko Petrović (v.d. člana) i Mustafa Abdulahović (v.d. člana).

Na osnovu Odluke Vlade F BiH o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP Ceste F BiH V.broj: 1909/2021 od 16.12.2021.god. Skupština JP Ceste F BiH svojom Odlukom broj: 01- 03.2-SK-12774-4/21 od 18.1.2022.god. imenovala vršioce dužnosti članova Nadzornog odbora JP Ceste F BiH u sastavu: Anis Krivić (v.d.Predsjednika), Sulejman Bečirević (v.d. člana), Igor Josipović (v.d. člana), Željko Petrović (v.d. člana) i Mustafa Abdulahović (v.d. člana) do okončanja konkursne procedure a najduže na vremenski period do 3 mjeseca počev od dana stupanja na snagu Odluke o imenovanju.

Na osnovu Odluke Vlade F BiH o davanju prethodne saglasnosti za razriješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP Ceste F BiH V.broj: 606/2022 od 28.4.2022.god. Skupština JP Ceste F BiH svojom Odlukom broj: 01- 03.2-SK-3299-4/22 od 3.6.2022.god. razriješila vršioce dužnosti članova Nadzornog odbora JP Ceste F BiH radi isteka mandata i to: Anis Krivić

JP CESTE FEDERACIJE BIH

(v.d.Predsjednika), Sulejman Bećirević (v.d. člana), Igor Josipović (v.d. člana), Željko Petrović (v.d. člana) i Mustafa Abdulahović (v.d. člana).

Na osnovu Odluke Vlade F BiH o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP Ceste F BiH V.broj: 607/2022 od 28.4.2022.god. Skupština JP Ceste F BiH svojom Odlukom broj: 01- 03.2-SK-3299-5/22 od 3.6.2022.god. imenovala vršiocima dužnosti članova Nadzornog odbora JP Ceste F BiH u sastavu: Anis Krivić (v.d.Predsjednika), Sulejman Bećirević (v.d. člana), Igor Josipović (v.d. člana), Željko Petrović (v.d. člana) i Mustafa Abdulahović (v.d. člana) do okončanja konkursne procedure a najduže na vremenski period do 3 mjeseca počev od dana stupanja na snagu Odluke o imenovanju.

Na osnovu Odluke Vlade F BiH o davanju prethodne saglasnosti za razriješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP Ceste F BiH V.broj: 1318/2022 od 8.9.2022.god. Skupština JP Ceste F BiH svojom Odlukom broj: 01- 03.2-SK-8643-1/22 od 4.10.2022.god. razriješila vršiocima dužnosti članova Nadzornog odbora JP Ceste F BiH radi isteka mandata i to: Anis Krivić (v.d.Predsjednika), Sulejman Bećirević (v.d. člana), Igor Josipović (v.d. člana), Željko Petrović (v.d. člana) i Mustafa Abdulahović (v.d. člana).

Na osnovu Odluke Vlade F BiH o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP Ceste F BiH V.broj: 1319/2022 od 8.9.2022.god. Skupština JP Ceste F BiH svojom Odlukom broj: 01- 03.2-SK-8643-2/22 od 4.10.2022.god. imenovala vršiocima dužnosti članova Nadzornog odbora JP Ceste F BiH u sastavu: Anis Krivić (v.d.Predsjednika), Sulejman Bećirević (v.d. člana), Igor Josipović (v.d. člana), Željko Petrović (v.d. člana) i Mustafa Abdulahović (v.d. člana) do okončanja konkursne procedure a najduže na vremenski period do 3 mjeseca počev od dana stupanja na snagu Odluke o imenovanju.

U oblasti općih poslova provodile su se aktivnosti na održavanju voznog parka, održavanju sistema mašinskih instalacija-grijanje i hlađenje, održavanju elektro i vodoinstalacija, održavanju radnih prostorija i poslovi protivpožarne zaštite te poslovi digitalnog protokola.

Takođe, u izvještajnom periodu su se obavljali poslovi iz oblasti radnih odnosa i kadrovski poslovi u skladu sa zakonom i opštim aktima. Obavljane su aktivnosti na prijemu novih radnika (poslovi sekretara Komisije i sačinjavanje svih potrebnih akata) u skladu sa Zakonom i opštim aktima JP Ceste BiH kao i redovne svakodnevne aktivnosti iz ove oblast.

U sklopu ISO certifikacije, a nakon obavljenih audita sa radnicima ovog Sektora, izrađeni su Karta procesa-imovinsko-pravni poslovi, Procedura za obuku osoblja, Procedura za opće poslove i Procedura za vrednovanje usklađenosti sa zakonskom regulativom i drugim obavezama za usklađivanje.

Kadrovski poslovi

Na dan 31.12.2022.god. obrazovna struktura radnika JP Ceste F BiH je sljedeća:

Red.br.	Vrsta školske spreme	Stanje 31.12.2022.
1.	Doktori nauka (građ.i saobr.)	2
2.	Magistri nauka (saob, ecc, komunikologije.)	3
3.	Magistri struke (saob. građ.ecc. arh; geografije)	13
4.	VSS građevinske struke	32
5.	VSS saobraćajne struke	2
6.	VSS ekonomske struke	8

JP CESTE FEDERACIJE BIH

7.	VSS pravne struke	13
8.	VSS geodetske struke	1
9.	VSS mašinske struke	1
10.	VSS infor.struke	2
11.	VSS društ.smjera	1
12.	VSS tehn.smjera	2
13.	VS (ing.grad.)	3
14.	VS (becheler ecc.)	3
15.	SSS građevinski tehničari	3
16.	SSS mašinske struke	1
17.	SSS saobraćajne struke	4
18.	SSS ekonomske struke	3
19.	SSS ostale struke (društ.,prir., tehn)	4
U K U P N O		101

U Izvještajnom periodu dva radnika je otišlo u penziju, kod jednog radnika je prestao radni odnos zbog nastupanja smrti, zasnovan je radni odnos na određeno vrijeme s četiri radnika, prestao je radni odnos na određeno vrijeme s četiri radnika i zasnovan je radni odnos na neodređeno vrijeme s dva radnika.



Direktor

Ljubo Pravdić, dipl.ing.grad.
