

**IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI
PLANA POSLOVANJA ZA PERIOD
1.1.-31.12.2020. GODINA**

Sarajevo, februar/veljača 2021. godina

SADRŽAJ

	Strana
U V O D	3
A. I JAVNI PRIHODI	6
A. II AMORTIZACIJA	11
B. I JAVNI RASHODI	12
1. Troškovi poslovanja	13
2. Služba „Pomoć-informacije na cestama“	15
3. Redovno održavanje	16
4. Rezervirana sredstva za rizike, neplanirane rashode i rashode koji ne terete projekte	26
5. Rezervirana sredstva za sudske presude	27
6. Troškovi konsultantskih usluga	28
7. Kamate	29
B. II TROŠKOVI AMORTIZACIJE	32
C. INVESTICIJE	33
1. Nabavka stalnih sredstava	34
2. Program „Modernizacija cesta u F BiH“	35
3. Projekti JP Ceste F BiH	49
4. Eksproprijacija i elaborati eksproprijacije	83
5. Projekti iz Budžeta F BiH i sufinansiranja iz drugih nivoa vlasti	85
D. ODJELA ZA JAVNE NABAVKE	90
E. PRAVNI I KADROVSKI POSLOVI	90

U V O D

Izveštaj o realizaciji Plana poslovanja Javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: JP Ceste F BiH) za period 01.01.- 31.12.2020. sačinjen je u skladu sa Zakonom o cestama F BiH, Zakonom o javnim preduzećima u F BiH, Statutom JP Ceste F BiH, Pravilnikom o računovodstvu i Računovodstvenim politikama JP Ceste F BiH koji je usaglašen sa važećim Međunarodnim računovodstvenim standardima (u daljem tekstu MRS), u mjeri u kojoj je to moguće, Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (u daljem tekstu MSFI), te u skladu sa specifičnostima poslovanja i pravnog statusa JP Ceste F BiH. Osnovna djelatnost JP Ceste F BiH je upravljanje, građenje, rekonstrukcija, održavanje i zaštita magistralnih cesta.

Realizacija navedenih aktivnosti omogućava evidentiranje finansijskih transakcija u skladu sa specifičnostima poslovanja, načina finansiranja i zahtjevima za prezentaciju finansijskih izvještaja u skladu sa MRS i MSFI.

Plan poslovanja JP Ceste F BiH za 2020. godinu predstavlja osnov svih planiranih aktivnosti JP Ceste F BiH. Nakon što je usvojen od strane Nadzornog odbora JP Ceste F BiH, Vlada F BiH u svojstvu osnivača Odlukom V broj:307/2020. od 28.februara 2020.godine, dala je saglasnost na isti, a Skupština JP Ceste F BiH Odlukom br.01-03.2-SK-4377-1/20. od 10.04.2020. godine potvrdila Odluku Vlade F BiH.

Bosna i Hercegovina je 16.03.2020 proglasila stanje prirodne nesreće u vezi sa pandemijom izazvanom pojavom coronavirusa (COVID-19), a Vlada F BiH je istog dana donijela Odluku V broj:408/2020 o proglašenju stanja prirodne nesreće uzrokovano pojavom coronavirusa (COVID-19) na području F BiH. COVID-19 pandemija i proglašene mjere za suzbijanje širenja (restriktivne mjere kretanja i putovanja, odnosno javnih okupljanja, socijalno distanciranje, ograničenje broja osoba u sredstvima za prijevoz) utjecale su na realizaciju planiranih aktivnosti JP Ceste F BiH u 2020 godini. Postupajući po donesenim naredbama i preporukama Federalnog štaba civilne zaštite, JP Ceste F BiH su većinu aktivnosti obavljale vezane za: redovno održavanje, završetak započetih projekata, eksproprijaciju, te pripremu tenderske dokumentacije.

Premda je Odlukom Vlada F BiH V broj: 701/2020. od 29.05.2020. proglašen prestanak stanja prirodne nesreće kontinuirana prijetnja širenja pandemije ima potencijalno značajne posljedice na implementaciju potpisanih ugovora, kao i na tekuće nabavke.

U skladu sa Statutom JP Ceste FBIH, uzimajući u obzir nastale okolnosti tokom implementacije plana koje su uticale na realizaciju planiranih aktivnosti, Uprava preduzeća u sastavu:

- Ljubo Pravdić, direktor,
- Nijaz Hadžikadunić, izvršni direktor za tehničke poslove i
- Bekir Isaković, izvršni direktor za ekonomske i pravne poslove

odlučila se za revidiranje Plana tj. za izradu Rebalansa Plana poslovanja za 2020 godinu. (u daljem tekstu: Rebalans). Vlada F BiH je dala saglasnost na Rebalans Odlukom V broj:1752/20 od 22.12.2020.

Program „Modernizacija cesta u FBIH“, čija je implementacija u toku, prva je faza modernizacije cestovnog sektora u F BiH, a osnovni razvojni cilj Programa je modernizacija cestovne infrastrukture (ceste, mostovi,tuneli) duž prioriternih dionica na magistralnoj cestovnoj mreži i poboljšanje sigurnosti prometa, te jačanje kapaciteta za održivo upravljanje magistralnom cestovnom mrežom u FBIH.

Program obuhvata investicije na magistralnoj cestovnoj mreži u ukupnom iznosu EUR 173,00 mil. od čega je EUR 50,00 mil. obezbijedeno iz kredita Evropske investicijske banke (EIB), EUR 58,00 mil. iz kredita Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) i EUR 65,00 mil. iz kredita Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD). Ministarstvo finansija i trezora, u ime Bosne i Hercegovine (BIH), potpisalo je Sporazume o kreditima sa međunarodnim razvojnim bankama u 2016. godini. Krediti su stavljeni na raspolaganje FBIH na osnovu Supsidijarnih sporazuma između BiH i FBIH, i nadalje JP

Ceste F BiH za implementaciju Programa.

Realizacija Programa planirana je u četverogodišnjem periodu, počev od 2017, međutim, kasnilo se u ispunjenju uvjeta za efektivnost kredita u skladu sa sporazumima o zajmu/kreditu, što je dovelo i do pomjeranja početka implementacije projekata u 2018. godinu.

Većina ugovora za radove preostalih za ugovaranje, kao i određeni broj već potpisanih ugovora ima probleme vezano za rješavanje imovinsko-pravnih pitanja, što posljedično dovodi do kašnjenja u realizaciji podprojekata obuhvaćenih Programom. I pored korištenja svih raspoloživih kapaciteta i aktivnosti u cilju ubrzavanja rješavanja imovinsko-pravnih pitanja za neke podprojekte (izgradnja trake za spora vozila Bosanski Petrovac-Drvar, granica RH (Izačić)- Bihać, kružna raskrsnica Kamenica R403) već duži period nije postignut značajniji napredak u rješavanju ovog pitanja zbog sporosti lokalnih zajednica koje su nosioci aktivnosti na eksproprijaciji. Okončanje postupka eksproprijacije, je prioritet, posebno za već ugovorene radove u cilju otklanjanja rizika od potencijalnih odštetnih zahtjeva Izvođača.

Složene procedure pribavljanje neophodnih odobrenja za građenje od različitih nivoa vlasti takođe ima utjecaj na prolongiranje nabavki i početak radova u Programu „Modernizacija cesta u FBiH“.

Rekonstrukcija tunela Crnaja na magistralnoj cesti M-17, dionica Jablanica-Konjic jedan je od prioritetnih projekata obuhvaćenih Projektom „Modernizacija cestovnog sektora u FBiH“. Rekonstrukcija postojećeg tunela Crnaja obuhvata značajne radove u tunelu kao što su: povećanje visine tunela, hidroizolacija tunela, izrada podnožnog svoda, nova sekundarna obloga, unutrašnja drenaža tunela, hidrantska mreža, sisteme sigurnosti i dr. Izvođenja radova planirano je sa odvijanjem prometa kroz tunel jednom trakom naizmjenično, uz regulaciju prometa semaforima.

Oko tunela ne postoje uvjeti za privremene obilaznice na kojima bi se bezbjedno mogao odvijati promet u toku rekonstrukcije tunela, a alternativni pravac je mnogo duži i zahtijeva duže vrijeme vožnje, te stoga ne postoji mogućnost potpune obustave prometa kroz tunel. Planirani početak radova bio je odgođen zbog razmatranja tehničkih opcija i alternativa upravljanja prometom, potaknuto poteškoćama u upravljanju prometom i sigurnošću prometa tokom rekonstrukcije tunela Vranduk. Premda je inicijalno jedna od razmatranih tehničkih alternativa bila izgradnja novog tunela, uključujući izmjenu trase, ona ima značajne vremenske implikacije, veće troškove izgradnje za koje bi trebalo osigurati dodatna sredstva i geološke rizike, odlučeno je da se radovi nastave po izrađenom projektu rekonstrukcije tunela, a početak radova se očekivao u septembru 2020.

Planirano vrijeme izvođenja radova je 16 (šesnaest) mjeseci od datuma početka radova, na koje se treba dodati obustava radova u vrijeme turističke sezone i intenzivnih privrednih aktivnosti (15.06-15.09. 2021).

Međutim, Vlada Federacije BiH je na svojoj sjednici od 17.09.2020 donijela Zaključak V. broj: 1274/2020., kojim je zadužila JP Ceste FBiH da izvrše dodatno brojanje saobraćaja, simulaciju naizmjeničnog propuštanja kroz tunel „Crnaja“ i da nakon izvršenih snimanja predloži dinamiku izvođenja radova sa ciljem izbjegavanja dužih čekanja u toku izvođenja radova na rekonstrukciji tunela „Crnaja“. Novi planirani početak radova je januar 2021.

Uzimajući u obzir početak radova na rekonstrukciji tunela Crnaja januar 2021, kao i procijenjeno potrebno vrijeme za završetak svih radova (uključujući obustave radova tokom ljeta), implementacija projekta ne bi se mogla završiti do datuma zatvaranja kredita iz kojih se finansiraju radovi (kredit Evropske investicijske banke i Međunarodne banke za razvoj).

Pored toga, nepovoljan utjecaj na napredak izazvan je pandemijom Corona virusom u posljednjih nekoliko mjeseci. Zasada određeni ugovori za radove imaju blago kašnjenje izazvano pandemijom Corona virusom, međutim kontinuirana opasnost od širenja koronavirusa može imati značajne posljedice na implementaciju Programa i njegov završetak.

U skladu sa Sporazumom o zajmu između BIH i Evropske banke za obnovu i razvoj krajnji rok

raspolaganja sredstvima zajma za „Sanaciju šteta od poplava i modernizaciju“ bio je 13 juli 2020. Međutim kako je implementacija projekata započela tek nakon proglašenja efektivnosti I tranša kredita u drugoj polovini 2019, na osnovu zahtjeva Ministarstva finansija i trezora BiH od 08.07.2020, Evropska banka za obnovu i razvoj je produžila krajnji datum raspolaganja sredstvima zajma do 13.01.2024. godine.

Imajući u vidu naprijed navedene okolnosti i značaj Programa JP Ceste FBIH je, u saradnji sa Federalnim ministarstvom prometa i komunikacija i Federalnim ministarstvom finansija, započelo razgovore sa Evropskom investicijskom bankom i Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj za produženje kranjih datuma zatvaranja kredita u cilju potpune implementacija Programa.

JP Ceste F BiH su u izvještajnom periodu ostvarile prihod u iznosu od 90,51 mil.KM, što je 102% od planiranih 88,80 mil.KM. Rashodi su realizovani sa 55,23 mil,KM, ili 96 % od 57,83 mil.KM, koliko je Rebalansom predviđeno.

U skladu sa mišljenjem i preporukom Ureda za reviziju institucija u F BiH, iskazanim u Izvještaju o finansijskoj reviziji za 2019. godinu, da prikupljena novčana sredstva po osnovu naknada od nafte i naftnih derivata i naknada za upotrebu cesta koje se plaćaju pri registraciji vozila nisu poslovni već javni prihodi namjenjeni za održavanje, zaštitu, obnovu, rekonstrukciju i izgradnju javnih cesta i da iste treba iskazivati na poziciji dugoročnih razgraničenja od momenta uplate do njihove realizacije, JP Ceste F BiH je dijelom ovih sredstava 44,98 mil.KM pokrilo razliku prihoda i rashoda poslovanja a ostatak je iskazan na poziciji dugoročnih razgraničenja, do momenta njihove realizacije, odnosno, pokriva otplata kredita i realizacije investicija. Na ovaj način se u bilanci uspjeha iskazuje finansijski rezultat jednak nuli kao i u poreznoj bilanci, jer JP Ceste F BiH nije obveznik poreza na dobit.

Spomenuto pokriva otplata, odnosi se na dospjele obaveze po kreditima za Programe „Rehabilitacija cesta u F BiH“ i „Modernizacija cesta u F BiH“. Program „Rehabilitacija cesta u F BiH“ je okončan 2013. godine, a finansiran je kreditnim sredstvima međunarodnih finansijskih institucija (EBRD, EIB, WB). Svi navedeni krediti su već u otplati. Otplata EBRD kredita je započeta 2010, WB 2017, a i otplata EIB kredita koja se vrši po povučenim tranšama kredita je takođe u toku. JP Ceste F BiH za otplatu oba programa su izdvojile sredstva u iznosu od 18,06 mil.KM.

Tokom izvještajnog perioda Vlada F BiH je usvojila Odluku V Broj:300/2020. godinu, o usvajanju Programa utroška sredstava „Kapitalni transferi javnim preduzećima - transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta“ utvrđenih Budžetom F BiH za 2020 godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija, kojom je JP Ceste F BiH odredila za implementatora sljedećih projekata: Izgradnja brze ceste Lašva –Nević polje – prolaz kroz poslovnu zonu Vitez, Izgradnja Južne obilaznice Mostara, Projekt izgradnje i rješavanje spoja magistralnih cesta M6.1 i M17, te sanacija i rekonstrukcija magistralnih cesta u gradu Mostaru, Poddionica Šićki Brod – Đurđevik na trasi cesta Tuzla - Sarajevo i Izgradnja gradskog autoputa u Sarajevu, dionica Stup – Buća Potok. Vladinom Odlukom V broj:806/2020. od 18. juna 2020. usvojena je izmjena Programa u dijelu obezbjeđenih sredstava Budžetom F BiH za projekte: Izgradnja brze ceste Lašva –Nević polje – prolaz kroz poslovnu zonu Vitez /M5, i Poddionica Šićki Brod – Đurđevik na trasi cesta Tuzla – Sarajevo/M18.

Također, Vlada F BiH je donijela Odluku V broj:663/2020. o kategorizaciji regionalne ceste R-417, Karlov Han – Kazaginac u magistralnu cestu sa oznakom M-16.5.

JP Ceste F BiH su bile angažovane na LOT – 2C projekta Sarajevska obilaznica, na osnovu Odluke Vlade F BiH broj: 233/05, koji se u poslovnim knjigama JP Ceste F BiH vodi vanbilansno. Nakon donošenja odluke Vlade F BiH, izvršiće se prenos na krajnje korisnike, odnosno upravitelje.

Nabavke roba, usluga i radova iz vlastitih sredstava obavljale su se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, a nabavke iz međunarodnih kreditnih sredstava po međunarodnim procedurama kreditora.

JP CESTE FEDERACIJE BIH


Javni prihodi, rashodi, investicije kao i ostale aktivnosti koje su JP Ceste F BiH provodile tokom izvještajnog perioda, dati su u nastavku.

1.I JAVNI PRIHODI


Red Br.	O P I S	Šifra naknade	Realizovano 2019.	Plan 2020.	Rebalans Plana 2020.	Realizovano 2020.	Index 7/6	Index 7/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Naknade od:		96.669.587	98.600.000	88.050.000	88.470.243	100	92
1.1	Nafte i naftnih derivata	717131 717114	46.124.233 17.080.801	46.100.000 17.800.000	39.300.000 14.950.000	38.834.365 15.623.281	99 105	84 91
1.2	Registracije – putarine – fizička lica	722532	17.682.373	18.300.000	17.700.000	17.569.159	99	99
1.3	Registracije – putarine – pravna lica	722531	8.065.460	8.500.000	8.200.000	8.212.775	100	102
1.4	Službe “Pomoć-informacije na cestama“	722535	5.268.037	5.400.000	5.300.000	5.263.518	99	100
1.5	Korištenja cestovnog zemljišta	722538	1.847.449	1.800.000	1.500.000	1.702.614	114	92
1.6	Vanrednih prevoza	722536 722534	461.310	500.000	1.000.000	1.155.178	116	250
1.7	Prekomjerne upotrebe cesta (vage)	722537	141.924	200.000	100.000	109.353	109	77
2.	Druga sredstva osigurana po posebnim propisima		488.340	520.000	450.000	506.033	112	104
2.1	Reklamni panoi	722539	330.012	350.000	300.000	371.630	124	104
2.2	Kamate	722565	37.978	50.000	50.000	36.465	73	96
2.3	Saglasnosti	722565	120.350	120.000	100.000	97.938	98	81
3.	Naknadno utvrđeni prihodi		708.900	200.000	300.000	1.537.702	513	217
	U K U P N O		97.866.827	99.320.000	88.800.000	90.513.978	102	92

U izvještajnom periodu prihodi su realizovani u iznosu od 90,51 mil.KM, što je 102% u odnosu na 88,80 mil.KM planiranih sredstava Rebalansom, a 92% ili 97,87 mil.KM, u odnosu na realizovani prihod u 2019.godini. Iz navedenog se vidi da je prihod JP Cesta F BiH u 2020 godini manji za 7,35 mil.KM u odnosu na prethodnu godinu. Zbog pandemije izazvane coronavirusom ostvaren je pad prihoda, a najviše, po osnovu naknada iz nafte i naftnih derivata, putarina za fizička lica, Službe „Pomoć informacije na cesti“, naknade za korištenje cestovnog pojasa, prekomjerne upotrebe cesta (vage), kamata i saglasnosti. Spomenute naknade ostvarene su u iznosu od 73,97 mil.KM, što je 9,06 mil.KM manje u odnosu na isti period prethodne godine, kada su realizovane sa 83,03 mil.KM. Prihod po osnovu naknada za putarine fizičkih lica, Službe „Pomoć informacije na cesti“, naknade za vanredni prevoz, naknade za postavljanje reklamnih panoa uz cestovni pojas je realizovan u iznosu od 24,36 mil.KM, i veći je za 0,62 mil.KM, u odnosu na 2019. godinu, kada su ove naknade realizovane u iznosu od 23,74 mil.KM. Naknadno utvrđeni prihod je realizovan sa 1,54 mil.KM, a najviše su uticale obračunate pozitivne tečajne razlike SDR-ova i ukidanje rezerviranja po započetim sudskim sporovima.

JP CESTE FEDERACIJE BIH

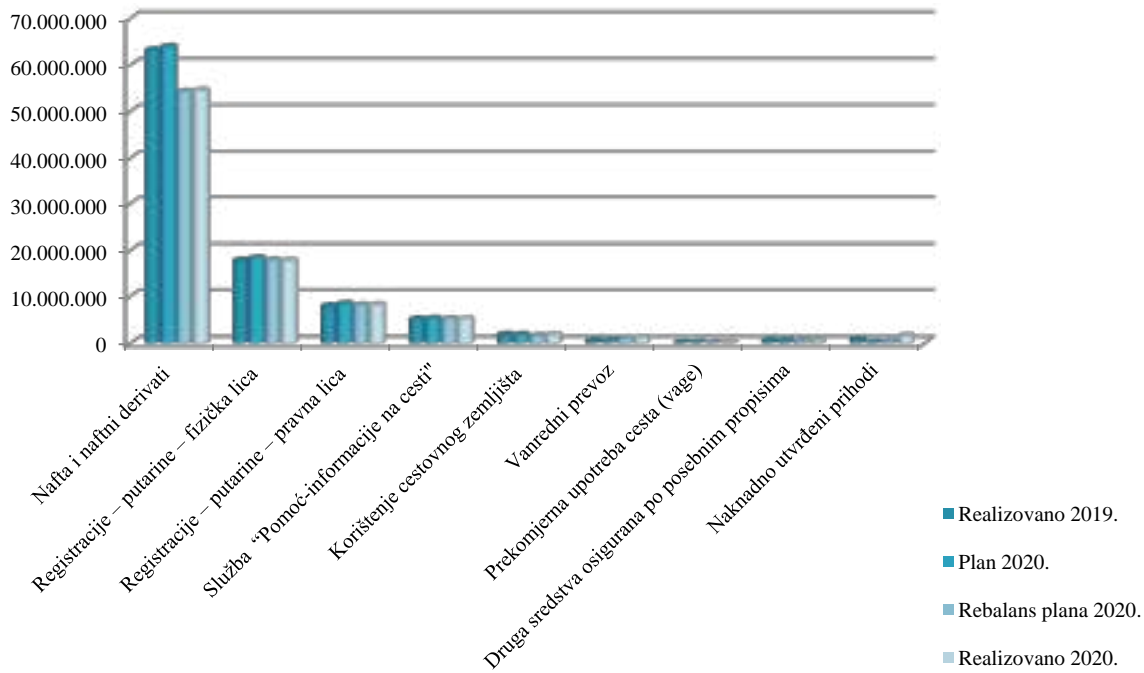

Grafikon prikazuje visinu ostvarenih i planiranih prihoda u 2019 i 2020. godini

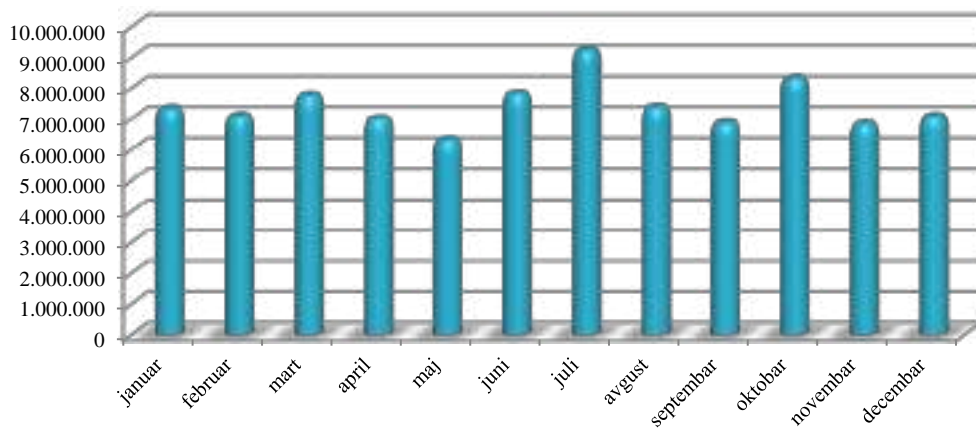


Visina ostvarenih prihoda po mjesecima

1. Naknada od:

1.1. - nafte i naftnih derivata se realizuju na osnovu Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, br. 49/09, 49/14 i 60/14) i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama u BiH („Službeni glasnik BiH“, br.91/17.). Putarina, kao vrsta indirektnog poreza, plaća se na naftne derivate u iznosu od 0,15 KM/ l za puteve na Jedinstven račun Uprave za indirektno oporezivanje. Na osnovu Pravilnika o izračunavanju koeficijenta doznačavanja sredstava entitetima i Distriktu Brčko, te Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH, propisana je raspodjela i pripadnost javnih prihoda. JP Ceste F BiH, zajedno sa kantonalnim direkcijama za puteve u F BiH, pripada iznos od 3,9 % u odnosu na visinu predviđenih sredstava, od čega, na osnovu Zakona o cestama u F BiH, JP Ceste F BiH pripada 40%. Zbog posljedica na privredu Bosne i Hercegovine izazvanih coronavirusom, prema dobijenoj projekciji prihoda od indirektnih poreza, prihod iz naknade - 717131 od nafte i naftnih derivata, Rebalansom je smanjen sa 46,10 mil.KM na 39,30 mil.KM, od čega je realizovano 38,83 mil.KM.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj: 91/2017.), putarina je povećana na 0,25 KM/l, od čega 0,05 KM/l za druge puteve, a namijenjena je za izgradnju autoputeva i izgradnju i rekonstrukciju drugih puteva. Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje usvojio je Odluku o privremenoj raspodjeli prihoda, kojom je utvrđeno da od ukupnih prihoda od putarine za izgradnju autoputeva i izgradnju i rekonstrukciju drugih puteva 10% ostaje na podračunu kod Centralne banke BiH i služi za poravnanje prihoda po utvrđivanju konačne metodologije raspodjele, a preostalih 90% prihoda podijeljeno je između entiteta i Brčko Distrikta. U Federaciji BiH prihod se raspoređuje na osnovu Zakona o cestama F BiH, po kome JP Ceste F BiH pripada 40 % od dobijenih sredstava. Ova naknada je, prema Projekciji, Rebalansom planirana u iznosu od 14,95 mil.KM, a realizovana je u iznosu od 15,62 mil.KM.

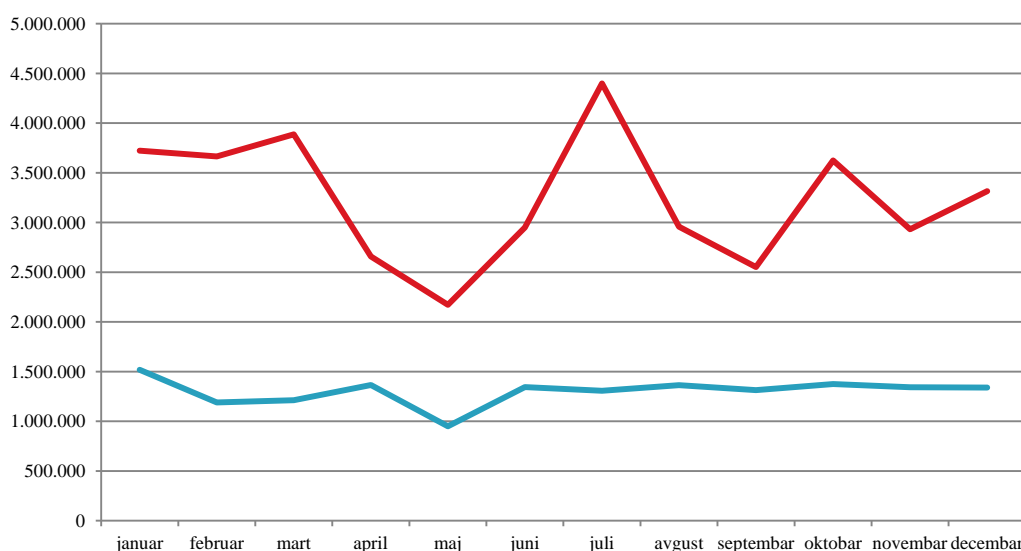


Grafički prikaz visine prihoda naknade (717131 i 717114) od nafte i naftnih derivata po mjesecima

1.2.i 1.3 putarine za fizička i pravna lica – Naknada se uplaćuje na osnovu „Uredbe o visini godišnje naknade za javne ceste koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila“, V broj: 202/2015, donesnom na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, a usvojene od strane Vlade F BiH. Od Rebalansom planiranih 25,90 mil.KM, realizovano je 25,78 mil.KM. Putarine za fizička lica

JP CESTE FEDERACIJE BIH

imale su pad prihoda u odnosu na prethodnu godinu za 0,11 mil.KM, dok je prihod od putarina za pravna lica povećan realizovan više za 0,15 mil.KM u odnosu na prihod po istom osnovu za prethodnu godinu.

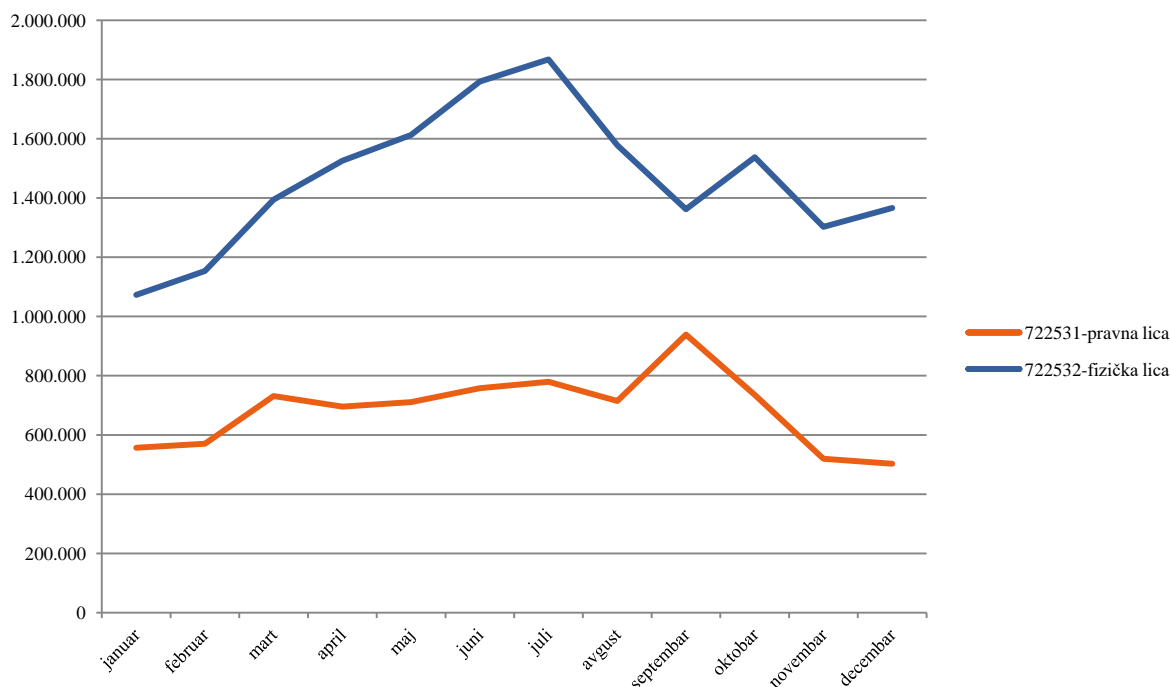

Grafički prikaz visine prihoda od putarina po mjesecima

1.4 službe “Pomoć-informacije na cestama” - u izvještajnom periodu je realizovana sa 5,26 mil.KM, što je 99% od planiranih 5,30 mil.KM. U odnosu na prethodnu godinu ostvaren je neznatno manji prihod, tako da procentualno iznosi 100%. Inače, naknada je definisana članom 88. i 100. Zakona o cestama Federacije BiH i Odlukom Vlade Federacije BiH V broj: 45/11 („Službene novine Federacije BiH“, br: 5/11.).

1.5. korištenja cestovnog zemljišta – je regulisana na osnovu Uredbe o izmjeni i dopuni visine naknade za korištenje zemljišta uz javni pojas, V broj: 956/2015, donesenom od strane Vlade F BiH. Iako su JP Ceste F BiH, zbog coronavirusa, smanjile planirana sredstva, realizovan je prihod u iznosu od 1,70 mil.KM, što je 14% više u odnosu na plan ili 0,20 mil.KM.

Potraživanja JP Ceste F BiH po osnovu zakupa zemljišta i panoa u cestovnom pojasu iznose 0,63 mil.KM, gdje su najveći dužnici: Buba Commerce d.o.o.Vitez (56.704KM); Media Res d.o.o. Mostar (39.178KM); Metromedia d.o.o. Sarajevo (38.832KM); Trgo Santovac d.o.o.Srebrenik (27.290 KM); Unitrade d.o.o.Ljubuški (25.493 KM); Belamionix d.o.o. Brčko Distrikt (24.400KM); Petrol d.d. Ljubuški (18.466KM); Hujdur Ahmet Tešanaj (14.732KM); Nasko d.o.o.Gračanica (12.125 KM); Babić d.o.o.Jablanica (14.136KM); DIBS 98 d.o.o.Bihać (11.872KM); Zovko auto d.o.o. Žepče (11.700KM)...

Sumnjiva i u sporu potraživanja iznose 1,43 mil.KM, a utuženi dužnici sa najvećim dugom su: Media Res d.o.o. Mostar (283.023KM); Petrol d.d. Ljubuški (117.475KM); Trgo Santovac d.o.o.Srebrenik (64.681 KM); Buba Commerce d.o.o.Vitez (61.048 KM); Kasumović Fuad i Mersija (43.536 KM); Zovko Oil d.o.o. Žepče (49.938KM); Europlakat d.o.o.Sarajevo (30.946 KM); Ves d.o.o. Žepče (27.041KM), TGT Trag Tas d.o.o. Ilijaš (25.400KM); OS Petrol d.o.o.Srebrenik (28.638KM); D&B Transport d.o.o.Busovača (20.138KM); Općina Posušje (19.739KM); Prestiž d.o.o. Posušje (17.266KM); Hasanović Irfan, Kalesija (22.204KM); AgroDG d.o.o. Cazin (14.907 KM); Autosaoobraćaj d.d. Travnik (15.256KM); Binela Komerc d.o.o.Vitez (12.236 KM); Begić Mustafa, Bihać (10.248KM);

JP CESTE FEDERACIJE BIH

CMA d.o.o Posušje (14.040KM); Dizdarević Ejub Bihać (15.204KM); Đug Smail, Živinice (14.476 KM); Exicon d.o.o. Bihać (10.524KM); Grad Bihać (10.546KM); Integral-SN d.o.o. Ključ (10.540KM); Kalen d.o.o.Zenica (16.626KM);Termoglas d.o.o. Velika Kladuša (15.652 KM) Maypet d.o.o. Zenica (10.485KM); Oštraković Amir Tuzla (17.892KM); Rizvić Mehmedalija, Konjic (13.356KM); Sinbra d.o.o.Tuzla (16.941KM); TalićTank d.o.o.Sanski most (17.514KM);Mustapić Frigo d.o.o. Široki Brijeg (10.926KM)...


1.6. i 1.7. vanrednih prevoza i prekomjerne upotrebe cesta (vage) – je realizovana u iznosu od 1,26 mil.KM, što je za 0,16 mil.KM više u odnosu planiranih 1,10 mil.KM, za obje naknade. U strukturi, visine prihoda, najveću realizaciju je imao vanredni prevoz u iznosu od 1,16 mil.KM, što je više za 16% u odnosu na planiranih 1,00 mil.KM. Ovako visoku realizaciju prihoda JP Ceste F BiH po ovom osnovu su prvi put ostvarile, a razlog je prevoz tereta vezanog za projekat izgradnje vjetroelektrane Podveležje. Zbog pandemije, prvobitno planirani prihod u iznosu od 0,20 mil.KM od prekomjerne upotrebe cesta (vage) je smanjen na 0,10 mil.KM, a u konačnici je realizovan 0,11 mil.KM ili 9% više od planiranih sredstava. Ostvaruje se po osnovu Zakona o cestama u F BiH, Pravilnika o utvrđivanju uslova za obavljanje javnih prevoza vozila na magistralnoj cesti i Pravilnika za utvrđivanje prekomjerne upotrebe javnih cesta.

2. Druga sredstva čine:

2.1 Naknada za reklamne znakove (panoi) u cestovnom pojasu – Iako je Rebalansom planirano manje sredstava u odnosu na Plan, a sve zbog coronavirusa, prihod je ostvaren u iznosu od 0,37 mil.KM ili 24% više u odnosu na Rebalansom predviđenih 0,30 mil.KM. Naknada se obračunava se na osnovu Zakona o cestama F BiH, Pravilnika o postavljanju reklamnih znakova na cestama i Uredbom o visini naknade za korištenje zemljišta uz javne ceste („Službene novine F BiH“, br: 58/2015.).

2.2 i 2.3 – kamata i saglasnosti – planirane su u iznosu od 0,15 mil.KM, a ostvarene sa 0,13 mil.KM ili 90%

3.Naknadno utvrđen prihod – Realizovan je u iznosu od 1,54 mil.KM, a najveću stavku čini ukidanje rezerviranja po sudskim sporovima u iznosu od 0,85 mil.KM, obračunate pozitivne kursne razlike SDR-ova na kredit WB za Program “Rehabilitacija cesta u F BiH” u iznosu od 0,55 mil.KM, prihod od naplate štete od osiguravajućih kuća 0,07 mil.KM, od regresnih potraživanja 0,02 mil.KM i dr...

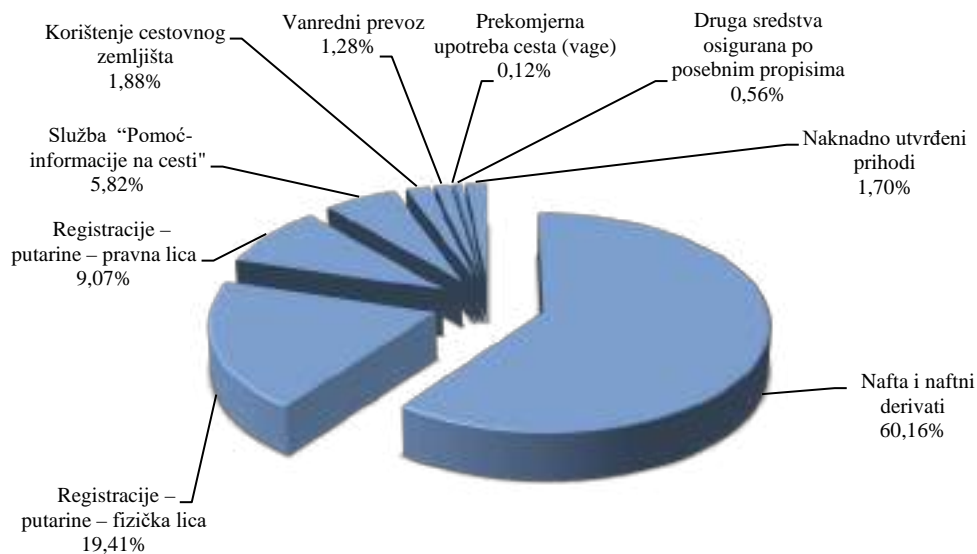

Grafik prikazuje strukturu realizovanih prihoda

A.II AMORTIZACIJA


Red. Br.	OPIS	Realizovano 2019	Plan 2020.	Rebalans Plana 2020.	Realizovano 2020.	Index 6/5	Index 6/3
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Amortizacija stalnih sredstava	262.555	300.000	300.000	361.700	121	138
UKUPNO		262.555	300.000	300.000	361.700	121	138

Napomena: Objašnjenje amortizacije dato na strani 32.

B. I JAVNI RASHODI

Red Br.	O P I S	Realizovano 2019.	Plan 2020.	Rebalans Plana 2020.	Realizovano 2020.	Index 6/5	Index 6/3
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Troškovi poslovanja	5.840.695	7.142.000	6.695.000	6.367.350	95	109
2.	Služba pomoć-informacije	4.983.733	5.022.000	4.929.000	4.957.389	101	99
3.	Redovno održavanje	35.127.990	40.257.000	40.222.000	37.212.490	92	106
4.	Rezervirana sredstva za rizike, neplanirane rashode i rashode koji ne terete projekte	3.211.083	1.700.000	1.900.000	3.493.045	184	109
5.	Rezervirana sredstva za sudske presude	508.176	600.000	970.000	1.266.757	131	249
6.	Troškovi konsultantskih usluga	599.409	1.820.000	1.811.500	748.084	41	125
7.	Kamate, servisni troškovi, kursne razlike, provizije	3.167.997	1.560.000	1.300.000	1.207.241	93	38
	U K U P N O	53.439.083	58.101.000	57.827.500	55.252.356	96	104

Rashodi su realizovani u iznosu od 55,23 mil.KM, što je 96% ili 2,60 mil.KM manje u odnosu na Rebalansom planiranih 57,83 mil.KM. U odnosu na prethodnu godinu, procentualno realizacija rashoda je veća za 4% ili 1,79 mil.KM. Najveću realizaciju imali su rashodi redovnog održavanja u iznosu od 37,21 mil.KM, što je 92 % ili 3,01 mil.KM manje od planiranih 40,22 mil.KM. Troškovi poslovanja realizovani su u iznosu od 6,37 mil KM ili 95% od 6,69 mil.KM planiranih sredstava. Po visini rashoda sljedeći su: „Služba pomoć informacije“, rezervirana sredstva za rizike, neplanirane rashode i rashode koji ne terete projekte, rezervirana sredstva za sudske presude, kamate, servisni troškovi, kursne razlike, provizije i troškovi konsultantskih usluga.

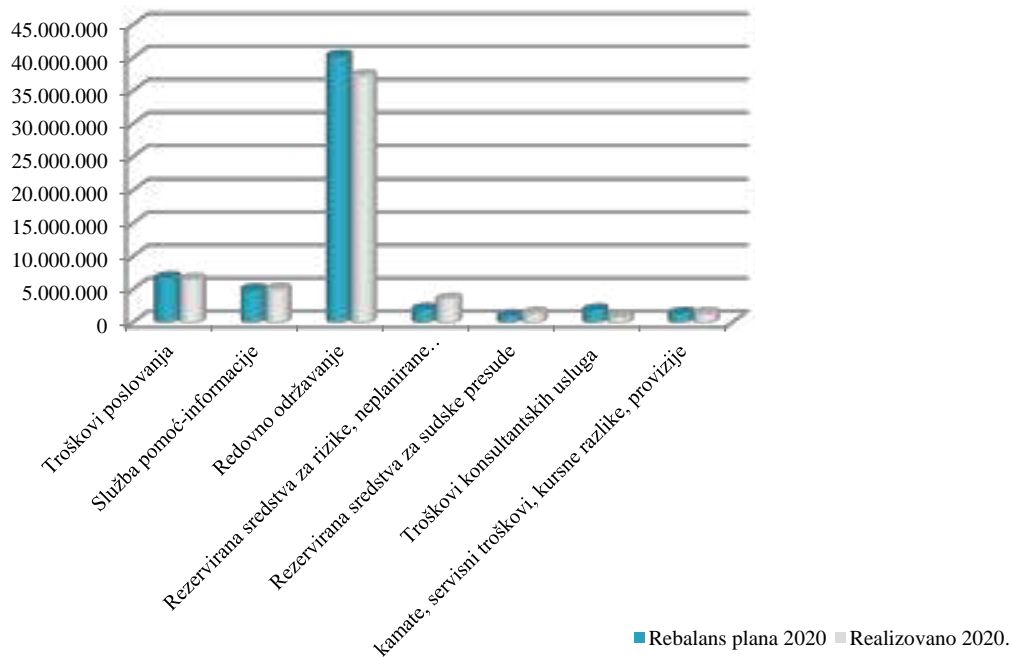

Grafički prikaz visine planiranih i realizovanih rashoda

1. Troškovi poslovanja

Red. br.	OPIS	Realizovano 2019.	Plan 2020.	Rebalans Plana 2020.	Realizovano 2020.	Index 6/5
1	2	3	4	5	6	7
I	Troškovi zaposlenih	4.432.419	5.480.000	5.265.000	5.060.630	96
II	Materijalni troškovi i usluge	1.408.276	1.662.000	1.430.000	1.306.720	91
	UKUPNO I+II	5.840.692	7.142.000	6.695.000	6.367.350	95

Troškovi poslovanja su realizovani u iznosu od 6,37 mil.KM ili 95% od planiranih 6,69 mil.KM. Na troškove zaposlenih se odnosi 5,06 mil.KM, a na materijalne troškove i usluge 1,31 mil.KM.

I Troškovi zaposlenih

Kao što smo već naveli troškovi zaposlenih su realizovani u iznosu od 5,06 mil.KM, što je 96% od planiranih 5,26 mil.KM. Troškovima su obuhvaćene isplate bruto plaća radnika i naknade, u skladu sa Pravilnikom o radu.

II Materijalni troškovi i usluge

Red. br.	O P I S	Realizovano 2019.	Plan 2020.	Rebalans Plana 2020.	Realizovano 2020.	Index 6/5	Index 6/3
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	kancelarijski i potrošni materijal	50.025	55.000	50.000	32.932	66	66
2.	električna energija	35.068	45.000	38.000	33.824	89	96
3.	gorivo i mazivo za automobile	86.405	110.000	95.000	61.678	65	71
4.	otpis sitnog inventara i auto guma	7.293	17.000	25.000	20.633	83	283
5.	usluge održavanja, servisiranja i registracije	184.666	250.000	200.000	219.297	110	119
6.	učesće na sajmovima i seminarima	84.296	82.000	5.000	4.654	93	6
7.	stručna literatura i časopisi	12.200	15.000	15.000	9.299	62	76
8.	grijanje	27.782	45.000	40.000	31.440	79	113
9.	zakupnina (poslovni prostori i licence)	114.795	112.000	125.000	133.591	107	116
10.	reklama i propaganda	12.169	35.000	35.000	2.526	7	21
11.	osiguranje imovine i lica i ljekarski pregledi	73.635	65.000	60.000	37.793	63	51
12.	bankarske usluge	19.778	10.000	15.000	16.058	107	81
13.	reprezentacija	32.378	40.000	35.000	29.451	84	91
14.	naknade za službena putovanja u zemlji	73.856	60.000	45.000	45.110	100	61
15.	naknade za službena putovanja u inostranstvu	46.143	45.000	10.000	-	-	-
16.	privremeni i povremeni poslovi, ugovori o djelu	28.691	40.000	20.000	21.142	106	74
17.	bruto naknade za članove Nadzornog odbora	80.159	82.000	86.000	84.745	99	106
18.	održavanje čistoće	40.443	40.000	51.000	47.366	93	117
19.	osiguranje zgrade	9.079	10.000	9.000	8.002	89	88
20.	PTT usluge	105.580	110.000	110.000	113.475	103	107
21.	komunalne usluge	16.907	18.000	18.000	16.066	89	95
22.	stručno osposobljavanje	0	10.000	10.000	6.156	62	-
23.	tenderi, konkursi i oglasi	43.810	60.000	65.000	71.658	110	164
24.	takse	23.067	40.000	30.000	20.034	67	87
25.	advokatske usluge i trošk.vještačenja	9.025	50.000	30.000	12.265	41	136
26.	troškovi eksterne revizije	17.630	12.000	12.000	-	0	0
27.	troškovi Odbora za reviziju	34.736	36.000	26.000	19.177	74	55
28.	ostali troškovi poslovanja	42.700	50.000	50.000	90.153	181	211
29.	kamate i kursne razlike	759	1.000	1.000	415	42	55
30.	naknadno utvrđeni rashodi	69.986	90.000	90.000	88.889	99	127
31.	troškovi koji ne zavise od finansijskog rezultata	25.215	27.000	29.000	28.891	100	115
	UKUPNO II	1.408.276	1.662.000	1.430.000	1.306.720	91	93

Materijalni troškovi i usluge su realizovani u iznosu od 1,31 mil.KM, što je 91 % u odnosu na predviđenih 1,43 mil.KM. Većina troškova je realizovana manje, u odnosu na visinu planiranih sredstava. Međutim, zbog nepredviđenih okolnosti, na nekim stavkama planirana sredstva su više realizovana, kao što su usluge održavanja, servisiranja i registracije, koje obuhvataju troškove održavanja stalnih sredstava: zgrada, liftovi.. (0,13 mil.KM), održavanje transpornih sredstava (0,08 mil.KM), i troškovi registracije automobila, te ostali troškovi poslovanja koji obuhvataju: rezerviranja sredstava za otpremnine zaposlenih u skladu sa MRS (0,04 mil.KM), troškove garažiranja službenih vozila, troškove članarina drugim udrugama i dr...). U konačnici, nije došlo do prekoračenja ukupno planiranih sredstava, u odnosu na visinu realizovanih sredstava.

2.Služba “Pomoć – informacije na cestama”

Služba „Pomoć-informacije“ na cestama F BiH (u nastavku SPI) povjerena je kao javno ovlaštenje JP Ceste F BiH po odredbama člana 100. stav 2. Zakona o cestama F BiH, a posebna naknada za SPI regulisana je na osnovu člana 88. tačke 5. i člana 100. stav 3 Zakona o cestama F BiH i Odluke o službi „Pomoć-informacije“ (Vlada Federacije BiH, od 20. januara 2011. godine).

Po osnovu člana 100. stav 2 Zakona o cestama F BiH, člana 70. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“ br. 39/14), a u skladu sa uvjetima definiranim Dokumentima ponude uz objavljeni Javni oglas za izbor najpovoljnije ponude za obavljanje poslova službe „Pomoć-informacije“ na cestama F BiH i na osnovu provedenog otvorenog postupka, za period: od 01.01.2019. do 31.12.2020. godine, temeljem okvirnog sporazuma i Odluke o dodjeli ugovora za obavljanje usluga Službe „Pomoć-informacije“ (SPI) na javnim cestama u F Bosne i Hercegovine su sklopljeni ugovori za 2020. godinu sa:

- **Auto moto savez u Bosni i Hercegovini** (skraćeni naziv **AMS u BiH**) Mostar za obavljanje poslova „Pomoć-informacije“ na području: Posavskog kantona (1 vozilo), Kanton Središnja Bosna (3 vozila), Hercegovačko-neretvanskog kanton (3 vozila), Zapadnohercegovačkog kantona (2 vozila) i Kanton 10 (2 vozila), i
- **BIHAMK** (Bosanskohercegovački auto-moto klub) Sarajevo za obavljanje poslova „Pomoć-informacije“ na području: Unsko-sanskog kantona (4 vozila), Tuzlanskog kantona (5 vozila), Zeničko-Dobojskog kantona (4 vozila), Bosansko-podrinjskog kantona (1 vozilo), Srednjo-bosanskog kantona (2 vozila), Hercegovačko-neretvanskog kantona (4 vozila) i Kantona Sarajevo (5 vozila + 1 vozilo-spec. vozilo «rescue car»).

Ugovorom je definisano da se isplata vrši prema mjesečnim privremenim obračunskim situacijama nakon izvršene kontrole od strane uposlenika JP Ceste F BiH. Nadzor nad radom Službe „Pomoć-informacije“ obavlja ovlašteno lice JP Ceste F BiH tako što vrši kontrolu privremenih obračunskih situacija, odnosno dnevnika informisanja i dnevnika pomoći na cesti za svaku bazu SPI. Planskim obilaskom baza SPI i putem nadzora pružanja intervencija na terenu kontroliše se na licu mjesta rad uposlenika SPI (izgled izvršioca i vozila, opremljenost, urednost vođenja dnevnika, tehnika pružanja pomoći i sl.), te se zapisnički konstatuje nađeno stanje.

Za svaku akciju iz Programa prometno - preventivnih aktivnosti izdaje se odobrenje, a na osnovu zahtjeva u kojem stoji šta će se raditi, od kada do kada, gdje, koliko će sudionika i vozila biti uključeno... Nakon završetka akcije, u okviru obračunske situacije, kontroliše se izvještaj koji sadrži navedene elemente i finansijski dio (strukturu i specifikaciju svih troškova sa računima za izvršene usluge i nabavke).

Prema dostavljenim mjesečnim obračunskim situacijama tokom 2020. godine ostvaren je sljedeći obim poslova i prihod po osnovi naknade za poslove SPI:

R. br.	Izvršitelj usluga SPI	Prispjela sredstva	% umanjeње po osnovu člana 5. Ugovora **	Obaveza Razlika (2-3)	Vrijednost situiranih radova	Razlika (4-5) *
	1	2	3	4	5	6
1	BIHAMK Sarajevo	4.188.071	243.819	3.944.252	3.887.682	56.570
2	AMS U BIH Mostar	1.075.447	62.610	1.013.137	1.000.165	12.972
UKUPNO		5.263.518	306.429	4.957.389	4.887.847	69.542

Pregled obima poslova i prihoda po osnovi naknade za poslove SPI

- * Po osnovu godišnjeg obračuna vrijednost situiranih radova u 2020. godini za SPI je bio **manji** za :
 - **56.570 KM** kod BIHAMK-a, i
 - **12.972 KM** kod AMS u BIHpa će taj dio razlike novčanih sredstava biti uvećan AMK-a u situaciji za februar 2021. godine.
- ** Procentualno umanjeње iz kolone 4 se vrši na osnovu Odluke o visini naknade za troškove implementacije iz sredstava za poslove „Pomoć – informacije“ na cestama (odluka Nadzornog odbora broj : 01-03.2-NO-6835-6/07 od 17.12.2007. godine), a po godišnjem obračunu, u iznosu od 5,7164 % (ovaj procenat predstavlja udio SPI u ukupnim prihodima po konačnom obračunu JP C FBiH).

Za navedene i izvršene poslove SPI u Federaciji BiH, tokom 2020. godine, utrošena su ukupna sredstva kako slijedi:

- Pomoć na cesti	3.793.746 KM
- Informiranje	769.598 KM
- <u>Prometno-preventivne aktivnosti</u>	<u>324.503 KM</u>
U K U P N O	4.887.847 KM

U izvještajnom periodu znatno smo unaprijedili poslove informiranja javnosti o stanju prohodnosti cesta u BiH putem postavljanja „live“ kamera za videonadzor saobraćajnica na specifičnim lokacijama (prevojima, graničnim prijelazima ...) gdje građani mogu direktno vidjeti putem posjete web stranica: BIHAMK –a (76 lokacija) i AMS u BIH (31 lokaciju) kakvo je stanje na cesti.

Zaključno, BIHAMK (Bosanskohercegovački auto-moto klub, Sarajevo) i AMS u BIH (Auto-moto savez u Bosni i Hercegovini, Mostar) su poslove pomoći na cesti, informisanja i prometno-preventivnih aktivnosti izvršili u potpunosti s obzirom na priliv finansijskih sredstava.

3. Redovno održavanje cesta

Prema Zakonu o cestama u F BiH i Pravilniku o održavanju javnih cesta, održavanje cesta čini skup mjera i radnji koje se obavljaju tokom većeg dijela godine ili cijele godine na cestama, uključujući i sve objekte i instalacije sa svrhom održavanja prohodnosti, tehničke ispravnosti i sigurnosti prometa na cestama. U redovno održavanje cesta uključeni su i radovi održavanja cesta i objekata u zimskim uslovima.

U postupku javne nabavke, za 10 od 12 tenderisanih LOT-ova je okončan postupak javne nabavke u 2019 godini, i sa odabranim izvođačima radova sklopljeni Okvirni sporazumi za period 01.07.2019. - 30.06.2023 godine, i jednogodišnji ugovori za period 01.07.2019.-30.06.2020., a potom i za period 01.07.2020.-30.06.2021. godina Sklapanjem novih ugovora, povećana je i ukupna dužina magistralnih cesta koje su predmet redovnog održavanja, pošto su uključene i neke nove dionice cesta – izgrađene ili u izgradnji, odnosno dionice preuzete prekategoričacijom.

Pored navedenog, i za novoproglašenu magistralnu cestu M-4.3 (LOT 14) postupak javne nabavke je okončan krajem 2019 godine, te je sa odabranim izvođačem radova – „Kovgrad“ Bužim sklopljen Okvirni sporazum za period 15.11.2019-14.11.2023 godine i jednogodišnji ugovor za period 15.11.2019. -14.11.2020.g, a potom i za period 15.11.2020.-14.11.2021.g.

Postupak javne nabavke radova redovnog održavanja za LOT 13 (novoproglašena magistralna cesta M-17.5) je završen okončanjem žalbenog postupka početkom 2020 godine, te je sa odabranim izvođačem radova -Konzorcij „Putovi“ Grude, KTM „Brina“ Posušje i „HP investing“ Mostar, sklopljen

Okvirni sporazum za period 01.02.2020-31.01.2024 godine, i jednogodišnji ugovor za period 01.02.2020.-31.01.2021.g.

Pošto postupci nabavke za LOT 5 i 7 nisu okončani do 14.11.2019., održavanje cesta na LOT-u 5 i LOT-u 7 je privremeno ustupljeno izvođačima radova koji su već sklopili okvirne sporazume za period 01.07.2019-30.06.2023 godine.

Na LOT-u 7 poslovi redovnog održavanja za period 15.11.2019-15.03.2020. g. su privremeno ugovoreni tako što je ukupna dužina LOTa 7 od 128,837 km podjeljena na tri ugovora: Ugovor s izvođačem „Sarajevoputevi“ Sarajevo za dionicu ceste M-17 Konjic-Jablanica-Drežnica dužine 39,942 km, Ugovor sa izvođačem „Ceste“ Mostar (TI Mostar) za dionicu ceste M-17 Drežnica-Mostar i ceste M-6.1 Mostar-Nevesinje dužine 58,748 km te Ugovor sa izvođačem „Ceste“ Mostar za dionicu ceste M-16.2 Prozor-Jablanica dužine 30,147 km (TI Kiseljak)

Okončanjem žalbenog postupka za LOT 7 31.01.2020. godine su završeni privremeni ugovori, i sa odabranim izvođačem – Konzorcij „HP investing“ Mostar i „Hercegovinaputevi“ Trebinje sklopljen Okvirni sporazum za period 01.02.2020. - 31.01.2024. godine, i jednogodišnji ugovor za period 01.02.2020.-31.01.2021g.

Postupak nabavke za LOT 5 nije okončan ni do kraja 2020. godine, pošto je krajem 2020. godine Sud BiH poništio posljednje Rješenje URŽa, pa će se postupak nabavke nastaviti u 2021 godini.

Na LOT-u 5 poslovi redovnog održavanja su privremeno ugovoreni tako što je ukupna dužina LOTa 5 od 136,782 km je podijeljena na: LOT 5a „Dobojputevi“ Doboj Jug za dio ceste M-5 i cestu M-16 (ukupno 79,04 km) i LOT 5b Konzorcij „Jata group“ Srebrenik i „HiH“ Živinice za dio ceste M-5 Torlakovac-Nević Polje (ukupno 57,742 km). Privremeni ugovori do završetka postupka nabavke, sklopljeni su za period 20.11.2019-15.03.2020. godine, produženi do 30.06.2020 godine, zatim do 14.11.2020 godine, i nakon toga do 15.03.2021. godine

Radovi redovnog održavanja u 2020. godine su vršeni na čišćenju i sanaciji kolovoza, ophodnji cesta, obnavljanju horizontalne i vertikalne prometne signalizacije i cestovne opreme, regulisanju odvodnje, košenju cestovnog pojasa i poboljšanju preglednosti, održavanju bankina, bermi, kosina usjeka i nasipa, održavanju objekata, potpornih i obložnih zidova, sve u skladu sa potrebama cesta i Pravilnikom o održavanju javnih cesta

Zimsko održavanje cesta - zimska služba

U periodu od 01.01.2020. - 15.03.2020. godine odnosno od 15.11-31.12.2020 godine kada se, prema Pravilniku, uspostavlja zimska služba na mreži magistralnih cesta u FBiH, formirano je dežurstvo na punktovima zimske službe, te izvršavani poslovi prema Operativnom planu zimske službe: čišćenje snijega i sprječavanje poledice na kolovozu, objektima i proširenjima kolovoza, obilježavanje širine planuma ceste rubnim motkama, nabavka, preuzimanje i deponovanje posipnog materijala, uklanjanje materijala sa kolovoza, uklanjanje vozila koja ometaju saobraćaj, osiguranje odvodnje u vrijeme padanja kiše i otapanja snijega, sprječavanje izlivanja vode na kolovoz, održavanje kolovoza i saobraćajne signalizacije u ispravnom stanju, postavljanje znakova II-46 „obavezna upotreba zimske opreme“ na pogodnim mjestima na ulazu u područje F BiH i pred usponima, informisanje o stanju na cestama.

Prema novim Okvirnim sporazumima, nabavku soli za posipanje cesta vršili su izvođači radova, a 20% od planiranih količina za sve izvođače osiguralo je JP Ceste F BiH kao rezervu. Ugovorena ja nabavka 1.000 tona industrijske soli NaCl granulacije 0/1 (LOT 2) za 2019/2020 godinu sa firmom Bom Impex po ugovoru 01-02.2-13893/19. U 2019 godini je realizovana isporuka 300 tona, a u 2020 godini

JP CESTE FEDERACIJE BIH

preostalih 700 tona. Ugovorena je i nabavka 22 tone CaCl₂ za 2019/2020 godinu u vrijednosti 19.048 KM po ugovoru 01-02.2-13992/19 od 06.12.2019. sa firmom Macot Sol Mostar.

Nabavka 925 tona morske soli 0/4 mm (LOT 1) nije realizovana u 2019 godini zbog žalbenog postupka. Nakon okoćanja žalbenog postupka krajem 2020 godine, sa firmom „Macot Sol“ Mostar ugovorena je nabavka soli za LOT 1, a prema postupku nabavke započetom u 2019 godini.

Prema potpisanom Sporazumu, učešće JP Ceste FBiH u održavanju pružnih prelaza na cesti M-14 Bihac – Bosanska Krupa iznosi 50% vrijednosti radova, a učešće JP Željeznice F BiH 50%. U 2020 godini nije bilo realizacije po ovom Sporazumu

Troškovi redovnog održavanja mostova i održavanje elektroopreme za rasvjetu tunela i prilaznih zona tunelima, rasvjete raskrsnica, semafora i trafostanica su realizovani prema potpisanim ugovorima sa izvođačima radova, a troškovi električne energije za rasvjetu tunela, raskrsnica i mostova, te semafora i brojača prometa su realizovani prema stvarnom utrošku odnosno prema fakturama Elektrodistribucije.

Pregled Sporazuma i ugovora redovnog održavanja magistralnih cesta po okončanju postupka nabavke za period naveden u tabeli:

Red.br	LOT	Izvođač	Vrijednost Okvirnog sporazuma	broj Okvirnog sporazuma	Period važenja Okvirnog sporazuma
1.	LOT 1	Rad-putevi Bihac, Behić Sanny Boy Bihac i Divel Sanski Most	12.565.800	01-02.2-7787/19	01.07.2019.-30.06.2023
2.	LOT 2	Kov-grad Bužim i I-Selimović Cazin	11.243.700	01-02.2-7788/19	01.07.2019.-30.06.2023
3.	LOT 3	Konz: Jata-group, Srebrenik,HIH Živinice,	19.691.100	01-02.2-7789/19	01.07.2019.-30.06.2023
4.	LOT 4	Dobojuputevi Doboju jug	10.073.700	01-02.2-7790/19	01.07.2019.-30.06.2023
5.	LOT 6	Goraždeputevi Goražde	6.493.500	01-02.2-7791/19	01.07.2019.-30.06.2023
6.	LOT 7	Konz. HP Investing Mostar i Hercegovina putevi Trebinje	6.549.920	01-02.2-1325/20.	01.02.2020.-31.01.2024.
7.	LOT 8	Sarajevoputevi Sarajevo	12.506.250	01-02.2-7792/19.	01.07.2019.-30.06.2023
8.	LOT 9	Ceste Mostar	4.538.560	01-02.2-7793/19.	01.07.2019.-30.06.2023
9.	LOT 10	Ceste Mostar	11.447.261	01-02.2-7794/19.	01.07.2019.-30.06.2023
10.	LOT 11	Ceste Mostar	24.205.658	01-02.2-7795/19.	01.07.2019.-30.06.2023
11.	LOT 12	Ceste Mostar	17.877.596	01-02.2-7796/19.	01.07.2019.-30.06.2023
12.	LOT 13	Konz. Putovi Grude, KTM Brina Posušje HP Investing Mostar	5.670.853	01-02.2-1328/20.	01.02.2020.-31.01.2024.
13.	LOT 14	Kov-grad Bužim	4.282.200	01-02.2-12930/20	15.11.2019.-14.11.2023.
		UKUPNO	147.146.098		

Ugovori 2019/2020 (01.07.2019-30.06.2020).

Red.br	LOT	Izvođač	Vrijednost ugovora	broj ugovora	Ugovoreni period:
1.	LOT 1	Rad-putevi Bihac, Behić Sanny Boy Bihac i Divel Sanski Most	2.924.720	01-02.2-7797/19	01-07.2019-30.06.2020.
2.	LOT 2	Kov-grad Bužim i I-Selimović Cazin	2.632.497	01-02.2-7798/19	01.07.2019-30.06.2020.
3.	LOT 3	Konz: Jata-group, Srebrenik,HIH Živinice,	4.574.697	01-02.2-7799/19	01.07.2019-30.06.2020.
4.	LOT 4	Dobojuputevi Doboju jug	2.337.218	01-02.2-7800/19.	01.07.2019-30.06.2020.
5.	LOT 5a	Dobojuputevi Doboju jug	716.922	01-02.2-13485/19.	20.11.2019.-15.03.2020.
6.	LOT 5b	Konz: Jata-group, Srebrenik,HIH Živinice	363.791	01-02.2-13486/19.	20.11.2019.-15.03.2020.

JP CESTE FEDERACIJE BIH

7.	LOT 5a	Dobojuputevi Doboj jug	349.917	01-02.2-3330/20.	16.03.2020.-30.06.2020.
8.	LOT 5b	Konz. Jata group Srebrenik i HIH Živinice	250.182	01-02.2-3331/20.	16.03.2020.-30.06.2020.
9.	LOT 6	Goraždeputevi Goražde	1.517.556	01-02.2-7801/19.	01.07.2019-30.06.2020.
10.	LOT 7	Sarajevoputevi Sarajevo	242.949	01-02.2-13293/19.	15.11.2019.-15.03.2020.
11.	LOT 7	Ceste Mostar TI Mostar	234.882	01-02.2-13292/19.	15.11.2019.-15.03.2020.
12.	LOT 7	Ceste Mostar TI Kiseljak	233.614	01-02.2-13291/19.	15.11.2019.-15.03.2020.
13.	LOT 8	Sarajevoputevi Sarajevo	2.901.598	01-02.2-7802/19.	01.07.2019-30.06.2020.
14.	LOT 9	Ceste Mostar	1.053.000	01-02.2-7803/19.	01.07.2019-30.06.2020.
15.	LOT 10	Ceste Mostar	2.655.900	01-02.2-7804/19.	01.07.2019-30.06.2020.
16.	LOT 11	Ceste Mostar	5.615.999	01-02.2-7805/19.	01.07.2019-30.06.2020.
17.	LOT 12	Ceste Mostar	4.147.814	01-02.2-7806/19.	01.07.2019-30.06.2020.
18.	LOT 14	Kov-grad Bužim	994.499	01-02.2-12929/19	15.11.2019.-14.11.2020
UKUPNO			33.747.755		

Ugovori 2020/2021 (01.07.2020-30.06.2021.)

Red.br	LOT	Izvođač	Vrijednost ugovora	broj ugovora	Ugovoreni period:
1.	LOT 1	Rad-putevi Bihać, Behić Sanny Boy d.o.o.Bihać i Divel d.o.o.Sanski Most	2.938.474	01-02.2-6874/20.	01.07.2020. - 30.06.2021.
2.	LOT 2	Kov-grad Bužim i I-Selimović d.o.o.Cazin	2.654.611	01-02.2-6875/20	01.07.2020. - 30.06.2021.
3.	LOT 3	Konz: Jata-group, Srebrenik,HIH Živinice,	4.644.554	01-02.2-6872/20.	01.07.2020. - 30.06.2021.
4.	LOT 4	Dobojuputevi d.d. Doboj jug	2.339.460	01-02.2-6873/20.	01.07.2020. - 30.06.2021.
5.	LOT 5a	Dobojuputevi d.d. Doboj jug	485.588	01-02.2-6871/20.	01.07.2020. - 14.11.2020.
6.	LOT 5a	Dobojuputevi d.d. Doboj jug	715.307	01-02.2-10664/20	15.11.2020.-15.03.2021.
7.	LOT 5b	Konz: Jata-group, Srebrenik,HIH Živinice.	339.340	01-02.2-6870/20.	01-07.2020.-14.11.2020.
8.	LOT 5b	Konz: Jata-group, Srebrenik,HIH Živinice,	363.726	01-02.2-10680/20.	15.11.2020.-15.03.2021.
9.	LOT 6	Goraždeputevi Goražde	1.517.917	01-02.2-6868/20.	01.07.2020. - 30.06.2021.
10.	LOT 7	Konz. HP Investing d.o.o.Mostar i Hercegovina putevi a.d. Trebinje	1.519.659	01-02.2-1322/20.	01.02.2020.-31.01.2021.
11.	LOT 8	Sarajevoputevi Sarajevo	2.976.425	01-02.2-6869/20.	01.07.2020. - 30.06.2021.
12.	LOT 9	Ceste Mostar	1.052.933	01-02.2-6867/20.	01.07.2020. - 30.06.2021.
13.	LOT 10	Ceste Mostar	2.655.871	01-02.2-6866/20.	01.07.2020. - 30.06.2021.
14.	LOT 11	Ceste Mostar	5.616.116	01-02.2-6877/20.	01.07.2020. - 30.06.2021.
15.	LOT 12	Ceste Mostar	4.148.281	01-02.2-6876/20.	01.07.2020. - 30.06.2021.
16.	LOT 14	Kov-grad Bužim	994.022	01-02.2-10681/20.	15.11.2020.-14.11.2021.
17.	LOT 13	Konz. Putovi Grude, KTM Brina Posušje HP Investing Mostar	1.315.705	01-02.2-1326/20.	01.02.2020.-31.01.2021.
UKUPNO			36.277.989		

Napomena: Zbog različitih perioda okončanja postupaka javne nabavke i žalbenih postupaka, ugovor za LOT 14 važi do 14.11.2020. g, a ugovori za LOT 7 i LOT 13 do 31.01.2021. godine.

LOT	Mag. Cesta	Dužina u km	Dionice magistralnih cesta	Plan 2020.			Rebalans Plana 2020.			Realizovano 2020.		
				Redovno održavanje	Zimska služba	Ukupno	Redovno održavanje	Zimska služba	Ukupno	Redovno održavanje	Zimska služba	Ukupno
1. L=199,309 km	M-5	115,116	(gr.Hrvatske) Izačić-Bihać-Ključ-Velečevo(gr.ent)	1.770.000	1.240.000	3.010.000	1.770.000	1.240.000	3.010.000	1.689.973	1.152.606	2.842.579
	M-11	8,526	Ripač-Užljebić(gr.Hrvatske)									
	M-14.2	26,337	Bosanski Petrovac-Drvar									
	M-15	49,33	(gr.ent)-Sanski Most-Kamičak-Ključ									
2. L=166,541 km	M-4.2	51,564	(gr.Hrvatske)Velika Kladuša-Cazin-Srbljani	1.765.000	945.000	2.710.000	1.765.000	945.000	2.710.000	1.709.830	898.048	2.607.878
	M-14	49,237	Bihać-Srbljani-Bosanska otoka-(Gr.entiteta)									
	M-14.2	53,674	Bosanska Krupa-Krnjeuša-Bosanski Petrovac									
		12,066	Čavkići-Spahići (u izgradnji)									
3. L=242,553 km	M-1.8	40,849	(gr.ent)-Arizona(gr.distr)(gr.distr.)-Srebrenik-Šiški Brod	2.910.000	1.800.000	4.710.000	2.910.000	1.800.000	4.710.000	2.656.966	1.563.267	4.220.233
	M-1.9	19,846	(gr.ent)-Slatina-Gradačac-Ormanica									
	M-4	71,881	Donja Orahovica-Petlja Šiški Brod-Tuzla-Simin Han-Kalesija-Memići(gr.ent)									
	M-14.1	13,817	(gr.ent)Modriča-Gradačac-Pelagićevo(gr.ent)									
	M-18	84,38	(gr.ent.)Priboj-Simin Han Šiški Brod-Kladanj-Tunel Karaula- Olovo									
	M-19.2	11,780	Vitalj-(gr.ent)									
4. L=140,991 km	M-4	38,694	(gr. Ent) Teslić -Jelah-Karuše;(gr.ent.) Doboj-Gračanica-Donja Orahovica	1.545.000	865.000	2.410.000	1.545.000	865.000	2.410.000	1.496.496	848.672	2.345.168
	M-5	5,217	Kaonik-Lašvanska petlja									
	M-17	97,081	(gr.ent.)Karuše-Žepče-Zenica-Lašva-Bilješevo (A1)									
5. L=132,782 km	M-5	81,923	(gr.ent.) Jezero- Jajce-Travnik-Nević Polje	1.380.000	1.080.000	2.460.000	1.380.000	1.080.000	2.460.000	1.340.643	830.218	2.170.861
	M-16	50,859	(gr.ent) Crna Rijeka-Jajce; Donji Vakuf-Bugojno-tunel Koprivnica									
6. L=95,191 km	M-5	13,998	(gr.ent)Prača-Hrenovica(gr.ent.)	1.010.000	550.000	1.560.000	1.010.000	550.000	1.560.000	992.881	504.626	1.497.507
	M-18	5,934	(gr.ent)Bogatići-Trnovo(gr.ent.)									
	M-18.1	46,334	Ustikolina-Grebak-Trnovo									
	M-20	28,925	(gr.ent.)Foča-Ustikolina-Goražde-Ustiprača(gr.ent.)									

JP CESTE FEDERACIJE BIH

7. L=128,837 km	M-6.1	26,209	Mostar-Gnojnice-Nevesinje(gr.ent)	915.000	745.000	1.660.000	915.000	745.000	1.660.000	847.484	468.565	1.316.049
	M-14.2	30,147	Prozor-Jablanica									
	M-17	72,481	Konjic-Jablanica-Mostar-Gnojnice									
8. L=130,617 km	M-5	20,104	Zelena meraja-Most.raskršće Vijećnica-Korija, Gradska obilaznica	1.920.000	1.060.000	2.980.000	1.920.000	1.060.000	2.980.000	2.331.316	1.020.566	3.351.882
	M-17	56,302	Jošanica-Stup; Stup-Tarčin-Konjic									
	M-18	54,211	Olovo-Semizovac-Koševsko brdo, Stup-Trnovo(gran.ent)									
9. L=64,512 km	M-1.8	7,992	(gr.Hrvatske)-Orašje-Lončari(gr.ent)	720.000	360.000	1.080.000	720.000	360.000	1.080.000	709.082	338.080	1.047.162
	M-14.1	24,670	(gr.ent)Brod-Svilaj-Odžak-Modriča(gr.ent)									
	M-14.2	31,850	Odžak-Šamac (gr.ent) (gr. ent) Šamac-Orašje									
10. L=136,385 km	M-5	58,00	Nević Polje-Kaonik-Busovača-Zelena Meraja	1.620.000	1.110.000	2.730.000	1.620.000	1.110.000	2.730.000	1.527.628	1.103.371	2.630.999
	M-16.2	39,6	Bugojno-Gornji Vakuf-Prozor									
	M-16.4	38,6	Bugojno-Novi Travnik-Nević Polje									
11. L=362,789km	M-6.1	158,647	(gr.Hrvatske) Kaldrma-Bos.Grahovo- Livno-Kolo-Studena Vrla	3.570.000	2.210.000	5.780.000	3.570.000	2.250.000	5.820.000	3.507.993	2.077.779	5.585.772
	M-14.2	33,355	Drvar-Resanovci; Bosansko Grahovo-Strmica (gr.Hrvatske)									
	M-15	96,809	(gr.ent)-Glamoč-Priluka Livno-Šujica-Kolo									
	M-16	56,778	Tunel K.Vrata-Kupres-Šujica Livno-Kamensko(gr.Hrvatske)									
	M-16.3	3,210	Renjići-Prisika (gr.Hrvatske)									
	M-16.5	14,07	Karlovo Han-Kazaginac									
12. L=332,727 km	M-2	9,258	(gr.Hrvatske)-Neum-(gr.Hrvatske)	3.405.000	870.000	4.275.000	3.405.000	870.000	4.275.000	3.237.770	821.245	4.059.015
	M-6	86,449	(gr.Hrvatske) Gorica-Čapljina-Stolac- Ljubinje(gr.ent)									
	M-6.1	63,954	Studena vrla-Posušje-Široki brijeg-Mostar									
	M-15	3,111	Posušje-Kutleše-Gr.Hrvatske									
	M-17	38,582	Gnojnice-Čapljina-Doljani (gr.Hrvatske)									
	M-17.3	81,076	Buna-Masline; Stolac-Hutovo –Neum(+Neum-Babin do)									
	M-20	8,49	(gr.Hrvatske)Dubrovnik-Duži- Trebinje(gr.ent)									
	M-17.4	41,807	Mostar-Čitluk-Ljubuški-Crveni Grm(gr.Hrvatske)									

JP CESTE FEDERACIJE BIH

13. L=100,00km	M-17.5	100,00	Jablanica-Blidinje-Posušje-Grude-Privalj	890.000	430.000	1.320.000	890.000	430.000	1.320.000	885.778	260.918	1.146.696
14. L=57,00km	M-4.3	57,00	Velika Kladuša-Bužim-Bosanska Otoka	655.000	340.000	995.000	655.000	340.000	995.000	663.581	300.902	964.483
		2.233,314	U K U P N O	24.075.000	13.605.000	37.680.000	24.075.000	13.645.000	37.720.000	23.597.421	12.188.863	35.786.284

- **Redovno održavanje mostova**

Naziv	Plan 2020.	Rebalans 2020	Konsultant /Izvođač	Ugovoreno	Realizovano 2020.
Redovno održavanje mostova			HP Investing d.o.o. Mostar 01-02.1-11499/17. 28.12.2017.	564.584 (preneseno 125.737)	119.841
<ul style="list-style-type: none"> - Most M-4.2-001-3-preko rijeke Kladušnice, Velika Kladuša, - Most M-4.2-001-585- preko nepoznatog potoka, Vejinac,Purići - Most M-4.2-002-506, preko radetina potoka, Čoralici, - Most M-4.2-002-589,preko lokalne ceste, Cazin - Most M-4.2-002-7 preko rijeke Une,Sedra, Ostraožac, - Most M-5-001-9, preko potok a Garavice, - Most M-5-003-17,preko potoka jaruga, Ripač, - PLP 15-004-478, pločasti propust preko potoka Sokolovo 	500.000	500.000	BC Gradnja d.o.o. Bosanska Otoka 01-02.1-14740/19 26.12.2019.	242.440	
UKUPNO	500.000	500.000			119.841

- Ugovor HP Investing – okončan
- Ugovor BC Gradnja – U toku (dio radova je izveden u prošloj godini, nije situirano).

- **Glavni pregledi objekata (složenih)**

Naziv	Plan 2020.	Rebalans 2020.	Konsultant /Izvođač	Ugovoreno	Realizovano 2020.
Glavni pregledi mostova: -M-17_na petlji Lašva, dionica 007 Topčić polje-Lašva 0 od km 31+732 do km 32+357; -M-5 dionica D13 Kaonik-Lašva, u km 5+115	100.000	100.000	INK Constructor d.o.o. Banja luka 01-02.1-1359/20. 28.01.2020.	72.868	72.868
UKUPNO	100.000	100.000			72.868

Ugovor INK Constructor – Okončano

- **Poboljšanje sigurnosti prometa – izrada noveliranih projekata**

Naziv	Plan 2020.	Rebalans 2020.	Aktivnost	Konsultant /Izvođač	Ugovoreno	Realizovano 2020.
Izrada noveliranih projekata				Institut za građevinstvo IG d.o.o. Banja luka 01-02.3-538/20. 13.01.2020.		
<ul style="list-style-type: none"> - M-6.1 Bosansko Grahovo-Kazanci-Priluka,L=64,70km; - M-15 Posušje –Osoje-(granica RH/Kutleše), L=3,1km; - M-17 Petlja Lašva-Donji Lučani (ulaz na AC) L=4,6 km. 	92.000	92.000	Projektovanje		43.289	43.289
			Revizija	NTSI-Institut d.o.o.Sarajevo, 01-02.3-5376/20. 11.05.2020.	4.036	4.036
<ul style="list-style-type: none"> - M4.3 Velika Kladuša- Vrnograč-Bužim-Bos.Otoka - M17.5 Jablanica-Posušje-Grude-Privalj 			Projektovanje	IG Banja luka, 01-02.3-9466/20. 01.10.2020.	68.979	-
UKUPNO	92.000	92.000				47.325

- **Obilježavanje pješačkih prijelaza sa plastikom optičko-vibracionim trakama kod škola**

Naziv	Plan 2020.	Rebalans 2020	Konsultant /Izvođač	Ugovoreno	Realizovano 2020.
Sanacija postojećih i izgradnja novih svjetlosnih prometnih znakova kod škola na magistralnim cestama	50.000	50.000	Sacom d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-9115/19. 29.07.2019.	42.500 (preneseno 3.449)	2.756
Izrada pješačkih prijelaza sa optičko/zvučnim trakama od plastike u blizini škola na magistralnim cestama			Colorex d.o.o.Mostar, 01-02.3-11903/19. 10.10.2019.	42.448 (preneseno)	42.448
			Sacom d.o.o.Sarajevo, 01-02.3-9285/20. 24.09.2020.	37.390	36.372
UKUPNO	50.000	50.000			81.576

- **Održavanje i nadzor elektroopreme (rasvjeta tunela i prilaznih zona tunelima, rasvjeta raskrsnica, semafori i trafo stanice)**

Okvirni sporazumi, za period 2017.- 2021.godina su potpisani dana: 22.09.2017. (01-02.4-8590/17.) sa Step d.d. Sarajevo, a regulišu okvirna pitanja vezana za nabavku radova redovnog održavanja javne rasvjete raskrsnica, tunela i prilaznih zona tunelima na magistralnim cestama u F BiH (vrijednost 712.104 KM) i Okvirni sporazum za održavanje semaforских uređaja i opreme na magistralnim cestama vrijednosti 981.122 KM (Step d.d. Sarajevo, br: 01-02.2-7052/17 od 03.07.2017).

Naziv i opis aktivnosti	Plan 2020.	Rebalans 2020.	Konsultant /Izvođač	Ugovoreno	Realizovano 2020.
Redovnog održavanja semaforских uređaja i opreme i svjetlosnih oznaka pješačkih prelaza na magistralnim cestama u F BiH, <i>Period: 03.08.2019-02.08.2020.</i>	450.000	580.000	Step d.d.Sarajevo, 01-02.2-9342/19 01.08.2019.	245.281 (preneseno 170.909)	170.853
Redovnog održavanja elektroopreme javne rasvjete raskrsnica, tunela i prilaznih zona tunelima na magistralnim cestama u F BiH, <i>Period: 01.09.2019-31.08.2020.</i>			Step d.d.Sarajevo, 01-02.2-10826/19. 11.09.2019.	178.025 (preneseno 163.863)	163.628
Redovno održavanje javne rasvjete, raskrižja, tunela i prilaznih zona tunelima na magistralnim cestama u F BiH. <i>Period:01.09.2020.-31.08.2021.</i>			Step d.d.Sarajevo, 01-02.2-8605/2020. 01.09.2020.	178.025	21.888
Redovno održavanje semaforских uređaja i opreme <i>Period:03.08.2020.-02.08.2021.</i>			Step d.d.Sarajevo, 01-02.2-7776/2020. 27.07.2020.	245.281	76.417
Nadzor nad radovima redovnog održavanja semaforских uređaja i opreme i postojećih oznaka pješačkih prelaza			Aber Design d.o.o. Sarajevo, 01-01.1-3186/19. 19.03.2019.	7.000	7.000
			Aber Design d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-7312/20. 14.07.2020.	7.000	
Nadzor nad radovima redovnog održavanja javne rasvjete raskrsnica, tunela i prilaznih zona tunelima na magistralnim cestama			Aber Design d.o.o. Sarajevo, 01-01.1-2871/19. 12.03.2019.	7.000	7.000
			Aber Design d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-6345/20. 12.06.2020.	7.000	-
UKUPNO	450.000	580.000			446.786

Ugovori za usluge (nadzor) na radovima redovnog održavanja semaforских uređaja i opreme i svjetlećih oznaka pješačkih prelaza na magistralnim cestama u F BiH i nadzora na radovima redovnog održavanja javne rasvjete raskrsnica, tunela i prilaznih zona tunelima su potpisani sa Aber Design d.o.o.

JP CESTE FEDERACIJE BIH

Sarajevo, koji su navedeni u gornjoj tabeli.

Također, u tabeli su navedeni ugovori za izvođenje sa Step-om d.d. Sarajevo i njihova realizacija.

- Monitoring vozila redovnog održavanja GPS-om

Potpisani su ugovori po LOT-ovima za satelitsko praćenje vozila sa TiM System d.o.o.Sarajevo kako slijedi:

LOT 1 - vozila zimske službe - broj ugovora:01-02.3-9373/20. 28.09.2020. vrijednosti 4.275 KM,

LOT 2 - ophodarskih vozila - broj ugovora: 01-02.3-9372. 28.09.2020. vrijednosti 6.318 KM

LOT 3 - vozila internog voznog parka proširena opcijom podrške vođenja evidencije troškova – broj ugovora 01-02.3-9371/20. 28.09.2020. vrijednosti 12.011 KM.

- Usklađivanje vertikalne signalizacije sa noveliranim prometnim projektima

Javna nabavka u toku, jer je ista ponavljana 2 puta.

REKAPITULACIJA ULAGANJA ZA REDOVNO ODRŽAVANJE

O P I S	Realizovano 2019.	Plan 2020.	Rebalans Plana 2020.	Realizovano 2020.	Index 5/4	Index 5/2
1	2	3	4	5	6	7
REDOVNO ODRŽAVANJE I ZIMSKA SLUŽBA	32.164.570	37.680.000	37.720.000	35.786.284	95	111
Redovno održavanje mostova	184.911	500.000	500.000	119.842	24	65
Glavni pregledi objekata (složenih)	-	100.000	100.000	72.868	73	-
Troškovi električne energije za rasvjetu tunela, raskrsnica, mostova, semafora i brojača prometa	468.677	500.000	500.000	479.787	96	102
Osiguranje pružnih prelaza u USK (sufinansiranje)	-	50.000	50.000	-	-	-
Poboljšanje sigurnosti prometa – izrada noveliranih prometnih projekata	19.480	92.000	92.000	47.325	51	243
Održavanje i nadzor elektro-opreme (rasvjeta tunela i prilaznih zona tunelima, rasvjeta raskrsnica, semafori i trafo stanice, te zamjena rasvjetnih tijela LED svjetiljkama)	425.041	450.000	580.000	446.786	77	105
Sanacija postojećih i izgradnja novih svjetlosnih prometnih znakova kod škola	41.284	60.000	60.000	-	-	-
Redovno održavanje brojača prometa	11.358	10.000	15.000	16.477	110	145
Monitoring vozila redovnog održavanja GPS-om	6.845	30.000	30.000	3.766	13	55
Obilježavanje pješačkih prijelaza sa plastikom optičko-vibracionim trakama kod škola	-	50.000	50.000	81.576	163	-
Tehničko izdavanje i čišćenje površine rizične od mina	21.987	210.000	-	-	-	-
Rekalibracija uređaja za mjerenje refleksije horizontalne i vertikalne signalizacije	-	25.000	25.000	24.979	100	-
Usklađivanje vertikalne signalizacije sa noveliranim prometnim projektima	-	300.000	300.000	-	-	-
Nabavka soli NaCl i CaCl ₂	1.783.837	200.000	200.000	132.800	66	7
UKUPNO REDOVNO ODRŽAVANJE	35.127.990	40.257.000	40.222.000	37.212.490	92	106

4. Rezervirana sredstva za rizike, neplanirane rashode i rashode koji ne terete projekte

N A Z I V	Realizovano 2019.	Plan 2020.	Rebalans Plana 2020.	Realizovano 2020.	Napomena
Rezervirana sredstva za rizike i neplanirane rashode					
-Rashodi vezani za projekat Sarajevska obilaznica				876.517	
-Izgradnja obilaznice tunela Vranduk -Idejni projekat obilaznice M-17 u toku rekonstrukcije tunela Vranduk, prolaz kroz Nemilu, L = 2,3 km -Idejni projekat obilaznice M-17 u toku rekonstrukcije tunela Vranduk, dionica Banlozi – Tetovo, L = 3,4 km	3.211.083	1.700.000	1.900.000	38.911 14.040 6.903	Finansirano iz kreditnih sredstava Sredstva JP Ceste F BiH
- Odluka o otpisu projekata 2019 godina				1.154.332	
- Odluka o otpisu projekata 2020 godina				1.402.342	
UKUPNO	3.211.083	1.700.000	1.900.000	3.493.045	

- Na osnovu vansudske nagodbe između JP Željeznice F BiH i JP Ceste F BiH u predmetu broj: 65 0 Ps 460047 14 Ps, vezanog za izgradnju Sarajevske obilaznice, isplaćena su novčana sredstva na ime zatezних kamata i sudskih troškova u iznosu od 187.783 KM. Glavni dug od 552.961KM je izmiren i tereti projekat Sarajevska obilaznica, koji se u poslovnim knjigama JP Ceste F BiH vodi vanbilansno. Usluge advokata se odnose na ugovor: 01-03.2-2302/20. od 17.02.2020. godine sa advokatskom kancelarijom Miljković, u predmetima zastupanja JP Ceste F BiH, gdje su fakturirani troškovi advokatskih usluga vezanih za projekat Sarajevska obilaznica u iznosu od 33.321 KM.

Fakturirani su i troškovi u iznosu od 35.553 KM od strane Advokatske kancelarije Gavrankapetanović, na osnovu Sporazuma o pružanju pravne pomoći broj 01-6307/11. Anexom I i II Sporazuma za zastupanje u postupku broj 65 0 Ps 247768 12 PS kod Općinskog suda Sarajevo po tužbi BBM d.o.o. Vareš protiv JP Cesta F BiH.

Presudom Općinskog suda u Sarajevu po Rješenju o izvršenju broj: 65 0 Ip 836097 20 Ip. BBM-po osnovu glavnice, kamata i troškova realizovan je iznos od 619.860 KM.

- Tokom rekonstrukcije tunela Vranduk II bilo je potrebno privremeno preusmjeriti saobraćaj na regionalnu cestu R 445 Nemila-Tetovo-Zenica i minimizirati negativne efekte na lokalne zajednice pogođene projektom. Regionalna cesta R 445 dužine 24 km se koristila samo za saobraćaj vozila do 7.5 t. Regionlna cesta je sanirana/ na pojedinim dijelovima rekonstruisana da bi mogla prihvatiti povećani saobraćaj i da bi se smanjili rizici u pogledu sigurnosti prometa.

Na osnovu „Sporazuma o provođenju aktivnosti vezanih za projekat rekonstrukcije tunela Vranduk II i mostova Bosna IV i V na M17“ između Grada Zenice, Direkcije za ceste Ze-Do kantona i JP Ceste F BiH urađen je idejni projekat obilaznice – prolaz kroz Nemilu koji je uradio Divil d.o.o. Sarajevo, na osnovu ugovora broj: 01-02.3-14772/19. od 27.12.2019. i idejni projekat obilaznice – dionica: Banlozi – Tetovo, L = 3,4 km uradila je Trasa d.o.o.Sarajevo, na osnovu ugovora: 01-02.3-14791/19. od 27.12.2019.

JP CESTE FEDERACIJE BIH

- Na osnovu preporuka Ureda za reviziju institucija F BiH i eksterne revizije, a u skladu sa računovodstvenim politikama i druga internim aktima, Uprava JP Ceste F BiH je po prijedlogu Komisije za procjenu i popis investicija u toku, donijela Odluke o otpisu sljedećih projekata, jer se isti neće dalje realizirati :

- Izgradnja ceste Hrenovica - Goražde	736.162 KM
- Izgradnja ceste gr. RH - Livno - Glamoč	257.096 KM
- Rekonstrukcija raskrsnice u naselju Bobara, općina Tomislavgrad	1.017 KM
- Rekonstrukcija ceste Lepenica – Šamin gaj	132.945 KM
- Rekonstrukcija ceste Novi Travnik – Bugojno –prolaz kroz BNT	16.301 KM
- <u>Rekonstrukcija ceste Resanovci – Bosansko Grahovo (godetsko snimanje)</u>	<u>10.811 KM</u>
Ukupno 2019:	1.154.332 KM

- Izgradnja pješačke staze Međine km 13+135-13+430	10.414 KM
- Izgradnja pješačke staze sa odvodnjom Rosulje-Ljetinić, Tešanj km13+800-15+850	7.546 KM
- Izgradnja pješačke staze Dobrič, Široki brijeg	5.700 KM
- Izgradnja pješačke staze naselje Ribič	6.845 KM
- Izgradnja pješačke staze Srebrenik -Šićki /Mihatovići	6.786 KM
- Izgradnja pješačke staze Han Ploča km12+400-13+450	4.830 KM
- Izgradnja obilaznice Ključa	93.955 KM
- Izgradnja obilaznice Kalesija	250.941 KM
- Izgradnja potputnjaka Varda /Obilaznica Mostara	29.320 KM
- Izgradnja pješačkog prelaza Nemila	12.683 KM
- Izgradnja oborinske odvodnje Topčić polje-Lašva	80 KM
- Rekonstrukcije raskrsnice - obilaznica Vel.Kladuša	17.263 KM
- Rekonstrukcije raskrsnice - lokalna cesta za Bistarac	6.330 KM
- Rekonstrukcije raskrsnice Guber-Žabljak	4.890 KM
- Rekonstrukcije raskrsnice Devetak	17.550 KM
- Rekonstrukcije raskrsnice u Sanskom mostu	8.957 KM
- Rekonstrukcije raskrsnice u Gurnjem Vakufu	13.874 KM
- Rekonstrukcije raskrsnice u Bužimu/Trg Alije Izetbegovića/	315 KM
- Rekonstrukcija ceste Ljubuški-Grude	870.215 KM
- <u>Rekonstrukcija ceste Sajkovići –Donji Rujani /Livno</u>	<u>33.848 KM</u>
Ukupno 2020:	1.402.342 KM

5. Rezervirana sredstva za sudske presude

NAZIV	Realizovano 2019.	Plan 2020.	Rebalans Plana 2020.	Realizovano 2020.	Napomena
Rezervirana sredstva za sudske presude	508.176	600.000	970.000	1.049.766 65.715 9.191 142.085	rezervirana sredstva za započete sudske sporove upravni i sudski troškovi po sudskim presudama nerezervirani troškovi po sudskim presudama obračunate zatezne kamate na sudske presude
UKUPNO	508.176	600.000	970.000	1.266.757	

JP CESTE FEDERACIJE BIH

Po započetim sudskim sporovima rezervirana su sredstva u iznosu od 1,05 mil.KM. Najveći broj sudskih sporova tj. tužbi se odnosi na saobraćajne i druge nezgode nastale na magistralnim cestama. U izvještajnom periodu realizovani su troškovi koji nisu rezervirani za tužbe, zatezne kamate vezane za sudske troškove, kao i drugi troškovi vezani za sudske procese u iznosu od 0,22 mil.KM.

6. Troškovi konsultantskih usluga

Red br.	N A Z I V	Plan 2020.	Rebalans Plana 2020.	Konsultant	Ugovoreno	Realizovano 2020.
1.	Obrada podataka i izrada Publikacije o prometu	15.000	40.000	GP IG d.o.o.Banja luka i INK Constructor d.o.o.Banja Luka,01-02.1-13066/19. 08.11.2019.	12.986	12.986
	- 2017. godina					
	- 2018. godina					
	- 2019. godina			NTSI-Institut d.o.o.Sarajevo 01-02.1-13064/19. 08.11.2019.	11.115	11.115
				NTSI-Institut d.o.o.Sarajevo 01-02.3-10472/20. 05.11.2020.	11.115	-
2.	Troškovi izrade projekta izvedenog stanja magistralnih cesta	150.000	-	-	-	-
3.	Troškovi konsultantskih usluga za potrebe neovisne kontrole kvalitete radova	30.000	30.000	-	-	-
4.	Troškovi održavanja sustava gospodarenja cestama – SUGOC	106.000	110.000	ZP TEB Informatika d.o.o. Zagreb i TEB d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-7761/20 27.07.2020.		105.394
5.	ISO 9001,ISO 14001 i ISO 45001 (grant sredstva EBRD-a)	140.000	140.000		-	-
6.	Konsultantske usluge vezane za nabavku radova i usluga po med. procedurama	130.000	92.500	Ugovor o konsultantskim uslugama, 01-02.1-758/20. 16.01.2020.	70.330	70.330
				Ugovor o djelu broj 01-8096/20 od 10.08.2020		20.862
7.	Izrada studije analize prometa na magistralnim pravcima	15.000	15.000		-	-
8.	Izrada plana posebnog obilježja mreže magistralnih cesta	20.000	20.000		-	-
9.	Tehnička i finansijska revizija(samo za projekte finansirane iz WB i EIB) – (vezana za Program Modernizacija cesta u F BiH – kreditna sredstva)	250.000	250.000	Ministarstvo finansija i trezora BiH Troškovi finansijske revizije za 2019		3.159
10.	Izrada Akcionih planova preseljenja za potrebe međunarodnih institucija	50.000	50.000		-	-
11.	Snimanje i uplanjenje mreže magistralnih cesta u F BiH	250.000	400.000		-	-
12.	Prikupljanje, obrada podataka i izrada georeferencijalnog panoramskog video zapisa magistralnih cesta u F BiH	600.000	600.000		-	-
	- Cesta u izgradnji M17.3 Stolac-Neum			Zeljko d.o.o.Jablanica, 01-02.3-3836/20. 27.03.2020.	7.020	7.020
	- Magistralne ceste M4.3 i M17.5			ZP TEB Informatika d.o.o. Zagreb i TEB d.o.o.Sarajevo, 01-02.3-4892/20.24.04.2020.	109.980	109.980
	- Magistralne ceste			ZP TEB Informatika d.o.o. Zagreb i TEB d.o.o.Sarajevo, 01-02.3-10076/20. 22.10.2020.	488.943	407.238
13.	Izrada elaborata: Analiza implementacije predloženih mjera i očekivanih efekata za racionalnu potrošnju električne energije za JP Ceste F BiH prema studijskom istraživanju iz 2016. godine	7.000	7.000		-	-
14.	Izrada elaborata potrošnje električne energije u poslovnoj zgradi JP Ceste F BiH	7.000	7.000		-	-
15.	Izrada Studije utvrđivanja lokacija na mreži magistralnih cesta u F BiH na kojima se događaju učestale prometne nezgode (crne tačke)	50.000	50.000		-	-
UKUPNO		1.820.000	1.811.500			748.084

JP CESTE FEDERACIJE BIH

- Rb.1 - U izvještajnom periodu realizovani su ugovori za izradu godišnje publikacije o intenzitetu prometa na magistralnim cestama za 2018. i 2019. godinu, dok je izrada publikacije za 2019.godinu u toku.
- Rb.2 - Rebalansom nije planirano.
- Rb. 3,5,7,8,11,13,14 - Aktivnosti planirane u 2021. godini
- Rb.4 - Sa ZP TEB Informatika d.o.o. Zagreb i TEB d.o.o.Sarajevo potpisan je jednogodišnji ugovor za održavanje, stručnu podršku i unapređenje rada u programskim rješenjima SUGOC (e-mailom, telefonom ili udaljenim pristupom) sistema, neophodnog za održavanje i upravljanje magistralnim cestama u Federaciji BiH.
- Rb.6 - Realizovan je Ugovor o konsultantskim uslugama građevinskog/geotehničkog inženjera (Marinos Skempas) za pregled i analizu alternativnih trasa za tunel Crnaja kojim je obuhvaćeno: posjeta lokaciji tunela Crnaja, detaljan pregled svih raspoloživih podataka i dokumenata kao što su izvještaji, projekti, crteži, rezultati ispitivanja tla itd., priprema odgovarajućeg izvještaja sa komentarima i preporukama za pregledanu trasu tunela crnaja i alternative za izgradnju kao i prezentacija dobijenih rezultata naručiocu i drugim vladinim organizacijama i predstavnicima. Ugovor o djelu je potpisan sa neovisnim konsultantom koji učestvuje u izradi i ocijeni prihvatljivosti Planova upravljanja okolišem i socijalnim aspektom za projekte obuhvaćene Programom Modernizacija cesta u F BiH, kao i druge obaveze iz ugovora. Ugovor je potpisan za period 10.08.2020. godina do 10.02.2021. godina
- Rb.9 - Prema preuzetim procedurama kreditora Programa „Modernizacija cesta u F BiH“, obavezna je finansijska i tehnička revizija projekata vezanih za Program. Revizije se finansiraju kreditnim sredstvima.
- Rb.10 - Za potrebe kreditora vezanih za Program „Modernizacija cesta u F BiH“ bilo je neophodno uraditi Akcione planove preseljenja. Aktivnost se realizuje kroz investicije.
- Rb.12 - Na osnovu ugovora broj:1-02.3-3836/20. Zeljko d.o.o. Jablanica je izvršio uslugu georeferenciranog panoramskog video zapisa magistralne ceste M17.3 Stolac – Neum. Prikupljanje, obradu i unos podataka u Bazu infrastrukturnih podataka, kao i izradu georeferencionalnog panoramskog video zapisa magistralnih cesta M4.3, Velika Kladaša – Vrnograč – Radića most –Bužim – Bosanska Otoka i M17.5 Jablanica –Posušje i Posušje –Grude, ukupne dužine 157 km, u svrhu odžavanja magistralnih cesta – SUGOC uradila je TEB informatika, na osnovu ugovora: 01-02.3-4892/20. U svrhu kvalitetnijeg odžavanja magistralnih cesta - SUGOC – potpisan je ugovor broj: 01-02.3-10076/20. usluge prikupljanja, obrade podataka i izrade georeferenciranog panoramskog video zapisa magistralnih cesta u F BiH tj. ažuriranje referentnog sistema i baze podataka
- Rb.15 - Okončana nabavka, ugovor u pripremi.

7.Kamate

Red. Broj	N A Z I V	Plan 2020.	Rebalans Plana 2020.	Realizovano 2020.	Napomena
1.	Kamate, servisni troškovi i kursne razlike za kredit EBRD-a, EIB-a i WB za program „Rehabilitacija cesta u F BiH“	1.000.000	500.000	216.635 134.155 78.461	EIB EBRD WB
2.	Provizija i takse na nepovučena sredstva kredita EBRD –a i IBRD-a za Program „Modernizacija cesta u F BiH“ (vlastita sredstva)	560.000	800.000	5.000 772.990	Bankarska provizija na tranšu IBRD Provizija na nepovučena sredstva: IBRD EBRD
UKUPNO		1.560.000	1.300.000	1.207.241	

Rb.1.- Program „Rehabilitacija cesta u F BiH“ okončan je 2013. godine, a finansiran kreditnim sredstvima od sljedećih međunarodnih finansijskih institucija:

- Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) – po ugovoru br. 37543 u iznosu 45 mil. EUR. Kamatna stopa je varijabilna (6 mjesečni EURIBOR +1% marža), a plaća se polugodišnje. Otplata kredita je u 24 jednake polugodišnje rate, počev od 5.12.2010. godine.
- Evropska investicijska banka (EIB), kredit broj: 23924 po finansijskom ugovoru br. 2005-0455 u iznosu 50 mil. EUR. Kamatna stopa je varijabilna (6 mjesečni EURIBOR + fiksni raspon). Povlačenje kredita je bilo po tranšama (sedam tranši). Period otplate kredita je do 18 godina, uključujući 6 godina perioda odgode otplate, a otplata se vrši u jednakim polugodišnjim ratama. Prvi datum otplate svake tranše je ne kasnije od 6 godina od datuma povlačenja tranše, a krajnji rok otplate posljednje rate je ne ranije od 4 godine i ne kasnije od 18 godina od datuma povlačenja. Otplata prve tranše počela je 2014 godine.
- Kredit Svjetske banke (WB) – IDA 43710, u iznosu 8,20 mil.SDR. Kamata na kredit je 0,75% na povučeni iznos kredita, a naknada za održavanje kredita iznosi 0,5% godišnje na nepovučeni iznos kredita. Obzirom da je originalna valuta kredita SDR, zavisno od kretanja valuta koje čine SDR pojavljuju se pozitivne ili negativne kursne razlike. Otplata kredita je u jednakim polugodišnjim ratama, u periodu od 20 godina, uključujući period odgode od 10 godina. Period otplate kredita počeo je 15.12.2017. do 15.06.2027 godine. Kreditna sredstva su povučena do 30.06.2012. godine.

U izvještajnom periodu pristigle su kamate, koje terete rashode perioda za kredit EBRD-a u iznosu od 134.155 KM, kredit EIB-a 216.635 KM i WB 78.461 KM, što ukupno iznosi 429.251 KM.

Rb.2 – U skladu sa Ugovorom o zajmu između Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i BiH, provizija na nepovučena sredstva zajma iznosi 0,5% godišnje na nepovučeni saldo zajma. Grejs period za obračun provizije na nepovučena sredstva zajma je za I Tranšu 60 dana i za II Tranšu 120 dana od datuma potpisivanja Ugovora o zajmu. Provizija na neiskorištena sredstva je plativa na svaki datum plaćanja kamate (15 februar i 15 august). U izvještajnom periodu provizija na nepovučena sredstva zajma iznosi 586.500 KM.


U skladu sa Sporazumom o zajmu između BiH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD), troškovi održavanja kredita (provizija na nepovučena sredstva kredita) obračunavaju se po stopi 0,25 % na nepovučeni iznos zajma. Naknada za održavanje kredita se zaračunava od datuma koji pada šezdeset dana nakon datuma Sporazuma o zajmu do odnosnih datuma na koje Zajmoprimac iznose zajma povuče s Računa zajma ili otkáže. Naknada za održavanje kredita se plaća polugodišnje unazad na svaki datum plaćanja (15 februar i 15 august). Navedena naknada je plativa nakon efektivnosti zajma. U izvještajnom periodu provizija na nepovučena sredstva zajma i provizija banke na povučenu tranšu kredita iznose 186.490 KM

Za okončani Program „Rehabilitacija cesta u F BiH“ i Program „Modernizacija cesta u F BiH“ u toku, iz finansijskog rezultata izmirene su pristigle otplate kredita u iznosu od 18,06 mil.KM i to:

Red.Br.	Naziv banke i broj kredita	Period	Otplata kredita
Program „Rehabilitacija cesta u F BiH“			
1.	EIB- 23924 –I tranša	12.09.2019-12.03.2020.	264.640
		12.03.2020.-12.09.2020.	264.640

JP CESTE FEDERACIJE BIH

2.	EIB- 23924 –II tranša	05.08.2019-05.02.2020.	391.166
		05.02.2020.-05.08.2020.	391.166
3.	EIB- 23924 –III tranša	27.08.2020.-27.02.2020.	469.399
		27.02.2020.-27.08.2020.	469.399
4.	EIB- 23924 –IV tranša	18.12.2019-18.06.2020.	352.049
		18.06.2020.-18.12.2020.	352.049
5.	EIB- 23924 – V tranša	09.09.2019.-09.03.2020.	625.866
		09.03.2020.-09.09.2020.	625.866
6.	EIB- 23924 – VI tranša	26.08.2019.-24.02.2020.	1.173.498
		24.02.2020.-24.08.2020.	1.173.498
7.	EIB- 23924 – VII tranša	05.08.2019.-03.02.2020.	430.283
		03.02.2020.-03.08.2020.	430.283
8.	WB – IDA 43710	15.12.2019.-15.06.2020.	1.002.156
		15.06.2020.-15.12.2020.	963.539
9.	EBRD – 37543	05.12.2019.-06.06.2020.	4.018.004
		06.06.2020.-07.12.2020.	4.018.004
A	UKUPNO		17.415.505
Program „Modernizacija cesta u F BiH“			
10.	EBRD -47461	15.08.2019-17.02.2020.	192.912
		17.02.2020.-17.08.2020.	454.971
B	UKUPNO		647.883
SVEUKUPNO A+B			18.063.388

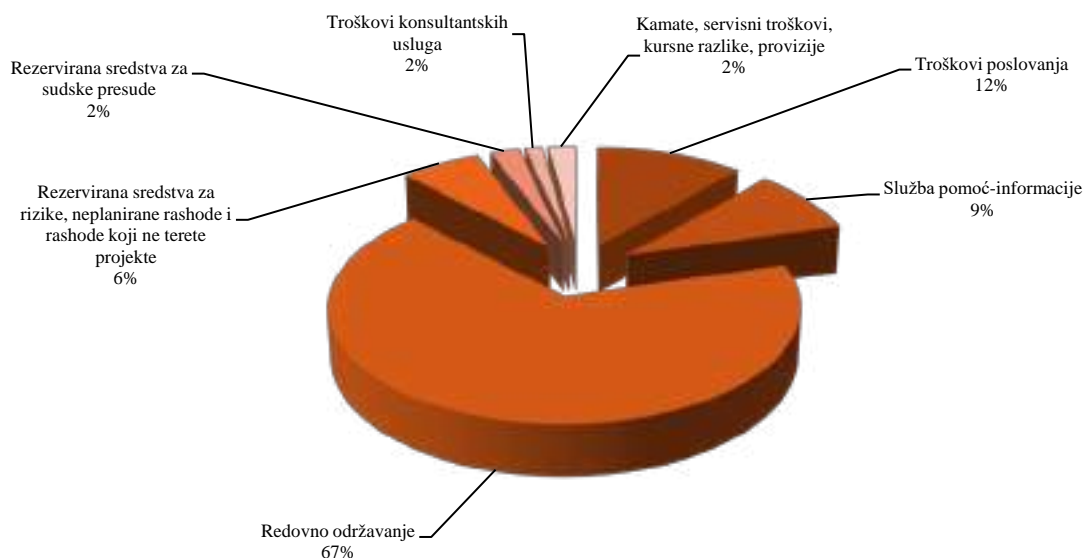

Grafički prikaz strukture realizovanih rashoda

B. II TROŠKOVI AMORTIZACIJE


Naziv	Realizovano 2019.	Plan 2020.	Rebalans Plana 2020.	Realizovano 2020.	Index 5/4	Index 5/2
1	2	3	4	5	6	7
Amortizacija stalnih sredstava	262.555	300.000	300.000	361.700	121	138
U K U P N O	262.555	300.000	300.000	361.700	121	138

Amortizacija se odnosi na nematerijalna stalna sredstva, opremu i transportna sredstva, te je u prihodovnoj i u rashodovnoj strani realizovana u iznosu od 0,36 mil.KM. Inače, u skladu sa MRS 20, vrijednost nematerijalne i materijalne imovine neophodne za obavljanje osnovne djelatnosti sistematski se otpisuje tokom procijenjenog vijeka trajanja i sučeljava sa pripadajućim dijelom odloženih prihoda (izvora) do momenta otpisa. Amortizacija se obračunava linearnom metodom otpisa, tokom procijenjenog korisnog vijeka trajanja stalnih sredstava.

C. INVESTICIJE

Red Br.	O P I S	Realizovano 2019.	Plan 2020.	Rebalans Plana 2020.	Realizovano 2020.	Index 5/4	Index 5/3
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Nabavka stalnih sredstava	463.182	930.000	1.150.000	578.886	50	125
2.	Program "Modernizacija cesta u F BiH"	48.509.075	180.060.100	104.157.300	77.820.996	75	160
	2.1. Program "Modernizacija cesta u F BiH"- vlastita sredstva	530.855	1.581.000	1.618.200	1.002.018	62	189
	2.2. Program "Modernizacija cesta u F BiH"- kreditna sredstva	47.978.220	178.479.100	102.539.100	76.818.978	75	160
3.	Projekti JP Ceste F BiH	11.457.957	65.498.300	54.474.600	24.972.427	46	218
	3.1. Projekti iz prethodnog perioda	9.632.667	47.267.300	38.717.000	21.961.974	57	228
	3.1.1. Projekti rekonstrukcije i izgradnje	359.120	5.710.000	4.297.900	3.065.257	71	854
	3.1.2. Rasvjeta i semaforizacija raskrsnica i tunela	81.963	257.000	199.600	127.453	64	156
	3.1.3. Poboljšanje sigurnosti prometa	5.474.102	21.433.200	16.929.300	6.669.301	39	122
	3.1.4. Vanredno održavanje	3.717.482	19.867.100	17.290.200	12.099.963	70	325
	3.1.4.1. Sanacija cestovnih objekata	1.245.031	8.627.200	6.561.300	3.055.190	47	245
	3.1.4.2. Sanacija klizišta, odrona, sanacija slijeganja trupa puta, kosina i zasjeka	270.941	3.266.300	2.626.400	2.067.526	79	763
	3.1.4.3. Sanacija oštećenih asfaltnih kolovoza	2.201.510	7.973.600	8.102.500	6.977.247	86	317
	3.2. Planirani projekti u 2020. godini	1.825.290	18.231.000	15.757.600	3.010.453	19	165
	3.2.1. Projekti rekonstrukcije i izgradnje	437.897	2.774.000	3.862.900	608.082	16	139
	3.2.2. Rasvjeta i semaforizacija raskrsnica	-	331.500	392.500	4.000	1	-
	3.2.3. Poboljšanje sigurnosti prometa	431.523	5.850.000	4.833.400	238.908	5	55
	3.2.4. Vanredno održavanje	955.870	9.275.500	6.668.800	2.159.463	32	226
	3.2.4.1. Sanacija cestovnih objekata	-	1.798.500	1.054.500	193.548	18	-
	3.2.4.2. Sanacija oštećenih asfaltnih kolovoza	779.683	6.483.000	5.427.300	1.965.915	36	252
	3.2.4.3. Sanacija klizišta, odrona, sanacija slijeganja trupa puta, kosina i zasjeka	176.187	994.000	187.000	-	-	-
4.	Eksproprijacija i elaborati eksproprijacije	6.124.057	6.000.000	6.610.000	7.231.341	109	118
5.	Projekti iz Budžeta F BiH i sufinansiranja iz drugih nivoa vlasti	253.479	52.707.200	43.500.000	1.614.548	4	637
	U K U P N O	66.807.750	305.195.600	209.891.900	112.218.198	53	168

U izvještajnom periodu JP Ceste F BiH su realizovale u investicije 112,22 mil.KM što je 53 % od planiranih 209,89 mil.KM, a 68% ili 45,41 mil.KM više u odnosu na realizaciju prethodne godine. Najveću realizaciju u iznosu od 77,82 mil.KM su imali projekti iz Programa „Modernizacija cesta u F BiH“, zatim projekti iz sredstava JP Ceste F BiH u iznosu 32,78 mil.KM, od čega je 7,23 mil.KM utrošeno za eksproprijaciju i aktivnosti vezane za istu. Iz sredstava Budžeta F BiH za 2020.godinu realizovan je 1,61 mil.

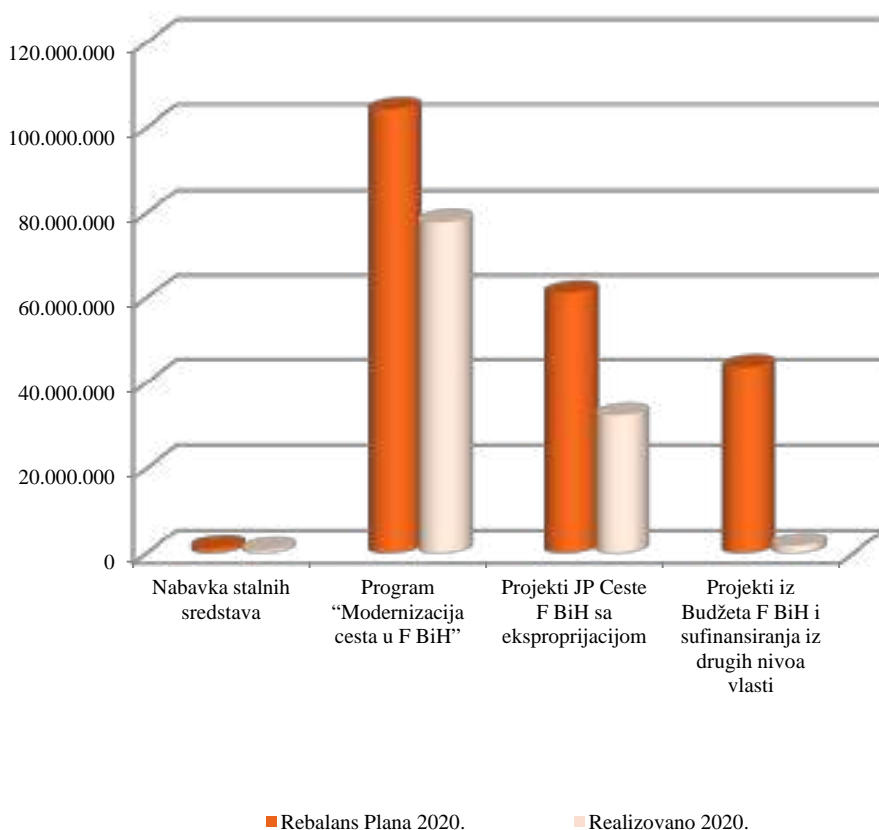

Grafički prikaz visine realizovanih ulaganja

1. Nabavka stalnih sredstava

Red. Br.	OPIS	Plan 2020.	Rebalans Plana 2020.	Realizovano 2020.
1.	Automatski brojači prometa	300.000	500.000	242.775
2.	Automobili	300.000	260.000	163.230
3.	Računarska oprema	90.000	150.000	29.040
4.	Ulaganja u poslovnu zgradu	100.000	100.000	13.993
5.	Nadogradnja sistema gospodarenja cestama	110.000	110.000	109.837
6.	Druge nabavke neophodne za izvršenje planiranih aktivnosti	30.000	30.000	20.011
UKUPNO		930.000	1.150.000	578.886

Rb.1. - NTSI-Institut d.o.o. Sarajevo na osnovu ugovora 01-02.1-13068/19. od 08.11.2019.godine je isporučio 25 uređaja za automatsko brojanje prometa tipa QLTC 10 ili ekvivalent, 25 solarnih panela sa nosačem kao i ostalu opremu za nesmetani rad automatskih brojača prometa. Vrijednost opreme iznosi 187.200 KM, s tim da iznos 180.180 KM tereti stalna sredstva, a 7.020 KM

rashode. Nabavkom navedene opreme, kao i njenim instaliranjem i korištenjem, omogućeno je praćenje prometa u realnom vremenu na svim "QLTC_10" lokacijama putem interneta. Timing d.o.o. Tuzla po ugovoru broj 01-02.3-7640/20 od 22.07.2020. izvršio je ugradnju automatskih brojača.

- Rb.2 - Na osnovu ugovora broj:01-03.2-11916/20. i 01-03.2-11917/20. od 28.12.2020. godine sa M.R.M. export-import d.o.o. Ljubuški i AC Quattro d.o.o. Sarajevo, realizovana je nabavka četiri planirana putnička automobila ukupne vrijednosti 163.230 KM. Postupak nabavke vozila sa posebnim karakteristikama, finansiranog iz kreditnih sredstava, biće pokrenut početkom 2021. godine, nakon što se usaglasi specifikacija sa kreditorom.
- Rb.3 - Nabavljena je Plateia Ultimate 4D, namijenjena obradi prostornih podataka, te poslovima projektiranja od CGS Labs d.o.o. Novi Sad na osnovu ugovora broj:01-02.3-10540/20. od 09.11.2020. vrijednosti 9.262 KM. Također, nabavljen je softver za projektovanje – obradu prostornih podataka specijalističkih softverskih alata ESRI ARC GIS na osnovu ugovora broj:01-02.3-10541/20. od 09.11.2020. godine vrijednosti 6.084 KM, a dobavljač je GDI d.o.o. Sarajevo. Na osnovu ugovora 01-02.3-8018/20 od 07.08.2020. godine sa Elur d.o.o. Kiseljak isporučena je računarska oprema vrijednosti 14.730KM.
- Rb.4. - Za uspostavu i implementaciju RAMS sistema i kontrolnog centra neophodno je bilo preurediti i prilagoditi prostor u poslovnoj zgradi JP Ceste F BiH. Sklopljeni su ugovori sa Stroping d.o.o Sarajevo (6.980 KM) i Hano d.o.o Sarajevo (7.012 KM).
- R.b.5. - Sa grupom ponuđača: TEB Informatika d.o.o. Zagreb i TEB Informatika d.o.o. Sarajevo potpisan je ugovor za nadogradnju sistema gospodarenja cestama JP Ceste F BiH (SUGOC – menadžerski portal broj: 01-02.3-6070/20 03.06.2020 vrijednosti 109.837 KM.
- R.br.6.- Druge nabavke obuhvataju opremu neophodnu za radne aktivnosti, kao što je nabavka radnih stolica, plakara i dr.

2. Zajednički projekti sa međunarodnim finansijskim institucijama

Program „Modernizacija cesta u F BiH“

Realizacija Programa u 2020 napreduje kroz odvijanje radova na ugovorima za izgradnju ceste Neum-Stolac, izgradnju obilaznica oko gradova, kao i na brojnim ugovorima srednje veličine za rekonstrukcije/rehabilitacije tunela i mostova, izgradnju traka za spora vozila, rekonstrukcije /rehabilitacije crnih tačaka i sanacije kolovoza i korekcije osovine.

U posmatranom izvještajnom periodu završeni su radovi na izgradnji ceste Stari Neum-Drenovac LOT4 izgradnja tunela Žaba (Hutovo) i trase ispred i iza tunela L= 1,65 km; dodatni radovi na obilaznici Mostara - izgradnja kružnog toka Međine i osvjetljenje raskrsnice; radovi na rekonstrukciji/sanaciji 8 mostova na magistralnim cestama M 1.8 dionica Srebrenik - Šiški Brod 3 (most preko rijeke V. Tinje, Gornja Špionica, most preko Špioničkog potoka, Donja Špionica, most preko rijeke Urvenice, Srebrenik, most preko rijeke Tinje, Drenik, nadvožnjak iznad želj. pruge Brčko – Banovići); M 4 dionica Teslić (Barići) – Karuše(most preko potoka Radušica); M 5 dionica autoput Jošanica1- Stup 1(most preko rijeke Bosne u Reljevu); M 18 dionica Vitalj – Olovo (most preko rijeke Drinjače u Kladnju) i dionica Olovo – Semizovac (most preko rijeke Ljubine); sanacija jednog tunela (tunel Ormanica), dvije sanacije kolovoza i korekcija osovine (Ustikolina-Goražde 8, kružni tok Vitkovići i Srebrenik –Šiški Brod).

Pregledi u periodu za otklanjanje nedostataka izvršeni su na 5 lokacija [mostovi preko rijeke Sane u Ključu i Plive u Jajcu, Tarčin-Konjic, km 16+800 - km 17+600, crna tačka, Mostar centar-Gnojnice (Mostar jug), km 1+640, crna tačka i Tasovčići-Čapljina kružna raskrsnica M6 i M17, km

0+000, crna tačka].

Kod većine ugovora za radove zabilježeno je kašnjenje u odnosu na predviđeni rok za završetak radova. Kašnjenja su uzrokovana odgođenim početkom radova, nepovoljnim vremenskim uvjetima (tokom maja a dijelom i u junu veliki broj kišnih dana i obilne padavine), te posljedicama izazvanih Corona virusom zbog produženja vremena od narudžbe do isporuke materijala što je usporilo aktivnosti na gradilištima.

Najznačajnije aktivnosti vezano za konsultantske usluge i nabavku roba u okviru Programa u 2020 bile su:

- Okončanje usluga za geodetsko praćenje putem ugrađenih inklinometara za tunel Crnaja;
- Završen je ugovor za nabavku opreme za sistem ranog upozorenja (izvršena je instalacija 13 meteoroloških stanica na terenu i uspostava sistema ranog upozorenja na poledicu i poplave);
- Potpisivanje ugovora za vanjsku kontrolu kvaliteta za projekte poboljšanja/rehabilitacije i radove na poboljšanju sigurnosti prometa;
- Završetak procjene izjava interesa za savjetodavne usluge za sigurnost prometa i upućivanje zahtjeva za dostavu ponuda konsultantima sa uže liste u novembru 2020;
- Procjena ponuda za tehničku pomoć za procjenu otpornosti od rizika na klimatske promjene na magistralnim cestama u FBiH završena je u decembru 2020;
- Otvaranje Tehničke ponude za tehničku reviziju otvorene su u oktobru 2020;
- Izvršena je nabavka nove opreme za prikupljanje podataka o stanju kolovoza (deflektometar i uređaj za mjerenje hrapavosti kolovoza), a instalacija i testiranje ovise o podizanju ograničenja u putovanjima zbog COVID-19 pandemije;
- Izvršena je uspostava sistema za upravljanje cestovnom imovinom.

Aktivnosti na unaprijeđenju kapaciteta za upravljanje cestama zabilježile su napredak u 2020 i može se očekivati da će većina biti završena do kraja 2021.

Jedno od najznačajnijih pitanja koje utiče na napredak Programa i implementaciju podprojekata vezano za građevinske radove je dugačak i složen proces rješavanja imovinsko-pravnih pitanja, što je prisutno od početka samog Programa. Proces je postigao izvjestan napredak u posljednje dvije godine, međutim većina ugovora za radove koji su preostali za ugovaranje, kao i nekoliko već potpisanih ugovora ima probleme sa rješavanjem imovinsko-pravnih pitanja, što često dovodi do kašnjenja u implementaciji Programa. U isto vrijeme JP ceste FBiH koriste sve raspoložive kapacitete i instrumente kako bi sa svoje strane doprinijeli ubrzanju rješavanja ovih pitanja.

Pribavljanje neophodnih odobrenja za građenje takođe ima utjecaj na nabavku i početak radova.

Pandemija izazvana Corona virusom dovela je do blagog kašnjenje u implementaciji ugovora za radove, kao i kod nabavke opreme i sa njima povezanim uslugama, zbog produženog vremena nabavke materijala i transporta, ograničenja vezano za putovanja. Premda još ne postoji jasna indikacija da bi ovo moglo značajnije ugroziti okončanje Programa situacija se pomno prati u cilju pravovremenog preduzimanja odgovarajućih mjera.

Rješavanje imovinsko-pravnih pitanja i nepredvidivi razvoj pandemije najznačajnija su prijetnja implementaciji Programa.

U nastavku je dat kratak sažetak trenutnog statusa radova po projektima, konsultantskih usluga i roba.

JP CESTE FEDERACIJE BIH

2.1. Radovi na modernizaciji magistralnih cesta i objekata i konsultantske usluge nadzora

2.1.1. Preneseni projekti iz 2019 godine

Red. Br.	Mag. Cesta	Dionica	DIONICA	Aktivnosti na projektu	Plan 2020.	Rebalans Plana 2020.	Izvođač/ Konsultant - ugovor	Ugovoreno	Realizovano 2020.	Napomena	
1. Izgradnja cesta – Poboljšanje elemenata u postojećem koridoru											
			Šiški Brod –Sarajevo, dionica Kladanj-Podpaklenik preko prevoja Karaula, izgradnja trase = 2.702m1 i objekata (dva mosta, most 13 i most 14 L=414m1)	Izvođenje			JV Euro-Asfalt d.o.o. i GP ŽGP d.d. Sarajevo, 01-02.3-879/18; 02.02.2018. Amandman br.2 01-05.2-/6057/20 02.07.2020	9.098.762	422.912	Radovi završeni 21.11.2019. i izdata potvrda o preuzimanju radova. Izvođač ispostavio obrač. sit. u feb.2020 i prilagod.cijene usljed rasta troškova po amandmanu br.2.	
				Kamata					30.607		
				Ukupno							453.519
			EIB	Izvođenje					422.912		
			Stolac - Neum, dionica Stari Neum – Oštrovac Asfaltiranje dionice Stari Neum – Babin Do L=5,3 km, izgradnja ceste Babin Do – Oštrovac L=1,7 km i izgradnja tunela Oštrovac L=900m1 (LOT1)	Izvođenje			Integral Inženjering ad Laktaši, 01-02.2-645/18. 24.01.2018. Amandman ugovora br.1 , 01-05.2-6909/20, 01.07.2020.	618.587	571.241	Radovi završeni 24.04.2019. i izdata potvrda o preuzimanju radova. Izvođač ispostavio obračun.sit. nakon potpisa amandmana br.1 koji je obuhvatio prilagod. cijene usljed rasta troškova	
				Kamata					27.108		
				Ukupno							598.349
1.1	M 7.3	N	Izgradnja tunela Žaba, L=0,975 km i ceste ispred i iza tunela L=1,65km (LOT 4)	Izvođenje	10.000.000	9.239.000	JV Euro-asfalt d.o.o.Sarajevo &HP Investing d.o.o.Mostar 01-02.3-7246/18, 23.08.2018.	19.707.006 (preneseno 10.558.512)	9.237.598	Radovi okončani U toku izrada konačnog obračuna.	
				Nadzor		519.000	923.000	JV iC consuelten GesmbH, Nievelt Ingenieur GmbH Wien and AIK Inženjering d.o.o. Banovići, 01-02.3-2574/18. 28.03.2018.	1.023.728 (preneseno 302.215)		491.237
				kamata							125.334
				Ukupno							9.854.169
			Stolac - Neum, dionica Oštrovac – Broćanac (LOT2)	Izvođenje	13.489.000	12.000.000	JV Euro-asfalt d.o.o. Sarajevo i HP Investing d.o.o. Mostar 01-02.3-7246/18, 23.08.2018. Amandman ugovora br.1, 01-02.2-646/18, 09.06.2020.	657.529	655.790	Radovi završeni 25.04.2019. i izdata Potvrda o preuzimanju radova. Izvođač ispostavio obračun.sit koja je obuhvatila prilagod.cijena usljed rasta troškova po amandmanu br.1	
							JV HP Investing d.o.o. Mostar Putovi d.o.o. Grude i Euro-asfalt d.o.o.Sarajevo, 01-02.3-7426/19. 18.06.2019.	14.989.032 (preneseno 13.413.972)	7.595.106		
			Neum-Stolac , izgradnja dionice Stolovi-Drenovac L=8.300 km	Nadzor	598.000	770.000	JV iC consuelten GesmbH, Nievelt Ingenieur GmbH Wien and AIK Inženjering d.o.o. Banovići,	1.251.767 (preneseno 1.141.885)	364.993	Radovi u toku Očekuje se završetak radova do marta 2021.	

JP CESTE FEDERACIJE BIH

							01-02.3-2574/18. 28.03.2018.			
										181.642
										8.797.531
2. Izgradnja traka za spora vozila										
2.2	M5	006	Bosanski Petrovac - Ključ – prevoj Lanište	Izvođenje	4.197.000	3.635.000	Euro-Asfalt d.o.o.Sarajevo, 01-02.3-3180/19. 19.03.2019.	4.468.663 (preneseno 3.635.196)	2.340.091	Radovi u toku, Očekuje se završetak u 2021.
				Nadzor	105.000	142.300	JV Divel d.o.o. Sarajevo, IG d.o.o. Banja luka IGH d.o.o.Mostar, 01-02.3-5708/18, 17.07.2018.	189.879 (preneseno 142.291)	133.099	
				Kamata					32.215	
				Ukupno					2.505.405	
3. Rekonstrukcije ceste i kolovozne konstrukcije, korekcija osovine										
3.1	M5		Bihać 4-Ripač, sanacija kolovoza i korekcija osovine	Izvođenje	1.398.000	350.000	JV Kov-grad d.o.o. Bužim BC- Gradnja d.o.o. Bos.Otoka, 01-02.3-8459/18. 03.10.2018.	1.613.419 (preneseno 1.420.554)	-	Završen samo dio kroz naselje Ribič pješačka staza (oko 12% ugovorenog). Preostali radovi odloženi do okončanja rješavanja imovinsko- pravnih pitanja i izdavanja dozvole za gradnje
				Nadzor	84.000	40.000	JV Divel d.o.o. Sarajevo, IG d.o.o. Banja luka IGH d.o.o. Mostar, 01-02.3-5708/18, 17.07.2018.	25.278	-	
				Ukupno					-	
3.2	M5	009	Jajce jug-Donji Vakuf , presvlačenje i ispravka osovine	Izvođenje	6.879.300	4.600.000	JVEuro Asfalt d.o.o.Sarajevo i BBM d.o.o.Sarajevo, 01-02.3-9997/19. 21.08.2019.	7.092.070	1.972.249	Radovi u toku. Početak radova na tunelu Skela čeka izdavanje odobrenje za gradnju Neriješena imovinsko- pravna pitanja onemogućavaju potpuni završetak radova na dionici
				Nadzor	288.000	197.000	JV Divel d.o.o. Sarajevo, IG d.o.o. Banja luka IGH d.o.o.Mostar, 01-02.3-5708/18, 17.07.2018.	308.882 (preneseno 304.629)	224.414	
				Kamata					22.545	
				Ukupno					2.219.208	
3.4	M20	009	Ustikolina – Goražde kružni tok, korekcija osovine, rješenje odvodnje i pješačke staze	Izvođenje	335.000	127.100	Euro-asfalt d.o.o.Sarajevo, 01-02.3-3181/19. 19.03.2019.	3.345.063 (preneseno 127.034)	127.034	Radovi okončani
				Nadzor	48.000	10.000	JV Divel d.o.o. Sarajevo, IG d.o.o. Banja luka IGH d.o.o.Mostar, 01-02.3-5708/18, 17.07.2018.		17.479	
				Ukupno					144.513	
4. Rekonstrukcije/ rehabilitacije tunela										
4.3	M17	007	Topčić polje – Lašva, sanacija tunela Vranduk II km 7+416	Izvođenje	3.700.000	5.000.000	JV Hering d.o.o. Široki Brijeg i BBM d.o.o. Sarajevo 01-02.3-7602/18, 06.09.2018.	11.797.158 (preneseno 3.102.335)	3.160.123	Najznačajniji radovi u glavnoj tunelskoj cijevi i na instalaciji opreme su završeni. Iskopi u servisnom tunelu su završeni, dok postoje kašnjenja u završetku sekundarne obloge i opreme. Za
				Nadzor	180.000	500.000	JV Divel d.o.o.Sarajevo, IG d.o.o. Banja luka IGH d.o.o. Mostar, 01-02.3-5708/18, 17.07.2018.	447.232	603.131	
				Kamata					72.031	

JP CESTE FEDERACIJE BIH

				Ukupno				3.835.285	dodatne radove za rekonstrukciju tunela pripremljen amandman ugovora i dost.kreditoru na saglasnost	
4.2	M1.8	003	Pelagićevo – Srebrenik, sanacija tunela Ormanica km 16+210	Izvođenje	1.466.000	1.291.000	JV Jata Group d.o.o. Srebrenik & Hering d.d. Široki brijeg, 01-02.3-7604/18. 06.09.2018.	1.853.519 (preneseno 1.291.129)	846.876	Radovi okončani
				Nadzor	100.000	129.000	JV Divel d.o.o. Sarajevo, IG d.o.o. Banja luka IGH d.o.o. Mostar, 01-02.3-5708/18, 17.07.2018.	87.502	112.604	
				kamata					66.452	
				Ukupno					1.025.932	
5. Rekonstrukcije – sanacije mostova										
5.17	M17	007	Nemila 0 – Lašva 0, most preko rijeke Bosne, Bosna IV i Bosna V	Izvođenje	300.000	74.000	Hering d.d. Široki brijeg, 01-02.3-2429/18. 26.03.2018.	1.882.270 - IV 653.903- V	-54.434 19.507	Radovi završeni, izvršena korekcija za prethodni period u 17 privremenoj situaciji za februar 2020.
				Nadzor	31.000	3.000	JV Divel d.o.o. Sarajevo, IG d.o.o. Banja luka IGH d.o.o. Mostar 01-02.3-5708/18, 17.07.2018.	84.585	2.933	
				Ukupno					-31.994	
Zajedničko finansiranje EIB +WB				Izvođenje	41.764.300	36.316.100			26.471.181	
				Nadzor	1.953.000	2.714.300			1.949.890	
Izgradnja cesta- Pобоljšanje elemenata u postojećem koridoru										
1.3	M6.1		Južna obilaznica Mostara, dovršetak dionice Međine – Miljkovići L=6.7km	Izvođenje	667.000	667.000	JV Putovi d.o.o. Grude, HP Investing d.o.o. Mostrar 01-02.3-11218/18. 13.12.2018. Amandman br.1 01-05.2-14424/19 17.12.2019	5.228.793 (preneseno 340.497 od osnovnog Ugovora)	922.005	Radovi po osnovnom ugovoru i amandmanu – raskrsnica Međine završeni
				Kamata					4.344	
				Ukupno					926.349	
E B R D				Izvođenje	667.000	667.000			922.005	
SVEUKUPNO EIB +WB+EBRD				Izvođenje	42.431.300	36.983.100			27.816.098	29.947.244
				Nadzor	1.953.000	2.714.300			1.949.890	

2.1.2. Planirani projekti u 2020 godini

Red. Br.	Mag. Cesta	Dionica	DIONICA	Aktivnosti na projektu	Plan 2020.	Rebalans Plana 2020.	Izvođač/ Konsultant - ugovor	Ugovoreno	Realizovano 2020.	Napomena
1. Izgradnja cesta – Pобоljšanje elemenata u postojećem koridoru										
	M17.3		Neum – Stolac , izgradnja dionice Broćanac – Papratnica L= 3.025 km (LOT 3)	Izvođenje	6.000.000	4.500.000	Strabag AG Austrija, 01-05.2-1231/20. 30.01.2020.	8.811.931	3.644.200	Radovi u toku

JP CESTE FEDERACIJE BIH

				Nadzor	359.000	200.000	JV iC consuelten GesmbH, Nievelt Ingenieur GmbH Wien and AIK Inženjering d.o.o. Banovići, 01-02.3-2574/18. 28.03.2018.	538.289	189.632	
				Kamata					41.077	
				Ukupno					3.874.909	
			Neum – Stolac , izgradnja dionice Hutovo-Cerovica L=4.475 km (LOT 5)	Izvođenje	7.530.000	2.600.000	JV:Hering d.d. Široki brijeg i Cester d.o.o.Split,01-05.2-7176/20.BP 16.07.2020.	9.673.721	705.648	U ugovoru objedinjeni radovi na dionici Hutovo-Cerovica i Cerovica – Stolovi. Radovi u toku
				Nadzor	376.800	130.000	JV iC consuelten GesmbH, Nievelt Ingenieur GmbH Wien and AIK Inženjering d.o.o. Banovići, 01-02.3-2574/18. 28.03.2018.	538.289	-	
				Kamata					12.585	
				Ukupno					718.233	
			Neum – Stolac , izgradnja dionice Cerovica-Stolovi L=7.00 km (LOT 6)	Izvođenje	8.215.000	2.400.000	JV:Hering d.d. Široki brijeg i Cestar d.o.o.Split,01-05.2-7176/20.BP 16.07.2020	8.067.634	447.588	Podijeljen nadzor i izvođenje
				Nadzor	411.000	120.000	JV iC consuelten GesmbH, Nievelt Ingenieur GmbH Wien and AIK Inženjering d.o.o. Banovići, 01-02.3-2574/18. 28.03.2018.		21.529	
				Ukupno					469.117	
2. Izgradnja traka za spora vozila										
2.3	M5	010	Donji Vakuf – Turbe (Komar)	Izvođenje	3.836.000	1.500.000	Jata Group d.o.o. Srebrenik, 01-02.3-10112/19. 26.08.2019.	3.835.791	1.342.822	Radovi nateritoriji općine D.Vakuf završeni. Za preostali dio radova na teritorijopćimi Travnik čeka se odobrenje za građenje.
				Nadzor	243.000	95.000	JV Divel d.o.o. Sarajevo, IG d.o.o. Banja luka IGH d.o.o.Mostar, 01-02.3-5708/18, 17.07.2018.	243.061	68.229	
				Kamata					15.061	
				Ukupno					1.426.112	
2.1	M5	003	Ripač – Dubovsko	Izvođenje	4.946.000	-			-	Nije planirano rebalansom
				Nadzor	218.800	-			-	
				Ukupno					-	
2.4	M6.1		Posušje – Grude – Široki Brijeg	Izvođenje	6.259.000	6.392.000	JV Putovi d.o.o.Grude, HP Investing d.o.o.Mostar KTM Brina d.o.o.Posušje, 01-05.2-4248/20. 16.04.2020.	6.392.055	5.819.620	Radovi u toku
				Nadzor	280.000	280.000	JV Divel d.o.o. Sarajevo, IG d.o.o. Banja luka IGH d.o.o.Mostar, 01-02.3-5708/18, 17.07.2018.	280.006	136.840	

JP CESTE FEDERACIJE BIH

				Kamata					61.769	
				Ukupno					6.018.229	
2.5	M14.2	003	Bos.Petrovac – Drvar	Izvođenje	3.716.100	-	-	-	-	Nije planirano rebalansom
				Nadzor	87.500	-	-	-	-	
				Ukupno					-	
2.6	M14.2	004	Drvar – Resanovci	Izvođenje	1.183.300	780.000	JV Jata Group d.o.o.Srebrenik i Rocco-commerce d.o.o.Livno,01-05.2-7959/20.BP 07.08.2020.	1.380.927	403.654	Radovi u toku
				Nadzor	70.000	46.000	JV Divel d.o.o. Sarajevo, IG d.o.o. Banja luka IGH d.o.o. Mostar, 01-02.3-5708/18, 17.07.2018.	70.002	26.211	
				Kamata					19.728	
				Ukupno					449.593	
2.8	M15	008 i 010	Livno – Šuica – Kupres, Borova Glava+ Trivunove krivine	Izvođenje	5.320.000	1.461.000	JV Livnoputovi d.o.o. Livno,Putovi d.o.o.Grude i HP Investing d.o.o.Mostar, 01-05.2-8328/20BP. 26.08.2020.	4.819.617	597.642	Radovi u toku
				Nadzor	196.000	82.000	JV Divel d.o.o. Sarajevo, IG d.o.o. Banja luka IGH d.o.o. Mostar, 01-02.3-5708/18, 17.07.2018.	245.005	25.203	
				Kamata					26.693	
				Ukupno					649.538	
4. Rekonstrukcije/rehabilitacije tunela										
4.4	M18	012	Konjic – Jablanica 1, rekonstrukcija tunela Crnaja km 15+082	Izvođenje	6.580.000	2.000.000	JV HP Investing d.o.o. Mostar, i Euro-Asfalt d.o.o.Sarajevo, 01-02.3-7425/19. 18.06.2019.	10.968.916	-	Početak radova u januaru 2021
				Nadzor	274.200	125.000	JV Divel d.o.o. Sarajevo, IG d.o.o. Banja luka IGH d.o.o. Mostar, 01-02.3-5708/18. 17.07.2018.	456.954	-	
				Ukupno					-	
6. Rekonstrukcija crnih tačaka i opasnih mjesta										
6.7	M18	006	Šiški Brod 3 – Živinice 1, rekonstrukcija crne tačke "Husino" km 2+500	Izvođenje	900.000	900.000	JV Jata Group d.o.o. Srebrenik &Hering d.d.Široki brijeg, 01-02.3-7604/18. 06.09.2018.	899.866	444.414	Radovi u toku
				Nadzor	49.600	49.600	JV Divel d.o.o.Sarajevo, IG d.o.o. Banja luka IGH d.o.o. Mostar, 01-02.3-5708/18, 17.07.2018.	49.584	166.898	
				Kamata					40.171	
				Ukupno					651.483	
6.2	M5	001	Granica BIH/ RH (Izačić) – Bihać,	Izvođenje	821.500	-	-	-	-	Nije planirano

JP CESTE FEDERACIJE BIH

			rekonstrukcija opasnog mjesta Kamenica (raskrsnica M-5 i R 403.a)	Nadzor	40.800	-			-	rebalansom
				Ukupno					-	
Zajedničko finansiranje EIB +WB				Izvođenje	55.306.900	22.533.000			13.405.588	
				Nadzor	2.606.700	1.127.600			634.542	
2. Izgradnja traka za spora vozila										
30-1	M5	2.9	Kobiljača	Izvođenje	3.611.300	4.500.000	Strabag AG Austrija, 01-05.2-4247/20. 16.04.2020.	6.270.003	5.221.248	Radovi u toku
				Nadzor	170.000	170.000	JV Divel d.o.o. Sarajevo, IG d.o.o. Banja luka IGH d.o.o. Mostar, 01-02.3-5708/18. 17.07.2018.	243.061	318.649	
				Kamata					58.452	
				Ukupno					5.598.349	
	M18	2.7	Banj Brdo-Simin Han	Izvođenje	2.543.000	-			-	Nije planirano rebalansom
				Nadzor	126.400	-			-	
				Ukupno					-	
Finansiranje WB + 1% JP Ceste F BiH				Izvođenje	6.154.300	4.500.000			5.221.248	
				Nadzor	296.400	170.000			318.649	
4. Rekonstrukcija – sanacija tunela										
4.1	M 16.2	003	Prozor – Jablanica 1 – Rehabilitacija tunela Jasen, Ustirama	Izvođenje	1.550.000	2.358.000	JV HP Investing d.o.o. Mostar i EuroAsfalt d.o.o. Sarajevo, 01-05.2-2710/20. 27.02.2020.	4.715.271	2.448.802	Radovi u toku
				Nadzor	78.000	90.000	Roughton International LTD. UK, 01-05.2-511/20. 13.01.2020.	142.007	152.222	
				Kamata					12.267	
				Ukupno					2.613.291	
5. Rekonstrukcija –sanacija mostova										
5.1	M 1.8	003	Pelagićevo – Srebrenik, most preko rijeke V.Tinje, Gornja Špionica	Izvođenje	417.000	417.000	Hering d.d. Široki Brijeg, 01-05.2-13576/19. 28.11.2019.	416.969	481.412	Okončano
				Nadzor	21.000	27.200	Roughton International LTD. UK, 01-05.2-511/20. 13.01.2020.	27.227	33.581	
				Ukupno					514.993	
5.2	M 1.8		Pelagićevo – Srebrenik, most preko Špioničkog potoka, Donja Špionica	Izvođenje	381.000	381.000	Hering d.d. Široki Brijeg, 01-05.2-13576/19. 28.11.2019	380.878	391.352	Okončano
				Nadzor	19.000	24.900	Roughton International LTD. UK, 01-05.2-511/20. 13.01.2020.	24.871	34.620	
				Ukupno					425.972	
5.3	M 1.8	004	Srebrenik – Šiški Brod 3, most preko rijeke Urvenice, Srebrenik	Izvođenje	235.000	235.000	Hering d.d. Široki Brijeg, 01-05.2-13576/19. 28.11.2019	234.267	347.905	Okončano
				Nadzor	12.000	15.300	Roughton International LTD. UK,	15.297	15.759	

JP CESTE FEDERACIJE BIH

							01-05.2-511/20. 13.01.2020.			
				Ukupno						363.664
5.4	M1.8	004	Srebrenik – Šiški Brod 3, most preko rijeke Tinje, Drenik	Izvođenje	410.000	410.000	Hering d.d. Široki Brijeg, 01-05.2-13576/19. 28.11.2019	409.633	363.320	Okončano
				Nadzor	21.000	26.700	Roughton International LTD. UK, 01-05.2-511/20. 13.01.2020.	26.748	27.107	
				Ukupno						
5.5	M1.8	004	Srebrenik – Šiški Brod 3, nadvoznjak iznad želj.pruge Brčko – Banovići	Izvođenje	373.000	373.000	Hering d.d. Široki Brijeg, 01-05.2-13576/19. 28.11.2019	372.765	206.499	Okončano
				Nadzor	19.000	24.300	Roughton International LTD. UK, 01-05.2-511/20. 13.01.2020.	24.341	24.735	
				Ukupno						
5.6	M4	008	Teslić (Barići) – Karuše, most preko potoka Radušica	Izvođenje	426.000	426.000	HP Investing d.o.o.Mostar, 01-05.2-13603/19. 28.11.2019.	426.082	406.628	Okončano
				Nadzor	21.300	24.400	Roughton International LTD. UK, 01-05.2-511/20. 13.01.2020.	24.348	24.348	
				Ukupno						
	M17		Nemila 0 – Lašva 1 – most preko rijeke Bosne (Zenica)	Izvođenje	2.246.000	2.366.000	HP Investing d.o.o.Mostar, 01-05.2-13603/19. 28.11.2019.	2.245.495	1.179.890	Okončano
				Nadzor	112.500	128.300	Roughton International LTD. UK, 01-05.2-511/20. 13.01.2020.	128.314	152.818	
				Kamata					6.275	
				Ukupno						
5.12	M5	008	HW Jošanica 1 – Stup 1, most preko rijeke Bosne u Reljevu	Izvođenje	797.000	797.000	HP Investing d.o.o.Mostar, 01-05.2-602/19. 28.11.2019.	796.634	794.592	Okončano
				Nadzor	40.000	64.500	Roughton International LTD. UK, 01-05.2-511/20. 13.01.2020.	64.523	59.955	
				Ukupno						
5.20	M18	008	Vitalj – Olovo, most preko rijeke Drinjače u Kladnju	Izvođenje	368.000	368.000	HP Investing d.o.o.Mostar, 01-05.2-602/19. 28.11.2019.	367.916	366.980	Okončano
				Nadzor	18.500	29.800	Roughton International LTD. UK, 01-05.2-511/20. 13.01.2020.	29.799	27.769	
				Ukupno						
5.21	M18	009	Olovo – Semizovac, most preko rijeke Ljubine	Izvođenje	442.000	442.000	HP Investing d.o.o.Mostar, 01-05.2-602/19. 28.11.2019.	441.178	440.220	Okončano
				Nadzor	22.000	35.700	Roughton International LTD. UK, 01-05.2-511/20. 13.01.2020.	13.628	33.349	
				Ukupno						

JP CESTE FEDERACIJE BIH

5.23	M20		Obilaznica Goražde, most preko rijeke Drine (postojeći most)	Izvođenje	2.667.000	900.000	GP ŽGP d.o.o. Sarajevo, 01-05.2-13577/19. 28.11.2019.	2.749.804	812.096	Radovi u toku
				Nadzor	134.000	51.000	Roughton International LTD. UK, 01-05.2-511/20. 13.01.2020.	128.314	71.777	
				Ukupno					883.873	
5.15	M 15	004	Kamičak – Ključ – most preko rijeke Banjice	Izvođenje	352.000	-			-	Rebalansom nije planirano
				Nadzor	18.000	-			-	
				Ukupno					-	
7. Izgradnja obilaznica										
7.1	M 16.4		Izgradnja obilaznice Bugojno	Izvođenje	900.000	-			-	Rebalansom nije planirano
7.3	M5		Izgradnja obilaznice Donji Vakuf – I faza	Izvođenje	2.100.000	-			-	Potpisivanje ugovora u januaru 2021.
	M15		Livno obilaznica – I faza	Izvođenje	1.000.000	-			-	Rebalansom nije planirano
	M 6.1		Mostar obilaznica – Izgradnja dionice Miljkovići – Rodoč, vijadukt Marjanovića Draga	Izvođenje	4.000.000	2.500.000	JV Hering d.d.dŠiroki Brijeg,KTM Brina d.o.o.Posušje, 01-05.2-7204/20. 16.07.2020.	7.625.529	299.088	Radovi u toku
	M14		Bihac – Bosanska Krupa – I faza, dionica Jablanska – Mali Lug	Izvođenje	2.400.000	-			-	Rebalansom nije planirano
	M 6.1		Mostar obilaznica – Izgradnja dionice Miljkovići – Rodoč (Tunel Novi)	Izvođenje	10.000.000	-			-	Rebalansom nije planirano
	M5		Izgradnja obilaznice Kiseljak – I faza	Izvođenje	1.173.000	-			-	Rebalansom nije planirano
	M 4.2		Izgradnja obilaznice Cazin – I faza	Izvođenje	5.500.000	-			-	Rebalansom nije planirano
	M5		Izačić – Kamenica – Izgradnja obilaznice Bihać – I faza	Izvođenje	5.500.000	-			-	Rebalansom nije planirano
	M6		Grude (veza M6 i R420) – Izgradnja sjeverne obilaznice	Izvođenje	2.500.000	-			-	Rebalansom nije planirano
			Izgradnja obilaznice Goražde-I faza	Izvođenje	586.000	-			-	Rebalansom nije planirano
8. Sanacija šteta poslije poplava i modernizacija										
8.1	M 1.8	001	Granica BH/HR – Lončari	Izvođenje	2.400.000	3.223.000	JV Jata Group d.o.o.&Roading d.o.o. Srebrenik, 01-05.2-2705/20 BP27.02.20	3.222.791	3.262.264	Okončano
				Nadzor	120.000	104.000	Roughton International LTD. UK, 01-05.2-511/20. 13.01.2020.	103.925	108.006	
				Kamata					15.870	
				Ukupno					3.386.140	
8.2	M 1.8	003	Pelagićevo - Srebrenik	Izvođenje	1.600.000	2.213.000	JV Jata Group d.o.o.&Roading d.o.o. Srebrenik, 01-05.2-2705/20 BP27.02.20	2.213.032	1.019.691	Radovi u toku
				Nadzor	80.000	71.000	Roughton International LTD. UK, 01-05.2-511/20. 13.01.2020.	71.364	15.180	
				Kamata					4.874	
				Ukupno					1.039.745	
8.3	M 1.8	004	Srebrenik – Šiški Brod	Izvođenje	4.890.000	5.275.000	JV Jata Group d.o.o.&Roading	5.274.929	5.274.830	Okončano

JP CESTE FEDERACIJE BIH

							d.o.o. Srebrenik, 01-05.2-2707/20. BP. 27.02.2020.			
				Nadzor	245.000	152.000	Roughton International LTD. UK, 01-05.2-511/20. 13.01.2020.	151.877	133.717	
				Kamata					25.465	
				Ukupno					5.434.012	
8.4 i 8.5	M18	007 i 009	Živinice 1 – Vitalj – rekonstrukcija škarpi i spora traka Stupari – Vitalj i Olovo – Semizovac – rekonstrukcija škarpi i spora traka Čevljanovići – Nišići	Izvođenje	1.000.000	-			-	Rebalansom nije planirano
				Nadzor	10.000	-			-	
				Ukupno					-	
8.10	M4	012	Simin Han 1 – Donje Caparde, tunel Čaklovići	Izvođenje	2.200.000	-			-	Potpisivanje ugovora u januaru 2021.
				Nadzor	82.000	-			-	
				Ukupno					-	
8.12	M15	004	Kamičak – Ključ - Crljeni – Zgon	Izvođenje	3.600.000	4.611.000	HP Investing d.o.o.Mostar, 01-05.2-2708/20. 27.02.2020.	4.611.418	2.244.882	Kamičak – Ključ okončano.Za nastavak čeka se izdavanje odobranja za građenje
				Nadzor	180.000	146.700	Roughton International LTD. UK, 01-05.2-511/20. 13.01.2020.	253.804	145.670	
				Kamata					10.609	
				Ukupno					2.401.161	
	M5		Kaonik-Gromiljak – završetak rekonstrukcije Busovača – Draga, Delfine krivine i Jehovac – Brestovsko	Izvođenje	2.445.000	3.472.000	Strabag AG Austria, 01-05.2-2709/20 BP.27.02.2020.	3.472.035	3.472.024	Okončano
				Nadzor	122.300	123.600	Roughton International LTD. UK, 01-05.2-511/20. 13.01.2020.	123.640	143.610	
				Kamata					35.308	
				Ukupno					3.650.942	
EBRD				Izvođenje	64.458.000	30.767.000			23.812.475	
				Nadzor	1.375.600	1.139.400			1.204.223	
SVEUKUPNO EIB + EBRD + WB +1% JP Ceste F BiH				Izvođenje	125.919.200	57.800.000			42.439.311	44.596.725
				Nadzor	4.278.700	2.437.000			2.157.414	

2.2. Konsultantske usluge

Red. Br.	Opis	Plan 2020.	Rebalans Plana 2020.	Izvođač/ Konsultant - ugovor	Ugovoreno	Realizovano 2020.	Finansijer	Napomena
1.	Tehnička pomoć pri implementaciji projekta	100.000	117.000	Roughton International LTD. UK, 01-02.3-8736/17. 28.09.2017.	463.747 (preneseno 240.150)	59.431	Finansiranje 100% EIB	U toku
2.	Tehnička pomoć za procjenu osjetljivosti cestovne mreže na klimatske promjene	782.300	50.000				Finansiranje 100% WB	Procjena ponuda završena 12/20
3.	Konsultantske usluge monitoringa tunela „Crnaja“ putem inklinometara	15.100	15.400	Geosonda d.o.o. Zenica. 01-02.3-11464/17. 27.12.2017.	164.731 (preneseno 22.680)	15.400	Finansiranje 99% WB 1% JP Ceste F BiH	Okončano
4.	Vanjska kontrola kvalitete radova izgradnje Stari Neum-Drenovac	300.000	70.000	JV Igmata d.o.o. DTQ d.o.o. IGH d.o.o. Mostar, 01-02.3-4861/19,	705.015 (preneseno 567.913)	103.694	Finansiranje EIB/WB	U toku

JP CESTE FEDERACIJE BIH

				22.04.2019.				
5.	Vanjska kontola – ostali projekti obuhvaćeni modernizacijom	300.000	20.000	JV AIK Inenjering d.o.o.Banovići, TPA Društvo za održavanje kvaliteta i inovacija d.o.o.Zagreb, 01-05.2-8210/20. 13.08.2020.	640.887	21.796	Finansiranje EIB/ WB	U toku
6.	Nadzor za projekte finansirane od strane EBRD iz II tranše	500.000	500.000				JP Ceste F BiH	
UKUPNO		1.997.400	772.400			200.321		

2.3 Robe

Red. Br.	NAZIV	Plan 2020.	Rebalans Plana 2020.	Izvođač/ Konsultant-ugovor	Ugovoreno	Realizovano 2020.	Finansijer
1.	Unapređenje postojeće opreme za prikupljanja podataka o stanju kolovoza	102.000	102.000	Dynatest A/S, Danska 01-05.2-6627/20 18.06.2020.	99.782	-	
2.	Nabavka hardvera i softvera za sistem upravljanja cestovnom imovinom (RAMS)	1.228.200	1.305.000	Telegroup d.o.o. Banja lukai Deighton Associates Ltd.USA 01-05.2-1616/20. 03.01.2020.	1.535.254	1.266.585	Finansiranje 100% WB
3.	Nabavka opreme za sistem za rano upozorenje (meteo stanice)	722.300	651.000	ALEM Sistem d.o.o. Sarajevo, 01-05.2-1609/20. 03.02.2020.	722.225	722.225	Finansiranje 100% WB
				saglasnosti		1.169	Vlastita sredstva
4.	Nabavka opreme za prikupljanje podataka o stanju kolovoza	355.000	319.500	RO Tehnologija d.o.o. Lukavac, 01-05.2-5050/20. 30.04.2020.	355.000	319.500	Finansiranje 100% WB
UKUPNO		2.407.500	2.377.500			2.309.479	

- 1 - Preostala obaveza isporuke opreme iz inostranstva i kalibracija na terenu koja ovisi o prestanku ograničenja putovanja zbog COVID-19,
- 2 - Uspostavljen sistem za upravljanje cestovnom imovinom,
- 3 - Izvršena nabavka 13 meteoroloških stanica, instalacija na terenu i definiranje aranžmana za upravljanje podacima, razmjenu i za sistem ranog upozorenja,
- 4 - Isporučena oprema (deflektometar i uređaj za mjerenje hrapavosti kolovoza), a instalacija i testiranje ovisne o prestanku ograničenja putovanja zbog COVID-19.

Kamate na međunarodne kredite

Red. Br.	NAZIV	Plan 2020.	Rebalans Plana 2020.	Realizovano 2020.	Napomena
1.	Kamate i servisni troškovi za program „Modernizacija cesta u FBiH“	1.073.000	1.073.000	948.482	Vlastita sredstva
UKUPNO		1.073.000	1.073.000	948.482	

JP CESTE FEDERACIJE BIH

U skladu sa Ugovorom o zajmu između Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i BiH zajam je podložen promjenljivoj kamatnoj stopi EURIBOR + 1% marže. Datumi plaćanja kamate 15. mart i 15. septembar svake godine.

U skladu sa kreditnim sporazumom između Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) i BiH kredit podliježe promjenljivoj kamatnoj stopi plus varijabilni raspon. Datumi plaćanja kamate 15. februar i 15. august svake godine.

Za povlačenje tranši kredita EIB-a, u skladu sa kreditnim sporazumom moguće je odabrati fiksnu ili promjenljivu kamatnu stopu, dok EIB utvrđuje varijabilni raspon u momentu povlačenja tranše. Prilikom povlačenja dosadašnjih tranši, u koordinaciji sa Federalnim ministarstvom finansija, odabrana je fiksna kamatna stopa, jer u momentu zahtjeva za povlačenja bila je povoljnija od varijabilne kamatne stope.

Revolving sredstva za PDV

U skladu sa odredbama člana 29. Zakona o porezu na dodanu vrijednost i instrukcijom Uprave za indirektno oporezivanje o uslovima i načinu povrata PDV-a po osnovu uvoza i isporuke dobara, nabavke radova i usluga za međunarodne projekte, može se ostvariti povrat PDV-a uz podnošenje propisane dokumentacije i dokaza o uplati PDV-a. Obzirom da se radi o povratnim sredstvima, plaćanje istih će se vršiti iz tekućeg priliva sredstava, a nadopunjavati povratom sredstava od Uprave za indirektno oporezivanje.

**REKAPITULACIJA PLANIRANIH I REALIZOVANIH ULAGANJA ZA
PROGRAM „MODERNIZACIJA CESTA U FBIH“**

Red. Br.	OPIS	Plan 2020.					Rebalans plana 2020.					Realizovano 2020.						
		EIB	EIB + WB	EBRD	WB	EIB+WB+EBRD	UKUPNO	EIB	EIB + WB	EBRD	WB	UKUPNO	EIB	EIB + WB	EBRD	WB	UKUPNO	
I	Radovi		97.071.200	65.125.000	6.154.300		168.350.500		58.849.100	31.434.000	4.455.000		94.738.100	422.912	39.876.769	24.734.480	5.169.036	70.203.197
1.	Troškovi nadzora		4.559.700	1.375.600	296.400		6.231.700		4.011.900	1.139.400			5.151.300		2.903.081	1.204.223		4.107.304
2.	Vanjska kontrola		300.000			300.000	600.000		90.000				90.000		125.490			125.490
3.	Monitoring tunela Cmajaja				14.900		14.900				15.200		15.200				15.246	15.246
4.	Tehnička pomoć pri implementaciji projekta	100.000					100.000	117.000					117.000	59.431				59.431
5.	Tehnička pomoć za procjenu osjetljivosti cestovne mreže na klimatske promjene				774.500		774.500				50.000		50.000					
II	Konsultantske usluge – ukupno	100.000	4.859.700	1.375.600	1.085.800	300.000	7.721.100	117.000	4.101.900	1.139.400	65.200		5.423.500	59.431	3.028.571	1.204.223	15.246	4.307.471
III	Robe				2.407.500		2.407.500				2.377.500		2.377.500				2.308.310	2.308.310
IV	SVEUKUPNO (I+II+III)	100.000	101.930.900	66.500.600	9.647.600	300.000	178.479.100	117.000	62.951.000	32.573.400	6.897.700		102.539.100	482.343	42.905.340	25.938.703	7.492.592	76.818.978

3. Projekti JP Ceste F BiH

3.1. Projekti iz prethodnog perioda

3.1.1. Projekti rekonstrukcije i izgradnje

Red Br.	Mag. Cesta	Naziv i opis projekta	Aktivnosti na projektu	Plan 2020.	Rebalans Plana 2020.	Izvođač/ Konsultant - ugovor	Ugovoreno	Realizovano 2020.	Napomena			
1.	M17.3	Izgradnja obilaznice Stoca - Izrada idejnog projekta, dionica Poplat-Stolac, L=cca 4km.	Konsultantske usluge	6.500	6.900	Integra d.o.o.Mostar, 01-02.1-2124/19. 19.02.2019.	6.904.	6.904	Okončano			
2.	M4.2	Izrada idejnog projekta izgradnje veze obilaznica Cazina(Mihaljevac) i Bihaća (Kamenica) L=cca14km	Projektovanje	215.000	92.000	GP:Euroing d.o.o Bihać,TZI Inženjering d.o.o.i Winer Project d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-7663/20. 22.07.2020.	91.646	78.065	U toku			
			Revizija	15.000	-			-				
			Ukupno					78.065				
3.	M15	Idejni -projekat izgradnje ceste M-15, dionica Vrhpolje – Donje Sokolovo – Crljeni,	Projektovanje	34.000	34.000	Sarajinženjering d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-11583/19. 02.10.2019.	33.895	-	U toku			
			Konsultantske usluge	-	7.000	Zedis d.o.o. Zenica 01-02.1-8441/20. 25.08.2020.	6.903	6.903				
			Ukupno					6.903				
4.	M6.1	Obilaznica Mostara, - Glavni projekti objekata-mostova na dionici Miljkovići-Rodoč-veza na M-17 (vijadukt Rodoč L=2x168m, podvožnjak Bulevar L=107m, podvožnjak Aluminij L=2x16,2m, Avijatičarski 2-novi L=133m, Avijatičarski – rekonstrukcija L=133m, nadvožnjak M17 L=122m, nadvožnjak iznad željezničke pruge L=2x30,32m)	Projektiranje	300.000	284.000					Revizija u toku		
			- vijadukt Rodoč								99.719 (preneseno 23.523)	21.188
			avijatičarski most								95.735 (preneseno 73.618)	57.580
			podvožnjak Bulevar								73.958 (preneseno 41.563)	39.228
			podvožnjak Aluminij								46.017 (preneseno 27.484)	25.149
			nadvožnjak M-17								75.564(preneseno 49.839)	31.039
			nadvožnjak iznad želj.pruge								55.421 (preneseno 39.463)	24.357
			avijačarski 1								41.029 (preneseno 26.025)	6.873
			Revizija								15.000	17.000
Ukupno					205.414							
5.	M5	Rekonstrukcija ceste Jajce-Donji Vakuf - Glavni projekat tunela („Cvitkovac“- L=cca 300m, „Vrbas“ – L=cca 212m i „Torlakovac“- L=cca 163m)	Projektiranje	100.000	-			-	Rebalansom nije planirano			
			Revizija	7.000	-			-				
6.	M5	Obilaznica Kiseljaka - Glavni projekat trase (II faza) , tunela (L=cca 600m) , ukupna dužina dionice L=cca 1.000m	Projektiranje	150.000	150.000	Ipsa Institut d.o.o.Sarajevo,01-02.1-8987/20. 14.09.2020.	149.200	-	Izrada u toku (predato na reviziju)			
			Revizija	15.000	15.000			-				
			Ukupno					-				
7.	M14.1	Glavni projekat izgradnje dionice ceste Grmuša – Mali Radič, L=8km, uključujući Misiju G21	Projektovanje	57.000	57.000	Institut za građevinarstvo IG d.o.o. Banja luka, 01-02.1-5678/18, 17.07.2018.	56.833	-	Ugovor za projektovanje i raskinut zbog potrebe deminiranja područja			
			Revizija	3.000	3.000	Trasa d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-10254/18 20.11.2018.	2.925	-				
			Ukupno					-				

JP CESTE FEDERACIJE BIH

8.	M17.3	Rekonstrukcija ceste M17.3, dionica: Drenovac-Stolac, L=cca 8 km - Glavni projekat	Projektovanje	40.000	52.000	Integra d.o.o.Mostar, 01-02.1-12269/19 18.10.2019. Anex:01-02.1-10053/20.22.10.20 20.	39.817 11.944	17.241	U toku
			Revizija	5.000	5.000	Pronasa d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-3227/20. 12.03.2020.	4.998		
			Ukupno					17.241	
9.	M5	Izgradnja ceste (izmještanje) M5, dionica: Jezero-Jajce - Glavni projekat	Projektovanje	60.000	-			-	Rebalansom nije planirano
			Revizija	5.000	-			-	
10.	M14	Izgradnja obilaznice Bosanska Otoka (veza cesta M14 i R 401) - Glavni projekat trase i mosta preko rijeke Une	Projektovanje	230.000	130.000			-	Nabavka u toku
			Revizija	5.000	10.000			-	
11.	M4	Izgradnja ceste Tuzla (Drežnik) – Šićki Brod, dovršetak izgradnje kružne raskrsnice Lipnica	Izvođenje	500.000	-			-	Rebalansom nije planirano
			Nadzor	15.000	-			-	
12.	M4.3	Izgradnja obilaznice Bužim	Izvođenje	1.300.000	1.336.000	Kov-Grad d.o.o.Bužim, 01-02.2-2446/20. 19.02.2020.	1.335.658	1.287.663	Okončano
			Nadzor	35.000	23.200	Institut za građevinstvo IG d.o.o.Banja luka, 01-02.2-6566/20. 18.06.2020.	23.166	23.166	
			Ukupno					1.310.829	
13.	M6	Izgradnja kružnog toka u Ljubuškom, dionica: Vitina-Tasovčići, na spoju obilaznice Ljubuški sa cestom M6, sa izgradnjom nogostupa uz cestu M-6, L=cca 800m	Izvođenje	500.000	500.000	Putovi d.o.o.Grude, 01-02.1-13561/19 22.11.2019.	498.420	498.180	Okončano
			Nadzor	10.000	10.000	IGH d.o.o.Mostar, 01-02.1-13710/19 28.11.2019.	9.302	9.302	
			Ukupno					507.482	
14.	M4.2	Rekonstrukcija/izgradnja mosta preko potoka Buhača (M4.1-01-1) na graničnom prijelazu Maljevac, dionica:Granica BH/RH-Skokovi, sa rekonstrukcijom raskrsnice na obilaznici Velike Kladuše	Izvođenje	500.000	-			-	Rebalansom nije planirano
			Nadzor	15.000	-			-	
15.	M14	Izrada Glavnog projekta izgradnje mosta preko rijeke Une, rekonstrukcije raskrsnica ceste M14_001 i lokalne ceste za naselje Brekovića, km 7+830	Projektovanje	80.000	61.700	INK Constructor d.o.o. Banja luka, 01-02.1-5472/20. 12.05.2020.	61.700	-	U toku
			Revizija	7.000	6.200	Infra d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-6904/20. 01.07.2020.	6.201	-	
			Ukupno					-	
16.	M6	Izgradnja kružnog toka na izlazu Prispa, na dionici: Gorica-Vitina, općina Grude, I faza	Izvođenje	590.000	590.000	Putovi d.o.o.Grude, 01-02.29294/20. 24.09.2020	586.401	-	Ekspropr. nije okončana i nije pribavljena građevinska
			Nadzor	7.000	6.600	Integra d.o.o.Mostar, 01-02.1-13711/19 28.11.2019.	6.552	-	
			Ukupno					-	
17.	M5	Izrada trake za spora vozila na M5 dionica:Gromljak-Blažuj, potez Kobiljača (elaborat) -Izrada Studije za okoliš	Konsult.usluge	4.700	-			-	Rebalansom nije planirano
			Konsult.usluge	6.500	-			-	
18.	M5	Izrada projektnog rješenja novog priključka sa ceste M5 na obilaznici Donji Vakuf	Projektovanje	3.400	-			-	Rebalansom nije planirano
19.	M17	Rekonstrukcija tunela Vranduk II-odvijanje prometa u toku izvođenja radova: -Misija G41,-revizija Misije G31	Konsult.usluge	42.900	42.900	Divel d.o.o.Sarajevo, 01-02.3-14772/19 27.12.2019.	7.020 7.020 6.903		Realizacija tereti rashode perioda

JP CESTE FEDERACIJE BIH

		- Idejni projekat obilaznice M-17 u toku rekonstrukcije tunela Vranduk, prolaz kroz Nemilu, L = 2,3 km -Idejni projekat obilaznice M-17 u toku rekonstrukcije tunela Vranduk, dionica Banlozi – Tetovo, L = 3,4 km -Glavni projekat rješenja pješačkog saobraćaja obilaznice M17 u toku rekonst. Tunela Vranduk, dionica Banlozi – Tetovo, L = 3,4 km -Glavni projekat rekonstrukcije obilaznice magistralne ceste M-17 u toku rekonstrukcije tunela Vranduk, L = 2,3 km - Glavni projekat rekonstrukcije obilaznice magistralne ceste M-17 u toku rekonstrukcije tunela Vranduk, L = 3,4 km				Nemila) Trasa d.o.o.Sarajevo, 01-02.3-14791/19 27.12.2019. (Banlozi-Tetovo) Divel d.o.o.Sarajevo 01- 02.3- 9111/20.17.09.202 0. Trasa d.o.o. Sarajevo 01-02.3- 9862/20. 19.10.2020.			
20.	M5	Rekonstrukcija ceste M5 dionica Gromljak-Blažuj, podionica: Kiseljak –Han ploča, L=cca 8 km	Projektovanje	60.000	55.000	Design&QC d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-10968/20. 24.11.2020.	56.628	-	U toku
			Revizija	5.000	5.000	Arting d.o.o Sarajevo, 01-02.1-11547/20. 14.12.2020.	2.223	-	
			Ukupno					-	
21.	M17.5	Sanacija magistralnog puta M17.5, dionica:Sovička Vrata –Potok Zec	Izvođenje	766.000	766.000		-	904.233	***
22.		Izgradnja Obilaznice Ljubuški –zapadna	Konsult.usluge	-	3.500	Integra d.o.o.Mostar 01-02.1-12689/19 30.10.2019.	3.487	3.487	Okončano
23.	M14	Obilaznica Bihaća: - Glavni projekat za dionicu: Jablanska ulica – čvor Mali Lug – veza na M14	Projektovanje	-	18.500	IG Banja luka, 01-02.1-876/18. 02.02.2018.	18.498	18.498	Okončano
24.		Izgradnja Sjeverne Obilaznice Gruda - Elaborat za vodne akte - Elaborat procjene utjecaja na Grudsko vrilo	Konsult.usluge		10.400	Integra d.o.o.Mostar, 01-02.1-8362/18. 01.10.2018.	6.201	6.201	Okončano
				5.710.000	4.297.900			3.065.257	

- R. broj. 3 – S obzirom da se nisu mogle pribaviti podloge od općine Sanski Most za izradu Idejnog projekta, naknadno je angažiran Zedis koji je snimio teren, te je projektant tek nakon toga pristupio projektiranju. Dostavljane radne verzije projekta;
- R. broj. 6 – Uložena žalba na tedersku dokumentaciju za Reviziju, tako da su ponude za reviziju tek otvorene u sječnju/januaru 2021 godine;
- R. broj. 8 – Projektnim zadatkom predviđeno da se Glavni projekat se može okončati tek nakon pribavljanja urbanističke. S obzirom da nije dostavljena urbanistička od strane općine Stolac projekat nije okončan.
- R. broj. 15 – Istražni radovi kao i prijedlog rješenja nisu prihvaćeni pa je u toku izvođenje dodatnih bušotina (u Misiji G21
- R. broj. 21- Odlukom Vlade F BiH V broj:232/19. Od 13.03.2019. godine regionalna cesta R 419 Jablanica –Posušje i R420 Posušje-Grude –Privalj prekategirirana je u magistralnu cestu M17.5.Takodjer, Odlukama Vlade F BiH V broj:910/2019. i 1040/19 odobrava se realizacija projekta sanacije magistralnog puta M17.5 Sovićka vrata-Potok Zec, gdje se JP Ceste F BiH zadužuju za osiguranjem 765. 572 KM iz vlastitih sredstava. Na osnovu navedenog, potpisan je Sporazum o sufinansiranju projekta između Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, Ministarstva prometa i komunikacija HNK/HNŽ i JP Ceste F BIH broj: 01-03.1-10974/20 od 24.11.2020.godine.HNK/HNŽ za radove i nadzor na navedenom projektu je uložio 138.661KM.

3.1.2. Rasvjeta i semaforizacija raskrsnica

Red br.	Mag. Cesta	Naziv i opis projekta	Aktivnosti na projektu	Plan 2020.	Rebalans Plana 2020.	Izvođač/ Konsultant - ugovor	Ugovoreno	Realizovano 2020.	Napomena
1.	M17	Rasvjeta mosta Begića i Begovićna na M17	Izvođenje	80.000	58.500	Elko-Marić d.o.o.Mostar, 01-02.2-6382/20. 12.06.2020.	58.393	56.762	Preneseno u 2021. Čeka se izrada trafoa za priključak, od strane EP
			Nadzor	2.000	2.000	Habitat d.o.o. Mostar, 01-02.2-3104/20. 10.03.2020.	1.989	-	
			Ukupno					56.762	
2.	M17	Rasvjeta raskrsnice u Žitomislčićima na M17	Izvođenje	80.000	52.500	Promark d.o.o.Mostar, 01-02.2-2122/20. 12.02.2020.	52.311	52.205	Okončano
			Nadzor	2.000	2.000	Habitat d.o.o. Mostar, 01-02.2-1092/20. 22.01.2020.	1.989	1.989	
			Ukupno					54.194	
3.	M14.2	Semaforizacija magistralne ceste M14.2 i lokalne ceste (8 Ulica), općina Orašje	Projektovanje	7.000	7.000	TZI Inženjering d.o.o.Sarajevo, 01-02.3-6920/20 02.07.2020.	5.967	5.967	Aktivnost planirana u 2021.
			Izvođenje	60.000	60.000	Telefonija Vidaković, d.o.o.Doboj, 01-02.3-10906/20. 23.11.2020.	45.836	-	
			Nadzor	7.000	7.000	Institut za saobraćaj i komunikacije, Sarajevo, 01-02.3-10946/20. 24.11.2020.	6.903	-	
			Ukupno					5.967	
4.	M14.2	Semaforizacija mosta na M14.2/006 Odžak – Bosanski Šamac, km 14+800 (naizmjenično propuštanje vozila)	Projektovanje	7.000	6.000	TZI Inženjering d.o.o.Sarajevo, 01-02.3-6168/20. 08.06.2020.	5.967	5.967	Okončano
5.	M5	Glavni projekat rasvjete raskrsnice na magistralnoj cesti M5 u naselju Pudin Han	Projektovanje	6.000	1.600	Manedra Company d.o.o.Mostar, 01-02.2-8488/20. 26.08.2020.	1.638	1.638	Okončano
6.	M5	Glavni projekat rasvjete raskrsnice na magistralnoj cesti M5 i M-11 u naselju Ripač	Projektovanje	6.000	3.000	Manedra Company d.o.o.Mostar, 01-02.2-8488/20. 26.08.2020.	2.925	2.925	Okončano
UKUPNO				257.000	199.600			127.453	

3.1.3. Poboljšanje sigurnosti prometa na magistralnim cestama izgradnjom traka za lijeva skretanja, pješačkih staza sa odvodnjom kišne kanalizacije, odmorišta i sanacija crnih tačaka

Red Br.	Mag. Cesta	Naziv i opis projekta	Aktivnosti na projektu	Plan 2020.	Rebalans Plana 2020.	Izvođač/ Konsultant - ugovor	Ugovoreno	Realizovano 2020.	Napomena
1.	M15	Rekonstrukcija raskrsnice Gorica u Livnu u kružni tok	Izvođenje	409.000	409.000	Livnopotovi d.o.o.Livno, 01-02.2-2259/20. 13.02.2020.	408.963	408.031	Okončano
			Nadzor	7.000	7.000	Integra d.o.o.Mostar 01-02.1-11589/16. 30.12.2016.	6.903	6.903	

JP CESTE FEDERACIJE BIH

		Ukupno						414.934	
2.	M14	Rekonstrukcija raskrsnice na cesti M14 001, (dionica: Bihać – Srbljani) i lokalne ceste za naselje Brekovića sa izgradnjom-mosta preko rijeke Une, km7+830	Izvođenje	1.300.000	-			-	Rebalansom nije planirano
			Nadzor	31.000	-			-	
3.	M18	Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok na Šipu, sa izmještanjem dijela Ulice Alipašina, općina Centar, Sarajevo	Izvođenje	900.000	669.000	Konzorcij: PBP d.o.o. Konjici Demus d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-9050/20. 15.09.2020.	668.783	488.741	Okončano
			Nadzor	30.000	15.000	Artimg BHD.o.o.Sarajevo, 01-02.2-9414/20. 29.09.2020.	14.859	14.859	
			Ukupno					503.600	
4.	M6.1	Rekonstrukcija raskrsnice na M6.1 sa lokalnom cestom za Blagaj, km 2+000	Izvođenje	350.000	-			-	U toku eksprop.
			Nadzor	7.000	-			-	
			Revizija	-	1.800	IG d.o.o. Banja luka, 01-02.2-7945/18, 14.09.2018	1.778	1.778	
			Ukupno					1.778	
5.	M5 M15	Rekonstrukcija raskrsnica cesta M5 i M15 izlaz iz Ključa	Projektovanje	7.400	7.400	GP:IPSA Institut d.o.o.Sarajevo, Divel d.o.o.Sarajevo, INK Constructor d.o.o. Banja luka, Geoput d.o.o. Banja luka, 01-02.2-6795/17, 26.07.2017.	14.683 (preneseno 7.342)	7.342	Okončano
			Revizija	1.800	1.800	IG d.o.o. Banja luka, 01-02.2-7945/18, 14.09.2018	1.779	1.778	
			Ukupno					9.120	
6.	M5	Rekonstrukcija raskrsnice cesta M14.2 i M5 u Bosanskom Petrovcu	Izvođenje	420.000	520.000	Divel d.o.o. Sanski most, 01-02.2-9453/20. 30.09.2020.	418.823	-	Aktivnost planirana u 2021
			Nadzor	10.000	10.000	IG d.o.o.Banja luka, 01-02.2-9449/20.30.09.2020.	9.945	-	
			Revizija	-	1.800	IG d.o.o. Banja luka, 01-02.2-7945/18, 14.09.2018	1.779	1.779	
			Ukupno					1.779	
7.	M18	Rekonstrukcija raskrsnice na M18 010 Kobilja Glava-Sarajevo – Malta km 8+340	Izvođenje	550.000	550.000			-	Aktivnost planirana u 2021.
			Nadzor	10.000	10.000			-	
8.	M17	Izgradnja pješačke staze Karuše – Mravići	Projektovanje	15.000	15.000			-	Aktivnost planirana u 2021.
			Izvođenje	250.000	-			-	
			Nadzor	7.000	-			-	
9.	M6.1	Rekonstrukcija raskrsnice M6.1 i R420 u naseljenom mjestu -Čitluk, općina Posušje	Izvođenje	400.000	401.000	KTM-Brina d.o.o. Posušje, 01-02.2-9504/20. 02.10.2020.	400.663	-	Aktivnost planirana u 2021.
			Nadzor	7.000	7.000	Integra d.o.o.Mostar, 01-02.4-1500/20. 31.01.2020.	6.961	-	
			Ukupno					-	
10.	M14	Rekonstrukcija raskrsnice magistralnih cesta M14 i M14.2 u Bosanskoj Krupi	Projektovanje	7.000	7.000	Geofeld d.o.o.Bihać, 01-02.2-10449/20. 05.11.2020.	6.903	6.903	Okončano

JP CESTE FEDERACIJE BIH

11.	M16.2	Izgradnja pothodnika na M16.2 (skretanje za naselje Podgrađe), dionica: Prozor/Rama-G. Vakuf/Uskoplje	Izvođenje	280.000	320.000	Hering d.d. Široki Brijeg 01-02.2-11493/18. 20.12.2018.	279.089	319.585	Okončano
						Anex: 01-02.2-11982/20. 30.12.2020.	40.559		
			Nadzor	5.600	5.600	Arting BH d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-1930/19. 13.02.2019.	5.522	5.522	
Ukupno								325.107	
12.	M4.2	Rekonstrukcija raskrsnice Todorovo, općina Cazin	Izvođenje	860.000	696.200	BC-Gradnja d.o.o. Bosanska Krupa, 01-02.4-12641/19. 29.10.2019.	999.765 (preneseno 696.177)	696.117	Okončano
			Nadzor	15.000	10.100	DTQ d.o.o.Sarajevo, 01-02.4-12640/19. 29.10.2019.	14.567	7.225	
			Revizija	-	2.000	Aber Design d.o.o.Sarajevo, 01-02.4-10936/19. 13.09.2019.	1.989	-	
			Ukupno					703.342	
13.	M14.1	Rekonstrukcija raskrsnica na M14.1 i M1.9 na ulazu u Gradačac	Revizija	3.000	-			-	Početak radova planiran za 2021
			Izvođenje	560.000	641.000	Balegem d.o.o.Gradačac, 01-02.2-6004/20. 02.06.2020.	640.557	-	
			Nadzor	7.000	7.000	Arting BH d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-10010/20. 20.10.2020.	5.750	-	
			Ukupno					-	
14.	M15	Rekonstrukcija raskrsnice u Sanskom mostu na M15	Izvođenje	350.000	-			-	Rebalansom nije planirano
			Nadzor	7.000	-			-	
15.	M17	Rekonstrukcija raskrsnice ceste M17 i R435a u naseljenom mjestu Potoci, dionica Potoci – Mostar	Izvođenje	250.000	-			-	Rebalansom nije planirano
			Nadzor	7.000	-			-	
16.	M14	Izgradnja pješačke komunikacije preko magistralne ceste M17 u općini Jablanica	Projektovanje	14.000	14.000	Design & QC d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-1434/19. 31.01.2019.	6.844	6.844	U toku
						Design & QC d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-7669/19. 25.06.2019.	6.727	-	
			Revizija	-	3.000	Arting d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-6679/20. 22.06.2020.	2.925	2.925	
			Izvođenje	350.000	-			-	Rebalansom nije planirano
			Nadzor	7.000	-			-	
Ukupno					9.769				
17.	M4	Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok, Tešanjka, općina Tešanj	Projektovanje	9.000	6.600	IG d.o.o. Banja luka, 01-02.2-3474/19. 25.03.2019.	9.009	-	Okončano Projektovanje nije situirano
			Revizija	3.000	3.000	Design & QC d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-9723/19. 14.08.2019.	2.925	2.925	
			Ukupno					2.925	
18.	M17	Izgradnja pješačke staze u naselju Šije, općina Doboj – Jug	Projektovanje	7.000	7.000			-	Aktivnost planirana u 2021.
19.	M4	Rekonstrukcija raskrsnice na ulazu u Jelah, općina Tešanj (Sufinansiranje sa Općinom Tešanj)	Projektovanje	7.000	6.600	Ipsa Institut d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-7926/20. 05.08.2020.	6.584	-	Rebalansom nije planirano
			Izvođenje	550.000	-			-	

JP CESTE FEDERACIJE BIH

			Nadzor	7.000	-			-	
			Ukupno					-	
20.	M18	Rekonstrukcija raskrsnice "Hotel Sunce", općina Vogošća	Izvođenje	500.000	555.000	Bosman d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-7486/20. 17.07.2020.	554.235	553.614	Okončano
			Nadzor	15.000	12.400	Trasa d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-9212/20. 22.09.2020.	14.508	14.508	
			Ukupno					568.122	
21.	M16.2	Gornji Vakuf-Bugojno, izgradnja pješačke staze	Izvođenje	200.000	213.000	Ceste-Company d.o.o.Kiseljak, 01-02.4-2715/20. 26.02.2020.	213.055	212.900	Okončano
			Nadzor	7.000	4.000	Arting BH d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-2262/20. 13.02.2020.	3.861	3.861	
			Ukupno					216.761	
22.	M17	Glavni projekat rekonstrukcije raskrsnice sa M17 i lokalne ceste za naselje Papratnica dionica M17_006: Ozimica-Topčić Polje, km 9+180, općina Žepče	Projektovanje	20.000	20.000	GP Trafficom d.o.o.Odžak i Trafficom d.o.o.Zagreb, 01-02.1-13615/19. 26.11.2019.	19.943	-	U toku
			Revizija	2.000	2.000	Design&QC d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-9854/20. 14.10.2020.	2.340	-	
			Ukupno					-	
23.	M17	Izgradnja odmorišta na dionici: Jablanica-Mostar,	Izvođenje	85.000	156.000	HP Investing d.o.o.Mostar, 01-02.4-5588/20. 15.05.2020.	156.000	152.584	Okončano
			Nadzor	2.000	2.000	Interprojekt d.o.o.Mostar, 01-02.4-10940/19. 13.09.2019.	1.948	1.948	
			Ukupno					154.532	
24.	M16	Izgradnja pješačke staze (Podgaj-Lug), općina Bugojno	Projektovanje	7.000	7.000	Arting BH d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-1501/20. 31.01.2020.	6.961	6.961	Aktivnost planirana u 2021.
			Izvođenje	290.000	290.000	Dobojputevi d.d. Doboj, 01-02.2-11192/20. 02.12.2020.	285.096	-	
			Nadzor	7.000	7.000			-	
			Ukupno					6.961	
25.	M17	Izgradnja pješačke staze i rasvjete u Kosovi, općina Maglaj	Izvođenje	242.000	162.000	Dobojputevi d.d. Doboj, 01-02.2-12655/19. 29.10.2019.	341.981 (preneseno 161.122)	161.122	Okončano
			Nadzor	4.000	3.500	Arting BH d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-12614/19. 27.10.2019.	6.845 (preneseno 3.423)	3.422	
			Ukupno					164.544	
26.	M18	Izgradnja privremenog kružnog toka, skretanje Energopetrol-industrijska zona, km 4+600, općina Vogošća	Izvođenje	334.000	368.500	MGBH d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-12276/19. 18.10.2019. Anex 01-02.28796/20. 08.09.2020.	333.797 34.466	368.264	Okončano
			Nadzor	7.000	7.000	AB Plan d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-12278/19. 18.10.2019.	6.999	6.999	
			Ukupno					375.263	
27.	M1.8	Rekonstrukcija raskrsnice M1.8 i lokalne ceste u naselju Bjelave, općina Srebrenik	Izvođenje	420.000	413.000	Jata-Group d.o.o.Srebrenik, 01-02.2-2062/20. 10.02.2020.	412.596	412.594	Okončano

JP CESTE FEDERACIJE BIH

			Nadzor	7.000	6.800	AIK-Inžinjer d.o.o.Banovići 01-02.2-3852/20. 30.03.2020.	6.786	6.786	
			Ukupno					419.380	
28.	M17	Rekonstrukcija raskrsnice magistralne ceste i lokalne ceste za Orahovicu, općina Konjic	Projektovanje	6.000	6.000	Integra d.o.o.Mostar, 01-02.4-1093/20. 22.01.2020.	5.967	5.967	Aktivnost planirana u 2021.
			Revizija	2.000	2.000	Interprojekt d.o.o.Mostar, 01-02.4-4878/20. 24.04.2020.	1.989	1.989	
			Konsult.usl.		1.200	Projecta d.o.o.Mostar 01-02.4- 3645/20.SĆ	1.117	1.117	
			Izvođenje	300.000	252.000	HP Investing d.o.o. Mostar, 01-02.4-9267/20. 23.09.2020.	251.550	-	
			Nadzor	6.000	6.000	Interprojekt d.o.o.Mostar, 01-02.4-6966/20. 03.07.2020.	5.850	-	
			Ukupno					9.073	
29.	M16.2	Izgradnja pješačke staze Bugojno – Gornji Vakuf	Izvođenje	200.000	164.000	HP Investing d.o.o. Mostar, 01-02.4-2685/20. 25.02.2020.	163.800	146.772	Okončano
			Nadzor	7.000	4.000	Arting BH d.o.o. Sarajevo, 01-02.4-2714/20. 26.02.2020.	3.861	3.861	
			Ukupno					150.633	
30.	M14.1	Izgradnja pješačke staze u naselju Posavska Mahala, općina Odžak	Projektovanje	4.700	4.700	Trafficon d.o.o. Odžak, 01-02.2-14576/19. 20.12.2019.	4.622	4.622	Okončano
			Izvođenje	250.000	256.500	Dobojputevi d.d. Doboj jug, 01-02.2-8460/20. 26.08.2020.	256.297	256.297	
			Nadzor	7.000	7.000	Geomatik d.o.o.Gornji Svilaj, 01-02.2-9264/20. 23.09.2020.	6.845	6.844	
			Ukupno					267.763	
31.	M17	Sanacija crne tačke Misurići, dionica (005) općina Maglaj, km 19+000	Projektovanje	13.000	13.000			-	Aktivnost planirana u 2021.
			Revizija	2.000	2.000			-	
32.	M17	Sanacija crne tačke Tatarbudžak, dionica (006), općina Žepče km 3+500	Projektovanje	13.000	13.000			-	Aktivnost planirana u 2021.
			Revizija	2.000	2.000			-	
33.	M15	Sanacija crne tačke Milin Birt, dionica (002),Sanski most km 25+750	Projektovanje	13.000	8.600	Routing d.o.o. Banja luka, 01-02.2-7784/20. 28.07.2020.	8.588	-	U toku projektovanje
			Revizija	2.000	2.000			-	
			Ukupno					-	
34.	M18	Izgradnja pješačke staze u naselju Olovske Luke, općina Olovo	Projektovanje	7.000	10.000	Arting BH d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-4331/20. 09.04.2020.	9.755	9.755	Aktivnost planirana u 2021.
			Izvođenje	200.000	200.000			-	
			Nadzor	7.000	7.000			-	
			Ukupno					9.755	
35.	M1.8	Izgradnja pješačke staze na dionici Ježinac-Čehaje-Srebrenik-skretanje za Ljenobud, L=3179 m(Ifaza)	Projektovanje	7.000	7.000			-	Aktivnost planirana u 2021
			Izvođenje	200.000	200.000			-	
			Nadzor	7.000	7.000			-	

JP CESTE FEDERACIJE BIH

36.	M4	Rekonstrukcija raskrsnice cesta M4 i R469, općina Kalesija, km 8+860	Izvođenje	260.000	350.000			-	Potrebno riješiti imovinske odnose Aktivnost planirana u 2021
			Nadzor	7.000	7.000			-	
37.	M6.1	Izgradnja pješačke staze u naseljenom mjestu Vranić, općina Posušje	Izvođenje	100.000	98.000	Graditelj Svrtišta d.o.o. Prozor-Rama i I-Selimović d.o.o.Cazin 01-02.2-6783/20. 26.06.2020.	97.128	97.091	Okončano
			Nadzor	2.000	2.000	Integra d.o.o. Mostar 01-02.4-5586/2020. 15.05.2020.	2.000	1.977	
			Ukupno					99.068	
38.	M17	Rekonstrukcija raskrsnice na M17 u naselju Janjići (veza za naselja Drivuša i Dolača), općina Zenica	Izvođenje	450.000	650.000			-	2 x tenderisano – prekoračenje budžeta
			Nadzor	7.000	7.000			-	
39.	M4	Rekonstrukcija raskrsnice za poslovnu zonu Glinište na M4	Projektovanje	11.000	11.000			-	Aktivnost planirana u 2021
			Revizija	2.000	2.000			-	
40.	M4	Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok na M4 – ulaz u Lukavac	Izvođenje	600.000	-			-	Rebalansom nije planirano
			Nadzor	7.000	-			-	
41.	M5	Izgradnja pješačke staze kroz MZ Pritoka (Put Armije BiH)	Izvođenje	245.000	287.700	Konzorcij: Behić Sanny Boy d.o.o. I-Selimović d.o.o.Cazin 01-02.2-7088/20. 08.07.2020.	286.680	20.970	U toku
			Nadzor	6.000	6.000	Industroprojekt a.d. 01-02.2-9701/20. 09.10.2020.	2.574	-	
			Ukupno					20.970	
42.	M5	Raskrsnica sa R441 (Vjetrenica), rekonstrukcija postojeće (postoji projekat) sa djelimičnom sanacijom kolovoza ispred i iza raskrsnice	Izvođenje	500.000	-			-	Rebalansom nije planirano
			Nadzor	7.000	-			-	
43.	M5	Izgradnja pješačke staze u naseljenom mjestu Polje, općina Busovača II faza	Izvođenje	165.000	165.000	Ceste-Company d.o.o. Kiseljak, 01-02.2-13251/19. 14.11.2019.	164.854	152.347	Okončano
			Nadzor	5.000	5.000	AB Plan d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-11933/19. 10.10.2019.	4.996	4.996	
			Ukupno					157.343	
44.	M5	Izgradnja pješačke staze u naseljenom mjestu Han Ploča, općina Kiseljak II faza	Izvođenje	100.000	100.000			-	Poništen jednom tender, Nastavak aktivnost u 2021
			Nadzor	3.000	3.000			-	
45.	M14	Izgradnja pješačke staze na ulazu u Bosansku Krupu, I faza	Izvođenje	215.000	192.000	Kov-grad d.o.o Bužim, 01-02.2-14681/19. 24.12.2019.	191.513	169.303	Okončano
			Nadzor	6.000	6.900	Geo feld d.o.o. Bihać, 01-02.2-4322/20. 09.04.2020.	6.844	6.844	
			Ukupno					176.147	
46.	M18	Rekonstrukcija krivine kod autobusnog stajališta Crijevčići – prema Tuzli	Projektovanje	13.000	9.500	Design&QC d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-6995/20. 03.07.2020.	9.243	-	Aktivnost planirana u 2021.
			Revizija	2.000	2.000			-	
			Ukupno					-	

JP CESTE FEDERACIJE BIH

47.	M17	Postavljanje odbojnih ograda nivoa zaštite H1	Projektovanje	30.000	30.000			-	Poništen jednom tender, Nastavak aktivnosti u 2021
			Izvođenje	863.000	863.000			-	
			Nadzor	7.000	7.000			-	
48.	M17	Rekonstrukcija raskrsnice cesta M17 i M16.2 općina Jablanica	Izvođenje	300.000	224.000	HP Investing d.o.o. Mostar, 01-02.4-5588/20. 15.05.2020	223.591	209.404	Okončano
			Nadzor	7.000	7.000	Aber Design d.o.o.Sarajevo, 01-02.4-3832/20. 27.03.2020.	5.850	5.850	
			Ukupno					215.254	
49.	M6	Rekonstrukcija raskrsnice na M6 i R427, općina Stolac	Projektovanje	6.000	5.200	Trafficon d.o.o. Odžak, 01-02.2-12471/19. 23.10.2019.	5.148	5.148	Projektovanje i revizija okončano, u toku eksproprij.
			Revizija	2.000	2.000	Integra d.o.o. Mostar, 01-02.2-13750/19. 29.11.2019.	2.000	2.000	
			Izvođenje	450.000	520.000			-	
			Nadzor	7.000	7.000			-	
			Ukupno					7.148	
50.	M17	Izgradnja pješačkog prelaza izvan nivoa kolovoza za naselje Nemila, km 4+700	Izvođenje	400.000	-			-	Rebalansom nije planirano
			Nadzor	7.000	-			-	
51.	M15	Rekonstrukcija raskrsnice na obilaznici Livna u kružni tok – križanje M15 i ul. Blajburških žrtava,	Izvođenje	450.000	580.000	Livnoputovi d.o.o. Livno, 01-02.4-4850/20. 23.04.2020.	578.652	578.430	Okončano
			Nadzor	7.000	7.000	Integra d.o.o. Mostar, 01-02.2-14800/19. 30.12.2019.	6.962	6.962	
			Ukupno					585.392	
52.	M5	Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok na cesti M5 u naseljenom mjestu Kalibunar, općina Travnik	Projektovanje	8.200	8.200	Geoput d.o.o. Banja luka, 01-02.2-11054/19. 17.09.2019.	8.189	8.189	Projektovanje i revizija okončano
			Revizija	3.000	3.000	Pronasa d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-12824/19. 04.11.2019.	2.925	2.925	
			Izvođenje	400.000	510.000			-	
			Nadzor	7.000	7.000	Arting BH d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-9736/20. 12.10.2020.	6.929	-	
			Ukupno					11.114	
53.	M17	Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok na cesti M17, ulaz u industrijsku zonu Pečuj, grad Zenica	Projektovanje	14.000	14.000			-	Aktivnost planirana u 2021.
			Revizija	2.000	2.000			-	
54.	M18	Nastavak izgradnje servisne saobraćajnice u općini Živinice	Izvođenje	350.000	350.000			-	Aktivnost planirana u 2021
			Nadzor	7.000	7.000			-	
55.	M16.2	Izgradnja pješačke staze u naselju Gračac, općina Prozor	Projektovanje	7.000	6.000	Trafficon d.o.o.Odžak, 01-02.2-12470/19. 23.10.2019.	5.967	5.967	U toku
			Izvođenje	200.000	240.000	GP:Graditelj svratišta d.o.o. Prozor/Rama, I-Selimović d.o.o.Cazin, 01-02.2-10195/20. 27.10.2020.	199.997	80.309	
			Nadzor	7.000	5.300	Arting d.o.o.Sarajevo,	5.265	-	

JP CESTE FEDERACIJE BIH

						01-02.2-8760/20. 07.09.2020.			
			Ukupno						86.276
56.	M16. 2	Rekonstrukcija raskrsnice za naselje Duge, općina Prozor	Projektovanje	14.000	5.200	VP- CPK d.o.o. Banja luka i HKP Consulting d.o.o.Banja luka, 01-02.2-13751/19. 29.11.2019.	5.148		5.148
			Revizija	2.500	2.500	Interprojekt d.o.o.Mostar, 01-02.4-5825/20. 27.05.2020.	2.457		2.457
			Izvođenje	300.000	300.000				-
			Nadzor	7.000	7.000				-
			Ukupno						
57.	M15	Izgradnja pješačke staze Mesihovina-Bukovica-Mrkodol, općina Tomislavgrad	Izvođenje	200.000	235.000	KTM Brina, d.o.o.Posušje, 01-02.-2261/20. 13.02.2020.	234.444		234.391
			Nadzor	6.000	6.000	Geo Data d.o.o.Mostar, 01-02.4-10938/19. 13.09.2019.	5.909		5.909
			Ukupno						
58.	M17	Izgradnja pješačke staze Goliješnica-Brankovići, općina Žepče	Projektovanje	6.000	6.000				-
			Izvođenje	200.000	180.000	Dobojputevi d.d. Doboj jug, 01-02.2-2126/20. 12.02.2020.	180.064		180.064
			Nadzor	7.000	5.000	Arting BH d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-2779/20. 27.02.2020.	4.914		4.914
			Ukupno						
59.	M14	Izgradnja pješačke staze kroz naselje Srbljani, grad Bihać	Izvođenje	200.000	177.000	Konzorcij: Behić Sanny Boy d.o.o. I-Selimović d.o.o.Cazin 01-02.2-7088/20. 08.07.2020.	176.175		-
			Nadzor	6.000	6.000	Industroprojekt a.d. 01-02.2-9701/20. 09.10.2020.	1.582		-
			Ukupno						
60.	M5	Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok, cesta M5-obilaznica Bihaća i skretanje za poslovnu zonu	Izvođenje	400.000	383.000	Konzorcij: Behić Sanny Boy d.o.o. I-Selimović d.o.o.Cazin 01-02.2-7088/20. 08.07.2020.	382.131		-
			Nadzor	7.000	7.000	Industroprojekt a.d. 01-02.2-9701/20. 09.10.2020.	3.431		-
			Ukupno						
61.	M5	Izgradnja pješačke staze na cesti M5: Ključ – Rogolji (II faza)	Izvođenje	20.000	30.200	Divel d.o.o. Sanski most, 01-02.2-12578/19 .25.10.2019.	195.979 (preneseno 30.146)		29.689
			Nadzor	2.000	1.000	Trasa d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-12656/19. 29.10.2019.	6.786 (preneseno 1.044)		1.044
			Ukupno						
62.	M15	Izgradnja pješačke staze na cesti M15 ispred OŠ i SŠC, općina Glamoč	Projektovanje	7.000	7.000				-
			Izvođenje	250.000	300.000	Komotin d.o.o. Jajce, 01-02.2-10874/20. 20.11.2020.	264.009		-

JP CESTE FEDERACIJE BIH

			Nadzor	7.000	7.000	Integra d.o.o.Mostar, 01-02.2-10464/20. 05.11.2020.	6.903	-	
			Ukupno					-	
63.	M15	Izgradnja pješačke staze na cesti M15, prolaz kroz naselje Tomina, općina Sanski Most	Izvođenje	250.000	150.000	Divel d.o.o. Sanski most, 01-02.2-2787/20. 27.02.2020.	149.876	145.010	Okončano
			Nadzor	5.000	5.900	Design&QC d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-4340/20. 09.04.2020.	5.850	5.850	
			Ukupno					150.860	
64.	M17	Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok, cesta M17-skretanje Hadžići	Projektovanje	-	7.000	Divel, d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-200/20, 08.01.2020.	7.020	7.020	Aktivnost planirana u 2021.
			Izvođenje	650.000	645.000	Bosman d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-2933/20. 05.03.2020.	644.907	-	
			Nadzor	7.000	7.000			-	
			Ukupno					7.020	
65.	M1.9	Rekonstrukcija ceste M1.9. Slatina (gr.entiteta) – Gradačac – izgradnja kružnog toka na križanju za industrijsku zonu, općina Gradačac	Izvođenje	343.000	343.000			-	Aktivnost planirana u 2021.
			Nadzor	7.000	7.000			-	
66.	M4.2	Rekonstrukcija raskrsnice na M4.2, izlaz iz Velike Klauše, dionica_001 (spoj Obilaznice i magistralne ceste)	Projektovanje	14.000	14.000			-	Aktivnost planirana u 2021.
			Revizija	2.000	2.000			-	
67.	M16.4	Izgradnja pješačke staze u naseljenom mjestu Stojkovići, općina Novi Travnik	Projektovanje	7.000	7.000			-	Ugovoreno, početak radova u proljeće
			Izvođenje	150.000	150.000	Građevinar BiH d.o.o.Novi Travnik, 01-02.2-11699/20. 18.12.2020.	149.175	-	
			Nadzor	3.000	3.000	Ting d.o.o. Žepče, 01-02.2-11308/20. 07.12.2020.	3.000	-	
			Ukupno					-	
68.	M16.2	Izgradnja pješačke staze u naselju Gračanica, općina Prozor/Rama	Izvođenje	188.000	185.000	HP Investing d.o.o.Mostar, 01-02.2-13749/19. 29.11.2019.	184.761	179.828	Okončano
			Nadzor	6.000	6.000	Inteprojekt d.o.o. Mostar, 01-02.2-13094/19. 08.11.2019.	5.967	5.967	
			Ukupno					185.795	
69.	M-17 M-5	Uređenje slijedećih lokacija za vaganje: -„Tatarbudžak“ na M -17, 006, dionica Ozimice – Topčić Polje, km. 4 +680 L -„Rakovica“ na cesti M -5, 014, dionica Gromiljak – Blažuj, km.19 +660 D -„Puđin Han“ na rask. M- 5 i R410 A, 006, dionica Gornje Bravsko – Ključ, km 14+990 L	Projektovanje	12.000	12.000			-	Aktivnost planirana u 2021.
70.	M6	Rekonstrukcija raskrsnice cesta M6.1 i lokalne ceste za Industrijsku zonu – naselje Knežpolje, općina Široki Brijeg	Projektovanje	10.000	10.000			-	Aktivnost planirana u 2021.
			Revizija	2.000	2.000			-	
71.	M17	Rekonstrukcija raskrsnice magistralne ceste M17, dionica: 008 HW (Jošanica) 1 – Stup 1, km 3+500 sa ulicom Reljevska, općina Novi grad Sarajevo	Projektovanje	7.000	8.700	Design&QC d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-4909/20. 24.04.2020.	8.658	-	U toku
			Revizija	2.000	2.000			-	
			Ukupno					-	

JP CESTE FEDERACIJE BIH

72.	M17	Rekonstrukcija sa semaforizacijom raskrsnice magistralne ceste M17, dionica: 008 HW (Jošanica) 1 – Stup 1, km 5+000 sa ulicom Rajlovačka cesta, općina Novi grad Sarajevo	Projektovanje	12.000	8.700	Design&QC d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-4909/20. 24.04.2020.	8.658	-	U toku
			Revizija	4.000	4.000			-	
			Ukupno					-	
73.	M18	Rekonstrukcija pješačkih staza sa rješavanjem odvodnje, magistralna cesta M18, dionica 010 Semizovac – Sarajevo – Malta, km 8+400 km – km 10+400 (Kobilja glava – Šip)	Projektovanje	10.000	10.000			-	Nabavka u toku
			Revizija	4.000	4.000			-	
74.	M5	Idejni projekat rekonstrukcije raskrsnice na M-5 A. Šaćirbegović _Korija_Ljubogoša km1+350	Projektovanje	7.000	7.000			-	Aktivnost planirana u 2021.
75.	M4	Rekonstrukcija raskrsnice u Gornjoj Kalesiji, općina Kelesija	Projektovanje	7.000	7.000			-	Aktivnost planirana u 2021.
76.	M17	Rekonstrukcija raskrsnice na magistralnoj cesti M17, općina Ilidža	Projektovanje	14.000	14.000			-	Aktivnost planirana u 2021.
77.	M5	Izgradnja pješačke staze Gromljak-Blažuj (Rakovica) II faza	Izvođenje	350.000	350.000			-	Nabavka u toku
			Nadzor	7.000	7.000			-	
78.	M16	Rekonstrukcija raskrsnice na magistralnoj cesti M16, općina Karadže, općina Bugojno	Projektovanje	14.000	14.000			-	Aktivnost planirana u 2021.
79.	M18	Izgradnja pješačke staze dionica: Priboj 2-Simin Han 1	Projektovanje	7.000	4.700	Design&QC d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-6223/20. 09.06.2020.	4.680	-	U toku
80.	M5	Izgradnja pješačke staze na magistralnoj cesti M5 u naselju Izačić	Projektovanje	7.000	7.000			-	Aktivnost planirana u 2021.
81.	M1.8	Izgradnja servisne saobraćajnic uz magistralnu cestu , općina Srebrenik	Projektovanje	7.000	7.000			-	Aktivnost planirana u 2021.
82.	M5	Rekonstrukcija raskrsnice M5 i lokalne ceste u Travniku (Plava voda)	Revizija	-	1.800	IG d.o.o. Banja luka, 01-02.2-7945/18, 14.09.2018	1.778	1.778	Okončano
83.	M18.1	Rekonstrukcija magistralne ceste M18.1 Ustikolina – Trnovo,	Izvođenje	-	156.000	Goraždeputevi d.o.o. Goražde, 01-02.1-12593/19. 28.10.2019.	249.963 (preneseno 155.431)	155.308	Okončano
			Nadzor	-	1.600	Smajić-Inženjering d.o.o.Goražde, 01-02.1-13923/19. 04.12.2019.	2.589 (preneseno 1.612)	1.611	
			Ukupno					156.919	
84.	M16.2	Rekonstrukcija raskrsnice na M16.2 u Gornjem Vakufu/Uskoplje	Projektovanje	-	6.800	Design&QC d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-1484/20. 30.01.2020.	6.786	6.786	Okončano
85.	M4	Rekonstrukcija raskrsnice na cesti M4 sa lokalnom cestom za općinu Usora sa rekonstrukcijom mosta preko rijeke Usore u mjestu Tešanjka	Konsult.usl	-	7.000	Trasa d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-14591/19. 20.12.2019.	6.973	6.973	Okončano
86.	M4	Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok na M4, ulaz u Lukavac	Revizija		1.800	IG d.o.o. Banja luka, 01-02.2-7945/18, 14.09.2018	1.778	1.778	Okončano
87.	M5	Izmjena projektne dokumentacije-Idejni projekt rekonstrukcije raskrsnica na M-5 Bihać4-Ripač (put AVNOJ-a)	Projektovanje		7.000	DiveL.d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-2326/19. 26.02.2019.	7.020	7.020	Okončano
UKUPNO				21.433.200	16.929.300			6.669.301	

3.1.4. Vanredno održavanje

3.1.4.1. Sanacija cestovnih objekata

Red br.	Mag. Cesta	Naziv i opis projekta	Aktivnosti na projektu	Plan 2020.	Rebalans Plana 2020.	Izvođač/ Konsultant - ugovor	Ugovoreno	Realizovano 2020.	Napomena
1.	M18	Rekonstrukcija mosta preko rijeke Ljubine u Semizovcu (M18-010-398), dionica Semizovac-Sarajevo – Malta, km 0+048	Izvođenje	590.000	595.000	Struktura d.o.o.Jajce, 01-02.1-4062/20. 02.04.2020.	594.977	594.901	Okončano
			Nadzor	15.000	10.400	Trasa d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-5474/20. 12.05.2020.	10.390	10.389	
			Ukupno					605.290	
2.	M18	Sanacija mosta preko rijeka Bioštica u Olovu (M18-009-187), dionica Olovo – Semizovac, km 0+404	Projektovanje	-	4.700	IG d.o.o.Banja luka, 01-02.1-6979/18, 14.08.2018.	21.762 (preneseno 4.680)	4.680	Projektiranje okončano Revizija nije fakturisana Priprema tendera za radove i nadzor u toku
			Revizija	-	3.100	Trasa d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-8139/18, 24.09.2018.	3.100	-	
			Izvođenje	520.000	750.000			-	
			Nadzor	15.000	20.000			-	
			Ukupno					4.680	
3.	M1.8	Sanacija kolovozne ploče mosta preko rijeke Tinje, Orlova klisura (M1.8-004-113), dionica Srebrenik – Šićki Brod 3, km 9+279	Izvođenje	102.000	102.000	Jata group, d.o.o.Srebrenik, 01-02.1-10725/19 09.09.2019.	101.845	95.351	Okončano Nadzor nije fakturisan
			Nadzor	5.200	5.200	Design & QC d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-8799/18. 11.10.2018.	5.200	-	
			Ukupno					95.351	
4.	M5	Zamjena dilatacionih naprava na mostu Babin zub preko strme padine (M05.0-5-02), dionica Malta –Vijećnica – Korija	Izvođenje	110.000	160.000			-	Priprema tendera za radove - u toku
			Nadzor	4.000	5.000	Structura d.o.o.Sarajevo. 01-02.1-10144/18 15.11.2018.	3.920	-	
			Ukupno					-	
5.	M15	Rekonstrukcija mosta preko rijeke Sane, Krkojevačko polje, Čaplje (M15-003-42), dionica Sanski most 1-Kamičak, km 4+283	Projektovanje	-	7.700	IG d.o.o.Banja luka, 01-02.1-6979/18, 14.08.2018.	22.523 (preneseno 7.605)	9.945	Okončano Revizija nije fakturisana
			Revizija	-	3.100	Trasa d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-8139/18, 24.09.2018.	3.101	-	
			Izvođenje	1.150.000	-			-	
			Nadzor	11.400	-			-	
			Ukupno					9.945	
6.	M5	Zamjena dilatacionih naprava na mostu preko rijeke Vrbas u Jajcu (M5-008-268) dionica Rogolji-Jajce Jug, km 27+717	Izvođenje	117.500	117.500	Sikra d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-7663/19. 24.06.2019.	117.340	117.259	Okončano
			Nadzor	4.700	4.700	Trasa d.o.o.Sarajevo, 01-01-1-7222/19. 27.06.2019.	4.680	4.680	
			Ukupno					121.939	
7.	M17	Zamjena dilatacionih naprava na obalnom stubu broj 6 na mostu preko strme padine, klizište u Prapraskom (M17-012-306) dionica Konjic-Jablanica 1, km 17+674	Izvođenje	108.000	108.000	Sikra d.o.o.Sarajevo ,01-02.1-8794/20. 08.09.2020.	102.328	18.371	U toku
			Nadzor	4.000	4.000	Instrukta d.o.o.Sarajevo	2.340	-	

JP CESTE FEDERACIJE BIH

						.01-02.1-9853/20. 14.10.2020.					
			Ukupno						18.371		
8.	M16	Zamjena dilatacione naprave na obalnom stubu broj 5 na mostu preko jezera Bočac na ušću rijeke Ugar u rijeku Vrbas, Bregovi (M16-006-522) dionica Crna Rijeka – Jajce Jug, km 6+364	Izvođenje	67.000	67.000	Sikra d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-8794/20. 08.09.2020	71.925		70.696	Okončano	
			Nadzor	3.000	3.000	Instrukta d.o.o.Sarajevo ,01-02.1-9853/20. 14.10.2020.		2.340			2.340
			Ukupno								73.036
9.	M17	Zaštita temelja mosta preko duboke uvale, Gradište kod Crnaje (M17-012-303), dionica Konjic- Jablanica 1, km 14+661	Izvođenje	190.000	190.000				-	u pripremi ponovljeni tender (tenderisano više puta)	
			Nadzor	5.000	5.000						-
10.	M16	Rekonstrukcija tunela Barevo III (T16-006-29) L=38m, dionica Crna Rijeka – Jajce Jug, km16+077	Projektovanje	-	5.600	Divel d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-9454/19. 05.08.2019.	5.557		-	Okončano nije fakturisano	
			Izvođenje	1.560.000	-						-
			Nadzor	45.000	-						-
			Ukupno								-
11.	M5	Rušenje postojećeg I izgradnja novog mosta preko potoka Bravnice u Bravnicama (M5-009-508), dionica: Jajce Jug – Donji Vakuf 1, km 3+746	Projektiranje	7.000	7.000				-	Nemogućnost dobijanja urbanističke suglasnost	
			Izvođenje	330.000	-						-
			Nadzor	8.500	-						-
12.	M19.2	Rušenje postojećeg i izgradnja novog mosta preko potoka Jezernica u Turalićima (M19.2-001-101), dionica Kladanj – Vlasenica, km 9+809	Izvođenje	395.000	420.000	HP Investing d.o.o.Mostar, 01-02.1-6748/19. 05.06.2019.	394.608		380.309	U toku	
			Nadzor	7.100	7.100	IG d.o.o. Banja luka, 01-02.1-7427/19. 18.06.2019	7.101		5.478		
			Ukupno								385.787
13.	M16.2	Sanacija mosta preko rijeke Bunte u Gračanici (M16.2-001-280) dionica Bugojno 2 – Gornji Vakuf, km 8+152	Izvođenje	330.000	330.000	GP: Struktura d.o.o. Jajce i MG Mind d.o.o. Mrkonjić Grad, 01-02.1-14786/19 27.12.2019.	329.888		329.857	Okončano	
			Nadzor	8.500	8.500	IG d.o.o.Banja luka 01-02.1-7427/19. 18.06.2019.	8.521		8.520		
			Ukupno								338.377
14.	M18	Sanacije mosta preko nepoznatog potoka, Poturovići (M18-009-604) dionica Olovo – Semizovac, km 31+567	Projektiranje	11.700	5.900	Design & QC d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-4907/19. 24.04.2019.	11.700 (preneseno 5.850)		5.850	Okončano	
			Revizija	2.300	2.300	Infra d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-7451/19, 18.06.2019.	2.340		2.340		
			Ukupno								8.190
15.	M5	Rekonstrukcije mosta preko Koševskog potoka u Sarajevu, Skenderija (M 05.0-5-01-a) dionica Stup-Vijećnica-Gr Ent ... Gr Ent Prača-Renovica-Gr Ent Kaljani, km 7+310	Projektiranje	17.500	17.500	Design & QC d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-4907/19. 24.04.2019.	17.550		-	Čeka suglasnost Kantona za istražne radove	
			Revizija	2.300	2.300	Infra d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-7451/19, 18.06.2019.	2.340		-		
			Ukupno								-
16.	M14	Rekonstrukcija mosta preko željezničke pruge Bihać-Bosanski Novi, Kostela (M14-002-51) dionica Srbljani-Bos. Krupa 1, km 5+171	Projektiranje	17.000	16.500	GP Trasa d.o.o. Sarajevo i Divel d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-13063/19. 08.11.2019.	16.408		12.664	Revizija u toku	
			Revizija	2.000	2.000	Design&QC d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-7107/20. 08.07.2020.	1.989		-		
			Ukupno								12.664

JP CESTE FEDERACIJE BIH

17.	M18	Sanacije mosta preko rijeke Suha u Stuparima (M18-007-83) dionica Živinice 1 – Vitalj, km 16+426	Projektiranje	20.000	19.100	GP Trasa d.o.o. Sarajevo i Divel d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-13063/19 08.11.2019.	19.123	19.122	Okončano Revizija nije fakturisana
			Revizija	2.500	2.300	Infra d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-1087/20. 22.01.2020.	2.223	-	
			Ukupno					19.122	
18.	M18	Sanacija mosta preko Ujića rijeke u Kladnju (M18-008-71) dionica Vitalja-Olovo, km 2+405	Projektiranje	20.000	20.000	GP Trasa d.o.o. Sarajevo i Divel d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-13063/19 08.11.2019.	20.058	15.378	Revizija u toku
			Revizija	2.500	2.300	Infra d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-1087/20. 22.01.2020.	2.223	-	
			Ukupno					15.378	
19.	M5	Sanacija mosta preko suhe doline, Mjedenica, obilaznica Sarajevo (M5-016-426) dionica A.Šaćirbegović-Korija-Ljubogošta, km 3+511	Projektiranje	17.000	17.000	GP Trasa d.o.o. Sarajevo i Divel d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-13063/19 08.11.2019.	17.082	13.338	Revizija u toku
			Revizija	2.000	2.000	Design&QC d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-7107/20. 08.07.2020.	1.989	-	
			Ukupno					13.338	
20.	M1.8	Sanacija mosta preko rijeke Tinje u Donjoj Potpeći (M1.8-004-114) dionica Srebrenik – Šićki Brod 3, km 10+709	Projektiranje	15.000	15.000	GP Trasa d.o.o. Sarajevo i Divel d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-13063/19 08.11.2019.	15.032	11.288	Revizija u toku
			Revizija	2.000	2.000	Design&QC d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-7107/20. 08.07.2020.	1.989	-	
			Ukupno					11.288	
21.	M17	Rekonstrukcija/sanacija tunela „Ivan“ (T17-011-46) l=646m, Ivan sedlo, dionica Tarčin-Konjic, km 7+750	Projektiranje	100.000	170.000			-	Ponovljeni tender u pripremi
			Revizija	7.000	15.000			-	
			Ukupno					-	
22.	M5	Rekonstrukcija mosta preko rijeke Ivančice u Busovači M5-013-233), dionica Kaonik-Gromiljak, km 3+695	Projektiranje	13.000	12.800	Design & QC d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-11811/19 08.10.2019.	12.753	12.753	Projektiranje Okončano
			Revizija	2.000	1.800	Infra d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-14603/19 20.12.2019.	1.755	1.755	
			Izvođenje	250.000	300.000	Struktura d.o.o.Jajce, 01-02.1-10994/20. 26.11.2020.	303.596	100.896	Radovi u toku
			Nadzor	7.000	7.000	Trasa d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-10673/20. 13.11.2020.	6.903	2.684	
			Ukupno					118.088	
23.	M17	Sanacija mosta (M17-011-342), preko nepoznatog potoka, lokacija Zukića kosa, dionica Tarčin – Konjic, km 13+736	Izvođenje	500.000	537.000	HP Investing d.o.o.Mostar, 01-02.1-4061/20. 02.04.2020.	536.883	536.883	Okončano
			Nadzor	15.000	11.200	IGH d.o.o.Mostar, 01-02.1-5088/20. 04.05.2020.	11.197	11.197	
			Ukupno					548.080	
24.	M18	Sanacija mosta) preko rijeke Stupčanice u Olovskim Lukama (M18-008-165) dionica Vitalj – Olovo, km 20+400	Izvođenje	460.000	385.000	HP Investing d.o.o.Mostar, 01-02.1-1320/20. 28.01.2020.	384.850	163.662	Okončano nije fakturisano
			Nadzor	14.000	10.400	Trasa d.o.o.Sarajevo,	10.319	4.389	

JP CESTE FEDERACIJE BIH

						01-02.1-5473/20. 12.05.2020.			
			Ukupno						168.051
25.	M17	Sanacije mosta preko rijeke Željeznice na Ilidži (M17-009-405) dionica Stup 3-Blažuj, km 2+635	Projektiranje	30.000	21.000	Infra d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-7431/20. 16.07.2020.	20.814		10.284
			Revizija	3.000	3.000	Instrukta d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-9442/20. 30.09.2020.	2.250		-
			Ukupno						10.284
26.	M5	Rekonstrukcija mosta preko Babinog potoka u Babinom Potoku (M5-009-288) dionica Jajce Jug – Donji Vakuf 1, km 23+025	Projektiranje	12.000	14.000	Infra d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-7431/20. 16.07.2020.	13.677		8.412
			Revizija	1.500	1.500	Instrukta d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-9442/20. 30.09.2020.	2.250		-
			Ukupno						8.412
27.	M16	Rekonstrukcija mosta preko potoka Komotin u Podmilačju (M16-006-246) dionica Crna Rijeka – Jajce Jug , km 18+285	Projektiranje	12.000	12.000	IG d.o.o.Banja luka, 01-02.1-8060/20 10.08.2020.	9.957		5.511
			Revizija	1.500	1.500				-
			Ukupno						5.511
28.	M4	Rekonstrukcija mosta preko Lohinjske rijeke u Donjoj Lohinji (M4-009-504) dionica Doboj - Donja Orahovica, km 23+498	Projektiranje	12.000	12.000	IG d.o.o.Banja luka, 01-02.1-8060/20. 10.08.2020	11.326		6.646
			Revizija	1.500	1.500				-
			Ukupno						6.646
29.	M18.1	Rekonstrukcija mosta preko Crne rijeke, Garež (M18.1-001-448) dionica Ustikolina-Grebak-Delijaš-Trnovo, km 46+237	Projektiranje	15.000	15.000	IG d.o.o.Banja luka, 01-02.1-8060/20. 10.08.2020	9.957		5.511
			Revizija	1.500	1.500				-
			Ukupno						5.511
30.	M19	Sanacija mosta preko rijeke Drinjača, Gojsalići (M19.2-001-97) dionica Kladanj – Vlasenica, km 2+323	Projektiranje	15.000	25.000				-
			Revizija	1.500	2.500				-
31.	M5	Sanacija mosta preko Duboke doline na Komaru (M-5-3-15) dionica: Donji Vakuf- Turbe, km 17+093	Projektiranje	7.000	20.000				-
			Revizija	1.000	2.500				-
32.	M18	Rekonstrukcija/Sanacija mosta preko rijeke Suha u Stuparima (M18-007-83) dionica Živinice 1 – Vitalj, km 16+426	Izvođenje	400.000	1.060.000				-
			Nadzor	12.000	30.000				-
33.	M5	Rekonstrukcija mosta (M-5-012-227) preko r. Bile, na cesti M-5, dionica Nević Polje- Kaonik, km 4+988 - Izrada projekta privremene obilaznice	Izvođenje	650.000	650.000	Struktura d.o.o.Jajce, 01-02.1-8451/20. 25.08.2020.	650.404		329.346
			Nadzor	15.000	15.000	IG d.o.o. Banja luka 01-20.1-8630/20. 01.09.2020.	14.994		-
			Projektovanje	7.000	7.000	AIK-Inžinjeri d.o.o.Banovići, 01-02.1-3276/20. 13.03.2020.	6.903		6.903
			Revizija			Infra d.o.o.Sarajevo 01-02.1-10678/20 13.11.2020.	1.498		1.498
			Ukupno						337.747

JP CESTE FEDERACIJE BIH

34.	M16	Izrada idejnog i glavnog projekta rekonstrukcije priključka lokalne ceste za Zdaljevac na cestu M16, dionica 006 Crna rijeka –Jajce Jug u km 13+900 i izgradnje mosta preko rijeke Vrbas (akumulacija hidroelektrane Jajce II)	Projektiranje	35.000	23.500	Design&QC d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-6905/20. 01.07.2020.	23.330	-	U toku (Idejni projekat predat)
			Revizija	4.000	4.000	Trasa d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-8059/20. 10.08.2020.	3.978	-	
			Ukupno					-	
35.	M17	Zamjena dilatacionih naprava na natputnjaku Iliđa (M17-009-422) kod Energoinvesta, na cesti M17, dionica 009 Stup 3 – Blažuj, u km 0+321	Izvođenje	170.000	-			-	Rebalansom nije planirano
			Nadzor	5.000	-			-	
36.	M17	Glavni projekat rekonstrukcije tunela Karaula. G. Goliješnica, Tupanovac (T17-006-42), dionica Ozimica – Topčić polje, km 2+699	Revizija	-	4.600	IG d.o.o. Banja luka, 01-02.1-3083/18. 13.04.2018.	4.551	-	Okončano nije fakturisano
37.	M5	Rekonstrukcija mosta preko Sokolinskog potoka u Torlakovcu (M5-009-598), dionica Jajce Jug – Donji Vakuf 1, km 18+298	Revizija	-	1.800	Design & QC d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-377/19. 10.01.2019.	1.755	1.755	Okončano
38.	M4	Sanacija mosta preko rijeke Soline u Tuzli (M04.0-4-05), dionica Šiški Brod – Kalesija – Gr. Ent (Memići), km 9+555	Revizija	-	1.800	Design & QC d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-377/19. 10.01.2019.	1.755	1.755	Okončano
39.	M17	Sanacija mosta (M17-007-174) preko rijeke Neretve, dionica Tarčin-Konjic, km 24+381	Izvođenje		110.600	HP Investing d.o.o.Mostar		110.594	Po Rješenju o izvršenju broj:65 0 IP 847834 20 IP
U K U P N O				8.627.200	6.561.300			3.055.190	

3.1.4.2. Sanacija klizišta, odrona, sanacija slijeganja trupa puta, kosina, usjeka i zasjeka

Red Br.	Mag. Cesta	Naziv i opis projekta	Aktivnosti na projektu	Plan 2020.	Rebalans Plana 2020.	Izvođač/ Konsultant - ugovor	Ugovoreno	Realizovano 2020.	Napomena
1.	M14	Sanacija škarpi i kosina, dionica: Srbljani – Bos.Krupa, na najugroženijim mjestima	Projektovanje	12.500	12.500			-	Okončano
			Revizija	1.900	1.900	Design & QC d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-11352/17. 21.12.2017.	1.872	1.872	
			Ukupno					1.872	
2.	M16 006	Dionica: Crna Rijeka – Jajce, km 6+500 do km 10+600 (više lokacija), sanacija škarpi i nestabilnih kosina	Revizija	-	3.300	Design & QC d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-11352/17. 21.12.2017.	3.276	2.808	Okončano
			Izvođenje	200.000	200.000			-	
			Nadzor	6.800	6.800			-	
			Ukupno					2.808	
3.	M18	Sanacija klizišta ispod nivelete i slijeganje trupa ceste dionica: Živinice 1-Vitalj, km 29+350	Izvođenje	780.000	773.000	Jata-Group d.o.o.Srebrenik, 01-02.2-4332/20. 09.04.2020.	772.656	766.370	Okončano
			Nadzor	4.600	4.600	Arting BH d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-8661/19. 19.07.2019.	4.581	4.580	
			Ukupno					770.950	
4.	M16. 4	Sanacija slijeganja trupa ceste, dionica: Bugojno – Nević polje, km 22+900	Izvođenje	200.000	-			-	Rebalansom nije planirano
			Nadzor	7.000	-			-	
5.	M5	Sanacija slijeganja trupa ceste, dionica: (007) Ključ – Rogolji, km 4+000	Projektovanje		11.700	Design & QC d.o.o Sarajevo, 01-02.2-10820/19. 11.09.2019.	11.700	11.700	Okončano

JP CESTE FEDERACIJE BIH

			Izvođenje	330.000	330.000	Mrkonjićputevi d.o.o. Mrkonjić grad, 01-02.2-5864/20. 28.05.2020.	329.256	328.423	
			Nadzor	6.000	5.100	GP: PPG d.o. Sarajevo, Routing d.o.o Banja luka, 01-02.2-5805/20. 26.05.2020.	5.064	5.064	
			Ukupno					345.187	
6.	M16	Crna Rijeka – Jajce, (006) km 6+500 do km 10+600 (više lokacija), sanacija škarp i nestabilnih kosina	Revizija		500	Design & QC d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-11352/17. 21.12.2017.	468	468	Okončano
			Izvođenje	270.000	266.000	Komotin d.o.o.Jajce, 01-02.2-13505/19. 21.11.2019.	265.239	265.239	
			Nadzor	5.900	5.900	Arting d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-11058/19. 17.09.2019.	5.850	5.850	
			Ukupno					271.557	
7.	M16.2	Sanacija slijeganja trupa ceste i potpornog zida ispod nivelete, cesta M16.2_003, dionica: Prozor – Jablanica 1, km 3+850	Izvođenje	273.000	273.000	HP Investing d.o.o. Mostar, 01-02.2-12672/19. 30.10.2019.	273.286	272.150	Okončano
			Nadzor	5.900	5.900	Arting d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-11057/19. 17.09.2019.	5.850	5.850	
			Ukupno					278.000	
8.	M14	Sanacija škarp i kosina, dionica: Srbljani – Bos.Krupa, na najugroženijim mjestima	Izvođenje	300.000	-			-	Rebalansom nije planirano
			Nadzor	6.000	-			-	
9.	M14	Sanacija slijeganja trupa ceste, cesta M14, dionica: Bihać – Grmuša (Prnjosor) – Mali Radić, dionica: Čavkići – Spahići, od P45 do P50, km 0+870 – km 0+959,51	Revizija	-	1.900	Design & QC d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-11352/17. 21.12.2017.	1.872	1.872	Okončano
			Izvođenje	200.000	47.000	I-Selimović d.o.o.Cazin, 01-02.2-11558/19. 02.10.2019.	199.760 (preneseno 46.973)	46.893	
			Nadzor	6.000	6.000	Geofeld d.o.o. Bihać, 01-02.2-11055/19. 17.09.2019.	5.990	5.990	
			Ukupno					54.755	
10.	M17	Sanacija slijeganja i izdizanja trupa ceste petlja Blatuša, Zenica	Projektovanje	30.000	30.000			-	Aktivnost planirana u 2021
11.	M5	Sanacija škarp i kosina, dionica: Kaonik-Lašva, cesta M5_D13, km 3+100 do km 3+250 i km 3+600 do km 3+850	Projektovanje	15.000	9.400	GF Univerziteta u Sarajevu, 01-02.2-4544/20. 15.04.2020.	9.360	9.360	Okončano
12.	M1.9	Sanacija klizišta i asfaltnog kolovoza cesta M1.9_002, dionica:Gradačac-Ormanica od km 2+000 do km 2+400	Izvođenje	300.000	327.500	Balegem d.o.o. Gradačac, 01-02.2-4966/20. 28.04.2020.	327.402	326.362	Okončano
			Nadzor	7.000	5.700	AIK Inženjering d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-5622/20. 18.05.2020.	6.675	6.675	
			Ukupno					333.037	
13.	M1.9	Sanacija klizišta i asfaltnog kolovoza cesta M1.9_002, dionica:Gradačac-Ormanica od km 6+600 do km 7+000	Projektovanje	11.700	11.700			-	
			Izvođenje	280.000	280.000			-	
			Nadzor	7.000	7.000			-	
UKUPNO				3.266.300	2.626.400			2.067.526	

3.1.4.3. Sanacija oštećenih asfaltnih kolovoza

Red br.	Mag. Cesta	Naziv i opis projekta	Aktivnosti na projektu	Plan 2020.	Rebalans Plana 2020.	Izvođač/ Konsultant - ugovor	Ugovoreno	Realizovano 2020.	Napomena
1.	M14 002	Sanacija asfaltnog kolovoza M14_002: Srbljani – Bosanska Krupa sa uređenjem i zaštitom škarpi zasjeka cca = 8,0 km	Projektovanje	12.500	12.500	Konzorcij: Divel d.o.o.Sarajevo,IG H d.o.o.Mostar Trasa d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-6987/17. 01.08.2017.		-	Okončano
			Revizija	2.400	2.400	Design & QC d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-11352/17. 21.12.2017.	2.340	2.340	
			Ukupno					2.340	
2.	M4.2	Sanacija asfaltnog kolovoza, dionica: Skokovi – Srbljani sa izgradnjom pješačke staze	Izvođenje	120.000	170.400	Kov-grad d.o.o. Bužim, 01-02.2-3841/19. 03.04.2019.	599.578 (preneseno 170.363)	170.363	Okončano
			Nadzor	1.500	2.200	DTQ d.o.o. Sarajevo, 01-01.1-4763. 19.04.2019.	6.669 (preneseno 2.134)	2.134	
			Ukupno					172.497	
3.	M5	Sanacija asfaltnog kolovoza M5: Gromiljak – Blažuj	Izvođenje	350.200	350.200	GP Ceste company d.o.o.Kiseljak i Sarajevoputevi d.d. Sarajevo, 01-02.2-12400/19. 22.10.2019.	350.169	348.637	Okončano
			Nadzor	7.000	7.000	Ipsa institut d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-12277/19. 18.10.2019.	6.669	6.669	
			Ukupno					355.306	
4.	M14	Sanacija asfaltnog kolovoza M14_002: Srbljani – Bosanska Krupa sa uređenjem i zaštitom škarpi zasjeka L = 8,0 km	Izvođenje	400.000	400.000			-	Aktivnost planirana u 2021.
			Nadzor	7.000	7.000			-	
5.	M1.9	Sanacija asfaltnog kolovoza Ormanica – Gradačac, L=2,0 km	Projektovanje	7.000	-			-	Okončano
			Izvođenje	300.000	300.000	Balegem d.o.o.Gradačac, 01-02.2-14610/19. 23.12.2019.	299.800	299.800	
			Nadzor	7.000	7.000	AIK Inžinjering d.o.o.Banovići, 01-02.2-14611/19. 23.12.2019.	3.346	3.346	
			Ukupno					303.146	
6.	M17	Sanacija asfaltnog kolovoza (017) Buna-Tasovčići	Izvođenje	665.000	652.200	HP Investing d.o.o.Mostar, 01-02.4-1204/20. 24.01.2020.	652.127	652.062	Okončano
			Nadzor	7.000	5.000	IGH d.o.o.Mostar 01-02.4-2816/20. 28.02.2020.	4.984	4.984	
			Ukupno					657.046	
7.	M17	Sanacija asfaltnog kolovoza M17 dionica Konjic –Jablanica, dužine cca 3km	Izvođenje	480.000	480.000	HP Investing d.o.o.Mostar, 01-02.4-14826/19. 30.12.2019.	479.345	478.529	Okončano
			Nadzor	7.000	5.800	Arting BH d.o.o. Sarajevo, 01-02.4-14319/19. 13.12.2019.	5.791	5.792	
			Ukupno					484.321	
8.	M4	Sanacija asfaltnog kolovoza (crne tačke Sarači), dionica: Simin HanI –Donje Caparde(012), km 11+600-12+000	Projektovanje	7.000	4.500	Arting BH d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-6330/20. 11.06.2020.	4.446	4.446	Okončano
			Izvođenje	250.000	250.000	Jata group d.o.o. Srebrenik, 01-02.2-9883/20.	165.539	165.517	

JP CESTE FEDERACIJE BIH

						15.10.2020.			
			Nadzor	5.000	5.000	AIK Inženjering d.o.o. Banovići, 01-02.2-10556/20. 09.11.2020.	4.973	4.972	
			Ukupno					174.935	
9.	M 17.4	Sanacija asfaltnog kolovoza (crne tačke "Potpolje"), dionica: (002) Čitluk-Medjugorje-Ljubuški, km 2+100-2+400	Izvođenje	250.000	347.000	HP Investing d.o.o. Mostar, 01-02.4-5610/20. 15.05.2020	347.004	346.737	Okončano
			Nadzor	5.000	9.200	Ipsa Institut d.o.o. Sarajevo, 01-02.4-6387/20. 12.06.2020.	5.174	5.174	
			Ukupno					351.911	
10.	M4.2	Sanacija crne tačke na magistralnoj cesti M4.2, dionica (002)	Projektovanje	7.000	7.000			-	Aktivnost planirana u 2021.
			Izvođenje	350.000	250.000			-	
			Nadzor	7.000	7.000			-	
11.	M17	Sanacija asfaltnog kolovoza (005) na poddionici: Poljice-Misurići, L=2,5 km, općina Maglaj	Izvođenje	650.000	646.000	Dobojputevi d.d. Doboj jug, 01-02.2-8461/20. 26.08.2020.	645.664	644.560	Okončano
			Nadzor	7.000	7.000	Design&QC d.o.o. Sarajevo, 01-02.3-8720/20. 04.09.2020.	6.786	6.786	
			Ukupno					651.346	
12.	M4	Sanacija asfaltnog kolovoza(010) Donja Orahovica – Šićki Brod, L=2,0 km (Miričina)	Izvođenje	750.000	870.000	Jata-Group d.o.o. Srebrenik, 01-02.3-2061/20, 10.02.2020.	869.386	869.232	Okončano
			Nadzor	7.000	6.900	AIK –Inženjering d.o.o. Banovići, 01-02.2-3851/20. 30.03.2020.	6.844	6.844	
			Ukupno					876.076	
13.	M 14.2	Sanacija oštećenog asfaltnog kolovoza Bosanski Petrovac – Pasjak – Resanovci	Projektovanje	-	6.900	Geo feld d.o.o. Bihać, 01-02.4-14757/19. 27.12.2019.	6.844	6.844	Po projektu potreban veći budžet
			Izvođenje	300.000	300.000			-	
			Nadzor	7.000	7.000			-	
			Ukupno					6.844	
14.	M14	Sanacija oštećenog asfaltnog kolovoza Otoka – Novi Grad	Projektovanje	7.000	-				Okončano
			Izvođenje	400.000	363.000	Kov-grad d.o.o. Bužim, 01-02.2-7087/20. 08.07.2020.	362.700	362.700	
			Nadzor	7.000	6.000	Trasa d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-6647/20. 22.06.2020.	5.967	5.967	
			Ukupno					368.667	
15.	M 16.2	Sanacija oštećenog asfaltnog kolovoza Bugojno 2 – Gornji Vakuf	Projektovanje	6.000	-				Okončano
			Izvođenje	250.000	278.000	Dobojputevi d.d. Doboj jug, 01-02.2-5908/20. 29.05.2020.	277.415	258.716	
			Nadzor	6.000	6.900	Arting BH d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-4346/20. 09.04.2020.	6.844,50	6.844	
			Ukupno					265.560	
16.	M4	Sanacija oštećenog asfaltnog kolovoza Teslić – Karuše	Izvođenje	350.000	348.000	Dobojputevi d.d. Doboj jug, 01-02.2-14856/19. 31.12.2019.	348.096	348.091	Okončano
			Nadzor	5.000	3.800	AIK Inženjering d.o.o. Banovići, 01- 02.2-14857/19.	3.791	3.791	

JP CESTE FEDERACIJE BIH

						31.12.2019.				
			Ukupno						351.882	
17.	M14	Sanacija kolovozne konstrukcije na cesti M14_001, (dionica: Bihać – Srbijani) u dužina cca 1,6 km (zaštita od visokih voda rijeke Une)	Projektovanje	7.000	-				-	Rebalansom nije planirano
18.	M6	Sanacija oštećenog asfaltnog kolovoza Masline-Stolac,	Izvođenje	150.000	150.000	HP Investing d.o.o.Mostar, 01-02.2-1360/20. 28.01.2020.	149.908	148.574		Okončano
			Nadzor	4.000	4.000	ProKonsing d.o.o.Mostar, 01-02.2-1516/20. 31.01.2020.	3.920	3.920		
			Ukupno						152.494	
19.	M5	Sanacija asfaltnog kolovoza: Nević Polje – Kaonik	Izvođenje	800.000	852.000	Dobojuptevi d.o.o. Sarajevo, 01-02.3-6938/20. 02.07.2020.	851.017	851.013		Okončano
			Nadzor	25.000	7.000	Divel d.o.o.Sarajevo, 01-02.3-9517/20. 02.10.2020	7.020	7.020		
			Ukupno						858.033	
20.	M6.1	Sanacija asfaltnog kolovoza M-6.1_010: Široki Brijeg-Mostar, ulaz u Mostar	Izvođenje	300.000	272.000	HP Investing d.o.o.Mostar, 01-02.4-5610/20. 15.05.2020	272.006	270.436		Okončano
			Nadzor	7.000	7.900	Ipsa Institut d.o.o.Sarajevo, 01-02.4-6387/20. 12.06.2020	7.890	4.057		
			Ukupno						274.493	
21.	M4.2	Sanacija asfaltnog kolovoza na cesti M4.2_002: Skokovi – Srbijani	Izvođenje	660.000	660.000	Kov-Grad d.o.o. Bužim, 01-02.2-2268/20. 13.02.2020.	659.317	658.784		Okončano
			Nadzor	7.000	6.900	DTQ d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-14531/19. 19.12.2019.	6.845	6.845		
			Ukupno						665.629	
22.	M4.2	Sanacija asfaltnog kolovoza na cesti M4.2, dionica: Skokovi – Srbijani, km 5+950 –km 9+950	Projektovanje	7.000	7.000				-	Aktivnost planirana u 2021
23.	M16	Sanacija asfaltnog kolovoza, dionica: Crna Rijeka – Jajce Jug, L=2,5 km	Nadzor	-	4.800	Konzorcij: Divel d.o.o. Sarajevo, Ipsa Institut d.o.o. Sarajevo i IG Institut d.o.o. Banja luka, 01-02.2-5967/16, 11.07.2016.	4.721	4.721		Okončano
UKUPNO				7.973.600	8.102.500				6.977.247	

3.2. Planirani projekti

3.2.1. Projekti rekonstrukcije i izgradnje

Red br.	Mag. Cesta	Naziv i opis projekta	Aktivnosti na projektu	Plan 2020.	Rebalans Plana 2020.	Izvođač/ Konsultant - ugovor	Ugovoreno	Realizovano 2020.	Napomena
1.	M5	Izgradnja (izmještanje) ceste M5, dionica I Izačić –Kamenica, glavni projekat trase - Dostava 5 primjeraka kompletne projektne dokumentacije u printanoj i elektronskoj formi sa predmjerima radova usklađenim sa Smjernicama za projektovanje, građenje i nadzor na putevima	Projektiranje	50.000	49.000	Ipsa Institut d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-7262/20. 13.07.2020.	48.555	-	U toku
			Revizija	5.000	5.000			-	Tender za reviziju u pripremi

JP CESTE FEDERACIJE BIH

		<ul style="list-style-type: none"> - Prevođenje tehničkog izvještaja i predmjera radova na engleski jezik - Izrada zbirnog predmjera (prema Smjernicama) u dvojezičnoj formi (BiH/Engleski) 							
2.	M4.2	Izgradnja obilaznice Cazina <ul style="list-style-type: none"> - Izrada glavnog projekta : natputnjaka u km 1+860 - Izrada glavnog projekta potputnjaka u km 3+420 	Projektiranje	50.000	36.000	Infra d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-8061/20.10.08.2020.	35.744	20.943	U toku
			Revizija	5.000	5.000	Design&QC d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-10827/20.18.11.2020.	4.914	-	
			Ukupno					20.943	
3.	M16.4	Izgradnja obilaznice Bugojna <ul style="list-style-type: none"> - Ažuriranje i usklađivanje projektnog rješenja (Izgradnja kružnog toka na ulazu u Bugojno –početak obilaznice – servisne saobraćajnice i pješačke staze; 	Projektiranje	50.000	50.000	Ipsa Institut d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-10992/20.26.11.2020.	48.906	-	U toku Tender za reviziju u pripremi
			Revizija	5.000	5.000			-	
			Ukupno					-	
4.	M14.2	Noveliranje glavnog projekta trase ceste M14.1, dionica Spahići-Jezero-Grmuša, poddionica Srbaljani –Tabla, L=6,27km	Projektiranje	7.000	7.000			-	Radi se u okviru redovnog održavanja-točka 5. rekapitulacije
			Revizija	2.000	2.000			-	
5.	M18	Izgradnja dionice–Kladanj-Podpaklenik-prevoj Karaula, IV faza–Izrada glavnog projekta <i>(uključuje glavni projekat trase L= cca 1500m prema Olovu-do motela Montana) i glavne projekte 3mosta i jednog tunela na dijelu prema Kladnju-do „Ujića rijeke“)</i>	Projektiranje	250.000	250.000			-	Projektni zadatak u pripremi
			Revizija	20.000	20.000			-	
6.	M5	Izrada glavnog projekta veze „nove“ ceste M5 Izačić – Kamenica na postojeću cestu M5 na području naselja Kamenica – I faza L=2km <i>(Uključuje izbacivanje petlje Kamenica, projektovanje trase i 2 kružne raskrsnice)</i>	Projektiranje	50.000	50.000	GP:Euroing d.o.o.Bihać, Ipsa Institut d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-12085/20.31.12.2020.	29.952	-	U toku Tender za reviziju u pripremi
			Revizija	5.000	5.000			-	
			Ukupno					-	
7.	M16.4	Rekonstrukcija ceste M16.4, dionica Novi Travnik-Bugojno – prolaz pored BNT-a	Projektiranje	7.000	7.000	Saraj inženjring d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-10163/20.26.10.2020.	6.880	-	U toku Nabavka za reviziju u pripremi
			Revizija	2.000	2.000			-	
			Ukupno					-	
8.	M14.1	Izgradnja sjevernog kraka obilaznice Odžaka- I faza	Izvođenje	500.000	500.000	Roading d.o.o.Gračanica,01-02.1-10969/20.24.11.2020.	496.834	-	Čeka se građevinska dozvola i povoljni vremenski uvjeti Za početak radova
			Nadzor	15.000	15.000	GP:Geomatik d.o.o. Gornji Svilaj, IGH d.o.o.Mostar,01-02.1-10967/20.24.11.2020.	6.084	-	
			Revizija			Integra d.o.o.Mostar, 01-02.1-11793/20.22.12.2020.	1.112	1.112	
			Ukupno					1.112	
9.	M6 M17.4	Izgradnja obilaznice Ljubuškog (spoj M6 i M17.4) –I faza	Izvođenje	500.000	490.000	Putovi d.o.o.Grude, 01-02.2-8487/20.26.08.2020.	488.279	-	Eksproprij. u toku
			Nadzor	15.000	15.000	Ipsa Institut d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-9649/20.07.10.2020.	14.976	-	
			Ukupno					-	
10.	M6	Izgradnja kružnog toka na izlazu Prispa, na dionici: Gorica-Vitina, općina	Izvođenje	500.000	500.000	Putovi d.o.o.Grude, 01-02.29294/20.	500.000	-	Rješavanje imovinsko pravnih

JP CESTE FEDERACIJE BIH

		Grude, II faza				24.09.2020.			odnosa
			Nadzor	15.000	7.000			-	
			Konsult. usluge	-	3.500	Integra d.o.o.Mostar 01-02.1-10456/19. 02.09.2019.	3.486	-	
			Ukupno					-	
11.	M6	Dionica:Grude-Ljubuški Izgradnja trake za lijevo skretanje, km 16+500	Revizija	-	1.200	Pronasa d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-8443/20. 25.08.2020.	1.150	1.150	Eksproprij. u pripremi
			Izvođenje	150.000	150.000			-	
			Nadzor	6.000	7.000			-	
			Ukupno					1.150	
12.	M6	Ažuriranje glavnog projekta ceste M-6 Posušje-Grude-Ljubuški, dionica Grude-Ljubuški, poddionica Cerno-spoj sa R425a (L=cca 5km)	Projektiranje	50.000	50.000			-	Projektni zadatak u pripremi
			Revizija	5.000	5.000			-	
13.	M6	Izrada glavnog projekta izmještanja trase ceste M6 na dionici Gornji Trebižat-spoj sa M17 u Klepcima (obilaznica Čapljine) (L=cca 8,7km)	Projektiranje	100.000	100.000			-	Projektni zadatak u pripremi
			Revizija	10.000	10.000			-	
		Pribavljanje saglasnosti, elaborata i dozvola za projekte iz Programa „Modernizacija cesta u F BiH“;							
		Uskladjivanje sa Smjernicama i prevođenje dokumentacije na engleski jezik							
	M17	- Izrada elaborata misije G1 i G21 i plan upravljanja optadom za izgradnju trafo stanice za tunel Vranduk				Trasa d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-1124/20. 23.01.2020.	5.850	5.850	
	M17	- Izrada i revizija glavnog projekta zaštite od požara na izgradnju TS1 i TS2 i opreme tunela Vranduk II				ZT Terhnozaštita d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-1373/20. 28.01.2020.	2.925	2.925	
	M14	- Saobraćajna analiza sa simulacijom saobraćaja na raskrsnici Jablanska				GF Univerziteta u Sarajevu, 01-02.1-4509/20. 14.04.2020.	5.500	5.500	Okončano
	M6 M17	- Izgradnja prethodne studije utjecaja na okoliš za projekt "Izgradnja i rekonstrukcija cesta M6.1 i M17 –Sjeverni ulaz u Mostar				Sendo d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-4153/20. 05.04.2020.	6.435	6.435	
		- Izrada idejnog i detalnog plana upravljanja građevinskim otpadom, i idejnog projekta geotehničke misije G1				IG d.o.o.banja luka, 01-02.1-7833/20. 30.07.2020.	5.325	5.325	
	M5	- Izrada Studije za prethodnu vodnu i Elaborata sa vodnu saglasnost za Izgradnja ceste M5, dionica Izačić –Kamenica				Euroing d.o.o.Bihać, 01-02.1-4275/20. 08.04.2020.	6.435	-	U toku
14.	M18	- Izrada Studije za prethodnu vodnu saglasnost za projekt izgradnja ceste Šićki Brod-Đurdevik	Ostalo	200.000	200.000	TZI-Inženjering d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-5822/20. 26.05.2020.	5.850	5.850	
	M18	- Rekonstrukcija ceste Šićki Brod-Đurdevik				Naknade, Saglasnost, Taksa	871	871	
	M5	- Izgradnja mag. ceste devijacija puta AVNOJ-a, spajanje na mag. cestu M5_002Bihać-Ripač				Revizija-Trasa d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-6027/20. 02.06.2020.	3.510	3.510	Okončano
						Ipsa Institut d.o.o.Sarajevo	800	800	
						Taksa, saglasnost, Naknada	12.715	12.715	
	M6	- Izrada elaborata o provedenim istražnim radovima za utvrđivanje utjecaja Sjeverne obilaznice Gruda na izvorište vode za piće „Grudsko vrilo“				Integra d.o.o.Mostar, 01-02.1-5991/20. 02.06.2020.	4.446	4.446	Okončano
		- Iskolčenje pojasa eksproprijacije				Naknada	27.023	27.023	
	M5	- Izmjena glavnog projekta izgradnje trake za spora vozila na M5, dionica:Donji Vakuf-Turbe,				Geometrika d.o.o.Grude, 01-02.1-10828/20. 18.11.2020	7.008	-	U toku
						Design&QC d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-6678/20.	7.020	7.020	Okončano

JP CESTE FEDERACIJE BIH

		od km 12+190 do km 12+660				22.06.2020.			
M17.3	-	Izgradnja ceste Neum-Stolac dionica:Hutovo-Cerovica				Naknada FMF	50		50
	-	Cerovica-Stolovi				taksa	35		35
M5	-	Treća traka- sanacija kolovoza i korekcija osovine Bihać 4-Ripač.				Saglasnost MUSK	522		522
M5	-	Izgradnja treće trake Bos.Petrovac-Drvnar				Naknada Općina	5.035		5.035
M5	-	Izgradnja trake za spora vozila Kobiljača				Naknada Općina	3.871		3.871
M5	-	Izgradnja trake za spora vozila Drvar_Resanovci_Bos.Grahovo				Elaborat zaštite	995		995
M6.1	-	Izgradnja trake za spora vozila Tomislavgrad-Široki				Taksa	11.830		11.830
	-	spora traka Čevljanovići – Nišići				Naknada Saglasnost	8.285		8.285
M5	-	Treća traka Donji Vakuf-Turbe				Taksa	115		115
	-	Banj Brdo-Simin Han				Naknada Općina	9.111		9.111
M5	-	Izgradnja Obilaznice Donji Vakuf Izrada projekta proširenja krajnjeg raspona mosta na Vrbasu za potrebe kružne raskrsnice na obilaznici				Saglasnost ,taksa	230		230
M4.2	-	Izgradnja Obilaznice Cazin				Naknada Općina	420		420
	-	Izgradnja Južne obilaznice Mostara				Infra d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-11794/20. 22.12.2020.	6.903	-	U toku
	-	Izgradnja Južne obilaznice Mostara Avijatičarski most 1				Saglasnost,taksa	176		1.306
M20	-	Izgradnja Obilaznice Goražde				Naknada, Saglasnost	7.978		8.874
	-	Izgradnja Obilaznice Grude, južna				naknada	80		80
	-	Izgradnja Obilaznice Bugojno				Naknada	1.232		1.232
	-	Iskolčenje pojasa eksproprijacije				taksa	3.440		3.440
M14.1	-	Izgradnja Obilaznice Odžak				Naknada	110		110
	-	Izgradnja Obilaznice Bihaća				Geodet d.o.Sarajevo, 01-02.1-10671/20. 12.11.2020.	2.334		2.334
M5	-	Izgradnja Obilaznice Kiseljaka				Naknada, Saglasnost	59.223		59.223
	-	Iskolčenje pojasa eksproprijacije				Naknada, saglasnost Taksa	1.738		1.738
	-	Izgradnja (izmještanje) ceste M5, dionica I Izačić – Kamenica				Naknada	110		110
	-	Ažuriranje akcionog plana preseljenja RAP za prjekat sanacija šteta od poplava				AMG d.o.o.Visoko .01-02.1-10480/20. 05.11.2020.	2.340		2.340
M14	-	Izgradnja Obilaznice Bosanska Otoka				Naknada	600		600
	-	Izgradnja Obilaznice Bužim				IG d.o.o.Banja luka, 01-05.2-10434 /20. 04.11.2020.	31.239		9.374
	-	Izgradnja Obilaznice Ljubuški - zapadna				IPSA institut, konsl.usluge	500		500
	-	Izgradnja gradskog autoputa –XII transferzala –Stup petlja-gr.entiteta RS				naknada	3.285		3.285
	-	Izgradnja pješačkog prelaza preko ceste M17 u naselju Nemila				Naknada Saglasnost	363		363
M20	-	Rekonstrukcija raskrsnice Goražde-Ustiprača km 0+550				Naknada, Saglasnost	1.684		1.684
M20	-	Ustikolna – Goražde kružni tok Vitkovići				Naknada	340		340
	-	Rekonstrukcija raskrsnice Skokovi-Srbljani Mala Lisa				Taksa	305		305
	-	Rekonstrukcija raskrsnice Olovske luke				Saglasnost	2.340		2.340
M17.3	-	Rekonstrukcija raskrsnice Babin Do, dionica: Neum-Stolac				Saglasnost	58		58
M16.4	-	Rekonstrukcija mosta preko rijeke Vrbas km 35+180				Taksa	4.535		4.535
	-					Naknada	847		847
	-					Naknada, taksa	4.439		4.439

JP CESTE FEDERACIJE BIH

	M17	- Nemila 0 – Lašva 1 – most preko rijeke Bosne (Zenica)				Saglasnost	145	145	
	M20	- Izgradnja Obilaznice Goražde most na Drini				Naknada	117	117	
		- Olovo – Semizovac, most preko rijeke Ljubine				Naknada	15	15	
		- Sanacija mosta preko rijeke Bunte u Gračanici (M16.2-001-280) dionica Bugojno 2 – Gornji Vakuf, km 8+152				Naknada, Saglasnost	1.300	1.300	
	M16	- Sanacija crne tačke Trivunove krivine				Naknade	142	142	
	M16.2	- Sanacija tunela Jasen, dionica: Bugojno-Jablanica				Naknada	4.539	4.539	
	M5	- Izgradnja brze ceste Lašva-Nević polje, prolaz kroz poslovnu zonu Vitez				Naknada	6.962	6.962	
	M5	- Rekonstrukcija ceste Han ploča-Šamin Gaj				Naknada	12.124	12.124	
		- Izgradnja tunela Žaba				Naknada	84.736	84.736	
		- Izgradnja JUNE obilaznice Mostara-rotor Varda i ulaz u tunel Novi				Integra d.o.o. Mostar 01-02.2-10764/20. 16.11.2020.	3.393	-	U toku
		- Šiški Brod 3 – Živinice 1, rekonstrukcija crne tačke "Husino" km 2+500				naknada	7.265	7.265	
		- Rekonstrukcija ceste Jajce jug potez tunel Skela				saglasnost	389	389	
		- Sanacija tunela Crnaja				Naknada Općine Jajce	147.847	147.847	Okončano
						Naknada Elektrodistribucije	14.250	14.250	
						Naknada	59	59	
						Ukupno		518.116	
15.	M18	Vrednovanje ranije obrađenih varijanti za skraćivanje vremena putovanja od Sarajeva do Tuzle sa idejnim rješenjem poboljšanja varijantnih rješenja	Projektovanje	200.000	-			-	Rebalansom nije planirano
16.	M5	Izgradnja trake za spora vozila na M5: Bos.Petrovac-Ključ, prevoj Lanište-Čišćenje terena od mina	Deminiranje	-	60.000	UEM d.o.o.Hadžići, 01-02.2-1479/20. 30.01.2020.	59.961	59.961	Okončano
17.	M 17.3	Obilaznica Stoca -Izrada glavnog projekta mosta preko rijeke Bregave	Projektovanje	-	7.000			-	Projektni zadatak u pripremi
			Revizija	-	2.000			-	
18.	M18	Izgradnja ceste Šiški Brod-Đurđevik - Izrada elaborata ukrštanja sa dalekovodima - Izrada projekta zaštite i izmještanja dalekovoda	Konsult. usluge	-	7.000	Energoinvest d.d.Sarajevo, 01-02.1-7097/20. 08.07.2020.	6.800	6.800	Projektni zadatak u pripremi
			Projektovanje	-	35.000			-	
			Revizija	-	3.000			-	
			Ukupno					6.800	
19.	M14	Izgradnja ceste Bihać – Bosanska Krupa – I faza, dionica Jablanska – Mali Lug - Izrada glavnog projekta izgradnje pružnog prelaza u nivou na M14, Jablanska ulica u Bihaću	Projektovanje	-	17.600	Konzorcij: Euroing d.o.o Bihać i INT BH d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-10625/20. 11.11.2020.	17.550	-	U toku
			Revizija	-	2.000			-	
			Ukupno					-	
20.	M4.3	Izgradnja obilaznice Bužim	Izvođenje	-	1.160.000			-	Aktivnost planirana u 2021.
			Nadzor	-	22.600			-	
				2.774.000	3.862.900			608.082	

3.2.2. Rasvjeta i semaforizacija raskrsnica i tunela

Red br.	Mag. Cesta	Naziv i opis projekta	Aktivnosti na projektu	Plan 2020.	Rebalans Plana 2020.	Izvođač/ Konsultant - ugovor	Ugovoreno	Realizovano 2020.	Napomena
1.	M16	Rasvjeta tunela Tuk na M-16, dionica: Crna Rijeka – Jajce	Projektovanje	6.000	6.000	Edeco Group d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-6965/20. 03.07.2020.	5.900	-	Projektov.u toku, čeka se posjedovni list od strane Općine
			Revizija	4.000	4.000			-	
2.	M 14.2	Semaforizacija mosta u Prudu /Šamac na cesti M14.2	Projektovanje	7.000	7.000			-	Aktivnost planirana u 2021
			Izvođenje	40.000	40.000			-	
3.	M4	Sanacija semafora u Matuzićima/Doboj jug (reprogramiranje po osnovu aktuelnog broja vozila...)	Projektovanje	7.000	-			-	Rebalansom nije planirano
4.	M5	Sanacija semafora u Jajcu, naselje Pijavice	Projektovanje	7.000	-			-	Rebalansom nije planirano
			Izvođenje	40.000	-			-	
5.	M5	Glavni projekat rasvjete raskrsnice na magistralnoj cesti M5 u naselju Pudin Han	Izvođenje	80.000	80.000			-	U toku žalbeni postupak za tender za radove
			Nadzor	3.000	3.000			-	
6.	M5	Rasvjeta tunela Vratnik	Projektovanje	4.000	4.000	Edeco Group d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-6963/20. 03.07.2020.	4.000	4.000	Projektov. okončano Ostale aktivnosti planirane u 2021.
			Revizija	1.000	1.000			-	
			Izvođenje	130.000	130.000			-	
			Nadzor	2.500	2.500			-	
			Ukupno				4.000		
7.	M1.9	Rasvjeta tunela Ormanica	Projektovanje	-	5.000			-	Aktivnost planirana u 2021.
			Izvođenje	-	100.000			-	
			Nadzor	-	3.000			-	
8.		Semaforizacija raskrsnice kod hotela Ero, Grad Mostar	Projektovanje		7.000			-	Aktivnost planirana u 2021
UKUPNO				331.500	392.500			4.000	

3.2.3. Poboljšanje sigurnosti prometa na magistralnim cestama izgradnjom traka za lijeva skretanja, pješačkih staza sa odvodnjom kišne kanalizacije, odmorišta i sanacija crnih tačaka

Red br.	Mag. Cesta	Naziv i opis projekta	Aktivnosti na projektu	Plan 2020.	Rebalans Plana 2020.	Izvođač/ Konsultant - ugovor	Ugovoreno	Realizovano 2020.	Napomena
1.		Saglasnosti i takse na projekte	Ostalo	50.000	50.000				Okončano
	M5	- Izgradnja kružnog toka Turbe-Nević Polje, Kalibunar				Saglasnost komisija	290 712	1.002	
		- Rekonstrukcija raskrsnice U1 Safeta Zajke				Naknada, saglasnost taksa	382	382	
	M18	- Rekonstrukcija raskrsnice Šip				Saglasnost	231	231	
	M6 i M17	- Izgradnja i rekonstrukcija cesta M6.1 i M17 –Sjeverni ulaz u Mostar				Naknada Saglasnost	999 111	1.110	

JP CESTE FEDERACIJE BIH

	M5	-	Rekonstrukcija raskrsnice Vjetrenica na M5 i R441				Saglasnost	181	181	Okončano	
	M14.2 M5	-	Rekonstrukcija raskrsnice cesta M-14.2 i M-5 u Bosanskom Petrovcu				Taksa	3.096	3.096		
	M14	-	Rekonstrukcija raskrsnice M14 Prvomajske u Bos. Krupi				Saglasnost	1.637	1.637		
	M6	-	Rekonstrukcija raskrsnice u Stocu M6 i R427				Saglasnost	715	715		
		-	Rekonstrukcija mosta preko rijeke Ljubinje Semizovac-Malta				Saglasnost	59	59		
	M18	-	Rekonstrukcija raskrsnice kod Hotela Sunce Vogošća				ZT Tehnozaštita d.o.o.Sarajevo,	700	700		
							Saglasnosti	254	254		
	M14.2	-	Semaforizacija magistralne ceste M14.2 i lokalne ceste (8 Ulica), općina Orašje				Saglasnost	1.006	1.006		
	M6	-	Izgradnja kružnog toka na izlazu Prispa, na dionici: Gorica-Vitina, općina Grude. I faza				Naknada	346	346		
	M6.1	-	Rekonstrukcija raskrsnice M6.1 i R420 u naseljenom mjestu -Čitluk, općina Posušje				Naknada	800	800		
		-	Rekonstrukcija raskrsnice Skela most				Naknada, taksa	19.463	19.463		
		-	Rekonstrukcija raskrsnice na M6.1 sa lokalnom cestom za Blagaj, km 2+000				Naknada	1.414	1.414		
		-	Rekonstrukcija raskrsnica cesta M5 i M15 izlaz iz Ključa				Saglasnost	821	821		
		-	Rekonstrukcija mosta na Sani u Ključu				Naknada	4.118	4.118		
		-	Rasvjeta raskrsnice u Žitomislićima na M17				Saglasnost	2.340	2.340		
		-	Izgradnja pješačke staze u naselju Gračac, općina Prozor				Saglasnost	21	21		
			Ukupno						39.696		
2.	M17 M5		Uređenje slijedećih lokacija za vaganje: „Tatarbudžak“ na M -17, 006, dionica Ozimice – Topčić Polje, km. 4 +680 L „Rakovica“ na cesti M -5, 014, dionica Gromiljak – Blažuj, km.19 +660 D „Pudin Han“ na rask. M- 5 i R410 A, 006, dionica Gornje Bravsko – Ključ, km 14+990	Izvođenje	90.000	90.000			-	Aktivnost planirana u 2021	
3.	M6 M17		Sanacija i rekonstrukcija magistralnih cesta u gradu Mostaru	Revizije	50.000	-			-	Rebalansom nije planirano	
4.	M 17.3		Izgradnja pješačke staze na dionici Neum-Stari Neum	Projektovanje	7.000	7.000			-	Aktivnost planirana u 2021	
				Revizija	2.000	2.000			-		
5.	M15		Izgradnja nogostupa uz cestu M15, dionica Šujica-Kolo, u naselju Šujica	Projektovanje	7.000	7.000			-		
				Izvođenje	200.000	226.000	Livnoputovi d.o.o. Livno, 01-02.2-9884/20. 15.10.2020.	226.315	95.925		U toku
				Nadzor	7.000	7.000	Integra d.o.o.Mostar, 01-02.2-9881/20. 15.10.2020.	5.762	2.442		
				Ukupno					98.367		
6.	M6.1		Izgradnja nogostupa uz cestu M6.1 u naseljenom mjestu Knešpolje	Izvođenje	213.000	250.000			-	Čeka se Općina da položi fekalnu kanalizaciju	
				Nadzor	7.000	7.000			-		
7.	M6.1		Rekonstrukcija križanja ceste M6.1 sa lokalnom cestom za industrijsku zonu u naselju Knešpolje	Projektovanje	20.000	20.000	Design&QC d.o.o.Sarajevo, 01-02.4-9268/20. 23.09.2020.	7.605	-	U toku	
				Revizija	4.000	4.000			-		
				Ukupno					-		

JP CESTE FEDERACIJE BIH

8.	M14.2	Izgradnja nogostupa u nasljenom mjestu D. Mahala, Dionica: Orašje-Grebnice, km 12+800 do km 14+616	Projektovanje	6.500	6.500			-	Poništen jednom tender, nastavak aktivnosti u 2021.
			Izvođenje	207.500	207.500			-	
			Nadzor	6.000	6.000			-	
9.	M17	Izgradnja trake za lijevo i desno skretanje na cesti M-17, dionica: Gnojnice –Buna, u zoni naselja Ortiješ	Projektovanje	15.000	-			-	
			Revizija	2.000	-			-	
10.	M16.2	Izgradnja pješačke staze na cesti M16.2, dionica Prozor-Jablanica I, potez Rat-Ustirama (kod tunela) - L=cca 500m	Projektovanje	7.000	7.000	Habitat d.o.o.Mostar, 01-02.4-9635/20, 07.10.2020.	6.985	-	U toku
			Revizija	1.000	1.000	Interprojekt d.o.o.Mostar, 01-02.4-11037/20. 27.11.2020.	1.000	-	
			Ukupno					-	
11.	M4	Rekonstrukcija raskrsnice u Gornjoj Kalesiji, općina Kalesija	Izvođenje	400.000	517.000			-	Aktivnost planirana u 2021
			Nadzor	7.000	7.000			-	
12.	M5	Gromiljak – Busovača, izgradnja pješačke staze kroz naselje Radanovići	Projektovanje	7.000	7.000	Arting BH d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-9789/20. 13.10.2020	10.399	10.399	Projekt urađen, nabavka radova u 2021.
			Izvođenje	250.000	250.000			-	
			Nadzor	7.000	10.400			-	
			Ukupno					10.399	
13.	M5	Gromiljak – Blažuj, izgradnja pješačke staze kroz naselje Bilalovac	Projektovanje	7.000	7.000			-	Nabavka u toku
			Izvođenje	250.000	250.000			-	
			Nadzor	7.000	7.000			-	
14.	M18	Rekonstrukcija pješačkih staza sa rješavanjem odvodnje, magistralna cesta M18, dionica 010 Semizovac – Sarajevo – Malta, km 8+400 km – km 10+400 (Kobilja glava – Šip)	Projektovanje	7.000	-			-	Nabavka projektovanja u toku
			Izvođenje	500.000	500.000			-	
			Nadzor	7.000	7.000			-	
15.	M5	Idejni projekat dogradnje trake na petlji Korija, cesta M5, Šeherćehajin most-Korija	Projektovanje	7.000	7.000	Pronasa d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-10187/20. 27.10.2020	6.786	6.786	Okončano
16.	M5	Idejni projekat rekonstrukcije raskrsnice na M5 A. Šaćirbegović-Korija-Ljubogošta, km 1+980	Projektovanje	7.000	7.000			-	Aktivnost planirana u 2021.
17.	M4	Doboj – Donja Orahovica, rekonstrukcija raskrsnice u Klokotnici (zaseok Kapak)	Projektovanje	7.000	7.000			-	Aktivnost planirana u 2021.
			Izvođenje	300.000	300.000			-	
			Nadzor	7.000	7.000			-	
18.	M16	Izgradnja raskrsnice ili treće trake: Donji Vakuf-Bugojno-Kupres (naselje Čipuljić-Poriče)	Projektovanje	7.000	7.000			-	Projektovanje planirano u 2021.
			Izvođenje	200.000	200.000			-	
			Nadzor	7.000	7.000			-	
19.	M4	Izgradnja pješačke staze L=cca. 925 m od Klokotnice (Samarica) do Brijesnice Velike	Projektovanje	7.000	7.000			-	Aktivnost planirana u 2021.
			Izvođenje	250.000	250.000			-	
			Nadzor	7.000	7.000			-	
20.	M17	Izgradnja pješačke staze M17_010, km 0+500-km 1+500 od Coca-Cole do autobuske stanice u Binježevu	Projektovanje	7.000	7.000			-	Aktivnost planirana u 2021.
21.	M17	Rekonstrukcija isključne trake za Lokve	Projektovanje	7.000	7.000			-	Aktivnost planirana u 2021.

JP CESTE FEDERACIJE BIH

22.	M14 M14.2	Izgradnja kružnog toka na spoju M14 i M 14.2 u Bos. Krupi	Izvođenje	300.000	-			-	Potrebno riješiti imovinske odnose
			Nadzor	7.000	-			-	
23.	M6	Rekonstrukcija i dogradnja pješačke staze u Sovićima, općina Grude	Izvođenje	70.000	70.000	Putovi d.o.o.Grude, 01-02.2-8257/20. 14.08.2020.	69.791	69.680	Okončano
			Nadzor	3.000	3.000			-	
			Ukupno					69.680	
24.	M17	Izgradnja pješačke staze u Počitelju, L=220 m	Projektovanje	7.000	7.000	Geo-Data d.o.o. Mostar, 01-02.4-6385/20 12.06.2020.	6.961	6.961	Projektovanje okončano, u toku izvođenje
			Izvođenje	200.000	200.000	HP Investing d.o.o.Mostar, 01-02.4-10989/20. 24.11.2020.	176.085	-	
			Nadzor	7.000	7.000	Integra d.o.o. Mostar, 01-02.4-9469/20. 01.10.2020.	6.897	-	
			Ukupno					6.961	
25.	M20	Rekonstrukcija raskrsnice u naselju Mravinjac, općina Goražde	Projektovanje	7.000	7.000			-	Aktivnost planirana u 2021.
			Izvođenje	250.000	250.000			-	
			Nadzor	7.000	7.000			-	
26.	M18	Rekonstrukcija raskrsnice Vogošća (Centar), općina Vogošća	Projektovanje	7.000	7.000			-	Aktivnost planirana u 2021.
27.	M18	Izgradnja pješačke staze Gornji Hotonj-Donji Hotonj	Projektovanje	7.000	7.000			-	Aktivnost planirana u 2021.
			Izvođenje	100.000	100.000			-	
			Nadzor	7.000	7.000			-	
28.	M18	Rekonstrukcija raskrsnice M18 i R461, općina Olovo	Projektovanje	7.000	7.000			-	Projektovanje planirano u 2021.
			Izvođenje	200.000	-			-	
			Nadzor	7.000	-			-	
29.	M5	Izgradnja pješačke staze na magistralnoj cesti M-5 u naselju Izačić	Izvođenje	250.000	250.000			-	Aktivnost planirana u 2021.
			Nadzor	7.000	7.000			-	
30.	M5	Rekonstrukcija raskrsnice ceste M-5, općina Ključ	Projektovanje	7.000	7.000			-	Aktivnost planirana u 2021.
			Izvođenje	200.000	200.000			-	
			Nadzor	7.000	7.000			-	
31.	M5	Rekonstrukcija raskrsnice u naseljenom mjestu Oborci, općina Donji Vakuf	Projektovanje	7.000	7.000			-	Aktivnost planirana u 2021.
32.	M5	Izgradnja pješačke staze u naseljenom mjestu Hadžići i dogradnja nedostajuću dionicu pješačke staze sa potpornim zidom cca 100 m, općina Donji Vakuf	Projektovanje	7.000	7.000			-	Aktivnost planirana u 2021.
33.	M5	Rekonstrukcija raskrsnice sa pješačkom stazom u naselju Barice, općine Donji Vakuf	Projektovanje	7.000	7.000			-	Aktivnost planirana u 2021.
			Izvođenje	250.000	250.000			-	
			Nadzor	7.000	7.000			-	
34.	M18	Rekonstrukcija raskrsnice cesta M18 i R455a u km 6+100, općina Živinice, naselje Maline	Projektovanje	7.000	7.000			-	Aktivnost planirana u 2021.
			Revizija	-	2.000			-	
35.	M17	Izgradnja podhodnika za pješake u naselju Čelebići, općina Konjic	Projektovanje	15.000	15.000	IG d.o.o.Banja luka, 01-02.4-9142/20. 17.09.2020.	11.232	-	Aktivnost planirana u

JP CESTE FEDERACIJE BIH

			Revizija	-	3.000	Interprojekt d.o.o.Mostar, 01-02.4-11650/20. 16.12.2020.	2.340	-	2021
			Izvođenje	300.000	-			-	Rebalansom nije planirano
			Nadzor	15.000	-			-	
			Ukupno					-	
36.	M17.5	Poboljšanje sigurnosti prometa na M-17.5, dionica: Posušje –Jablanica	Projektovanje	7.000	7.000			-	Aktivnost planirana u 2021.
			Izvođenje	386.000	-			-	
			Nadzor	7.000	-			-	
37.	M17	Izgradnja pješačke staze pored groblja Sutina, Grad Mostar	Projektovanje	-	2.500			-	Priprema tendera
			Izvođenje	-	55.000			-	
			Nadzor	-	2.500			-	
38.	M1.8	Izrada glavnog projekta podhodnika za pješake na M1.8, u naselju Bjelave, općina Srebrenik	Projektovanje	-	7.000			-	Aktivnost planirana u 2021.
			Revizija	-	3.000			-	
39.	M6	Izrada idejnog projekta kružne raskrsnice na cesti M6.1 u Stocu, (kod tvornice armatura)	Projektovanje	-	7.000			-	Aktivnost planirana u 2021.
40.	M18	Izrada idejnog projekta rekonstrukcije raskrsnice na magistralnoj cesti M18, dionica 010 Semizovac – Sarajevo – Malta, lokalitet Zetra	Projektovanje		7.000			-	Aktivnost planirana u 2021.
41.	M6.1 M17	Sjeverni ulaz u Mostar – Izrada glavnog projekta odvodnje raskrsnice i tunela	Projektovanje		7.000	JP Vodovod d.o.o.Mostar, 01-02.1-6903/20. 01.07.2020.	7.019	7.019	Okočano
UKUPNO				5.850.000	4.833.400			238.908	

3.2.4. Vanredno održavanje

3.2.4.1. Sanacija i rekonstrukcija cestovnih objekata

Red br.	Mag. Cesta	Naziv i opis projekta	Aktivnosti na projektu	Plan 2020.	Rebalans Plana 2020.	Izvođač/ Konsultant - ugovor	Ugovoreno	Realizovano 2020.	Napomena
1.	M5	Rekonstrukcija mosta preko potoka Rika (M5_009_214) i rekonstrukcija raskrsnice na lokaciji Skela, na cesti M5, dionica Jajce Jug-Donji Vakuf 1, km 0+894	Izvođenje	1.040.000	-			-	Rebalansom nije planirano
			Nadzor	40.000	-			-	
2.	M6.1	Rekonstrukcija mosta (M6.1-002-462) preko rijeke Korane na cesti M-6.1, dionica Resanovci – Bosansko Grahovo 1 u km 12+921	Izvođenje	250.000	270.000	Struktura d.o.o. Jajce, 01-02.1-10298/20. 30.10.2020	270.820	185.463	U toku
			Nadzor	7.000	7.000	Design&QC d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-8439/20. 25.08.2020.	6.786	-	
			Ukupno					185.463	
3.	M1.8	Zamjena dilatacione naprave na obalnom stubu broj 18 (OS18), most M1.8-001-62 preko rijeke Save u Orašju na cesti M1.8, dionica Gran. BH/HR (Županja) – Lončari, km 0+000 (M 01.8-1-01)	Izvođenje	50.000	75.000			-	Ponovljeni tender u pripremi
			Nadzor	2.500	4.000			-	
4.	M17	Zamjena dilatacionih naprava naprave na obalnim stubovima broj 1 i 5, most (M17-006-195) preko rijeke Bosne u Želečoj, Bosna I, na cesti M17, dionica Ozimica-Topčić polje, km 12+506 (M 17.0-2-14)	Izvođenje	90.000	142.000			-	Ponovljeni tender u pripremi
			Nadzor	3.500	5.000			-	

JP CESTE FEDERACIJE BIH

5.	M17	Zamjena dilatacionih naprava naprave obalnom stubu broj 1 i stubu 6 most M17-006-196 preko rijeke Bosne u Donjoj Golubinji, Bosna II, na cesti M17, dionica Ozimica-Topčić polje, km 13+681 (M 17.0-2-15)	Izvođenje	90.000	127.000			-	Ponovljeni tender u pripremi
			Nadzor	3.500	5.000			-	
6.	M17.3	Sanacija mosta (M17.3-002-323) preko rijeke Bregave u Stocu, na cesti M17.3, dionica Stolac 2-Hutovo, km 0+139	Projektovanje	15.000	20.000			-	Projektni zadatak u pripremi
			Revizija	2.000	2.500			-	
7.	M14.2	Sanacija mosta M14.2-004-494 preko rijeke Unac u Drvaru, na cesti M14.2, dionica Pasjak-Resanovci, km 7+035	Projektovanje	18.000	25.000			-	Projektni zadatak u pripremi
			Revizija	3.000	3.000			-	
8.	M5	Rekonstrukcija mosta (M5-010-290) preko Oboračke rijeke, na cesti M5, dionica Donji Vakuf 1 – Turbe, km 4+577	Projektovanje	15.000	20.000			-	Tender u toku
			Revizija	2.000	2.500			-	
9.	M5	Rekonstrukcija mosta (M5-010-291) preko Oboračke rijeke, na cesti M5, dionica Donji Vakuf 1 – Turbe, km 4+687	Projektovanje	15.000	20.000			-	Tender u toku
			Revizija	2.000	2.500			-	
10.	M17	Rekonstrukcija mosta (M17-017-325) preko rijeke Bune, na cesti M17, dionica Buna-Tasovčići, km 0+759	Projektovanje	50.000	50.000			-	Ugovor u pripremi
			Revizija	5.000	5.000			-	
11.	M20	Sanacija mosta (M20-008-206) preko rijeke Koline u Ustikolini, na cesti M20, dionica Foča 1 – Ustikolina, km 9+916	Projektovanje	25.000	30.000	Infra d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-12084/20. 31.12.2020.	25.237	-	U toku
			Revizija	3.000	3.000			-	
			Ukupno					-	
12.	M20	Sanacija mosta (M20-009-210) preko Odske rijeke u Mravinjcu, na cesti M20, dionica Ustikolina – Goražde 8, km 14+840	Projektovanje	30.000	35.000	Infra d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-12084/20. 31.12.2020.	23.002	-	U toku
			Revizija	3.500	4.000			-	
			Ukupno					-	
13.	M11	Rekonstrukcija tunela Užljebić (T11-001-36) , na cesti M11, dionica Ripač-Užljebić, km 7+582	Izvođenje	30.000	35.000			-	Žalba na Tender u toku
			Nadzor	3.500	4.000			-	
14.	M4	Izrada idejnog projekta sanacije/rekonstrukcije mosta preko rijeke Jale u Siminom Hanu na M4 dionica 012, Sinim Han-Donje Caparde 3 km0+214	Projektovanje	-	7.000	Infra d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-8956/20. 11.09.2020.	6.962	6.962	Okončano
			Konsult.usl.	-	1.000	Celab d.o.o.Kakanj 01-02.1-7899/20. 26.08.2020	1.123	1.123	
			Ukupno					8.085	
15.		Rekonstrukcija mosta preko rijeke Liješnice, na petlji Maglaj.općina Maglaj	Izvođenje	-	150.000			-	Aktivnost planirana u 2021.
UKUPNO				1.798.500	1.054.500			193.548	

Napomena: Red.br.15 sufinansiranje sa Općinom Maglaj

3.2.4.2. Sanacija oštećenih asfaltnih kolovoza

Red br.	Mag. Cesta	Naziv i opis projekta	Aktivnosti na projektu	Plan 2020.	Rebalans Plana 2020.	Izvođač/ Konsultant - ugovor	Ugovoreno	Realizovano 2020.	Napomena
1.	M 17.5	Sanacija asfaltnog kolovoza na M17.5 Rakitno –Posušje	Projektovanje	7.000	-			-	Okončano
			Izvođenje	286.000	284.000	KTM Brina d.o.o.Posušje, 01-02.4-7351/20. 15.07.2020.	283.974	283.467	

JP CESTE FEDERACIJE BIH

			Nadzor	7.000	7.000	Integra d.o.o.Mostar, 01-02.4-6386/20.12.06.2020.	6.950	6.950	
			Ukupno					290.417	
2.	M 18.1	Sanacija i rekonstrukcija asfaltnog kolovoza na M18.1: Ustikolina-Trnovo (Grebak), sa rješavanjem odvodnje	Projektovanje	7.000	7.000				-
			Izvođenje	793.000	793.000				-
			Nadzor	7.000	7.000	Arting BH d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-8525/20.27.08.2020.	5.959		-
			Ukupno						-
									Aktivnost planirana u 2021.
3.	M17	Sanacija asfaltnog kolovoza na M-17 prolaz kroz Jablanicu	Projektovanje	7.000	7.000	Arting BHd.o.o.Sarajevo, 01-02.2-9532/20.02.10.2020.	6.903	6.903	
			Izvođenje	286.000	286.000				-
			Nadzor	7.000	7.000				-
			Ukupno						6.903
									Okončano
4.	M5	Sanacija asfaltnog kolovoza na M5-Kapljuh	Izvođenje	500.000	474.600	I Selimović d.o.o. Cazin, 01-02.2-8308/20.19.08.2020	474.521	474.230	
			Nadzor	7.000	6.500	Design&QC d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-6989/20.03.07.2020.	6.435	6.435	
			Ukupno						480.665
									Okončano
5.	M4.2	Sanacija asfaltnog kolovoza M4.2 dionica 002	Izvođenje	800.000	300.000				-
			Nadzor	7.000	7.000				-
									Aktivnost planirana u 2021.
6.	M6	Sanacija asfaltnog kolovoza: Tasovčići-Masline	Projektovanje	7.000	-				-
			Izvođenje	300.000	289.000	HP Investing d.o.o.Mostar 01-02.4-7352/20.15.07.2020.	288.857		-
			Nadzor	7.000	5.300	Ipsa Institut d.o.o Sarajevo, 01-02.4-8593/20.31.08.2020	5.236		-
			Ukupno						-
									U toku
7.	M6	Sanacija asfaltnog kolovoza: Masline-Stolac	Projektovanje	7.000	-				-
			Izvođenje	250.000	260.500	HP Investing d.o.o.Mostar 01-02.4-7352/20.15.07.2020.	260.451		-
			Nadzor	7.000	5.300	Ipsa Institut d.o.o Sarajevo, 01-02.4-8593/20.31.08.2020	5.236		-
			Ukupno						-
									U toku
8.	M16.2	Rehabilitacija magistralne ceste M-16.2, dionica: Gornji Vakuf-Prozor	Projektovanje	20.000	20.000				-
									Aktivnost planirana u 2021.
9.	M4.3	Rehabilitacija magistralne ceste M-4.3, dionica: Bužim –Velika Kladuša	Izvođenje	500.000	-				-
			Nadzor	7.000	-				-
									Rebalansom nije planirano
10.	M4.3	Rehabilitacija magistralne ceste M4.3, dionica: Otoka-Bužim	Projektovanje	7.000	7.000				-
			Izvođenje	500.000	500.000				-
			Nadzor	7.000	7.000				-
									Aktivnost planirana u 2021.
11.	M17	Sanacija asfaltnog kolovoza, dionica: Ozimica-Nemila 0	Projektovanje	7.000	7.000				-
			Izvođenje	500.000	500.000				-
			Nadzor	7.000	7.000				-
									Aktivnost planirana u 2021.

JP CESTE FEDERACIJE BIH

12.	M5	Sanacija asfaltnog kolovoza i pješačke staze M5, dionica: Kamenica-Bedem	Izvođenje	600.000	591.000	BC Gradnja d.o.o. Bosanska Krupa, 01-02.2-7938/20.05.08.2020.	590.171	536.948	Okončano
			Nadzor	15.000	15.000	Konzorcij:Geo feld d.o.o.Bihać, Aber Design d.o.o.Sarajevo 01-02.2-9265/20.23.09.2020.	11.963	11.963	
			Ukupno					548.911	
13.	M16	Sanacija asfaltnog kolovoza Crna rijeka-Jajce jug	Projektovanje	7.000	7.000	-	-	-	Okončano
			Izvođenje	300.000	300.000	Mrkonjićputevi do.o.o. Mrkonjić Grad, 01-02.2-7086/20.08.07.2020.	299.345	289.152	
			Nadzor	7.000	7.000	Arting d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-7346/20.15.07.2020.	6.900	6.900	
			Ukupno					296.052	
14.	M5.1	Sanacija oštećenog asfaltnog kolovoza, dionica:Kaonik-Gromiljak-Blažuj	Izvođenje	343.000	343.000	Ceate Company d.o.o.Koseljak,01-02.2-9048/20.15.09.2020.	342.125	-	U toku
			Nadzor	7.000	7.000	Ipsa Institut d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-8338/20.20.08.2020	6.903	-	
			Ukupno					-	
15.	M17.4	Sanacija oštećenog asfaltnog kolovoza, dionica:Mostar-Čitluk	Izvođenje	343.000	336.100	Putovi d.o.o.Grude, 01-02.2-8340/20.20.08.2020	336.007	336.005	Okončano
			Nadzor	7.000	7.000	IGH d.o.o.Mostar, 01-02.2-8339/20.20.08.2020.	6.962	6.962	
			Ukupno					342.967	
16.	M4	Sanacija oštećenog asfaltnog kolovoza, dionica:Doboj-Donja Orahovica	Projektovanje	-	10.000			-	Aktivnost planirana u 2021.
17.	M4	Sanacija oštećenog asfaltnog kolovoza, dionica:Donja Orahovica-Šićki Brod 1	Projektovanje	-	10.000			-	Aktivnost planirana u 2021.
UKUPNO				6.483.000	5.427.300			1.965.915	

3.2.4.3. Sanacija klizišta, odrona, sanacija slijeganja trupa puta, kosina, usjeka i zasjeka

Red br.	Mag. Cesta	Naziv i opis projekta	Aktivnosti na projektu	Plan 2020.	Rebalans Plana 2020.	Izvođač/ Konsultant - ugovor	Ugovoreno	Realizovano 2020.	Napomena
1.	M5	Sanacija slijeganja trupa ceste, M-5_016, dionica: Azize Šaćirbegović – Koriya, km 1+450	Projektovanje	20.000	20.000			-	Aktivnost planirana u 2021
			Revizija	3.000	3.000			-	
2.	M17	Sanacija škarpe zasjeka na cesti M17, dionica :Jablanica – Potoci, potez Komadinovo Vrelo	Izvođenje	800.000	-			-	Rebalansom nije planirano
			Nadzor	7.000	-			-	
3.	M17	Sanacija škarpe zasjeka cesta M16.2, dionica 002 na potezu od km 13+000 – 15+150	Projektovanje	20.000	20.000			-	Aktivnost planirana u 2021
			Revizija	3.000	3.000			-	
4.	M16.2	Sanacija slijeganja trupa ceste, cesta M17_013, dionica:Jablanica 1-Potoci, km 1+400 i km 2+600	Projektovanje	20.000	20.000			-	Aktivnost planirana u 2021
			Revizija	3.000	3.000			-	
5.		Sanacija slijeganja trupa ceste i	Projektovanje	15.000	15.000			-	Aktivnost planirana u 2021

JP CESTE FEDERACIJE BIH

		rješavanje odvodnje na 001, Blaževac	Revizija	3.000	3.000			-	2021.
6.		Izrada projektne dokumentacije za novonastale sanacije slijeganja, klizišta i škarp	Projektovanje	100.000	100.000			-	Aktivnost planirana u 2021.
		Sanacija slijeganja trupa ceste na M18_010, dionica: Semizovac-Sarajevo_Malta, km 10+880				Design&QC d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-11972/20. 29.12.2020.	22.230	-	Projektov. u toku
		UKUPNO		994.000	187.000			-	

4. Eksproprijacija i elaborati eksproprijacije

U okviru Programa „Modernizacija cesta u FBiH“ koji se finansira iz sredstava kredita međunarodnih finansijskih institucija osnovni preduslov, za početak radova, je okončanje postupka eksproprijacije. Za projekte gdje su neophodne pripreme za eksproprijaciju, elaborati eksproprijacije, kao i vještačenja i konsultantske usluge (pravna pomoć) JP Ceste F BiH su u izvještajnom periodu za ove aktivnosti realizovale iznos od 7,23 mil.KM, što je 9% više od planiranih 6,61 mil.KM.

Red. br.	O P I S	Plan 2020.	Rebalans Plana 2020.	Izvođač/ Konsultant - ugovor	Ugovoreno	Realizovano 2020.	Napomena
	Elaborati eksproprijacije i pripreme faze za eksproprijaciju (vještačenja, pretvorbe zemljišta. i sl.)						
	-obilaznica Goražda, ažuriranje i dopuna elaborata eksproprijacije			Geodet d.o.o.Sarajevo 01-02.1-1744/20. 05.020.2020.	5.280	5.280	Okončano
	Izgradnja trake za uključivanje naselja Zalik na M17			Geodata d.o.o.Mostar, 01-02.4-11036/20. 27.11.2020.	1.170	-	U toku
	Pripreme faze za eksproprijaciju (vještačenja, pretvorbe zemljišta. i sl.)						
	Vještačenja						
	- Izgradnja ceste Neum-Stolac, dionica: Hutovo-Cerovica				43.451	43.451	
	- Cerovica-Stolovo-Drenovac				75.094	75.094	
	- Treća traka- sanacija kolovoza i korekcija osovine Bihać 4-Ripač,				16.959	16.959	
	- Rekonstr.ceste devijacija puta AVNOJ-a				971	971	
	- Treća traka Donji Vakuf-Turbe				6.701	6.701	
	- Treća traka Bos Petrovac-Drvar				1.554	1.554	
1.	- Izgradnja južne obilaznice Mostara	300.000	310.000		1.791	1.791	
	- Izgradnja Obilaznice Velika Kladuša				600	600	
	- Izgradnja Obilaznice Bihaća				3.883	3.883	
	- Izgradnja Obilaznice Kiseljaka				4.109	4.109	
	- Izgradnja Obilaznice Bužim				987 7.116	8.103	Okončano
	- Rekonstrukcija raskrsnice cesta M-14.2 i M-5 u Bosanskom Petrovcu				4.151	4.151	
	- Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok, cesta M-17-skretanje Hadžići				474	474	
	- Izgradnja magistralne ceste Bihać - Bosanska Krupa				119	119	
	- Rekonstrukcija raskrsnice Babin Do, dionica Neum-Stolac				10.538	10.538	
	- Sanacija mosta preko rijeke Bunte u Gračanici (M16.2-001-280) dionica Bugojno 2 – Gornji Vakuf, km 8+152				237	237	
	- Rekonstrukcija ceste dionica: Kaonik - Gromljak, potez „Delfine krivine“				5.870	5.870	
	- Izgradnja kružnog toka na izlazu Prispa, na dionici: Gorica-Vitina, općina Grude, I faza				16.449	16.449	
	- Izgradnja pješačkog prelaza preko ceste M17 u naselju Nemila				403	403	

JP CESTE FEDERACIJE BIH

- Izgradnja tunela Žaba				11.384	11.384	
- rekonstrukcija raskrsnice Kamenica M5 i R 403a				2.431	2.431	
- Dogradnja petlje Šićki				771	771	
- Rekonstrukcija raskrsnice Čitluk, općina Posušje				1.423	1.423	
- Izgradnja kružnog toka Turbe-Nević Polje, Kalibunar				1.898	1.898	
- Izgradnja rotora Varda				11.208	11.208	
- Rekonstrukcija raskrsnice na obilaznici Livna u kružni tok – križanje M15 i ul. Blajburških žrtava				356	356	
- Rekonstrukcija ceste Izačić Vrkašić-Kamenica				710	710	
- Livno – Suica – Kupres, Borova Glava+ Trivunove krivine				2.565	2.565	
- Jajce jug-Donji Vakuf , presvlačenje i ispravka osovine				6.314	6.314	
Konsultantske usluge –pravna pomoć						
- Rekonstrukcija raskrsnice Šip				3.558	3.558	
- Rekonstrukcija raskrsnice cesta M-14.2 i M-5 u Bosanskom Petrovcu				1.000	1.000	
- Izgradnja kružnog toka Turbe-Nević Polje, Kalibunar				1.956	1.956	
- Izgradnja Obilaznice Bužim				290	290	
UKUPNO			300.000	310.000		252.601

U slijedećoj tabeli navedeni su projekti gdje je potrebno uraditi i gdje se radila eksproprijacija:

Red. br.	Mag. Cesta	NAZIV PROJEKTA	Plan 2020.	Rebalans Plana 2020.	Realizovano 2020.
1.	M17.3	Neum – Stolac			2.148.827
2.	M6.1	Južna Obilaznica Mostara, servisna saobraćajnica na dionici Međine - Miljkovići i dionici Miljkovići – Rodoč - veza na M17			32.259
3.	M14	Obilaznica Bihaća, dionica Izačić - Kamenica, cca 3 km			
4.	M16.4	Obilaznica Bugojna			
5.	M4.2	Obilaznica Cazina			
6.	M6	Južna obilaznica Gruda (I faza)			
7.	M14.1	Izgradnja magistralne ceste Bihać - Bosanska Krupa, Srbaljansko – Grmuški plato, L= 25 km			16.740
8.	M5	Rekonstrukcija raskrsnice cesta M-5 i R-403 u Kamenici			
9.	M5	Bihać: Devijacija pored Robota i Doma zdravlja Bihać			
10.	M1.8	Rekonstrukcija raskrsnice ceste M-1.8 u Špionici dionica (003), km 21+200			
11.	M18	Rekonstrukcija raskrsnice ceste M-18 "Husino" dionica (006), km 2+500			270.779
12.	M4	Rekonstr. raskrsnice ceste M-4 i lokane ceste za Bistarac, dionica (010): Donja Orahovica-Šićki Brod, km 23+500	5.700.000	6.300.000	
13.	M6.1	Rekonstrukcija ceste M-6.1, dionica (010), km 9+000 do 10+000 Dobrič			
14.	M5	Rekonstrukcija raskrsnice M-5 i lokalne ceste Dolac na Lašvi, dionica (011), km 10+200-9+950			
15.	M5	Izgradnja pješačke staze u neslju Izačić, M5_001, km 2+450 – km 3+000			
16.	M1.8	Rekonstrukcija raskrsnice u naselju Čehaje			
17.	M17	Topčić Polje – Lašva 0, km 1+600 i km 3+880			
18.	M18	Priboj 2 – Simin Han 0, km 9+100 – km 9+200			
19.	M18	Priboj 2 – Simin Han 1, km 11+050 do km 21+300			
20.	M5	Rekonstrukcija ceste dionica: Kaonik - Gromljak, potez „Delfine krivine“			148.301
21.	M15	Kamičak – Ključ, km 17+000			
22.	M4	Magistralna cesta Doboj - Tuzla, dionica Drežnik (bolnica „Kreka“) - petlja Šićki Brod			
23.	M6	Rekonstrukcija raskrsnice za Kravice, dionica: 002; km 12+400			

JP CESTE FEDERACIJE BIH

24.	M6.1	Izgradnja pješačke staze na dionici: Mostar - Široki brijeg, kroz naseljeno mjesto Međine			
25.	M6	Rješenje odvodnje magistralne ceste na ulazu u Stolac, II faza			
26.	M4.2	Sanacija klizišta, cesta M-4.2_002, dionica 002: Skokovi - Srbljani, km 13+350			
27.	M18	Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok na Šipu, općina Centar, Sarajevo			
28.	M14	Izgradnja kružnog toka u Bosanskoj Krupi (kolodvor) dionica 002			
29.	M15	Izgradnja kružnog toka u Sanskom Mostu na spoju cesta M-15 i R-405 dionica 003			
30.	M5	Rekonstr. raskrsn. cesta M-5 i M-16.4 u kružni tok, M-5, (012), km 0+000 (Nević Polje)			
31.	M18	Rekonstruk. raskrsnice cesta M-17 i ulice Safeta Zajke u kružni tok, M-17, (008), km 7+350			
32.	M5	Rekonstrukcija raskrsnica na obilaznici Viteza			
33.	M18	Rekonstrukcija raskrsnica na cesti M-18 u kružne tokove (prolaz kroz Vogošću)			
34.	M17	Izgradnja potpunjaka za naselje Nemila, M-17			
35.	M17	Rekonstrukcija crne tačke Bulajića krivina na M-17 013, km 35+80 do 36+800			
36.	M5	Izgradnja traka za spora vozila, Bihać - Bos.Petrovac, dionica: Ripač - Dubovsko			45.796
37.	M18	Izgradnja ceste Potpaklenik - Kladanj, Karaula			
38.	M17	Izgradnja pješačkog prelaza izvan nivoa kolovoza za naselje Nemila, km 4+700			
39.	M4.3	Izgradnja Obilaznice Bužim			951.631
40.	M5	Izgradnja treće trake Kobiljača			166.926
41.	M6.1	Izgradnja trake Tomislavgrad-Široki			71.035
42.	M5	Rekonstrukcija ceste devijacija puta V korpusa AVNOJ-a			653.675
43.	M5	Treća traka Donji Vakuf-Turbe			37.819
44.	M5	Izgradnja Obilaznice Donji Vakuf			1.714
45.	M20	Rekonstrukcija raskrsnice Goražde-Ustiprača km 0+550, na Obilaznici Goražda			240.682
46.	M5	Rekonstrukcija raskrsnice cesta M-14.2 i M-5 u Bosanskom Petrovcu			20.539
47.	M17.3	Izgradnja Obilaznice Stoca			
48.	M18	Treća traka Čevljanovići – Nišići			
49.	M6	Izgradnja kružnog toka na izlazu Prispa, na dionici: Gorica-Vitina, općina Grude, I faza			93.125
50.		Izgradnja Obilaznice Kiseljaka			1.140.849
51.		Izgradnja Obilaznice Odžaka-Sjeverni krak			100.278
52.		Izgradnja kružnog toka Turbe-Nević Polje, Kalibunar			3.780
53.		Treća traka Bos Petrovac-Drvar			42.512
54.		Izgradnja Obilaznice Velika Kladuša			7.240
55.		Rekonstrukcija raskrsnice Čitluk, općina Posušje			71.157
56.		Rekonstrukcija raskrsnice na obilaznici Livna u kružni tok – križanje M15 i ul. Blajburških žrtava			3.780
57.		Rekonstrukcija ceste Jajce jug potez tunel Skela			699.397
58.		Sanacija crne tačke Trivunove krivine			9.899
		UKUPNO	5.700.000	6.300.000	6.978.740

5. Projekti iz Budžeta Federacije BiH i sufinansiranja iz drugih nivoa vlasti

- a) Vlada F BiH je Odlukom o usvajanju Programa utroška dijela sredstava „Kapitalni transferi javnim preduzećima – transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta“ V broj: 1155/2019. od 10.10.2019. utvrđenih Budžetom F BiH za 2019. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija, odredila JP Ceste F BiH za implementatora sredstava slijedećih projekata:

JP CESTE FEDERACIJE BIH

1. Izgradnja brze ceste Lašva-Nević polje - prolaz kroz zonu Vitez u iznosu od 34,00 mil.KM (eksprijacija - 3,00 mil.KM, izvođenje - 30,00 mil.KM i nadzor - 1,00 mil.KM),
2. Izgradnja Južne obilaznice Mostara u iznosu od 7,00 mil.KM (eksprijacija - 1,50 mil.KM, izvođenje i nadzor - 5,50 mil.KM),
3. Projekat izgradnje i rješavanja spoja magistralnih cesta M6.1 i M17, te sanacija i rekonstrukcija magistralnih cesta u gradu Mostaru 13,00 mil.KM (projektiranje - 0,50 mil.KM, eksprijacija 0,80 mil.KM, izvođenje - 11,00 mil.KM i nadzor - 0,70 mil.KM) i
4. Poddionica: Šićki Brod - Đurđevik na trasi ceste Tuzla - Sarajevo u iznosu od 40,00 mil.KM (izvođenje - 35,00 mil.KM, nadzor - 3,00 mil.KM i studijsko tehničku dokumentaciju - 2,00 mil.KM).

U Budžetu F BiH za 2020 godinu, na poziciji „Kapitalni transferi javnim preduzećima - Transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta“, Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija je odobren iznos od 100 mil.KM. Međutim, Vlada F BiH je donijela Odluku V broj 300/2020. „Kapitalni transferi javnim preduzećima – transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta“ sa izmjenjenim projektima i budžetima na sljedećim projektima:

- Izgradnja Južne obilaznice Mostara u iznosu - 2,00 mil.KM;
- Sanacija i rekonstrukcija ceste M15, dionica: granica entiteta – Sanski Most 1-Kamičak- projekat nije obuhvaćen Odlukom i
- Izgradnja gradskog autoputa u Sarajevu, dionica Stup-Buća potok – 6,00 mil.KM

U skladu sa navedenom Odlukom V broj: 300/2020, potpisan je Ugovor o implementaciji projekata za 2020.godinu, između Federalnog ministarstva prometa i komunikacija i JP Ceste F BiH broj:01-02.1-3827/20 od 26.03.2020. kojim su detaljno regulisana prava i obaveze potpisnika u vezi implementacije projekata, kao i način implementacije sredstava.

Posljedice coronavirusa uticale su i na Budžet F BiH za 2020.godinu, pa je donesen Rebalans Budžeta F BiH za 2020 godinu, između ostalih, sa izmjenama koje se tiču kapitalnih transfera javnim preduzećima. Vlada F BiH je nakon usvajanja Rebalansa Budžeta F BiH za 2020.godinu, donijela Odluku V broj: 806/2020. od 18.06.2020. kojom je izmijenila Odluku V broj:300/2020. godina. Izmjene su odnosile se na smanjenje predviđenih budžeta i promjenu strukture ulaganja za sljedeće projekte:

1. Izgradnja brze ceste Lašva – Nević polje – prolaz kroz poslovnu zonu Vitez - 10,00 mil.KM;
2. Poddionica Šićki Brod – Đurđevik na trasi ceste Tuzla – Sarajevo – 12,50 mil.KM.

U donjoj tabeli navedeni su projekti i izmjene budžeta u skladu sa Odlukama Vlade F BiH, kao i realizacija u 2020.godini:

Red br.	Mag. Cesta	Naziv i opis projekta	Aktivnosti na projektu	Plan 2020.	Rebalans Plana 2020.	Izvođač/ Konsultant - ugovor	Ugovoreno	Realizovano 2020.	Napomena
1.	M6.1	Izgradnja južne obilaznice Mostara	Eksprijacija	1.000.000	1.000.000			-	Okončano
			Izvođenje					-	
			Nadzor	6.000.000	1.000.000	GP:IGH d.o.o.Mostar i Institut IGH d.d.Zagreb 01-02.1-11217/18 13.12.2018. anex GP:IGH d.o.o.Mostar i Institut IGH d.d.Zagreb 01-02.1-4782/20. 22.04.2020.	144.612 14.409	20.755	

JP CESTE FEDERACIJE BIH

		-dionica Miljkovići –Rodoč, veza na M17, potez rotor Varda (P231)-ulaz u tunel Novi (P280), L=1,516m, uključujući vijadukt „Marijanovića Draga“, L=200m			GP: IGH d.o.o. Mostar i Institut IGH d.d. Zagreb, 01-02.1-8388/20. 24.08.2020.	391.365	39.043	U toku	
			Ukupno				59.798		
2.	M5	Izgradnja brze ceste Lašva-Nević polje –prolaz kroz poslovnu zonu Vitez	Eksproprijacija	3.500.000	3.500.000		-	Eksproprij. u toku	
			Izvođenje	10.000.000	6.000.000		-		
			Nadzor	500.000	500.000		-		
3.	M17 M6.1	Izgradnja i rješavanje spoja magistralnih cesta M6.1 i M17, ta sanacija i rekonstrukcija magistralnih cesta u gradu Mostaru	Projektovanje	135.000	135.000		56.135	U toku	
			Eksproprijacija	750.000	760.000		-		
			Izvođenje	11.790.000	11.779.500		1.417.929		
			Nadzor	325.000	325.500		15.386		
			Ukupno				1.489.450		
4.	M18	Tuzla –Sarajevo, poddionica: Šiški Brod-Đurđevik	Projektovanje	2.500.000	3.500.000		-	Žalba na tendere: Glavni proj Lot-2 Idejni projekt Lot1 i LOT 3 U toku	
			Eksproprijacija	2.000.000	2.500.000		-		
			Izvođenje	9.000.000	6.000.000		-		
			Nadzor	500.000	500.000		-		
5.	M15	Sanacija i rekonstrukcija ceste M-15. dionica: granica entiteta –Sanski Most 1-Kamičak	Izvođenje	980.000	-		-	Nije planirano	
			Nadzor	20.000	-		-		
6.		Izgradnja gradskog autoputa u Sarajevu, dionica: Stup- Buća potok	Projektovanje		6.000.000	GP: Divel d.o.o., Ipsa Institut d.o.o. PPG d.o.o., Saraj inenjeri d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-10265/20. 29.10.2020	1.604.105	65.300	Projektiranje u toku Tender za reviziju u toku
UKUPNO				49.000.000	43.500.000		1.614.548		

Za projekat „Izgradnja i rješavanje spoja magistralnih cesta M6.1 i M17, ta sanacija i rekonstrukcija magistralnih cesta u gradu Mostaru“ na pojedinim dionicama je predviđena kompletna izmjena komunalnih instalacija koje su u nadležnosti Grada Mostara. U cilju efikasnije realizacije projekta zaključen je „Sporazum o implementaciji pojedinih dionica kroz grad Mostar“ na temelju kojeg dionice implementira Grad Mostar. Sporazum, broj: 01-02.1-4691/20 od 20.04.2020. godine su potpisali FMPiK, Grad Mostar i JP Ceste FBiH.

Podprojekti projekta: „Izgradnja i rješavanje spoja magistralnih cesta M6.1 i M17, te sanacija i rekonstrukcija magistralnih cesta u gradu Mostaru“ navedeni su u sljedećoj tabeli:

Red. br.	Naziv	Aktivnost	Planirani Iznos	Izvođač/ Konsultant - ugovor	Ugovoreno	Realizovano 2020.	Napomena
3.1	Rješavanja spoja magistral. cesta M6.1 i M17 – Sjeverni ulaz u Mostar	Eksprop.	500.000			-	U toku pribavljanje urbanističke suglasnosti
		Radovi	4.000.000			-	
		Nadzor	121.500			-	
3.2	Sanacija dionice M6.1, od Španjolskog trga do Doma zdravlja	Radovi	169.000	HP Investing d.o.o. Mostar 01-02.4-5587/20. 15.05.2020.	162.543	162.367	Okončano
		Nadzor	6.000	Integra d.o.o. Mostar, 01-02.4-4661/20. 20.04.2020.	5.850	5.850	
		Ukupno				168.217	
3.3	Sanacija dijela prometnice od raskrižja kod Doma zdravlja do ulaza na parking Doma	Radovi	224.500	HP Investing Mostar 01-02.1-	198.184	197.889	Okončano Nadzor nije

JP CESTE FEDERACIJE BIH

	zdravlja			4691/20			fakturisan Sporazum grad Mostar, FMPiK I JP Ceste FBiH
		Nadzor				-	
		Ukupno				197.889	
3.4	Rekonstrukcija Ulice kralja Tomislava (Avenija) – (Vodovod i kanalizacija)	Radovi	4.150.000	HP Investing, d.o.o.Mostar 01-02.1-4691/20	2.951.916	641.152	U toku Sporazum grad Mostar, FMPiK I JP Ceste FBiH
		Nadzor		Cadoro-Ing d.o.o.Mostar,01-02.1-4691/20	28.949	5.393	
		Ukupno				646.545	
3.5	Izgradnja rotora na križanju Ulica kralja Tomislava i Rudarska	Radovi	500.000	HP Investing, d.o.o.Mostar 01-02.1-4691/20	713.962	101.822	U toku Sporazum grad Mostar, FMPiK I JP Ceste FBiH
		Nadzor		Cadoro-Ing d.o.o.Mostar, 01-02.1-4691/20	7.002	1.304	
		Ukupno				103.126	
3.6	Rješavanje oborinskih voda sa M 17 u naselju Mazoljice	Projektir.	20.000	Design&QC d.o.o.Sarajevo, 01-02.4-7377/20. 15.07.2020.	13.806	-	Projekt. u toku
		Eksproprij.	78.000			-	
		Revizija	2.000	Integra d.o.o. Mostar, 01-02.4-11559/20, 15.12.2020.	1.989	-	
		Radovi	700.000			-	
		Nadzor	21.000			-	
		Ukupno				-	
3.7	Rekonstrukcija raskrižja na Španjolskom trgu	Projektir.	20.000	Integra d.o.o.Mostar, 01-02.4-5184/20. 05.05.2020	13.923	4.446	Projektovanje u toku
		Revizija	2.000	Interprojekt d.o.o.Mostar, 01-02.4-5230/20. 06.05.2020.	1.989	-	
		Radovi	498.000			-	
		Nadzor	15.000			-	
		Ukupno				4.446	
3.8	Rekonstrukcija raskrižja kod Hotela Ero	Projektir.	25.000	Integra d.o.o.Mostar, 01-02.4-6384/20. 12.06.2020.	14.391	4.680	Projektovanje u toku
		Revizija	2.500	Interprojekt d.o.o.Mostar, 01-02.4-6964/20. 03.07.2020.	2.457	-	
		Radovi	497.500			-	
		Nadzor	15.000			-	
		Ukupno				4.680	
3.9	Rekonstrukcija raskrižja kod zgrade Mostarka	Projektir.	22.500	Routing d.o.o. Banja luka, 01-02.4-6139/20. 05.06.2020.	15.058	8.282	Projektovanje u toku
		Revizija	2.500	Interprojekt d.o.o. Mostar, 01-02.2-8490/20. 26.08.2020	2.340	1.170	
		Ukupno				9.452	
3.10	Rekonstrukcija raskrižja Ilička ul. naselje Balinovac	Projektir.	22.500			-	Sporazum grad Mostar, FMPiK i JP Ceste FBiH
		Revizija	2.500			-	
3.11	Izgradnja trake za uključivanje naselja Zalik na M17	Projektir.	20.000	INK Constructor d.o.o.Banja luka, 01-02.4-5350/20. 08.05.2020.	13.104	13.104	Okončano projektovanje I revizija
		Revizija	2.000	Integra d.o.o.Mostar, 01-02.4-5229/20 06.05.2020.	1.989	1.989	
		Radovi	171.000			-	
		Nadzor	7.000			-	

JP CESTE FEDERACIJE BIH


		Ukupno				15.093	
3.12	Izgradnja dionice Španjolski trg – Hotel Ero:	Radovi	669.500	HP Investing, d.o.o.Mostar 01-02.1-4691/20	1.553.783	314.699	Radovi u toku Sporazum grad Mostar, FMPiK i JP Ceste FBiH
		Nadzor		Cadoro-Ing d.o.o.Mostar, 01-02.1-4691/20	15.237	2.839	
		Ukupno				317.538	
3.13	Rekonstrukcija ceste M17.4, od ulaza u naselje Zalik do spoja sa M17	Projektir.	45.000	INK Constructor d.o.o. Banja luka, 01-02.4-6383/20. 12.06.2020.	18.018	18.018	Okončano
		Revizija	5.000	Interprojekt d.o.o.Mostar, 01-02.4-7350/20. 15.07.2020.	4.446	4.446	
		Ukupno				22.464	
3.14	Sanacija i rekonstrukcija kružnog toka na M17, na južnom ulazu u Mostar	Radovi	450.000			-	Sporazum grad Mostar, FMPiK i JP Ceste FBiH
		Nadzor	13.500			-	
U K U P N O			13.000.000			1.489.450	

Red.br.- 3.3;3.4;3.5;3.10;3.12 i 3.14 -Sporazum grad Mostar, FMPiK i JP Ceste FBiH.

Potpisan je „Sporazum o zajedničkoj implementaciji projekta rekonstrukcije XII transferzale na magistralnoj cesti M-18, lokalitet Stupska petlja - Granica Entiteta“ sa Ministarstvom saobraćaja Kanton Sarajevo, broj: 01-02.1-14475/19. dana 18.12.2019. godine, gdje predviđena dogradnja još jedne kolovozne trake.

Sporazumom je predviđeno da Kanton Sarajevo obezbjedi nepovratna sredstva za izvođenje radova i eksproprijaciju, a da JP Ceste F BiH obezbjedi sredstva za izradu projektne dokumentacije, reviziju, prikupljanje neophodnih saglasnosti, odbrenje za građenje, te nadzor nad izvođenjem radova. Implementator projekta je JP Ceste F BiH.

Pripremljen je Idejni projekat uz suglasnost Zavoda za planiranje KS. Podnešen je zahtjev Ministarstvu prostornog uređenja KS za izdavanje urbanističke suglasnosti. S obzirom da se ovo Ministarstvo oglasilo nenadležnim zahtjev je upućen FMPU, koje se također proglasilo nenadležnim. Zbog nastalog problema upućen je pismeni zahtjev za sastanak, Ministarstvu saobraćaja KS, ali i pored telefonskih urgencija do danas se nije održao.

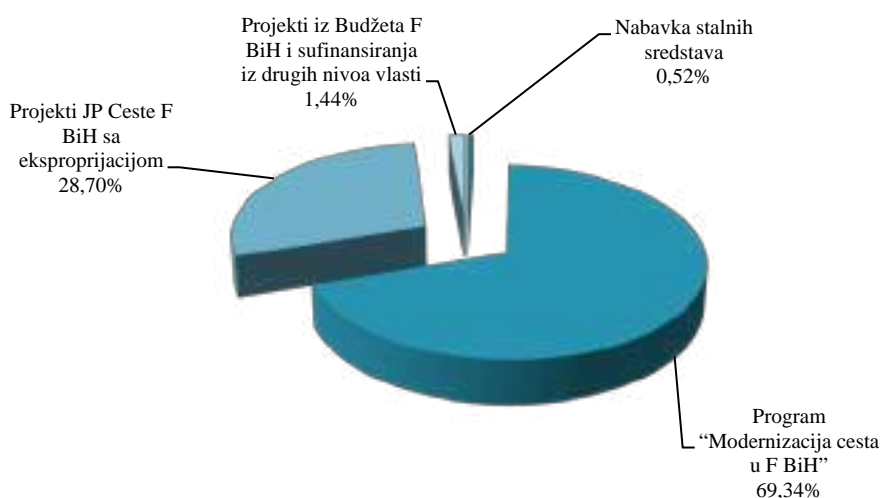

Grafički prikaz strukture investicija

D. ODJEL ZA JAVNE NABAVKE

Izvještaj o radu je urađen na bazi raspoloživih podataka, i odnosi se na nabavke provedene po Zakonu o javnim nabavkama BiH.

Nabavke za navedeni period su realizovane u skladu sa Privremenim planom nabavki za 2020.godinu koji je usvojen i objavljen 7.1.2020.godine, i sa Planom nabavki za 2020.godinu koji je usvojen i objavljen 14.4.2020.godine.

Za navedeni period na osnovu provedenih postupaka nabavki ugovoreno je 334 ugovora u iznosu od 78.006.241 KM. U izvještaj su uključeni i:

- ugovori za postupke nabavke koji pokrenuti po Planu nabavki iz 2019 godine, a potpisani u 2020 godini,
- kao i ugovori koji su potpisani u 2020.godini.

Ugovorene nabavke po vrstama postupaka uključujući vrijednosti

Vrsta postupka nabavke	Iznosi u KM (sa PDV-om)	Broj ugovora
Ukupno	78.006.241	334
Otvoreni	38.873.546	127
Konkurentski	229.816	22
Pregovarački	1.197.309	15
Direktni sporazumi	735.314	145
Neprioritetne usluge	92.168	6
Ograničeni postupak	36.878.088	19

Za pet (5) postupaka nabavki procjena ponuda je u toku.

Za dvadesetsedam (27) postupaka nabavki, donesene odluke o dodjeli ugovora i čeka se ugovaranje.

Pet (5) postupaka nabavke je pokrenuto i čekaju se ponude.

Žalbe

U toku 2020.godini podneseno je 40 žalbi, od kojih su 34 žalbe rješene i postupci nastavljani/ponovljeni. Šest žalbi je na rješavanju u Uredu za žalbe BiH.

E. PRAVNI I KADROVSKI POSLOVI

Sektor pravnih, kadrovskih i općih poslova JP Cesta F BiH sve svoje poslove i aktivnosti bazira na primjeni svih pozitivnih zakonskih propisa koji su doneseni i važe u F BiH, odnosno u državi BiH kao i svih izmjena i dopuna koje se donesu u planiranoj godini.

Svi pravni poslovi se dijele na sve oblasti prava i to prvenstveno na oblast privrednog prava, gdje se reguliše rad privrednih društava, javnih preduzeća itd.. kao i oblast parničnih, vanparničnih, prekršajnih, izvršnih i upravnih postupaka i imovinsko-pravnih poslova.

Najveća aktivnost ovog pravnog Sektora usmjerena je na organizaciju i zastupanje JP Ceste F BiH pred nadležnim sudovima u F BiH, u BiH i u pojedinim predmetima i u regionu.

Vođene su aktivnosti na pokretanju tužbi, gdje se kao tužilac pojavljuje JP Ceste F BiH, kao i pokretanje izvršnih prijedloga na temelju pravosnažnih i izvršnih presuda protiv korisnika koji redovno ne plaćaju svoje obaveze, te pokretanje tužbi za naknadu štete na cestovnoj opremi i sl.

Izdvajamo također i aktivnosti na regresnim tužbama gdje za to postoje zakonski uslovi.

JP CESTE FEDERACIJE BIH

U sudskim postupcima gdje se JP Ceste F BiH pojavljuje u ulozi tužitelja, broj aktivnih tužbi JP Ceste F BiH protiv trećih lica na dan 31.12.2020.god. iznosi 28 predmeta (naplata za cestovno zemljište, regresne tužbe i oštećenje cestovne opreme), a podnesena je 1 tužba.

U predmetima gdje je JP Ceste F BiH tužena strana, u izvještajnom periodu podneseno je 69 novih tužbi. Broj aktivnih tužbi protiv JP Ceste F BiH na dan 31.12.2020.god. iznosi 258 predmeta.

U oblasti imovinsko-pravnih poslova vodile su se aktivnosti na provođenju postupka eksproprijacije nepokretnosti, zaključivanju sporazuma o naknadi na planiranim projektima kao i onim već otpočetim te zastupanje pred organima uprave-uglavnom općinskim radi sporazumnog određivanja naknada za izuzete nekretnine kao i zastupanje pred svim sudovima (vanparnični i parnični postupak) u okviru rješavanja imovinsko-pravnih poslova.

U izvještajnom periodu su obavljane aktivnosti na usklađivanju akata JP Ceste F BiH sa izmjenama i dopunama pozitivnih propisa, kao i aktivnosti na izradi nacрта i prijedloga opštih akata preduzeća za usvajanje od strane nadležnih organa JP Ceste F BiH. Potrebno je naglasiti da je u izvještajnom periodu usvojen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji JP Ceste F BiH broj: 01-03.2NO-4772-5/20 od 30.04.2020.god. kao i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu JP Ceste F BiH broj: broj: 01-12034-3/20 od 30.12.2020.god.

U periodu 01.01.- 31.12.2020. godina obavljane su aktivnosti koje se odnose na sve stručne i administrativne poslove vezane za rad i funkcionisanje organa JP Ceste F BiH i to: Uprave, Odbora za reviziju, Nadzornog odbora i Skupštine društva.

Vršene su pripreme sjednica organa JP Ceste F BiH, pripremanje i distribucija materijala za iste kao i aktivnosti vezane za realizaciju odluka i zaključaka sa sjednica Skupštine JP Ceste F BiH, Nadzornog odbora i Uprave ovog preduzeća.

U izvještajnom periodu održane su 4 sjednice Skupštine, 8 redovnih (4 sjednice u starom sazivu, konstituirajuća i 3 radne sjednice u novom sazivu) i dvije vanredne sjednice Nadzornog odbora (u starom sazivu), 6 redovnih i jedna vanredna sjednica Odbora za reviziju i 24 redovne i jedna vanredna sjednica Uprave JP Ceste F BiH.

Potrebno je istaći da je Odboru za reviziju JP Ceste F BiH koji je odlukom Vlade F BiH V.broj: 1412/16 od 24.6.2016.godine a koja je stupila na snagu 14.7.2016.god. imenovan na period od 4 godine, istekao mandat dana 14.7.2020.god.

Komisija za odabir i predlaganje kandidata Odbora za reviziju, imenovana Odlukom Nadzornog odbora broj: 01-03.2 NO-4772-1/20 od 30.4.2020. godine, provela je konkursnu proceduru ali do kraja izvještajnog perioda Odbor za reviziju nije imenovan.

U skladu sa Odlukom o davanju prethodne saglasnosti za razriješenje dužnosti članova Uprave JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo V.broj: 329/2020 koju je Vlada F BiH donijela na svojoj sjednici dana 28.2.2020.god., Nadzorni odbor JP Ceste F BiH je dana 5.3.2020.god. razriješio članove Uprave JP Ceste F BiH zbog isteka mandata a kako slijedi:

1. Direktor JP Ceste F BiH Ljubo Pravdić dipl.ing.građ. razriješen Odlukom Nadzornog odbora broj: 01-03.2 NO- 2711-2/20 od 5.3.2020.god.
2. Izvršni direktor za tehničke poslove JP Ceste F BiH Dedo Pjanić dipl.ing.građ. razriješen Odlukom Nadzornog odbora broj: 01-03.2 NO- 2711-3/20 od 5.3.2020.god.
3. Izvršni direktor za za ekonomske i pravne poslove JP Ceste F BiH Bekir Isaković dipl.pravnik razriješen Odlukom Nadzornog odbora broj: 01-03.2 NO- 2711-4/20 od 5.3.2020.god.

U skladu sa Odlukom o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Uprave JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo V.broj: 330/2020 koju je Vlada Federacije BiH donijela na svojoj sjednici dana 28.2.2020.godine, Nadzorni odbor JP Ceste F BiH je dana 5.3.2020.god.

imenovao v.d. članove Uprave JP Ceste F BiH d.o.o. Sarajevo do okončanja konkursne procedure, a najduže na vremenski period do 12 mjeseci i to:

1. Za v.d. direktora JP Ceste F BiH Ljubo Pravdić dipl.ing.građ. imenovan Odlukom Nadzornog odbora broj: 01-03.2 NO - 2711-5/20 od 5.3.2020.god.
2. Za v.d. izvršnog direktora za tehničke poslove JP Ceste F BiH imenovan Nijaz Hadžikadunić dipl.ing.građ. Odlukom Nadzornog odbora broj: 01-03.2 NO- 2711-6/20 od 5.3.2020.god.
3. Za v.d. izvršnog direktora za ekonomske i pravne poslove JP Ceste F BiH imenovan Bekir Isaković dipl.pravnik Odlukom Nadzornog odbora broj: 01-03.2 NO- 2711-6/20 od 5.3.2020.god.

Nakon provedene konkursne procedure za imenovanje članova Uprave JP Ceste F BiH - Direktora i Izvršnog direktora za ekonomske i prave poslove, Vlada F BiH je dana 5.6.2020.god. donijela Odluku o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Ceste F BiH za razriješenje vršilaca dužnosti članova Uprave- v.d. Direktora Pravdić Ljube i v.d. Izvršnog direktora za ekonomske i pravne poslove Isaković Bekira V.broj: 760/2020.

Odlukom V.broj: 761/2020 od 5.6.2020.god. Vlada F BiH je dala prethodnu saglasnost Nadzornom odboru JP Ceste F BiH za donošenje odluke o imenovanju članova Uprave JP Ceste F BiH- Direktora Pravdić Ljubu i Izvršnog direktora za ekonomske i pravne poslove Isaković Bekira.

Odlukom Privremenog Nadzornog odbora broj: 01-03.2 NO- 8434-4/20 od 3.9.2020.god. za direktora JP Ceste F BiH je imenovan Ljubo Pravdić dipl.ing.građ.

Odlukom Privremenog Nadzornog odbora broj: 01-03.2 NO- 8434-3/20 od 3.9.2020.god. za izvršnog direktora za ekonomske i pravne poslove JP Ceste F BiH je imenovan Bekir Isaković dipl.pravnik.

Nakon provedene Konkursne procedure za izbor i imenovanje izvršnog direktora za tehničke poslove, na osnovu Odluke o davanju prethodne saglasnosti za razriješenje v.d. izvršnog direktora za tehničke poslove V.broj: 1354/2020 i Odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje člana Uprave JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo V.broj: 1355/2020 koje je Vlada Federacije BiH donijela na svojoj sjednici dana 8.10.2020.godine, Privremeni Nadzorni odbor je Odlukom broj: 01-03.2 NO- 9788-2/20 od 22.10.2020.god. razriješio vršioca dužnosti izvršnog direktora za tehničke poslove te Odlukom broj: 01-03.2 NO- 9788-3/20 od 22.10.2020.god. za izvršnog direktora za tehničke poslove JP Ceste F BiH imenovao Hadžikadunić Nijaza dipl.ing.građ.

Potrebno je naglasiti da je na osnovu Odluke Vlade F BiH o davanju prethodne saglasnosti za razriješenje dužnosti članova Nadzornog odbora JP Ceste F BiH V.broj: 965/20, Skupština JP Ceste F BiH svojom Odlukom broj: 01-03.2SK-7795-1/20 od 29.7.2020.god. razriješila dužnosti članove Nadzornog odbora JP Ceste F BiH radi isteka mandata i to: Enal Sarajlić (predsjednik Nadzornog odbora), Sulejman Bečirević (člana), Daliborka Marić (člana), Željko Petrović (člana) i Mehmed Hero (član).

Na osnovu Odluke Vlade F BiH o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP Ceste F BiH V.broj: 966/20, Skupština JP Ceste F BiH svojom Odlukom broj: 01-03.2SK-7795-2/20 od 29.7.2020.god. imenovala vršioce dužnosti članova Nadzornog odbora JP Ceste F BiH u sastavu: Anel Kljako (v.d. Predsjednika), Sulejman Bečirević (v.d. člana), Daliborka Marić (v.d. člana), Željko Petrović (v.d. člana) i Mustafa Abdulahović (v.d. člana) do okončanja konkursne procedure a najduže na vremenski period do 3 mjeseca počev od dana stupanja na snagu Odluke o imenovanju.

Na osnovu Odluke Vlade F BiH o davanju prethodne saglasnosti za razriješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP Ceste F BiH V.broj: 1414/20, Skupština JP Ceste F BiH svojom Odlukom broj: 01-03.2SK-10285-2/20 od 13.11.2020.god. razriješila vršioce dužnosti članova Nadzornog odbora JP Ceste F BiH radi isteka mandata

Na osnovu Odluke Vlade F BiH o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti

JP CESTE FEDERACIJE BIH

članova Nadzornog odbora JP Ceste F BiH V.broj: 1415/20, Skupština JP Ceste F BiH svojom Odlukom broj: 01-03.2SK-10285-3/20 od 13.11.2020.god. imenovala vršioce dužnosti članova Nadzornog odbora JP Ceste F BiH u sastavu: Anel Kljako (v.d.Predsjednika), Sulejman Bečirević (v.d. člana), Daliborka Marić (v.d. člana), Željko Petrović (v.d. člana) i Mustafa Abdulahović (v.d. člana) do okončanja konkursne procedure a najduže na vremenski period do 3 mjeseca počev od dana stupanja na snagu Odluke o imenovanju.

U oblasti općih poslova provodile su se aktivnosti na održavanju voznog parka, održavanju sistema mašinskih instalacija-grijanje i hlađenje, održavanju elektro i vodoinstalacija, održavanju radnih prostorija i poslovi protivpožarne zaštite te poslovi digitalnog protokola.

Takođe, u izvještajnom periodu su se obavljali poslovi iz oblasti radnih odnosa i kadrovski poslovi u skladu sa zakonom i opštim aktima. Obavljane su aktivnosti na prijemu novih radnika (poslovi sekretara Komisije i sačinjavanje svih potrebnih akata) u skladu sa Zakonom i opštim aktima JP Ceste BiH kao i redovne svakodnevne aktivnosti iz ove oblast.

- Kadrovski poslovi

Na dan 31.12.2020.god. obrazovna struktura radnika JP Ceste F BiH je sljedeća:

Red.br.	Vrsta školske spreme	Stanje 31.12.2020.
1.	Magistri nauka (građ. saob, ecc, komunikologije.)	4
2.	Magistri struke (saob. građ.ecc. arh; geografije)	14
3.	VSS građevinske struke	34
4.	VSS saobraćajne struke	2
5.	VSS ekonomske struke	7
6.	VSS pravne struke	13
7.	VSS geodetske struke	1
8.	VSS mašinske struke	1
9.	VSS infor.struke	2
10.	VSS društ.smjera	1
11.	VSS tehn.smjera	2
12.	VS (ing.građ.)	4
13.	VS (becheler ecc.)	2
14.	SSS građevinski tehničari	4
15.	SSS mašinske struke	1
16.	SSS saobraćajne struke	4
17.	SSS ekonomske struke	3
18.	SSS ostale struke (društ.,prir., tehn)	3
UKUPNO		102

U izvještajnom periodu jedan radnik je otišao u penziju, jedan radnik je na neplaćenom odsustvu, zasnovan je radni odnos na neodređeno vrijeme s 9 radnika dok je s dva radnika zasnovan radni odnos na određeno vrijeme.



Direktor:

Ljubo Pravdić, dipl.ing.građ.
