



**IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI
PLANA POSLOVANJA ZA PERIOD
01.01. -31.12.2023. GODINE**

Sarajevo; mart/ožujak 2024.

SADRŽAJ

	Strana
U V O D	3
A. I JAVNI PRIHODI	5
A. II AMORTIZACIJA	9
B. I JAVNI RASHODI	10
1. Troškovi poslovanja	11
2. Služba „Pomoć-informacije na cestama“	13
3. Redovno održavanje	16
4. Rezervirana sredstva za rizike, neplanirane rashode i rashode koji ne terete projekte	26
5. Rezervirana sredstva za sudske presude	27
6. Troškovi konsultantskih usluga	28
7. Kamate	30
B. II TROŠKOVI AMORTIZACIJE	33
C. INVESTICIJE	34
1. Nabavka stalnih sredstava	35
2. Program „Modernizacija cesta u F BiH“	36
3. Projekti JP Ceste F BiH	45
4. Eksproprijacija i elaborati eksproprijacije	71
5. Projekti iz Budžeta F BiH i sufinansiranja iz drugih nivoa vlasti	72
D. ODJEL JAVNE NABAVKE	75
E. PRAVNI I KADROVSKI POSLOVI	76

U V O D

Na osnovu Zakona o cestama u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH broj: 6/02. i 18/02.) i Rješenja Kantonalnog suda upisana je u sudski registar Direkcija cesta Federacije Bosne i Hercegovine, a sukladno Zakonom o javnim preduzećima FBiH („Službene novine F BiH“ broj: 8/05.) provedena je pravna procedura i Direkcija cesta Federacije BiH je nastavila sa radom pod nazivom: Javno preduzeće Direkcija cesta Federacije BiH društvo sa ograničenom odgovornošću, Sarajevo.

Vlada Federacije BiH je donijela Odluku V broj: 562/10., kojom je JP Direkcija cesta FBiH uskladila naziv, organizaciju poslova i zadataka, način upravljanja i rukovođenja i način transformisanja u „Javno preduzeće Ceste Federacije BiH d.o.o.“ („JP Ceste FBiH“). Zakonom o cestama FBiH („Službene novine F BiH br. 12/10., 16/12 i 66/13) registrovana je navedena promjena kod Općinskog suda Sarajevo Rješenjem o registraciji broj: 065-0-Reg-11-000713 marta 2011. godine. Sjedište Društva je u Sarajevu, na adresi Terezije 54.

JP Ceste F BiH su sačinile Plan poslovanja za 2023. godinu (u daljem tekstu: „Plan“) u skladu sa Zakonom o cestama F BiH, Zakonom o javnim preduzećima u F BiH, Statuta JP Ceste F BiH, koji je Nadzorni odbor JP Ceste F BiH usvojio 29.12.2022. godine Odlukom: 01-03.2NO-12111-1/22. Vlada F BiH je u svojstvu osnivača dala saglasnost, na isti, Odlukom V broj: 755/2023. od 01.06.2023. godine, dok je Skupština donijela Odluku o potvrđivanju Odluke o davanju saglasnosti na Plan poslovanja broj: 01-03.2SK-4771-1/23., 26.06.2023. godina. Kao što se iz navedenog vidi, za usvajanje Plana je proteklo pola godine, što se odrazilo i na plan nabavki roba i usluga za projekte finansirane iz sredstava JP Ceste F BiH, kao i na njihovu realizaciju. Prateći realizaciju Plana, Uprava JP Ceste F BiH se odlučila na izradu Rebalansa Plana poslovanja za 2023. godinu (u daljem tekstu: „Rebalans Plana“) zbog visine dospjelih obaveza po kamatama kreditnih sredstava međunarodnih finansijskih institucija za okončani Program „Rehabilitacija cesta u F BiH“ i „Modernizacija cesta u F BiH“, čija je implementacija u toku.

6-mjesečni EURIBOR u 2023. godini kretao se u rasponu od 2,73 % u januaru 2023. do oko 4% početkom decembra 2023., što se odrazilo na rast kamatnih stopa na odobrene kredite međunarodnih razvojnih banaka za program „Rehabilitacije cesta u FBIH“ (kredit EIB) i Program „Modernizacije cesta u FBIH“ sa ugovorenim promjenljivom kamatnom stopom vezanom za 6-mjesečni EURIBOR (kredit IBRD i EIB). Kredit Svjetske banke za „Rehabilitaciju cesta u FBIH“ je odobren u Specijalnim pravima vučenja (SDR), te se kod istog javlja i obračun kursnih razlika. Kod kredita EIB za „Rehabilitaciju cesta u FBIH“ na promjenljivu kamatnu stopu dodaje se i utvrđeni fiksni raspon u momentu povlačenja tranši, dok kod kredita EBRD za „Modernizaciju cesta u FBIH“ utvrđeni fiksni raspon je 1% koji se dodaje na promjenljivu kamatnu stopu.

Program „Modernizacija cesta u FBIH“ (u daljem tekstu Program), prva je faza modernizacije cestovnog sektora u FBIH, a osnovni razvojni cilj Programa je modernizacija cesta i cestovnih objekata (mostovi, tuneli) duž prioriternih dionica na magistralnoj cestovnoj mreži, izgradnja obilaznica oko gradova, poboljšanje sigurnosti prometa, te jačanje kapaciteta za održivo upravljanje magistralnom cestovnom mrežom u FBIH. Program obuhvata više podprojekata koji se mogu podijeliti u dvije grupe i to:

- **I grupa** projekti izgradnje cestovnih dionica od strateškog značaja za FBiH/ BiH i izgradnje obilaznica oko gradova; i
- **II grupa** projekti rekonstrukcije/sanacije postojećih cesta i kolovozne konstrukcije, korekcija osovine, izgradnje trećih traka za spora vozila, rehabilitacije/ rekonstrukcije mostova i

tunela, rehabilitacije/ rekonstrukcije crnih tačaka i opasnih mjesta i dr.

Program se najvećim dijelom finansira iz dugoročnih kredita međunarodnih razvojnih banaka, a dijelom i vlastitim sredstvima JP Ceste FBiH. Odobreni iznosi kredita za podršku Programu su sljedeći:

1. Evropska investicijska banka (EIB), kredit op.br. 82137 – 50.00 mil. EUR
2. Svjetska banka (WB) -Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD), kredit op.br. 8640 – 58.00 mil. EUR
3. Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD), kredit op.br. 47461– 65.00 mil. EUR

Krajnji rok raspolaganja sredstvima kredita Međunarodne banke za obnovu i razvoja (IBRD) bio je 30.09.2023. Amandmanom br. 1 na Finansijski ugovor između BiH i EIB krajnji rok raspolaganja sredstvima kredita EIB bio je do 23.02.2023. godine. Dakle, 2023. godina je posljednja godina realizacije projekata iz Programa koji zajednički i/ili finansiraju EIB i IBRD.

Međutim, zaključeni ugovor za radove Bihac 4-Ripač duži period je imao neriješene imovinsko-pravne odnose, obzirom da je jedna kuća i pripadajuća parcela predmet spora što je onemogućavalo pristup u dužini od oko 200 m i pribavljanje građevinske dozvole za navedeni dio, te radovi na ovom dijelu nisu završeni do krajnjeg datuma zatvaranja kredita.

Restrukturiranjem Programa, prihvaćenim od EIB i IBRD, uvedena je dodatna cestovna dionica za Neum-Stolac: Ulaz u Stolac (Vidovo Polje) - veza na magistralnu cestu M-6, rekonstrukcija ceste dužine cca L=1,3 km u cilju poboljšanja cjelokupne funkcionalnosti ceste Neum-Stolac. Ova dionica obuhvatila je novu trasu sa dvije prometne trake koja obilazi Stolac i povezuje ceste M-17.3 i M-6, te na taj način omogućava adekvatan prometni kapacitet i sigurnost prometa za sve kategorije korisnika, sa tri kružne raskrsnice i mostom preko rijeke Bregave. Do datuma zatvaranja kredita EIB i IBRD radovi i konsultantske usluge zajednički i/ili finansirani od EIB i IBRD, kao i nabavka roba za poboljšanje aktivnosti upravljanja cestama finansirana samo od IBRD su okončani.

Krajnji rok povlačenja EBRD kredita je do 13.01.2024 godine, jer je I tranša kredita efektivna tek od polovine 2019., a II tranša je efektivna od kraja 2021, a obuhvata izgradnju novih dionica magistralnih cesta i obilaznica oko gradova koji zahtijevaju duži period izgradnje. Na početak implementacije podprojekata izgradnje novih dionica cesta i obilaznica oko gradova najveći uticaj je imao dug i složen proces rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i pribavljanja odobrenja za građenje.

Nakon pažljive procjene tekućeg napretka ugovorenih radova i očekivanih nabavki građevinskih radova koji se finansiraju iz EBRD kredita, JP Ceste FBiH je procijenilo da će biti potrebno produženje krajnjeg datuma zatvaranja EBRD kredita za oko 18 mjeseci u cilju potpune implementacije projekta i ciljeva Projekta. Zahtjev za produženje krajnjeg roka raspolaganja sredstvima kredita dostavljen je EBRD, putem Ministarstva finansija i trezora, u septembru 2023., te se očekuje pozitivan odgovor EBRD na zahtjev.

Poslovne knjige i druge evidencije JP Ceste F BiH vodile su se u skladu sa zakonima i Međunarodnim računovodstvenim standardima i Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja, kojima se uređuje materijalno-finansijsko poslovanje i računovodstvene politike.

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, JP Ceste F BiH obavljaju nabavke roba, usluga i radova, finansirane iz vlastitih sredstava, a nabavke iz međunarodnih kreditnih sredstava po međunarodnim procedurama kreditora.


U nastavku su prikazani javni prihodi, rashodi, investicije, kao i druge aktivnosti koje su JP Ceste F BiH realizovale u periodu od 01.01.2023.-31.12.2023. godine.

1.1 JAVNI PRIHODI


Red Br.	O P I S	Šifra naknade	Realizirano 2022.	Rebalans Plana 2023.	Realizirano 31.12.2023.	Index 6/5	Index 6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Naknade od:		107.754.007	109.150.000	110.273.892	101	102
1.1	Nafte i naftnih derivata	717131 717114	55.406.886 16.689.871	54.600.000 18.150.000	55.182.567 17.990.322	101	101
1.2	Registracije – putarine – fizička lica	722532	18.512.940	19.000.000	19.323.633	102	104
1.3	Registracije – putarine – pravna lica	722531	8.769.190	9.000.000	9.135.633	102	104
1.4	Službe “Pomoć-informacije na cestama”	722535	5.523.591	5.800.000	5.755.415	99	104
1.5	Korištenja cestovnog zemljišta	722538	1.466.689	1.600.000	1.943.570	121	133
1.6	Vanrednih prevoza	722536 722534	1.211.572	850.000	788.855	93	65
1.7	Prekomjerne upotrebe cesta (vage)	722537	173.268	150.000	153.897	103	89
2.	Druga sredstva osigurana po posebnim propisima		400.895	550.000	642.305	117	160
2.1	Reklamni panoji	722539	200.897	400.000	478.163	120	238
2.2	Kamate	722565	86.556	50.000	67.854	136	78
2.3	Saglasnosti	722565	113.442	100.000	96.288	96	85
3.	Naknadno utvrđeni prihodi		4.173.688	500.000	803.951	161	19
U K U P N O			112.328.590	110.200.000	111.720.148	101	99

JP Ceste FBiH su ostvarile prihod u iznosu 111,72 mil KM, što je 1% ili 1,52 mil. KM više od Rebalansom planiranih 110,20 mil KM. Najveći prihod je realizovan od naknada nafte i naftnih derivata sa 73,18 mil. KM ili 1% više od planiranih 72,75 mil.KM. U odnosu na prethodnu godinu ukupan prihod od nafte i naftnih derivata je veći za 1,08 mil. KM.

Drugi po veličini je prihod od registracija za pravna i fizička lica u iznosu od 28,46 mil. KM ili 2% veći od planiranih 28,00 mil. KM, a 1,18 mil. KM je veći u odnosu na isti period prethodne godine. Prihod od naknada Službe „Pomoć informacije na cestama“, korištenja zemljišta u putnom pojasu i vanrednog prevoza u zemlji i inostranstvo, realizovan je u iznosu od 8,49 mil. KM ili 3% više od planiranih 8,25 mil. KM. Reklamni panoji u putnom pojasu, kamate i saglasnosti realizovani su sa 0,64 mil. KM, što je 17% više od planiranih 0,55 mil. KM, a veći su za 0,24 mil. KM u odnosu na prethodnu godinu. Naknada od prekomjerne upotrebe cesta (vage) je realizirana u iznosu od 0,15 mil. KM što je manje u odnosu na realizirano 0,17 mil. KM iz prethodne godine. Naknadno utvrđeni prihod iznosi 0,80 mil. KM i veći je za 61% u odnosu na Rebalansom planirani iznos.

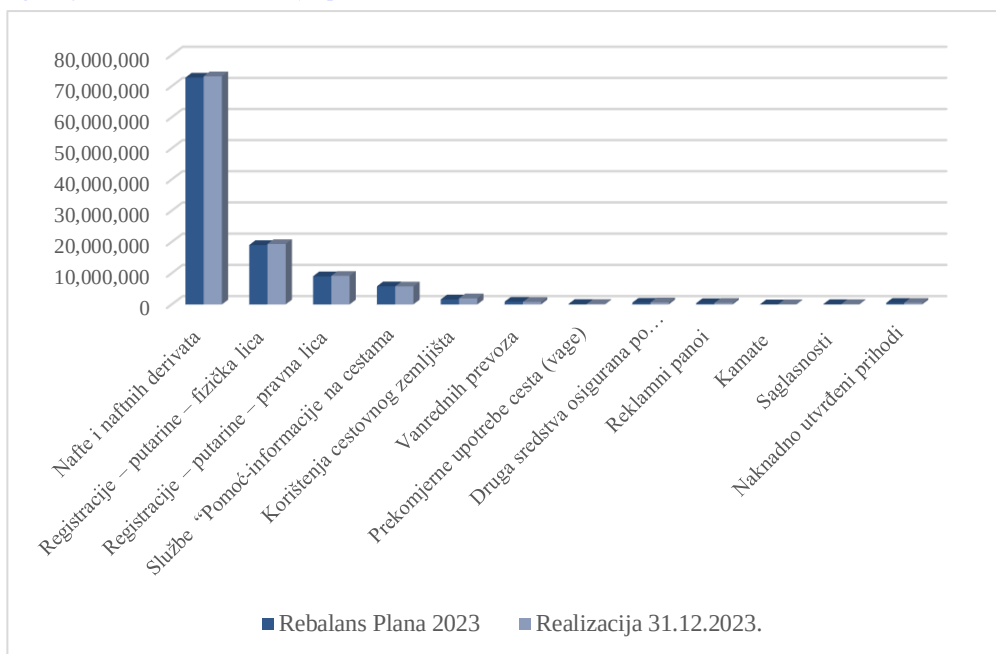

Grafikon prikazuje visinu planiranih i realiziranih prihoda u 2023.

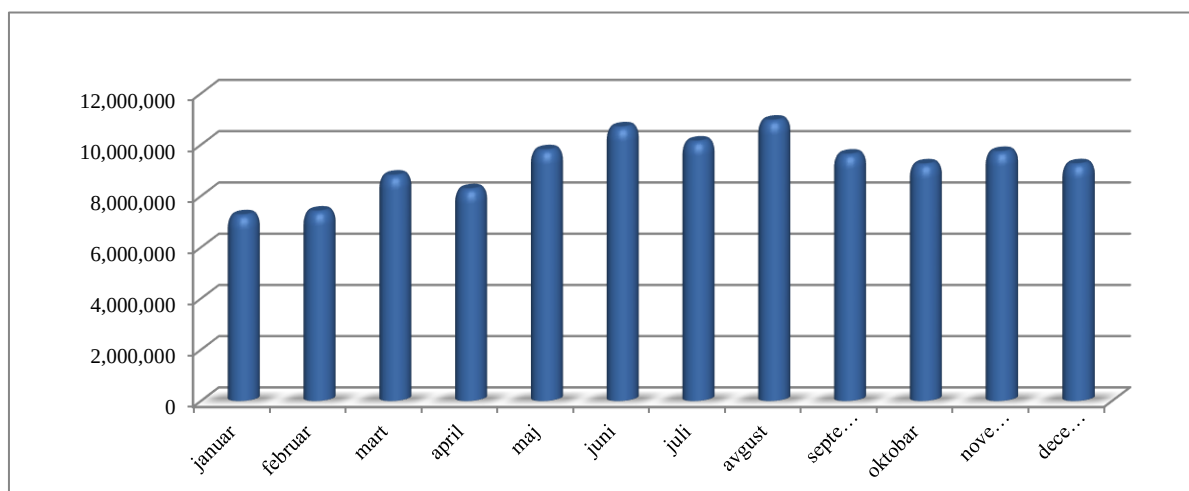

Visina ostvarenih prihoda po mjesecima u 2023.

1. Naknada od:

1.1. - nafte i naftnih derivata je realizovana u iznosu od 55,18 mil. KM, od planiranih 54,60 mil. KM što je 1,06% više od planiranih sredstava. Realizuje se na osnovu Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, br. 49/09, 49/14 i 60/14) i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama u BiH („Službeni glasnik BiH“, br.91/17.). Putarina, kao vrsta indirektnog poreza, plaća se na naftne derivate u iznosu od 0,15 KM/ l za puteve na Jedinstven račun Uprave za indirektno oporezivanje. Na osnovu Pravilnika o izračunavanju koeficijenta doznačavanja sredstava entitetima i Distriktu Brčko, te Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH, propisana je raspodjela i pripadnost javnih prihoda. JP Ceste F BiH, zajedno sa kantonalnim direkcijama za puteve u F BiH, pripada iznos od 3,9 % u odnosu na visinu predviđenih sredstava od čega, na osnovu Zakona o cestama u F BiH, JP Ceste F BiH pripada 40%.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj: 91/2017.), putarina je povećana na 0,25 KM/l, od čega 0,05 KM/l za druge puteve, a namijenjena je za izgradnju autoputeva i izgradnju i rekonstrukciju drugih puteva. Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje usvojio je Odluku o privremenoj raspodjeli prihoda, kojom je utvrđeno da od ukupnih prihoda od putarine za izgradnju autoputeva i izgradnju i rekonstrukciju drugih puteva 10% ostaje na podračunu kod Centralne banke BiH i služi za poravnanje prihoda po utvrđivanju konačne metodologije raspodjele, a preostalih 90% prihoda podijeljeno je između entiteta i Brčko Distrikta. U Federaciji BiH prihod se raspoređuje na osnovu Zakona o cestama F BiH, po kome JP Ceste F BiH pripada 40 % od dobijenih sredstava. Prihod po ovoj osnovi je realizovan u iznosu od 17,99 mil. KM, što je 99,12% od planiranih 18,15 mil. KM.

1.2. i 1.3. putarine za fizička i pravna lica – Na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, Vlada F BiH je donijela „Uredbu o visini godišnje naknade za javne ceste koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila“, V broj: 202/2015, na osnovu koje se obračunava naknada putarine za fizička i pravna lica. Od planiranih 28,00 mil. KM, realizovano je 28,46 mil. KM ili 101,64%.

1.4. Službe “Pomoć-informacije na cestama” - realizovana je u iznosu od 5,76 mil. KM, što je 99,23% od planiranih 5,80 mil. KM. Ista je definisana članom 88. i 100. Zakona o cestama F BiH i Odlukom Vlade F BiH V broj: 45/11 („Službene novine Federacije BiH“, br: 5/11.), a predstavlja pružanje tehničke pomoći motorizovanim učesnicima u saobraćaju na javnim cestama, uklanjanje sa javnih cesta oštećenih vozila i vozila u kvaru, davanje informacija o stanju prohodnosti cesta i pružanje druge pomoći.

1.5. korištenja cestovnog zemljišta - je regulisana Uredbom o izmjeni i dopuni visine naknade za korištenje zemljišta uz javni pojas, V broj: 956/2015, donesenom od strane Vlade F BiH. Od planiranih 1,60 mil.KM realizovano je 1,94 mil.KM što je 21% više od planiranih sredstava. U prvom dijelu izvještajnog perioda, većinom je naplaćen fakturisani iznos krajem i početkom godine, a odnosi se na period za 2022. godinu. Zbog odredbi Pravilnika o naknadama za korištenje cestovnog zemljišta (Sl. novine FBiH broj: 75/10 i 51/15) koje se odnose na prolaze kroz gradove, ukinuto je 30 korisnika zemljišta u 2023. god. u odnosu na prethodnu godinu, a u ukupnom iznosu od 0,04 mil. KM.


1.6. i 1.7. vanrednih prevoza i prekomjerne upotrebe cesta (vage) – se ostvaruju po osnovu Zakona o cestama u F BiH, Pravilnika o utvrđivanju uslova za obavljanje javnih prevoza vozila na magistralnoj cesti i Pravilnika za utvrđivanje prekomjerne upotrebe javnih cesta. Od planiranih 1,00 mil. KM za obje naknade, realizovano je 0,94 mil. KM.

2. Druga sredstva čine:

2.1. Naknada za reklamne znakove (panoi) u cestovnom pojasu – se obračunava na osnovu Zakona o cestama F BiH, Pravilnika o postavljanju reklamnih znakova na cestama i Uredbom o visini naknade za korištenje zemljišta uz javne ceste („Službene novine F BiH“, br: 58/2015.). Od planiranih 0,40 mil. KM, u izvještajnom period realizovan je iznos od 0,48 mil. KM.

2.2. i 2.3. – kamata i saglasnosti – se odnosi na kamate ostvarene po transakcijskim računima, kao i prihod po osnovu izdatih saglasnosti za radove u cestovnom pojasu. Realizovan je iznos od 0,16 mil.

3. Naknadno utvrđen prihod – obuhvata prihod od donacija tj. grant sredstva EBRD-a namijenjena za uvođenje ISO standarda (0,21 mil. KM), ukidanja rezerviranja po osnovu sudskih sporova (0,16 mil. KM), naknade štete od osiguravajućih kuća (0,10 mil. KM), prihod od grant sredstava Ministarstva prometa i komunikacija BiH za održavanje mostova preko rijeke Save u Šamcu i Orašju (0,07 mil. KM), prihoda od prodaje transportnih sredstava (0,03 mil. KM), naplate sudskih troškova (0,03 mil. KM), od prodaje otpada tj. uništenih znakova i odbojne ograde (0,01 mil. KM), te ostalih prihoda (0,19 mil. KM).

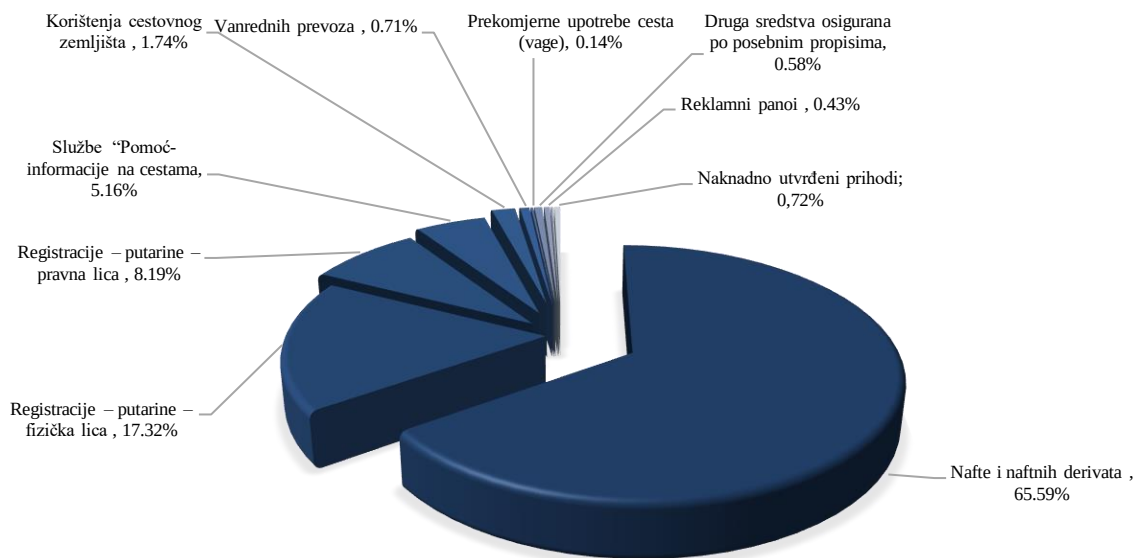

Grafik prikazuje ostvarenu strukturu prihoda u 2023. godini

-Preknjižavanje javnih prihoda u skladu sa MRS 15

JP Ceste FBiH su postupile u skladu sa mišljenjem i preporukom Ureda za reviziju institucija u FBiH, iskazanim u Izvještaju o finansijskoj reviziji za 2019. godinu, da prikupljena novčana sredstva po osnovu naknada od nafte i naftnih derivata i naknada za upotrebu cesta koje se plaćaju pri registraciji motornih vozila (pravna i fizička lica), nisu poslovni već javni prihodi namijenjeni za održavanje, zaštitu, obnovu, rekonstrukciju i izgradnju javnih cesta i da ih treba iskazivati na poziciji dugoročnih razgraničenja od momenta uplate do njihove realizacije (ne podliježu primjeni MRS 15). Od navedenih naknada, naplaćena finansijska sredstva do momenta realizacije (datum bilansiranja) se raspoređuju na sljedeći način:

Javni prihodi		Za pokriće rashoda (655500)	Otplata kredita (409400)	Izvori-Investicije u toku (419860)	Ukupno
Nakada od:	Šifra naknade				
Nafta i naftnih derivata	717131	28.665.021	17.125.889	9.391.657	55.182.567
Nafta i naftnih derivata	717114	0	0	17.990.322	17.990.322
Registracije/putarine pravna lica	722531	9.135.633	0	0	9.135.633
Registracije/putarine fizička lica	722532	19.323.633	0	0	19.323.633
UKUPNO		57.124.287	17.125.889	27.381.979	101.632.155

- Naknade od nafte i naftnih derivata (717131 – 55.182.567 KM) na pokriće otplate kredita (17.125.889 KM), razliku do visine ukupnih rashoda poslovanja (28.665.021 KM) i ostatak na izvore sredstava rezervirane za investicije u toku (9.391.657 KM)
- Naknade od nafte i naftnih derivata (717114 – 17.990.322 KM) na izvore sredstava rezervirane za investicije u toku
- Naknade za upotrebu cesta/registracije za pravna (722531 – 9.135.633 KM) i fizička lica (722532 – 19.323.633 KM) za pokriće dijela troškova redovnog održavanja.

Napomena* - Iznos za pokriće rashoda 57.124.287 KM se dobije kada se od ukupnih javnih rashoda (sa amortizacijom) u iznosu od 69.296.615 KM oduzmu javni prihodi od 12.172.328 KM. Ovim iznosom obuhvaćene su sljedeće naknade:

- 722535 Služba pomoć-informacije – 5.755.415 KM
- 722538 korištenje cestovnog pojasa - 1.943.570 KM
- 722539 korištenje reklamnih panoa u cestovnom pojasu – 478.163 KM
- 722534 i 722536 vanredni prijevozi u zemlji i inostranstvu – 788.855 KM
- 722537 prekomjerna upotreba cesta – vage – 153.897 KM
- 722565 kamate i suglasnosti – 164.142 KM
- ostali prihodi - 803.951 KM
- prihodi po osnovu usklađivanja vrijednosti stalnih sredstava – 2.084.335 KM

A.II AMORTIZACIJA


Red. Br.	O P I S	Realizirano 2022.	Rebalans Plana 2023.	Realizirano 31.12.2023.	Index 5/4	Index 5/3
1	2	3	4	5	6	7
1.	Amortizacija stalnih sredstava	2.459.441	2.500.000	2.084.335	83	85
UKUPNO		2.459.441	2.500.000	2.084.335	83	85

Napomena: Objašnjenje amortizacije dato na strani 33.

B. I JAVNI RASHODI

Red Br.	O P I S	Realizirano 2022.	Rebalans Plana 2023.	Realizirano 31.12.2023.	Index 5/4	Index 5/3
1	2	3	4	5	6	7
1.	Troškovi poslovanja	7.338.941	7.819.000	7.526.202	96	103
2.	Služba pomoć-informacije	5.137.065	5.390.000	5.576.979	103	109
3.	Redovno održavanje	39.463.461	46.542.000	45.482.079	98	115
4.	Rezervirana sredstva za rizike, neplanirane rashode i rashode koji ne terete projekte	404.445	500.000	469.095	94	116
5.	Rezervirana sredstva za sudske presude	4.399.363	1.100.000	418.994	38	10
6.	Troškovi konsultantskih usluga	2.370.817	908.500	703.645	77	30
7.	Kamate, servisni troškovi, kursne razlike, provizije	1.620.487	7.200.000	7.035.286	98	434
	UKUPNO	60.734.579	69.459.500	67.212.280	97	111

Rashodi su realizovani u iznosu od 67,21 mil. KM, što je 97% od planiranih 69,46 mil. KM. Kao i uvijek, najveću realizaciju su imala sredstva redovnog održavanja u iznosu od 45,48 mil. KM, što je 98% od planiranih 46,54 mil. KM, a više su realizovana za 15 % ili 6,02 mil. KM, u odnosu na isti period prethodne godine. Sredstva redovnog održavanja čine najveći stavku rashoda, a obuhvataju zimsku službu, glavne preglede objekata, troškove električne energije za rasvjetu tunela, raskrsnica, mostova, semafora i brojača prometa, osiguranje pružnih pralaza u USK, održavanje i nadzor elektroopreme, poboljšanje sigurnosti prometa – izradu noveliranih prometnih projekata, sanaciju postojećih i izgradnju novih svjetlosnih prometnih znakova kod škola, redovno održavanje brojača prometa, monitoring vozila redovnog održavanja GPS-om, obilježavanje pješačkih prijelaza sa plastikom optičko-vibracionim trakama kod škola. Troškovi poslovanja obuhvataju troškove zaposlenih i materijalne troškove i usluge i realizovani su u iznosu od 7,53 mil. KM, što je 96 % od planiranih 7,82 mil. KM. Kamate, servisni troškovi, kursne razlike i provizije realizovane su u iznosu 7,04 mil. KM, što je 98% od planiranih 7,20 mil. KM, a čak 5,42 mil. KM više nego u istom periodu prošle godine. Služba pomoć informacije na cesti je realizovana u iznosu od 5,58 mil. KM ili 3% više od planiranih 5,39 mil. KM, konsultantske usluge su realizovane sa 0,70 mil. KM, rezervirana sredstva za rizike, neplanirane rashode i rashode koji ne terete projekte sa 0,47 mil. KM, rezervirana sredstva za sudske presude 0,42 mil. KM.

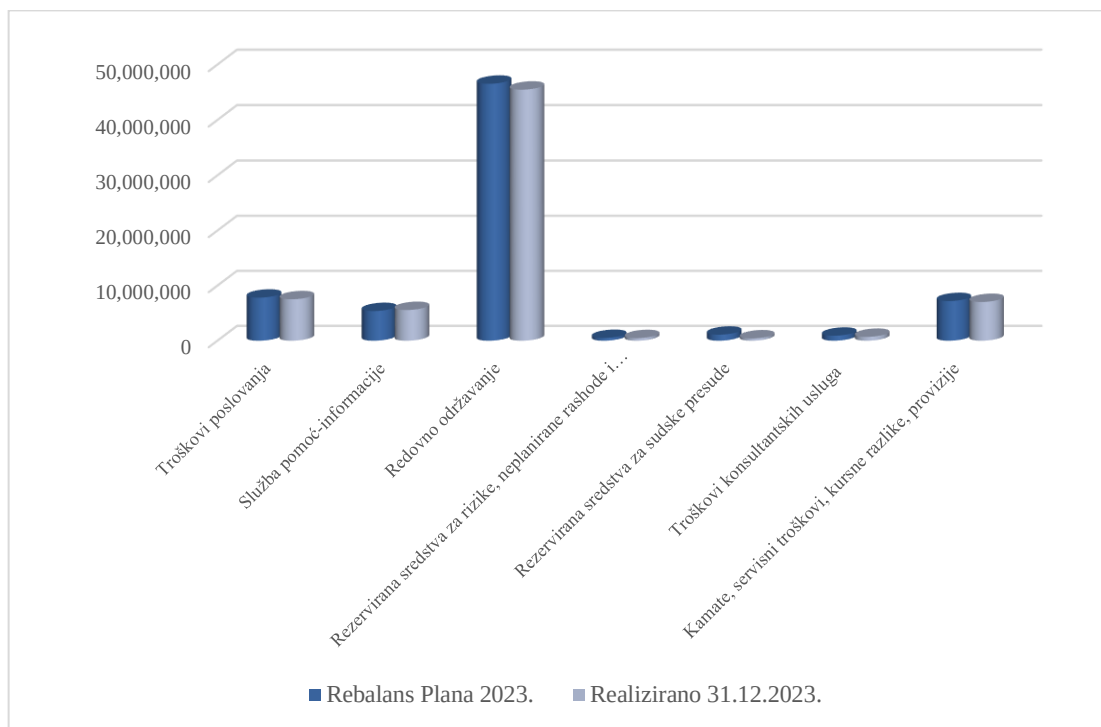

Grafički prikaz visine predviđenih i realizovanih rashoda

1. Troškovi poslovanja

Red. br.	O P I S	Rebalans Plana 2023.	Realizirano 31.12.2023.	Index 4/3
1	2	4	4	5
I	Troškovi zaposlenih	5.970.000	5.922.058	99
II	Materijalni troškovi i usluge	1.849.000	1.604.144	86
	UKUPNO I+II	7.819.000	7.526.202	96

Od planiranih 7,82 mil. KM za troškove poslovanja, realizovano je u izvještajnom periodu 7,53 mil. KM, od čega se 5,92 mil. KM odnosi na zaposlene, a 1,61 mil. KM na materijalne troškove i usluge.

I Troškovi zaposlenih

Troškovi zaposlenih za 2023. godinu iznosili su 5,92 mil.KM, što je 99% od planiranih 5,97 mil.KM. Istim su obuhvaćene bruto plaće zaposlenih kao i naknade u skladu sa Pravilnikom o radu.

II Materijalni troškovi i usluge

Red. br.	O P I S	Rebalans Plana 2023.	Realizirano 31.12.2023.	Index 4/3
1	2	3	4	5
1.	kancelarijski i potrošni materijal	60.000	50.627	84
2.	električna energija	70.000	44.732	64
3.	gorivo i mazivo za automobile	120.000	94.058	78
4.	otpis sitnog inventara i auto guma	10.000	3.147	31
5.	usluge održavanja, servisiranja i registracije	250.000	222.458	89
6.	učešće na sajmovima i seminarima	75.000	70.513	94
7.	stručna literatura i časopisi	20.000	12.103	61
8.	grijanje	40.000	39.879	100
9.	zakupnina (poslovni prostori i licence)	205.000	202.631	99
10.	reklama i propaganda	40.000	6.461	16
11.	osiguranje imovine i lica i ljekarski pregledi	60.000	54.610	91
12.	bankarske usluge	40.000	38.900	97
13.	reprezentacija	40.000	37.924	95
14.	naknade za službena putovanja u zemlji	55.000	36.607	67
15.	naknade za službena putovanja u inostranstvu	40.000	34.030	85
16.	privremeni i povremeni poslovi, ugovori o djelu	10.000		0
17.	bruto naknade za članove Nadzornog odbora	112.000	110.862	99
18.	održavanje čistoće	60.000	57.328	96
19.	obezbjedenje zgrade	13.000	13.783	106
20.	PTT usluge	120.000	127.344	106
21.	komunalne usluge	25.000	23.648	95
22.	stručno osposobljavanje	10.000	6.838	68
23.	tenderi, konkursi i oglasi	60.000	55.995	93
24.	takse	50.000	45.372	91
25.	advokatske usluge i trošk. vještačenja	50.000	3.904	8
26.	troškovi eksterne revizije	12.000	11.700	98
27.	troškovi Odbora za reviziju	47.000	46.415	99
28.	ostali troškovi poslovanja	70.000	70.125	100
29.	kamate i kursne razlike	1.000	215	22
30.	naknadno utvrđeni rashodi	50.000	50.140	100
31.	troškovi koji ne zavise od finansijskog rezultata	34.000	31.795	94
	U K U P N O II	1.849.000	1.604.144	87

Materijalni troškovi su realizirani u iznosu 1,61 mil. KM, što je 87% od Rebalansom planiranih 1,85 mil. KM. Iako su u strukturi materijalnih troškova i usluga pojedine stavke realizirane više u odnosu na planirana sredstva, došlo je do preraspodjele sredstava sa stavki manje utrošenih sredstava, tako da su u ukupnom iznosu materijalni troškovi i usluge realizirani u manjem iznosu od planiranih sredstava.

2. Služba „Pomoć – informacije na cestama”

Po osnovu člana 100. stav 2. Zakona o cestama F BiH («Službene novine F BiH» br. 12/2010...) Služba «Pomoć-informacije» na cestama F BiH (SPI) povjerena je kao javno ovlaštenje JP Ceste F BiH d.o.o. Sarajevo, a posebna naknada za SPI regulisana je na temelju člana 88. tačke 5. i člana 100. stav 3 Zakona o cestama F BiH i Odluke o službi „Pomoć-informacije» (Vlada F BiH, od 20. 01. 2011. godine).

Nakon provedene procedure otvorenog postupka javne nabavke, a na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine («Sl. glasnik BiH» br. 39/14), a u skladu sa uvjetima definiranim Dokumentima ponude uz objavljeni Javni oglas za izbor najpovoljnije ponude za obavljanje poslova službe «Pomoć-informacije» na cestama F BiH, za period: od 01.01.2022. do 31.12.2024. godine, Okvirnog sporazuma, te na temelju Odluke o dodjeli ugovora za obavljanje usluga Službe «Pomoć-informacije» (SPI) na javnim cestama u Federaciji Bosne i Hercegovine su sklopljeni ugovori za 2023. godinu sa:

- **Bosanskohercegovački auto-moto klub, BIHAMK** Sarajevo za obavljanje poslova «Pomoć-informacije» na području gradova i općina: Bihać, Cazin, Bosanska Krupa; Bosanski Petrovac, Ključ; Sanski Most; Velika Kladuša, Bužim; Tuzla, Kladanj; Banovići, Živinice, Kalesija, Sapna, Teočak, Ćelić, Srebrenik, Gračanica, Lukavac, Doboj Istok; Olovo; Zenica, Kakanj; Zavidovići, Žepče, Maglaj; Tešanj, Usora, Doboj Jug; Goražde, Prača, Ustikolina; Bugojno, Gornji Vakuf/Uskoplje, Donji Vakuf; Travnik, Novi Travnik; Konjic; Mostar; Jablanica, Prozor/Rama; Stari Grad-Sarajevo, Centar-Sarajevo, Novo Sarajevo, Novi Grad-Sarajevo, Ilidža, Vogošća, Hadžići, Trnovo; Ilijaš, Visoko, Breza, Vareš, i
- **Auto moto savez u Bosni i Hercegovini** (skraćeni naziv **AMS u BiH**) Mostar za obavljanje poslova «Pomoć-informacije» na području gradova i općina: Mostar, Čitluk; Stolac, Čapljina, Neum, Ravno; Ljubuški, Grude; Posušje, Široki Brijeg; Drvar, Bosansko Grahovo; Livno, Glamoč, Kupres, Tomislavgrad; Vitez, Busovača; Dobretići, Jajce; Kiseljak, Kreševo, Fojnica; Domaljevac-Šamac, Orašje i Odžak.

Ugovorom je definisano da se isplata vrši prema mjesečnim privremenim obračunskim situacijama nakon izvršene kontrole od strane uposlenika JP Ceste FBiH. Nadzor nad radom Službe «Pomoć-informacije» obavlja ovlašteno lice JP Ceste FBiH tako što vrši kontrolu privremenih obračunskih situacija, odnosno dnevnika informisanja i dnevnika pomoći na cesti za svaku bazu SPI. Planskim obilaskom baza SPI i putem nadzora pružanja intervencija na terenu kontroliše se na licu mjesta rad uposlenika SPI (izgled izvršioca i vozila, opremljenost, urednost vođenja dnevnika, tehnika pružanja pomoći i sl.), te se zapisnički konstatuje nađeno stanje.

Za svaku akciju iz Programa prometno - preventivnih aktivnosti izdaje se odobrenje, a na osnovu zahtjeva u kojem stoji šta će se raditi, od kada do kada, gdje, koliko će sudionika i vozila biti uključeno... Nakon završetka akcije, u okviru obračunske situacije, kontroliše se izvještaj koji sadrži navedene elemente i finansijski dio (strukturu i specifikaciju svih troškova sa računima za izvršene usluge i nabavke).

O uvjetima i načinu korištenja usluga pomoći na cesti, a na osnovu tačke 1.3 iz Obima usluga BIHAMK i AMS u BiH su obavještavali javnost i to: objavom namjenske informacije u dnevnoj štampi - četiri puta mjesečno; putem obavještenja u okviru tonskih emitovanja informacija

JP CESTE FEDERACIJE BIH

o stanju na cestama - dva puta sedmično, objavom informacija na više razlititih „općinskih“ portala, te obezbjedili da sve stanice tehničkog pregleda vozila na području djelovanja imaju u pisanoj formi predmetnu informaciju u obliku plakata. Na području na kome vrše poslove SPI na pogodnim mjestima cesta u Federaciji BIHAMK i AMS u BIH su postavili table/znakove obavještenja sa brojem telefona na koji motorizovani građani mogu zatražiti pomoć na cesti.

Prema dostavljenim mjesečnim obračunskim situacijama tokom 2023. godine ostvaren je sljedeći obim poslova i prihod po osnovi naknade za poslove SPI:

R.b.	Izvršitelj usluga SPI	Prispjela sredstva (KM)	% umanjeno po osnovu člana 5. Ugovora **	Obaveza Razlika (2-3)	Vrijednost situiranih radova	Razlika (4-5) *
	1	2	3	4	5	6
1.	BIHAMK Sarajevo	4.586.913	233.749	4.353.164	4.248.056	105.108
2.	AMS U BIH Mostar	1.168.367	59.540	1.108.828	1.086.582	22.246
UKUPNO		5.755.280	293.289	5.461.992	5.334.638	127.354

Pregled obima poslova i prihoda na osnovu naknade za poslove SPI za 2023. godinu

* Po osnovu godišnjeg obračuna vrijednost situiranih radova u 2023. godini za SPI je bio **manji** za:

- 105.108 KM kod BIHAMK-a, i

- 22.246 KM kod AMS u BIH

pa će taj dio razlike novčanih sredstava biti uvećan AMK-a u situaciji za februar 2024. godine.

** Procentualno umanjeno iz kolone 4 se vrši na osnovu Odluke o visini naknade za troškove implementacije iz sredstava za poslove „Pomoć – informacije“ na cestama (odluka Nadzornog odbora broj : 01-03.2-NO-6835-6/07 od 17.12.2007. godine), a po godišnjem obračunu za 2023. godinu, u iznosu od 5,1 % (ovaj procenat predstavlja udio SPI u ukupnim prihodima po konačnom obračunu JP Ceste F BiH za 2023. godinu).

U periodu od **01.01.2023.** do **31.12.2023.** godine izvršene su sljedeće usluge i aktivnosti:

- Pomoć na cesti	- broj pruženih intervencija učesnicima u prometu	40.667
	- broj pruženih intervencija patrolnog vozila SPI	24.038
	- broj pruženih intervencija vučnim vozilom (šlepom)	16.629
	- sati rada	59.476
	- sati dežure	110.521
- Informativni centar	- broj prikupljenih informacija	105 328
	- broj datih informacija	192 181
	- broj datih tonskih izvještaja	24 458
	- ukupan broj javljanja u pisanoj formi	154 463

U izvještajnom periodu znatno smo unaprijedili poslove informiranja javnosti o stanju prohodnosti cesta u BiH putem postavljanja „live“ kamera za video nadzor saobraćajnica na specifičnim lokacijama (prevojima, graničnim prijelazima ...) gdje građani mogu direktno vidjeti putem posjete web stranica: BIHAMK –a (78 lokacija) i AMS u BIH (31 lokaciju) kakvo je stanje na cesti.

Oba auto-moto kluba su realizovala preventivnu akciju pripreme vozila za zimske uvjete vožnje. Akcija se sastojala od besplatne kontrole rashladne tekućine u sistemu hlađenja, kontrole ispravnosti akumulatora, kontrole dubine šara na gumama, itd.

AMS u BiH je proveo prometno-edukativnu i natjecateljsku akciju: „Sigurno u prometu“ u 5 kantona u okviru koje je izvršeno osposobljavanje školske djece od 10 – 12 godina starosti u poznavanju prometnih propisa i pravila, te praktičnom dijelu spretnosti upravljanja biciklom. Učestovalo je 480 natjecatelja iz pedesetak osnovnih škola. U sklopu ove akcije su dijeljeni leci „Brzina ubija – imaš samo jedan život“, a sama akcija je realizovana tokom avgusta i septembra 2023. godine kao i akcija „Vežite pojas – spasite život“. Izrađene su brošure koje ukazuju vozačima na potrebne vještine i znanja za vrijeme vožnje. Tokom septembra je realizovana akcija „Počela je školska godina“ s ciljem upozorenja sudionika u prometu: vozača, pješaka i posebno djece na poštivanje prometnih propisa. U navedenu akciju je bila uključeno 104 osnovnih škola, aktivirana 61-a školska patrola i održano 147 prikladnih predavanja.

BIHAMK je početkom 2023. godine prikupio i objavio informacije o stanju cestovnog saobraćaja koje se odnose na broj registrovanih vozila, o starosnoj strukturi vozila, broju saobraćajnih nezgoda i posljedicama istih. Izrađene su predmetne informacije koje su dostavljene svim relevantnim institucijama, organizacijama i medijima. 17.03.2023. godine realizovana je konferencija „Let's drive green“ s ciljem promovisanja elektromobilnosti i električnih vozila u Bosni i Hercegovini. U maju i junu mjesecu 2023. godine BIHAMK je organizovao i realizovao saobraćajno – obrazovno takmičenje učenika osnovnih škola koje je obuhvatilo više od 1000 učenika. Učenici su „online“ sistemom popunjavali testove na platformi BIHAMK-a: „e-testovi“, a na finalnom takmičenju u Sarajevu je izabrana ekipa (dva dječaka i dvije djevojčice) koji su predstavljali Bosnu i Hercegovinu na Evropskom takmičenju u septembru mjesecu koje je održano u Baru (Crna Gora). Reprezentacija BiH je osvojila 13 mjesto. Od 7-9 juna u Sarajevu je održan Trening o sigurnosti tunela u Bosni i Hercegovini koji je vezan za EU Direktivu 2004/ 54 o minimalnim sigurnosnim zahtjevima u tunelima.

BIHAMK je drugi put organizovao takmičenje „Najbolji mladi vozač u BiH“ u cilju povećanja sigurnosti saobraćaja na cestama za osobe starosti 18 do 26 godina koje imaju položen vozački ispit B kategorije. Takmičenje se sastoji od teorijskog online testa i praktičnog dijela gdje se cijene vozačke sposobnosti i snalaženje mladih vozača u specifičnim situacijama. Finalo takmičenja je održano 08.09.2023. godine u Sarajevu gdje su izabrana dva najbolja mlada vozača u BiH. Na internacionalnom takmičenju održanom u Beču najbolji mladi vozač iz BiH Elmedin Ćibo je zauzeo drugo mjesto. Krajem godine BIHAMK je realizovao digitalnu kampanju „Ko te vozi kući“ kojom se nastojalo uticati na svijest građana i skrenuti pažnja na teme važne za cestovnu sigurnost kao što su: poštivanje saobraćajnih pravila, prilagođavanje vožnje uslovima na cesti, apel za ne korištenje mobitela u vožnji i sl.

JP Ceste F BiH u saradnji sa BIHAMK-om, AMSuBIH, Federalnim ministarstvom prometa i komunikacija, te kantonalnim ministarstvima obrazovanja, pokrenulo je u oktobru 2023. godine kampanju podizanja svijesti učesnika u prometu o sigurnosti vožnje u raskrsnicama sa kružnim tokom. Aktuelni trend izgradnje raskrsnica sa kružnim tokom u Bosni i Hercegovini nerijetko je popraćen problemom nepravilnog prolaska velikog broja vozila kroz iste, te prometnim nezgodama. Fokusirajući se prvenstveno na sigurnost učesnika u prometu, u prostorijama JP Ceste Federacije

JP CESTE FEDERACIJE BiH

BiH upriličena je prezentacija edukativnog priručnika „Kako sigurno voziti u raskrsnici sa kružnim tokom?“. Cilj priručnika je da bude edukacijski material za vozača, instruktora i predavača teoretske nastave u auto školama, te da skrene pažnju projektantima na pravilan izbor signalizacije (vertikalne i horizontalne) koja direktno upravlja prometom u kružnom toku.

Priručnik o pravilnoj i sigurnoj vožnji u raskrsnicama sa kružnim tokom je dostupan na web stranici JP Ceste FBiH kao i na web stranicama ostalih učesnika kampanje.

Za navedene i izvršene poslove SPI u Federaciji BiH, tokom 2023. godine, utrošena su ukupna sredstva kako slijedi:

Pomoć na cesti.....	4.241.223 KM
Informiranje	813.594 KM
<u>Prometno-preventivne aktivnosti</u>	<u>407.174 KM</u>
U K U P N O :	5.461.992 KM

Zaključno, BIHAMK (Bosanskohercegovački auto-moto klub, Sarajevo) i AMS u BiH (Auto-moto savez u Bosni i Hercegovini, Mostar) su poslove pomoći na cesti, informisanja i prometno-preventivnih aktivnosti izvršili u potpunosti s obzirom na priliv finansijskih sredstava tokom 2023. godine.

3. Redovno održavanje cesta

Prema Zakonu o cestama u F BiH i Pravilniku o održavanju javnih cesta, održavanje cesta čini skup mjera i radnji koje se obavljaju tokom većeg dijela godine ili cijele godine na cestama, uključujući i sve objekte i instalacije sa svrhom održavanja prohodnosti, tehničke ispravnosti i sigurnosti prometa na cestama. U redovno održavanje cesta uključeni su i radovi održavanja cesta i objekata u zimskim uslovima.

Procedura postupka javne nabavke za potpisivanje postojećih okvirnih sporazuma je pokrenuta 11.11.2022 godine, i za 10 od 14 LOT-ova potpisani su okvirni sporazumi sa izvođačima radova za period 01.07.2023. – 30.06.2027. godine, za Lot-ove 5, 7 i 14 potpisani su okvirni sporazumi sa izvođačima radova za period 15.11.2023. – 14.11.2027. godine, a za LOT 13 će biti potpisan nakon isteka postojećeg okvirnog sporazuma, i to za period 01.02.2024.-31.01.2028.godine.

Obim i vrsta radova redovnog održavanja za period 16.03. do 14.11.2023. godine procijenjeni na osnovu vrijednosti potpisanih ugovora sa izvođačima radova, odnosno sredstava planiranih tender dokumentacijom za pojedine LOTove. Vrijednost planiranih radova je određena na osnovu važećih jediničnih cijena u postojećim ugovorima redovnog održavanja.

Radovi redovnog održavanja u 2023. godine su vršeni na čišćenju i sanaciji kolovoza, ophodnji cesta, obnavljanju horizontalne i vertikalne prometne signalizacije i cestovne opreme, regulisanju odvodnje, košenju cestovnog pojasa i poboljšanju preglednosti, održavanju bankina, bermi, kosina usjeka i nasipa, održavanju objekata, potpornih i obložnih zidova, sve u skladu sa potrebama cesta i Pravilnikom o održavanju javnih cesta

Prema potpisanom Sporazumu, učešće JP Ceste FBiH u održavanju pružnih prelaza na cesti M-14 Bihać-Bosanska Krupa iznosi 50% vrijednosti radova, a učešće JP ŽFBiH 50%.

Troškovi redovnog održavanja mostova i održavanje elektroopreme za rasvjetu tunela i

prilaznih zona tunelima, rasvjete raskrsnica, semafora i trafostanica su realizovani prema potpisanim ugovorima sa izvođačima radova, a troškovi električne energije za rasvjetu tunela, raskrsnica i mostova, te semafora i brojača prometa su realizovani prema stvarnom utrošku odnosno prema fakturama Elektrodistribucije.

Troškovi monitoringa GPS-om vozila angažovanih u sklopu redovnog održavanja.

Zimsko održavanje cesta - zimska služba

Za period 01.01. – 15.03.2023. godine je urađen Operativni program i Plan zimske službe u okviru plana zimskog održavanja magistralnih cesta za zimu 2022/23 godine. Plan zimske službe je skup mjera i aktivnosti u cilju stvaranja uslova za trajno, bezbjedno i nesmetano odvijanje prometa na cestama u zimskim uvjetima, u skladu sa zakonskim obavezama. Plan zimske službe baziran je na stečenom iskustvu iz prethodnih godina i do sada primjenjivanim organizacijskim i tehnološkim postupcima.

Planom je predviđeno čišćenje snijega i sprječavanje poledice na kolovozu, ulazno-izlaznim trakama, objektima i proširenjima kolovoza, obilježavanje širine planuma ceste rubnim motkama, nabavka, preuzimanje i deponovanje posipnog materijala (sol i abrazivni materijal), uklanjanje osulinskog i drugog materijala sa kolovoza, uklanjanje vozila koja ometaju promet, osiguranje odvodnje u vrijeme padanja kiše i otapanja snijega, sprječavanje izlivanja vode na kolovoz, održavanje kolovoza i prometne signalizacije u ispravnom stanju, postavljanje znakova II-46 - „obavezna upotreba zimske opreme“ na pogodnim mjestima na ulazu u područje F BiH i pred usponima, informiranje o stanju prohodnosti cesta, a po potrebi i druge mjere i aktivnosti u cilju stvaranja uslova za sigurno odvijanje prometa.

U skladu sa postojećim okvirnim sporazumom, planom je obuhvaćeno održavanje 2.414,62 km magistralnih cesta, od čega 64,37 km sa makadamskim kolovozom (Održavanje dijela magistralnih cesta kroz grad Sarajevo u dužini od 16,65 km organizovala je Direkcija za puteve Kantona Sarajevo, a u skladu sa Ugovorom potpisanim sa JP Ceste FBiH).

Za period zimske službe od 15.11. do 31.12.2023. godine izvodili su se radovi prema Operativnom programu i Planu zimske službe za zimu 2023/24 godine, u kojem su planirana ista sredstva rada, radna snaga i posipni materijal, pa su procijenjeni troškovi na osnovu važećih jediničnih cijena u postojećim ugovorima redovnog održavanja planirani kao za period 15.11. do 31.12.2022. godine.

Prema novoj tender dokumentaciji, nabavku soli za posipanje cesta vrše izvođači radova, a 20% od planiranih količina za sve izvođače osigurava JP Ceste F BiH kao rezervu.

U 2023. godini je zbog kategorisanja novih regionalnih cesta u magistralne, te povećanja stavki koje učestvuju u jediničnoj cijeni radova redovnog održavanja (sve u skladu sa Okvirnim sporazumom) došlo do povećanja ukupne vrijednosti održavanja, kako je prikazano u tabeli.

U donjoj tabeli dat je pregled Sporazuma i ugovora redovnog održavanja magistralnih cesta za period naveden u tabeli:

Red. br	LOT	Izvođač	Vrijednost Okvirnog sporazuma	Broj Okvirnog sporazuma	Perod važenja Okvirnog sporazuma
1.	LOT 1	Rad-putevi Bihać, Behić Sanny Boy d.o.o. Bihać i Divil d.o.o. Sanski Most	12.565.800	01-02.2-7787/19	01.07.2019.-30.06.2023
2.	LOT 2	Kov-grad d.o.o. Bužim i I-Selimović d.o.o. Cazin	11.243.700	01-02.2-7788/19	01.07.2019.-30.06.2023
3.	LOT 3	Konz: Jata-group d.o.o. Srebrenik, HIH Živinice	19.691.100	01-02.2-7789/19	01.07.2019.-30.06.2023

JP CESTE FEDERACIJE BIH

4.	LOT 4	Dobojputevi d.d. Doboj jug	10.073.700	01-02.2-7790/19	01.07.2019.-30.06.2023
5.	LOT 6	Goraždeputevi d.d. Goražde	6.493.500	01-02.2-7791/19	01.07.2019.-30.06.2023
6.	LOT 7	Konz. HP Investing d.o.o. Mostar i Hercegovinaputevi a.d. Trebinje	6.549.920	01-02.2-1325/20.	01.02.2020.-31.01.2024.
7.	LOT 8	Sarajevoputevi d.d. Sarajevo	12.506.250	01-02.2-7792/19.	01.07.2019.-30.06.2023
8.	LOT 9	Ceste d.d. Mostar	4.538.560	01-02.2-7793/19.	01.07.2019.-30.06.2023
9.	LOT 10	Ceste d.d. Mostar	11.447.261	01-02.2-7794/19.	01.07.2019.-30.06.2023
10.	LOT 11	Ceste d.d. Mostar	24.205.658	01-02.2-7795/19.	01.07.2019.-30.06.2023
11.	LOT 12	Ceste d.d. Mostar	17.877.596	01-02.2-7796/19.	01.07.2019.-30.06.2023
12.	LOT 13	Konz. Putovi d.o.o. Grude, KTM Brina d.o.o. Posušje HP Investing d.o.o. Mostar	5.670.853	01-02.2-1328/20.	01.02.2020.-31.01.2024.
13.	LOT 14	Kov-grad d.o.o. Bužim	4.282.200	01-02.2-12930/20	15.11.2019.-14.11.2023.
14.	LOT 5	Jata group d.o.o. Srebrenik i Balem d.o.o. Gradačac	9.682.264	01-02.2-8846/21.	01.09.2021.-31.08.2025.
U K U P N O			156.828.362		

Potpisani su novi Okvirni sporazumi
za period 01.07.2023.-30.06.2027. i 15.11.2023.-14.11.2027.

Red. br	LOT	Izvođač	Vrijednost Okvirnog sporazuma	Broj Okvirnog sporazuma	Period važenja Okvirnog sporazuma
1.	LOT 1	Rad-putevi Bihać, Behić Sanny Boy d.o.o. Bihać i Divel d.o.o. Sanski Most	14.332.236	01-02.2-4914/23	01.07.2023.-30.06.2027.
2.	LOT 2	Kov-grad Bužim i I-Selimović d.o.o.Cazin	12.909.974	01-02.2-4916/23	01.07.2023.-30.06.2027.
3.	LOT 3	Konz: Jata-group, Srebrenik,HIH Živinice,	22.853.497	01-02.2-4918/23	01.07.2023.-30.06.2027.
4.	LOT 4	Dobojputevi d.d. Doboj jug	13.819.616	01-02.2-4920/23	01.07.2023.-30.06.2027.
5.	LOT 5	Jata Group d.o.o. Srebrenik	11.128.897	01-02.2-10362/23	15.11.2023.-14.11.2027.
6.	LOT 6	Goraždeputevi Goražde	7.516.117	01-02.2-4922/23	01.07.2023.-30.06.2027.
7.	LOT 7	HP Investing d.o.o. Mostar	8.510.005	01-02.2-10471/23	15.11.2023.-14.11.2027.
8.	LOT 8	Sarajevoputevi d.d. Sarajevo	14.340.046	01-02.2-4924/23	01.07.2023.-30.06.2027.
9.	LOT 9	Ceste d.d. Mostar	5.283.413	01-02.2-4926/23	01.07.2023.-30.06.2027.
10.	LOT 10	Ceste d.d.Mostar	13.180.368	01-02.2-4928/23	01.07.2023.-30.06.2027.
11.	LOT 11	Ceste d.d.Mostar	27.749.825	01-02.2-4930/23	01.07.2023.-30.06.2027.
12.	LOT 12	Ceste d.d. Mostar	20.933.699	01-02.2-4932/23	01.07.2023.-30.06.2027.
13.	LOT 14	Kov-Grad d.o.o. Bužim	4.899.907	01-02.2-10399/23	15.11.2023.-14.11.2027.
UKUPNO			177.457.600		

Ugovori 2022./2023.

Red. br	LOT	Izvođač	Vrijednost ugovora	Broj ugovora	Ugovoreni period:
1.	LOT 13	Konzorcij:Putovi d.o.o. Grude, KTM Brina d.o.o. Posušje i HP Investing d.o.o. Mostar	1.319.529	01-02.2-786/22.	01.02.2022.-31.01.2023.
2.		Anex	134.499	01.02.2-786-1/23	01.02.2022.-31.03.2023.
3.	LOT 1	Rad-putevi Bihać, Behić Sanny Boy d.o.o.Bihać i Divel d.o.o. Sanski Most	3.173.498	01-02.2-4762/22	01.07.2022.-30.06.2023.
4.		Anex	33.872	01-02.2-12450/22	01.07.2022.-30.06.2023.

JP CESTE FEDERACIJE BIH

5.		Anex II	143.052	01-02.2-8927/23	01.07.2022.-30.06.2023.
6.	LOT 2	Kov-grad d.o.o. Bužim i I-Selimović d.o.o. Cazin	2.875.932	01-02.2-4763/22	01.07.2022.-30.06.2023.
7.		Anex	31.290	01-02.2-12451/22	01.07.2022.-30.06.2023.
8.		Anex II	85.204	01.02.2-8967/23	01.07.2022.-30.06.2023.
9.	LOT 3	Konz: Jata-group d.o.o. Srebrenik, HIH Živinice	4.479.373	01-02.2-4764/22	01.07.2022.-31.03.2023.
10.		Anex	90.814	01-02.2-12447/22	01.07.2022.-31.03.2023.
11.		Anex II	113.526	01-02.2-8733/23	01.07.2022.-31.03.2023.
12.		Konzorcij: Jata grup d.o.o. Srebrenik i Balem d.o.o. Gradačac	1.778.255	01-02.2-868/23	01.04.2023.-30.06.2023.
13.	LOT 4	Konzorcij: Jata grup d.o.o. Srebrenik i Balem d.o.o. Gradačac	2.676.075	01-02.2-8681/22	16.10.2022.-30.06.2023.
14.	LOT 5	Jata group d.o.o. Srebrenik i Balem d.o.o. Gradačac	2.489.614	01-02.2-7800/22	01.09.2022.-31.08.2023.
15.			559.998	01-02.2-8145/23	01.09.2023.-14.11.2023.
16.	LOT 6	Goraždeputevi Goražde	1.638.866	01-02.2-4766/22	01.07.2022.-30.06.2023.
17.		Anex	31.056	01-02.2-12452/22	01.07.2022.-30.06.2023.
18.		Anex II	83.822	01-02.2-8825/23	01.07.2022.-31.03.2023.
19.	LOT 7	Konzorcij: HP Investing d.o.o. Mostar i Hercegovina putevi a.d. Trebinje	1.751.039	01-02.2-476/23	01.01.2023.-31.12.2023.
20.	LOT 8	Sarajevoputevi d.d. Sarajevo	3.213.642	01-02.2-4768/22	01.07.2022.-30.06.2023.
21.		Anex	31.090	01-02.2-12453/22	01.07.2022.-30.06.2023.
22.		Anex II	68.318	01-02.2-4002/23	01.07.2022.-30.06.2023.
23.		Anex III	93.384	01-02.2-8426/23	01.07.2022.-30.06.2023.
24.	LOT 9	Ceste d.d. Mostar	1.118.793	01-02.2-4769/22	01.07.2022.-30.06.2023.
25.		Anex	20.200	01-02.2-12369/22	01.07.2022.-30.06.2023.
26.		Anex II	18.460	01-02.2-4004/23	01.07.2022.-30.06.2023.
27.		Anex III	25.538	01-02.2-8427/23	01.07.2022.-30.06.2023.
28.	LOT 10	Ceste d.d. Mostar	2.823.186	01-02.2-4770/22	01.07.2022.-30.06.2023.
29.		Anex	60.534	01-02.2-12368/22	01.07.2022.-30.06.2023.
30.		Anex II	53.981	01-02.2-4003/23	01.07.2022.-30.06.2023.
31.		Anex III	46.235	01-02.2-8428/23	01.07.2022.-30.06.2023.
32.	LOT 11	Ceste d.d. Mostar	5.968.060	01-02.2-4772/22	01.07.2022.-30.06.2023.
33.		Anex	96.613	01-02.2-12371/22	01.07.2022.-30.06.2023.
34.		Anex II	96.255	01-02.2-4005/23	01.07.2022.-30.06.2023.
35.		Anex III	135.370	01-02.2-8429/23	01.07.2022.-30.06.2023.
36.	LOT 12	Ceste d.d. Mostar	4.956.745	01-02.2-4773/22	01.07.2022.-30.06.2023.
37.		Anex	89.080	01-02.2-12372/22	01.07.2022.-30.06.2023.
38.		Anex II	47.892	01-02.2-4006/23	01.07.2022.-30.06.2023.
39.		Anex III	135.167	01-02.2-8430/23	01.07.2022.-30.06.2023.
40.	LOT 14	Kov-grad d.o.o. Bužim	1.143.230	01-02.2-10426/22	15.11.2022.-14.11.2023.
		UKUPNO	43.731.087		

Red. br	LOT	Izvođač	Vrijednost ugovora	Broj ugovora	Ugovoreni period:
1.	LOT 1	Rad-putevi Bihać, Behić Sanny Boy d.o.o.Bihać i Divel d.o.o.Sanski Most	3.583.059	01-02.2-4913/23	01.07.2023.-30.06.2024.
2.	LOT 2	Kov-grad Bužim i I-Selimović d.o.o.Cazin	3.227.493	01-02.2-4915/23	01.07.2023.-30.06.2024.
3.	LOT 3	Konz: Jata-group d.o.o. Srebrenik i HIH d.o.o. Živinice	5.713.374	01-02.2-4917/23	01.07.2023.-30.06.2024.
4.	LOT 4	Dobojputevi d .d. Doboj jug i Rial-Šped d.o.o. Doboj I.	3.454.904	01-02.2-4919/23	01.07.2023.-30.06.2024.
5.	LOT 5	Jata Group d.o.o. Srebrenik	2.782.224	01-02.2-10363/23	15.11.2023.-14.11.2024.
6.	LOT 6	Goraždeputevi Goražde	1.879.029	01-02.2-4921/23	01.07.2023.-30.06.2024.
7.	LOT 7	HP Investing d.o.o. Mostar	2.127.501	01-02.2-10472/23	15.11.2023.-14.11.2024.
8.	LOT 8	Sarajevoputevi d.d. Sarajevo	3.585.012	01-02.2-4923/23	01.07.2023.-30.06.2024.
9.	LOT 9	Ceste d.d. Mostar	1.320.853	01-02.2-4925/23	01.07.2023.-30.06.2024.
10.	LOT 10	Ceste d.d.Mostar	3.295.092	01-02.2-4927/23	01.07.2023.-30.06.2024.
11.	LOT 11	Ceste d.d.Mostar	6.937.456	01-02.2-4929/23	01.07.2023.-30.06.2024.
12.	LOT 12	Ceste d.d. Mostar	5.233.425	01-02.2-4931/23	01.07.2023.-30.06.2024.
13.	LOT 13	Konzorcij: Putovi d.o.o. Grude, KTM Brina d.o.o. Posušje i HP Investing d.o.o. Mostar	1.494.631	01-02.2-918/23	01.02.2023.-31.01.2024.
14.	LOT 14	Kov-Grad d.o.o. Bužim	1.224.977	01-02.2-10400/23	15.11.2023.-14.11.2024.
		UKUPNO	45.859.030		

U donjoj tabeli prikazani su planirani i realizovani iznosi
redovnog i zimskog održavanja po LOT-ovima

LOT	Mag. Cesta	Dužina u km	Dionice magistralnih cesta	Rebalans Plana 2023.			Realizirano 01.01.-31.12.2023.		
				Redovno održavanje	Zimska služba	Ukupno	Redovno održavanje	Zimska služba	Ukupno
1. L=199,309 km	M5	115,116	(gr.Hrvatske) Izačić-Bihać-Ključ-Velečevo(gr.ent)	2.070.000	1.420.000	3.490.000	2.378.632	1.098.386	3.477.018
	M11	8,526	Ripač-Užljebić(gr.Hrvatske)						
	M14.2	26,337	Bosanski Petrovac-Drvr						
	M15	49,33	(gr.ent)-Sanski Most-Kamičak-Ključ						
2. L=166,541 km	M4.2	51,564	(gr.Hrvatske)Velika Kladuša-Cazin-Srbljani	1.995.000	970.000	2.965.000	2.117.279	789.770	2.907.049
	M14	49,237	Bihać-Srbljani-Bosanska otoka-(Gr.entiteta)						
	M14.2	53,674	Bosanska Krupa-Krnjeuša-Bosanski Petrovac						
		12,066	Čavkići-Spahići (u izgradnji)						
3. L=292,684km	M1.8	40,849	(gr.ent)-Arizona(gr.distr) (gr.distr.)-Srebrenik-Šićki Brod	3.630.000	2.225.000	5.855.000	4.186.921	1.352.514	5.539.435
	M1.9	19,846	(gr.ent)-Slatina-Gradačac-Ormanica						
	M4	71,881	Donja Orahovica-Petlja Šićki Brod-Tuzla-Simin Han-Kalesija-Memići(gr.ent)						
	M14.1	13,817	(gr.ent)Modriča-Gradačac-Pelagićevo(gr.ent)						
	M18	84,38	(gr.ent.)Priboj-Simin Han Šićki Brod-Kladanj-Tunel Karaula- Olovo						
	M19.2	11,780	Vitalj-(gr.ent)						
	M17.1	45,507	Ribnica-Banovići-Živinice-Dubrave-Medaš, spoj na aerodrom Tuzla						
4. L=182	M4	38,694	(gr. Ent) Teslić -Jelah-Karuše; (gr.ent.) Doboj-Gračanica-Donja Orahovica	2.240.000	1.220.000	3.460.000	2.756.282	992.650	3.748.932

JP CESTE FEDERACIJE BIH

	M5	5,217	Kaonik-Lašvanska petlja						
	M17	97,081	(gr.ent.)Karuše-Žepče-Zenica-Lašva-Bilješevo (A1)						
	M17.1	42,04	Žepče-Zavidovići-Ribnica						
5. L=132,782 km	M5	81,923	(gr.ent.) Jezero- Jajce-Travnik-Nević Polje	1.490.000	1.110.000	2.600.000	1.622.401	1.018.724	2.641.125
	M16	50,859	(gr.ent) Crna Rijeka-Jajce; Donji Vakuf-Bugojno-tunel Koprivnica						
6. L=95,191 km	M5	13,998	(gr.ent)Prača-Hrenovica(gr.ent.)	1.220.000	600.000	1.820.000	1.226.054	628.339	1.854.393
	M18	5,934	(gr.ent)Bogatići-Trnovo(gr.ent.)						
	M18.1	46,334	Ustikolina-Grebak-Trnovo						
	M20	28,925	(gr.ent.)Foča-Ustikolina-Goražde-Ustiprača(gr.ent.)						
7. L=128,837 km	M6.1	26,209	Mostar-Gnojnice-Nevesinje(gr.ent)	987.000	765.000	1.752.000	968.079	580.921	1.549.000
	M14.2	30,147	Prozor-Jablanica						
	M17	72,481	Konjic-Jablanica-Mostar-Gnojnice						
8. L=130,617 km	M5	20,104	Zelena meraja-Most.raskršće Vijećnica-Korija, Gradska obilaznica	2.150.000	1.125.000	3.275.000	2.117.583	1.286.858	3.404.441
	M17	56,302	Jošanica-Stup; Stup-Tarčin-Konjic						
	M18	54,211	Olovo-Semizovac-Koševsko brdo, Stup-Trnovo(gr.ent)						
9. L=64,512 km	M1.8	7,992	(gr.Hrvatske)-Orašje-Lončari(gr.ent)	920.000	350.000	1.270.000	948.553	355.610	1.304.163
	M14.1	24,670	(gr.ent)Brod-Svilaj-Odžak-Modriča(gr.ent)						
	M14.2	31,850	Odžak- Šamac (gr.ent) (gr. ent) Šamac-Orašje						
10. L=136,385 km	M5	58,096	Nević Polje-Kaonik-Busovača-Zelena Meraja	1.715.000	1.140.000	2.855.000	1.773.134	1.102.550	2.875.684
	M16.2	39,096	Bugojno-Gornji Vakuf-Prozor						
	M16.4	38,617	Bugojno-Novi Travnik-Nević Polje						
11. L=362,869 km	M6.1	158,647	(gr.Hrvatske) Kaldurma-Bos.Grahovo-Livno-Kolo-Studena Vrla	4.340.000	2.300.000	6.640.000	5.117.885	1.800.070	6.917.955
	M14.2	33,355	Drvar-Resanovci; Bosansko Grahovo-Strmica (gr.Hrvatske)						
	M15	96,809	(gr.ent)-Glamoč-Priluka Livno-Šujica-Kolo						
	M16	56,778	Tunel K.Vrata-Kupres- Šujica Livno-Kamensko(gr.Hrvatske)						
	M16.3	3,210	Renjići-Prisika (gr.Hrvatske)						
	M16.5	14,07	Karlov Han-Kazaginac						
12. L=366,858km	M2	9,258	(gr.Hrvatske)-Neum-(gr.Hrvatske)	4.000.000	1.030.000	5.030.000	3.830.240	1.032.356	4.862.596
	M6	86,449	(gr.Hrvatske) Gorica-Čapljina-Stolac-Ljubinje(gr.ent)						
	M6.1	70,224	Studena vrila-Posušje-Široki brijeg-Mostar Južna obilaznica Mostara						
	M15	3,111	Posušje-Kutleše-Gr.Hrvatske						
	M17	38,582	Gnojnice-Čapljina-Doljani (gr.Hrvatske)						
	M17.3	84,167	Buna-Masline; Stolac-Hutovo –Neum(+Neum-Babin do)						
	M20	8,49	(gr.Hrvatske)Dubrovnik-Duži-Trebinje(gr.ent)						
	M17.4	41,807	Mostar-Čitluk-Ljubuški-Crveni Grm(gr.Hrvatske)						
	M17.6	72,805	Dračevo-Hutovo-Ravno						
13. L=100	M17.5	100,775	Jablanica-Blidinje-Posušje-Grude-Privalj	1.010.000	490.000	1.500.000	923.757	571.400	1.495.157
14. L=57	M4.3	57,00	Velika Kladuša-Bužim-Bosanska Otoka	810.000	390.000	1.200.000	559.395	678.704	1.238.099
		2.414,618	U K U P N O	28.577.000	15.135.000	43.712.000	30.526.196	13.288.851	43.815.047

JP CESTE FEDERACIJE BIH

Redovno održavanje mostova

Naziv	Rebalans Plana 2023.	Konsultant /Izvođač	Ugovoreno	Realizovano 01.01.- 31.12.2023.
Redovno održavanje mostova				
- Most M-4.2 001-3-preko rijeke Kladušnice, Velika Kladuša - Most M-4.2-001-585- preko nepoznatog potoka, Vejinac,Purići - Most M-4.2-002-506, preko radetina potoka, Čoralici, - Most M-4.2-002-589,preko lokalne ceste, Cazin - Most M-4.2-002-7 preko rijeke Une,Sedra, Ostrožac, - Most M-5-001-9, preko potok a Garavice, - Most M-5-003-17,preko potoka jaruga, Ripač, - PLP 15-004-478, pločasti propust preko potoka Sokolovo	455.000	BC Gradnja d.o.o. Bosanska Otoka 01-02.1-14740/19 26.12.2019. Anex na osnovni ugovor:01-02.1- 242/23.10.01.2023	48.105	-
UKUPNO	455.000			-

Pregledi mostova

Naziv	Rebalans Plana 2023	Konsultant /Izvođač	Ugovoreno	Realizovano 01.01.- 31.12.2023.
Redovno održavanje pregledi mostova				
- Geodetsko opažanje mosta preko rijeke Bosne na M17 u Topčić polju km 0+747	50.000	Geobiro d.o.o.Konjic 01-02.1-9223/21. 10.09.2021.	6.903	-
UKUPNO	50.000			-

Poboljšanje sigurnosti prometa – izrada noveliranih prometnih projekata

Naziv	Rebalans Plana 2023	Konsultant /Izvođač	Ugovoreno	Realizovano 01.01.- 31.12.2023.
Projektovanje noveliranih prometnih projekta na				
- M5- Podgrab (e.l.) –Prača-Hrenovica (e.l.), - M6.1-Priluka-Livno, - M17-Zenica-petlja Lašva, - M14.1-Brod (e.l.)-Svilaj-Vukosavlje (e.l.) - M16.5-Karlov Han-Kazaginac	140.000	Divel d.o.o.Sarajevo, 01-02.3-4453/23, 13.06.2023.	43.237	21.619
Revizija noveliranih prometnih projekta na				
- M5- Podgrab (e.l.) –Prača-Hrenovica (e.l.), - M6.1-Priluka-Livno, - M17-Zenica-petlja Lašva, - M14.1-Brod (e.l.)-Svilaj-Vukosavlje (e.l.) - M16.5-Karlov Han-Kazaginac		Institut za saobraćaj i komunikacije Sarajevo, 01-02.3- 7484/23, 09.08.2023.	6.903	
UKUPNO	140.000			21.619

Održavanje i nadzor elektroopreme (rasvjeta tunela i prilaznih zona tunelima, rasvjeta raskrsnica, semafori i trafo stanice)

Naziv i opis aktivnosti	Rebalans Plana 2023	Konsultant /Izvođač	Ugovoreno	Realizovano 01.01.- 31.12.2023.
Usluge opravke, pregleda, održavanja i instalacija sistema za upravljanje tunelom Karaula	700.000	Clima Trade d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-8661/22 31.10.2022	3.359	3.359
		Sicon sas d.o.o.Tuzla, 01-02.2-12207/22, 22.12.2022.	936	936
		Matisa d.o.o. Tuzla, 01-02.2-12232/22, 23.12.2022.	4.651	3.380

JP CESTE FEDERACIJE BIH

		Electra d.o.o.Sarajevo 01-02.2-292/23. 11.01.2023	4.785	4.785
		Proving d.o.o.Sarajevo, P1293,13.04.2023.	328	328
Redovno održavanje ventilatora, trafo stanica i UPS sistema u tunelu „Žaba“		Clima Trade d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-11211/23 od 05.12.2023.	4.329	4.329
		Deling d.o.o. Tuzla, 01-02.2-11210/23, 05.12.2023.	6.903	-
		Sicon sas d.o.o.Tuzla, 01-02.2-10772/23. 17.11.2023.	5.265	
Redovno održavanje javne rasvjete tunela i prilaznih zona tunelima, raskrsnica i trafo stanica na mag.cestama		Step d.d.Sarajevo, 01-02.2-11310/22. 30.11.2022.	314.357	314.308
Redovno održavanje semaforских uređaja, opreme i svjetlećih oznaka pješačkih prelaza na mag.cestama u FBiH		Step d.d.Sarajevo, 01-02.2-8470/22. 26.09.2022.	319.643	204.305
Redovno održavanje semaforских uređaja i opreme, svjetlosnih oznaka pješačkih prijelaza i svjetlosnih upozorenja na prekoračenje brzine kod škola na mag. cestama u FBiH		Step d.d. Sarajevo, 01-02.2-9255/23, 02.10.2023.	319.643	23.802
Nadzor nad radovima redovnog održavanja semaforских uređaja i opreme i svjetlećih oznaka pješačkih prelaza		Aber Design d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-12358/22. 28.12.2022.	7.000	-
Nadzor nad radovima redovnog održavanja javne rasvjete tunela i prilaznih zona tunelima, raskrsnica i trafo stanica na mag.cestama		Aber Design d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-492/23. 17.01.2023.	7.000	-
UKUPNO	700.000			559.532

Za radove redovnog održavanja semaforских uređaja i opreme i svjetlećih oznaka pješačkih prelaza na magistralnim cestama u F BiH, za period 2021.-2025., potpisan je Okvirni sporazum broj:01-02.2-9869/21. 29.09.2021. na iznos od 1.278.570 KM.

Okvirni sporazum broj: 01-02.2-11667/21. od 24.11.2021. potpisan je za redovno održavanje javne rasvjete tunela, prilaznih zona tunelima, raskrižja i trafo stanica na magistralnim cestama u F BiH za period 2021. - 2025. na iznos od 1.257.426KM. Okvirni sporazumi su potpisani sa Step d.d. Sarajevo.

- Redovno održavanje brojača prometa

Okvirni sporazum redovnog održavanje brojača prometa postavljenih uz magistralne ceste u F BiH za period 2022. -2026. broj: 01-02.3.1-8621/22. potpisan je 03.10.2022. godine sa GP: Alem sistem d.o.o. Sarajevo i Bogal Inženjering d.o.o. Novi Sad u iznosu od 259.997 KM.

Naziv i opis aktivnosti	Rebalans Plana 2023	Konsultant /Izvođač	Ugovoreno	Realizovano 01.01.- 31.12.2023.
Redovno održavanje brojača prometa postavljenih uz magistralne ceste u F BiH	65.000	GP: Alem sistem d.o.o.Sarajevo i Bogal Inženjering d.o.o. Novi Sad 01-02.3.1-8622/22. 03.10.2022.	64.982	34.620
		GP:Alem sistem d.o.o. Sarajevo i Bogal Inženjering d.o.o. Novi Sad, 01-02.3-9290/23, 03.10.2023.	65.040	5.195
UKUPNO	65.000			39.815

JP CESTE FEDERACIJE BIH

- Redovno održavanje cestovnih meteoroloških stanica

Za redovno održavanje cestovnih meteoroloških stanica postavljenih uz magistralne ceste u F BiH 2022. – 2026. potpisan je 03.10.2022. (01-02.3.1-8623/22) Okvirni sporazum sa Alem Sistemi d.o.o. Sarajevo, vrijednosti 259.997 KM.

Naziv i opis aktivnosti	Rebalans Plana 2023	Konsultant /Izvođač	Ugovoreno	Realizovano 01.01.- 31.12.2023.
Redovno održavanje cestovnih meteoroloških stanica postavljenih uz magistralne ceste u F BiH	65.000	Alem Sistem d.o.o.Sarajevo 01-02.3.1-8624/22. 03.10.2022.	64.982	50.649
		Alem Sistem d.o.o. Sarajevo, 01-02.3-9249/23, 02.10.2023.	64.994	11.092
UKUPNO	65.000			61.741

- Sanacija postojećih i izgradnja novih svjetlosnih prometnih znakova kod škola

Naziv i opis aktivnosti	Rebalans Plana 2023	Konsultant /Izvođač	Ugovoreno	Realizovano 01.01.- 31.12.2023.
Sanacija postojećih i izgradnja novih svjetlosnih prometnih znakova kod škola	370.000	Projecta d.o.o.Mostar, 01- 02.3-11562/22. 05.12.2022	119.862	119.862
		Projecta d.o.o. Mostar, 01- 02.3-9163/23, 27.09.2023.	149.919	58.044
Obilježavanje pješačkih prijelaza sa plastikom i optičko-zvučnim trakama kod škola		Sacom d.o.o.Sarajevo, 01- 02.3-347/23. 12.01.2023.	33.881	33.312
		Sacom d.o.o. Sarajevo, 01- 02.3-9531/23, 10.10.2023.	39.722	-
UKUPNO	370.000			211.218

- Monitoring vozila redovnog održavanja GPS-om

Naziv i opis aktivnosti	Rebalans Plana 2023	Konsultant /Izvođač	Ugovoreno	Realizovano 01.01.- 31.12.2023.
Usluge satelitskog nadzora	65.000	TIM System d.o.o. Sarajevo		
LOT 1- vozila zimske službe		01-03.2-11575/22	2.809	8.582
LOT 2 – ophodarskih vozila		01-03.2-11576/22	3.488	
LOT 3- vozila internog voznog parka		01-03.2-11577/22. 05.12.2022.	4.563	
UKUPNO	65.000			8.582

REKAPITULACIJA ULAGANJA ZA REDOVNO ODRŽAVANJE

Red. br.	O P I S	Rebalans Plana 2023.	Realizacija 01.01.-31.12.2023.	Index 4/3
1	2	3	4	5
1.	REDOVNO ODRŽAVANJE I ZIMSKA SLUŽBA	43.712.000	43.815.047	100
2.	Redovno održavanje mostova	100.000	-	-
3.	Glavni pregledi objekata (složenih)	50.000	-	-
4.	Troškovi električne energije za rasvjetu tunela, raskrsnica, mostova, semafora, brojača prometa i meteo stanica	800.000	722.961	90
5.	Osiguranje pružnih prelaza u USK (sufinansiranje) Ugovor Željeznice	50.000	945	2
6.	Poboljšanje sigurnosti prometa – izrada noveliranih prometnih projekata	140.000	21.619	15
7.	Održavanje i nadzor elektro-opreme (rasvjeta tunela i prilaznih zona tunelima, rasvjeta raskrsnica, semafori i trafo stanice, te zamjena rasvjetnih tijela LED svjetiljkama)	800.000	559.532	69
8.	Poboljšanje sigurnosti prometa kod škola: - Sanacija postojećih i izgradnja novih svjetlosnih prometnih znakova - Obilježav. pješačk. prijelaza sa plastikom optičko-vibracionim trakama - Zaštita učenika kod škola na magistralnim cestama	370.000	211.218	57
9.	Redovno održavanje brojača prometa	65.000	15.640 39.815	85
10.	Redovno održavanje cestovnih meteoroloških stanica	65.000	61.741	95
11.	Monitoring vozila redovnog održavanja GPS-om	30.000	8.582	29
12.	Usklađivanje vertikalne signalizacije sa noveliranim prometnim projektima	300.000	-	-
13.	Rekalibracija mjernih uređaja za:Reflekciju horizontalne i vertikalne signalizacije i za praćenje stanja kolovoza	60.000	24.979	42
	UKUPNO REDOVNO ODRŽAVANJE	46.542.000	45.482.079	98

4. Rezervirana sredstva za rizike, neplanirane rashode i rashode koji ne terete projekte

N A Z I V	Rebalans Plana 2023.	Realizovano 01.01.- 31.12.2023.
Rezervirana sredstva za rizike i neplanirane rashode		
- Rashodi vezani za projekat „Sarajevska obilaznica“		14.040
- Obračun zateznih kamata po osnovu dužničko-povjerilačkih odnosa vezanih za Program „Modernizacija cesta u F BiH“	500.000	72.779
- Gubici na ugovore o izgradnji		120.940
- Troškovi vezani za okončane projekte		238.229
- Troškovi rada Koordinacionog tijela TEN-T mreža		21.352
Mjerenje buke Ceteor		1.755
UKUPNO	500.000	469.095

- Troškovi vezani za projekat Sarajevska obilaznica, odnose se na preostale predmete eksproprijacije (Rješenja 65 0 I: 1012601, 1012608, 101606, 1012612, 1012610 i 1012604), gdje su obračunate glavnice i kamate.
- JV Hering d.d. Široki brijeg & KTM Brina d.o.o. Posušje na osnovu ugovora BA/FBH/RFRU/W/4-1/20 finansiranog iz kreditnih sredstava EBRD-a u okviru Programa „Modernizacija cesta F BiH“, obračunali su zatezne kamate u iznosu od 72.779 KM za kašnjenje u izmirenju prispjelih obaveza po ispostavljenim privremenim situacijama u periodu od 15.03.2023.- 31.10.2023, a odnose se na projekt „Izgradnja Južne obilaznice Mostara“.
- Gubici na ugovore o izgradnji su realizovani u iznosu od 0,12 mil.KM, a odnose se na ispatu naknade štete po Presudi broj: 32 o P 209725 22 od 26.01.2023. godine u pravnoj stvari „Azabagić“ nastalu zbog zauzetog zemljišta koje je u sastavu gabarita izvedenog stanja magistralne ceste na projektu „Izgradnja Petlje Šićki brod“ i naknadu troškova u pripremi ponude firme Hering d.d. Široki Brijeg na projektu „Izgradnja brze ceste Lašva-Nević Polje, prolaz kroz poslovnu zonu Vitez“ LOT4.
- Troškovi vezani za okončane projekte se odnose na završene procese eksproprijacije na projekte koji su okončani u ranijem periodu – treća traka Kobiljača, rekonstrukcija raskrsnice Husino, rekonstrukcija magistralne ceste Ustikolina-Garež, izgradnja magistralne ceste Neum-Stolac, dionica Kiševo-Broćanac, rekonstrukcija magistralne ceste M18 na prijevoju Karaula, rekonstrukcija raskrsnice M6.1-R420 Čitluk-Posušje, sve u iznosu 38.827 KM.

Na osnovu preporuka Ureda za reviziju institucija FBiH i eksterne revizije, a u skladu sa Računovodstvenim politikama i drugim internim aktima JP Ceste FBiH, Uprava JP Ceste FBiH je po prijedlogu Komisije za popis investicija u toku, donijela Odluku o otpisu sljedećih projekata koji se neće dalje realizirati:

a.	Izgradnja Obilaznice Stolac/M17.3	11.583 KM
b.	Rekonstrukcija raskrsnice Velika Brijesnica/10+800	19.993 KM
c.	Rekonstrukcija raskrsnice ulaz u Jelah/12+600	14.871 KM
d.	Rekonstrukcija raskrsnice Kamenica/M5-R403a	37.633 KM
e.	Rekonstrukcija raskrsnice i LC Dolac na Lašvu 10+200-9+950 M5	9.883 KM
f.	Rekonstrukcija raskrsnice i LC u Travniku (Plava Voda) M5	16.503 KM
g.	Rekonstrukcija ceste i pješačke staze V. Kladuša/2+450-2+900	9.067 KM
h.	Izgradnja ceste M5 Jezero-Jajce	<u>79.869 KM</u>
	UKUPNO	199.402 KM

JP CESTE FEDERACIJE BIH

- Na osnovu Rješenja Vlade FBiH V broj: 538/2022 od 07.04.2022. godine i V broj 1356/22 od 15.09.2022. godine („Službene novine FBiH broj: 30/22) imenovano je Koordinaciono tijelo za TEN-T mrežu u FBiH. Točkom V Rješenja o imenovanju Koordinacionog tijela za TEN-T mrežu utvrđeno je da će financijska sredstva osigurati JP Ceste FBiH.

U skladu sa navedenim, poslovi i zadaci Koordinacionog tijela su:

- Definisanje tehnički i finansijski izvodljivog scenarija za razvoj mreže prema identifikovanim prioritetima, odnosno na proširenje koridora na sveobuhvatnoj i osnovnoj mreži trans-europske transportne mreže (TEN-T Core NetWork) uzimajući u obzir širok opseg postojećih studija o razvoju transportne infrastrukture u FBiH i BiH
 - Suradnja sa Ministarstvom prometa i komunikacija BiH u cilju predstavljanja stavova FBiH i praćenje provedbenih aktivnosti
 - Predlaganje akcija i praćenje aktivnosti u cilju usklađivanja planiranog proširenja TEN-T mreže sa drugim državama u regionu
 - Predlaganje akcija i praćenje aktivnosti u cilju usklađivanja planiranog proširenja TEN-T mreže sa Republikom Srpskom i Distriktom Brčko
 - Praćenje rada Transportne Zajednice i predlaganje mjera i aktivnosti u cilju ostvarivanja benefita u članstvu u Transportnoj Zajednici
 - Praćenje i sinhronizacija aktivnosti apliciranja za WBIF grantove u cilju poboljšanja prikupljanja grantova.
 - U izvještajnoj godini JP Ceste FBiH su za Koordinaciono tijelo isplatile 21.352 KM.
-
- Na osnovu Ugovora br. 01-02.2-11546/23 izvršeno je mjerenje nivoa dnevne buke na dvije lokacije u ulici Kurta Schorka, naselje Dobrinja B i po tom osnovu je plaćeno 1.755 KM.

5. Rezervirana sredstva za sudske presude

NAZIV	Rebalans Plana 2023.	Realizirano 31.12.2023.	Napomena
1	2	3	4
Rezervirana sredstva za sudske presude	1.100.000	11.399	Troškovi rezerviranja po započetim sudskim sporovima
		66.393	Troškovi usluga advokata i notara
		85.526	Nerezervirani troškovi po sudskim presudama
		120.059	Upravni i sudski troškovi po sudskim presudama
		135.617	Zatezne kamate temeljem sudskih presuda
UKUPNO	1.100.000	418.994	

U izvještajnom periodu realizovan je iznos od 0,42 mil. KM što je 38% od Rebalansom planiranih 1,10 mil. KM. Zbog prometnih nezgoda na magistralnim cestama, većina sredstava se odnosi na rezerviranja za sudske sporove vezane za nadoknadu štete.

JP CESTE FEDERACIJE BIH

6. Troškovi konsultantskih usluga

Red br.	N A Z I V	Rebalans Plana 2023.	Konsultant	Ugovoreno	Realizirano 01.01.-31.12.2023.	Index 6/3
1	2	3	4	5	6	7
1.	Obrada podataka i izrada Publikacije o prometu	67.000	UNSA Gradj. Fakult Sarajevo, 01-02.3-2507/23. 03.04.2023. Ugovor o djelu: 01-02.3-9847/23 od 19.10.2023. Ugovor o djelu: 01-02.3-11343/23 od 08.12.2023.	5.500 33.871 3.558	5.500 33.870 3.558	64
2.	Troškovi konsultantskih usluga za potrebe neovisne kontrole kvalitete radova	30.000	-	-	-	-
3.	Troškovi održavanja sustava gospodarenja cestama – SUGOC	110.000	GP TEB Informatika d.o.o. Zagreb i TEB Informatika d.o.o.Sarajevo, 01-02.3-9545/23, 11.10.2023.	109.961	109.961	100
4.	ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001 (grant sredstva EBRD-a)	72.000	TIM Know How d.o.o.Sarajevo 01-05.2-1248/22. 15.02.2022.	70.000 EUR (160.182 sa PDV-om)	71.670	100
5.	Konsultantske usluge vezane za nabavku radova i usluga po međ. procedurama	20.000	-	-	-	-
6.	Tehnička i finansijska revizija (samo za projekte finansirane iz WB i EIB) – (vezana za Program Modernizacija cesta u FBiH – kreditna sredstva)	208.000	EGIS International, BA/FBH/RMP/QCBS/4 9-1.1/CS/20,01-05.2-8635/21. 24.08.2021. Ministarstvo finansija	483.579 (preneseno 237.163) 7.399 7.135	241.789 14.534	123
7.	Snimanje i uplanjenje mreže magistralnih cesta FBiH sa uspostavom webGIS programskog rješenja za prikaz vlasništva	50.000	-	-	-	-
8.	Izrada Studije utvrđivanja lokacija na mreži magistralnih cesta u FBiH na kojima se događaju učestale prometne nezgode (crne tačke)	90.000	-	-	-	-
9.	Izrada elaborata za uvezivanje sistema upravljanja objektima (tuneli) na magistralnim cestama	37.000	Manedra-Company d.o.o. Mostar, 01-02.3-4529/23. 14.06.2023.	29.952	8.986	24
10.	Izrada elaborata procijene imovine	27.000	Ekonomski institut Banja Luka, 01-03.1-1327/23. 17.02.2023.	19.890	19.890	74
11.	Nabavka aplikacije za finansijsko upravljanje i kontrolu (FUK)	20.000	-	-	-	-
12.	Godišnji nadzorni audit za ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001	7.000	TUV Adria d.o.o. Sarajevo, 01-02.3-11684/23 od 21.12.2023.	6.991	-	-
13.	Održavanje sistema upravljanja cestovnom imovinom RAMS	126.000	-	-	-	-
14.	Elaborat uspostave sistema vaganja u pokretu	30.000	-	-	-	-
15.	Izrada elaborata: Analiza implementacije predloženih mjera i očekivanih efekata za racionalnu potrošnju električne enrgije u JP Ceste F BiH prema studijskom istraživanju iz 2016. godine	7.000	UNSA Elektrotehnički fakultet Sarajevo, 01-02.2-4622/22	6.786	6.786	97
16.	Izrada akta o procjeni rizika na radnim mjestima	7.500	Vatrosistemi d.o.o. Sarajevo 01-03.2-7959/22. 7960 07.09.2022.	7.011 526	7.537	100
17.	Ažuriranje, obrada i izrada podataka georeferenciranog panoramskog video zapisa magistralnih cesta u F BiH		GP TEB Informatika d.o.o. Zagreb i TEB Informatika d.o.o.Sarajevo, 01-02.3-8947/22, 12.10.2022.	799.340 (preneseno 179.564)	179.564	
U K U P N O		908.500			703.645	77

- R.b. 1 - Na osnovu ugovora 01-02.3-2507/23 Građevinski fakultet Univerziteta u Sarajevu je uradio recenziju Studije intenziteta prometa na magistralnim cestama za 2021. godinu. Ugovorom o djelu 01-02.3-9847/23 zaključeno je obavljanje poslova obrade podataka i izrade publikacije o prometu na magistralnim cestama u Federaciji u 2022. godini. Na osnovu Ugovora o djelu 01-02.3-11343/23 urađena je recenzija publikacije o prometu na magistralnim cestama Federacije BiH u 2022. godini.
- R.b. 3 - Održavanje, stručna podrška i unapređenje rada u programskim rješenjima SUGOC (e-mailom, telefonom ili udaljenim pristupom) sistema neophodni su za održavanje i upravljanje magistranim cestama u Federaciji BiH, na osnovu ugovora sa GP TEB Informatika d.o.o. Zagreb i TEB Informatika d.o.o. Sarajevo, 01-02.3-9545/23 od 11.10.2023.
- R.b. 4 - Cilj konsultantskih usluga bila je uspostava i implementacija integriranog sistema upravljanja kvalitetom (ISO 9001:2015), zaštitom okoliša (ISO 14001:2015) i zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu (ISO 45001:2018), te priprema i certifikacija preduzeća. Finansiranje konsultantskih usluga osigurano je iz granta Centralne evropske inicijative koji administrira Evropska banka za obnovu i razvoj u iznosu do EUR 70.000 bez PDV. Ugovor sa Konsultantom je zaključen na iznos od EUR 69.600 bez PDV. Konsultant je završio sve aktivnosti definirane obimom zadatka. Uspješno je provedena certifikacija preduzeća od certifikacijske kuće TUVADRIA, članice grupe TÜV Thüringen, Njemačka za sljedeća područja primjene integriranog sistema upravljanja: Upravljanje, građenje, rekonstrukcija, održavanje i zaštita magistralnih cesta. Na osnovu rezultata provedenog certifikacijskog audita potvrđena je usklađenost Integriranog menadžment sistema (IMS) sa primjenljivim zahtjevima standarda ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018 i sistem je ocjenjen kao efektivan. Izdani su certifikati koji su važeći od 05.01, odnosno 06.01.2023. Period važenja certifikata je 3 godine, a nadzorni audit se provodi godišnje.
- R.b. 6 - Cilj konsultantskih usluga tehničke revizije za Program „Modernizacija cesta u FBiH“ bio je provjera i neovisna potvrda da su građevinski radovi na cestama i objektima (tuneli, mostovi), kao i građevinski radovi za poboljšanje sigurnosti prometa na cestama izvršeni u skladu sa odgovarajućim zahtjevima iz ugovora, tehničkim specifikacijama, primjenljivim standardima i najboljim međunarodnim praksama. Konsultant je u 2022 obavio ispitivanja i provjere uključujući pregled i provjeru dokumentacije, terenske provjere, vizualne preglede i laboratorijska ispitivanja uzoraka uzetih za određene materijale i završene radove. U 2023 godini dostavljen je revidirani izvještaj sa druge terenske misije i konačni izvještaj tehničke revizije sa preporukama, čime su završene usluge Konsultanta. Ministarstvo finansija i trezora BiH izvršilo je nabavku usluga revizije finansijskih izvještaja za sve projekte koji se finansiraju iz kredita Svjetske banke, pa tako i projekta “Modernizacija cesta u F BiH”. Ugovor je zaključen sa Baker Tilly Opinion. Revizija finansijskih izvještaja vrši se u skladu sa Međunarodnim standardima za reviziju (ISAs) i Vodičem za povlačenja sredstava za finansiranje investicionih projekata i priručnikom Svjetske banke za zajmoprimce i okvirom za nabavke. Troškovi revizije finansijskih izvještaja za projekt „Modernizacija cesta u FBiH“ odnose se na obavljenju reviziju za 2022 i za 2023 koja će biti obavljena u 2024 tj. nakon krajnjeg datuma raspolaganja kreditom, jer se navedeni troškovi finansiraju iz kreditnih sredstava IBRD (99%) i sredstava JP Ceste FBiH (1%).
- R.b. 9 - Potpisan je ugovor 01-02.3-4529/23 sa Manedra-Company d.o.o. Mostar, a odnosi se na izradu elaborata za uvezivanje upravljanja objektima (tuneli) sa pregledom postojećih i prijedlogom jedinstvenog sistema upravljanja. Naime, planirano je uvezivanje postojećih

JP CESTE FEDERACIJE BIH

sistema upravljanja objektima na magistralnim cestama u jedinstven sistem, prenos signala u Kontrolni centar JP Ceste FBiH i uspostava osnovnog modela ITS sistema.

- R.b. 10. -U skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji u F BiH („Službene novine F BiH“ 15/21.), zbog novih dionica magistralnih cesta koje su prema Odluci Vlade F BiH preategorisane iz regionalnih u magistralne, urađena je procijena tog dijela dugotrajne imovine JP Cesta F BiH.
- R.b. 12. –Potpisan je ugovor sa TUV Adria d.o.o. Sarajevo, 01-02.3-11684/23 od 21.12.2023. za provođenje godišnjeg nadzornog audita.
- R.b. 15 - Urađen je elaborat Analize implementacije predloženih mjera i očekivanih efekata za racionalnu potrošnju električne energije u JP Ceste F BiH prema studijskom istraživanju iz 2016. godine.
- R.b. 16 - Akti procjene rizika na radnim mjestima urađeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu
- R.b. 17 - Postojeći podaci u bazi infrastrukturnih podataka (BIP) su prikupljeni i obrađeni u 2010. godini. Kategorisanjem novih cesta u posljednjih 6 godina, te implementacijom projekta iz Programa „Modernizacija cesta F BiH“ (rekonstrukcije, izmjena trase, izgradnja obilaznica, ...) došlo je do izmjene prostornih podataka, te su postojeći postali neupotrebljivi i zastarjeli. Za funkcionisanje sistema održavanja cesta (ROC) koje se bazira na ažurnoj bazi podataka neophodno je uraditi georeferencirani video zapis svih dionica magistralnih cesta, te na osnovu njega izvršiti prikupljanje i obradu podataka i na kraju ažurirati podatke u bazu. Ugovor je okončan.
- R.b. - 2, 5, 7, 8, 11, 12, 13 i 14 nije bilo realizacije u izvještajnom periodu.

7. Kamate

Red. Broj	N A Z I V	Rebalans Plana 2023.	Realizirano 01.01.- 31.12.2023.	Napomena
1.	Kamate, servisni troškovi i kursne razlike za kredit EIB-a i WB za program „Rehabilitacija cesta u F BiH“	1.720.000	1.713.963	Kamata EIB
			82.015	Kamata EBRD
			75.321	Kamata WB
2.	Kamate, provizija i takse za kredit EIB-a, EBRD –a i IBRD-a za Program „Modernizacija cesta u F BiH“ (vlastita sredstva)	5.300.000	776.936	Kamata EIB
			4.173.878	Kamata IBRD
			196.909	Provizija na nepovučena sredstva EBRD
			16.264	Provizija IBRD
UKUPNO		7.020.000	7.035.286	

Rb.1- Program „Rehabilitacija cesta u F BiH“ okončan je 2013. godine, a finansiran je kreditnim sredstvima međunarodnih finansijskih institucija i to:

- Evropska investicijska banka (EIB), op. br. 23924 u iznosu 50 mil. EUR. Ugovorena kamatna stopa je varijabilna (6 mjeseci EURIBOR) + fiksni raspon koji EIB utvrđuje u momentu povlačenja tranše. Obračun kamate započinje šest mjeseci nakon datuma povlačenja tranše. Ukupno je povučeno sedam tranši kredita.
- kredit Svjetske banke (WB) – IDA op.br. 43710 u iznosu 8,20 mil.SDR. Kamata na kredit je 0,75% na povučeni iznos kredita, a naknada za održavanje kredita iznosi 0,5% godišnje na nepovučeni iznos kredita. Obzirom da je originalna valuta kredita SDR, zavisno od kretanja valuta koje čine SDR pojavljuju se pozitivne ili negativne kursne razlike.

- Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) – op.br. 37543, u iznosu 45 mil. EUR. Otplata kredita je završena sa 05.06.2022. godine.

Rb.2 – Program „Modernizacija cesta u F BiH“ finansira se iz kreditnih sredstava međunarodnih finansijskih institucija i to:

- Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), op.br. 47461, u iznosu 65 mil. EUR. U skladu sa sporazumom o zajmu između EBRD i BiH, troškovi održavanja kredita (provizija na nepovučena sredstva zajma) iznose 0,5% godišnje. Period otplate kredita je 12 godina, uključujući 3 godine odgode otplate. Kamatna stopa je promjenljiva (6-mjesečni EURIBOR) + varijabilna marža 1%, a datumi plaćanja su 15.02. i 15.08. svake godine. Otplata kredita započela 15.08.2019. godine.
- Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD), op.br.8640 u iznosu 58 mil.EUR. U skladu sa kreditnim sporazumom provizija na nepovučeni iznos kredita iznos 0,25 % godišnje. Kamatna stopa je promjenljiva (6-mjesečni EURIBOR) +varijabilni raspon, a datumi plaćanja su 15.02. i 15.08. svake godine. Period otplate kredita je 22 godine, uključujući 12 godina period odgode otplate. Otplata kredita započinje 15.08.2028.
- Evropska investicijska banka (EIB), op.br. 82137 u iznosu 50,00 mil. EUR. Povlačenje kredita u tranšama. U skladu sa finansijskim ugovorom između EIB i BiH moguće je odabrati promjenljivu ili fiksnu kamatnu stopu, dok EIB utvrđuje varijabilni raspon u momentu povlačenja tranše. Ukupno je povučeno šest tranši kredita, a na povučene tranše primjenjuje se fiksna kamatna stopa.


6-mjesečni EURIBOR-a u 2023 godini kretao se u rasponu od 2,73 % u januaru do oko 4% početkom decembra, što se odrazilo na rast kamatnih stopa na odobrene kredite međunarodnih razvojnih banaka za program „Rehabilitacije cesta u FBIH“ (kredit EIB) i Program „Modernizacije cesta u FBIH“ sa ugovorenom promjenljivom kamatnom stopom vezanom za 6-mjesečni EURIBOR (kredit IBRD i EIB). Kredit Svjetske banke za „Rehabilitaciju cesta u FBIH“ je odobren u Specijalnim pravima vučenja (SDR), te se kod istog javlja i obračun kursnih razlika. Kod kredita EIB za „Rehabilitaciju cesta u FBIH“ na promjenljivu kamatnu stopu dodaje se i utvrđeni fiksni raspon u momentu povlačenja tranši, dok kod kredita EBRD za „Modernizaciju cesta u FBIH“ utvrđeni fiksni raspon je 1% koji se dodaje na promjenljivu kamatnu stopu.

U nastavku su tabelarno prikazane pristigle i izmirene otplate kredita za Programe „Rehabilitacija cesta u F BiH“ i „Modernizacija cesta u F BiH“ u izvještajnom periodu.

Red.Br.	Naziv banke i broj kredita	Period	Otplata kredita
<i>Program „Rehabilitacija cesta u F BiH“</i>			
1.	EIB- 23924 – I tranša	12.09.2022. - 13.03.2023.	264.640
2.	EIB- 23924 – I tranša	13.03.2023. - 12.09.2023.	264.640
3.	EIB- 23924 – II tranša	05.08.2022. - 05.02.2023.	391.166
4.	EIB- 23924 – II tranša	05.02.2023. – 07.08.2023.	391.166
5.	EIB- 23924 – III tranša	28.08.2022. - 27.02.2023.	469.399
6.	EIB- 23924 – III tranša	27.02.2023. – 28.08.2023.	469.399
7.	EIB- 23924 – IV tranša	19.12.2022. - 19.06.2023.	352.049

JP CESTE FEDERACIJE BIH

8.	EIB- 23924 – IV tranša	19.06.2023. – 18.12.2023.	352.049
9.	EIB- 23924 – V tranša	09.09.2022. - 09.03.2023.	625.866
10.	EIB- 23924 – V tranša	09.03.2023. – 11.09.2023.	625.866
11.	EIB- 23924 – VI tranša	24.08.2022. - 24.02.2023.	1.173.498
12.	EIB- 23924 – VI tranša	24.02.2023. - 24.08.2023.	1.173.498
13.	EIB- 23924 – VII tranša	03.08.2022. - 03.02.2023.	430.283
14.	EIB- 23924 – VII tranša	03.02.2023. - 03.08.2023.	430.283
15.	WB – IDA 43710	15.12.2022. - 15.06.2023.	979.823
16.	WB – IDA 43710	15.06.2023. – 31.12.2023.	996.202
A	UKUPNO		9.389.827
<i>Program „Modernizacija cesta u F BiH“</i>			
1.	EBRD - 47461	15.08.2022.-15.02.2023.	2.913.421
2.	EBRD - 47461	15.02.2023.-15.08.2023. A*	2.604.337
3.	EBRD - 47461	15.02.2023.-15.08.2023. B*	914.418
4.	EIB 82137 – I tranša	17.10.2022.-17.04.2023.	651.943
5.	EIB 82137 – I tranša	17.04.2023.-17.10.2023.	651.943
B	UKUPNO		7.736.062
	SVEUKUPNO A+B		17.125.889

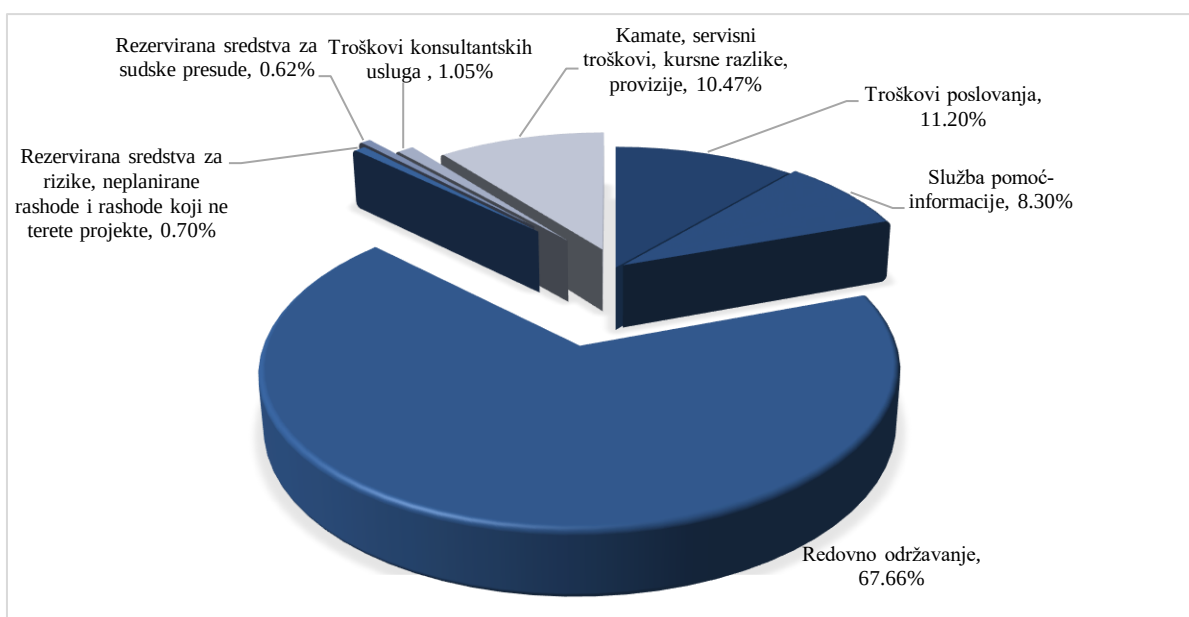

Grafički prikaz strukture realizovanih rashoda

B. II TROŠKOVI AMORTIZACIJE

Red. Br.	O P I S	Realizovano 2022.	Rebalans Plana 2023.	Realizirano 31.12.2023.	Index 5/4	Index 5/3
1	2	3	4	5	6	7
1.	Amortizacija stalnih sredstava	2.459.441	2.500.000	2.084.335	83	85
U K U P N O		2.459.441	2.500.000	2.084.335	83	85


Vrijednost nematerijalne i materijalne imovine neophodne za obavljanje osnovne djelatnosti sistematski se otpisuje tokom procijenjenog vijeka trajanja i sučeljava sa pripadajućim dijelom odloženih prihoda (izvora) do momenta otpisa, u skladu sa MRS 20. Amortizacija se obračunava linearnom metodom otpisa, tokom procijenjenog korisnog vijeka trajanja stalnih sredstava. Amortizacija se odnosi na nematerijalna stalna sredstva (1.104.668 KM), građevinske objekte (56.662 KM) opremu (748.928 KM) i transportna sredstva (174.077 KM).

JP CESTE FEDERACIJE BiH

C. INVESTICIJE

Red Br.	O P I S	Realizovano 2022.	Rebalans Plana 2023.	Realizirano 31.12.2023.	Index 5/4	Index 5/3
1	2	3	4	5	6	7
1.	Nabavka stalnih sredstava	735.148	2.396.000	1.018.550	43	139
2.	Program "Modernizacija cesta u F BiH"	43.045.829	41.570.300	37.045.232	89	86
	2.1. Program "Modernizacija cesta u F BiH"- vlastita sredstva	1.245.649	3.300.000	3.205.391	97	257
	2.2. Program "Modernizacija cesta u F BiH"- kreditna sredstva	41.800.180	38.270.300	33.839.841	88	81
3.	Projekti JP Ceste F BiH	17.560.974	70.007.250	24.412.597	35	139
	3.1. Projekti iz prethodnog perioda	14.110.469	47.628.450	23.520.731	49	167
	3.1.1. Projekti rekonstrukcije i izgradnje	2.640.955	5.289.500	3.406.966	64	129
	3.1.2. Rasvjeta i semaforizacija raskrsnica i tunela	88.701	1.692.800	24.383	1	27
	3.1.3. Poboljšanje sigurnosti prometa	1.338.445	16.961.400	7.084.654	42	529
	3.1.4. Vanredno održavanje	10.042.368	23.684.750	13.004.728	55	129
	3.1.4.1. Sanacija cestovnih objekata	2.708.785	10.813.250	4.999.491	46	185
	3.1.4.2. Sanacija klizišta, odrona, sanacija slijeganja trupa puta, kosina i zasjeka	717.651	3.061.600	1.100.744	36	153
	3.1.4.3. Sanacija oštećenih asfaltnih kolovoza	6.615.932	9.809.900	6.904.493	70	104
	3.2. Planirani projekti u 2023. godini	3.450.505	22.378.800	891.866	4	26
	3.2.1. Projekti rekonstrukcije i izgradnje	794.233	3.259.000	382.826	12	48
	3.2.2. Rasvjeta i semaforizacija raskrsnica	-	623.000	0	0	
	3.2.3. Poboljšanje sigurnosti prometa	6.962	4.463.000	0	0	0
	3.2.4. Vanredno održavanje	2.649.310	14.033.800	509.040	4	19
	3.2.4.1. Sanacija cestovnih objekata	-	3.356.000	183.679	5	
	3.2.4.2. Sanacija oštećenih asfaltnih kolovoza	2.496.082	7.871.000	163.565	2	7
	3.2.4.3. Sanacija klizišta, odrona, sanacija slijeganja trupa puta, kosina i zasjeka	153.228	2.806.800	161.796	6	106
4.	Eksproprijacija i elaborati eksproprijacije	5.301.992	3.030.000	1.409.994	47	27
5.	Projekti iz Budžeta F BiH i sufinansiranja iz drugih nivoa vlasti	9.283.291	30.000.000	2.973.804	10	32
U K U P N O		75.927.234	147.003.550	66.860.177	45	88

Investicije su realizirane u iznosu od 66,86 mil. KM, što je 45% od planiranih 147,00 mil. KM. Najveću realizaciju su imali projekti Programa „Modernizacija magistralnih cesta u FBiH“ od 33,84 mil. KM što je 88% od planiranih 38,27 mil. KM. Projekti finansirani sredstvima JP Ceste FBiH zajedno sa eksproprijacijom i nabavkom stalnih sredstava realizirani su u iznosu od 30,05 mil. KM, odnosno 38,17% od ukupno planiranih 78,73 mil. KM. Projekti finansirani iz Budžeta FBiH za 2023. godinu realizirani u iznosu 2,97 mil. KM.

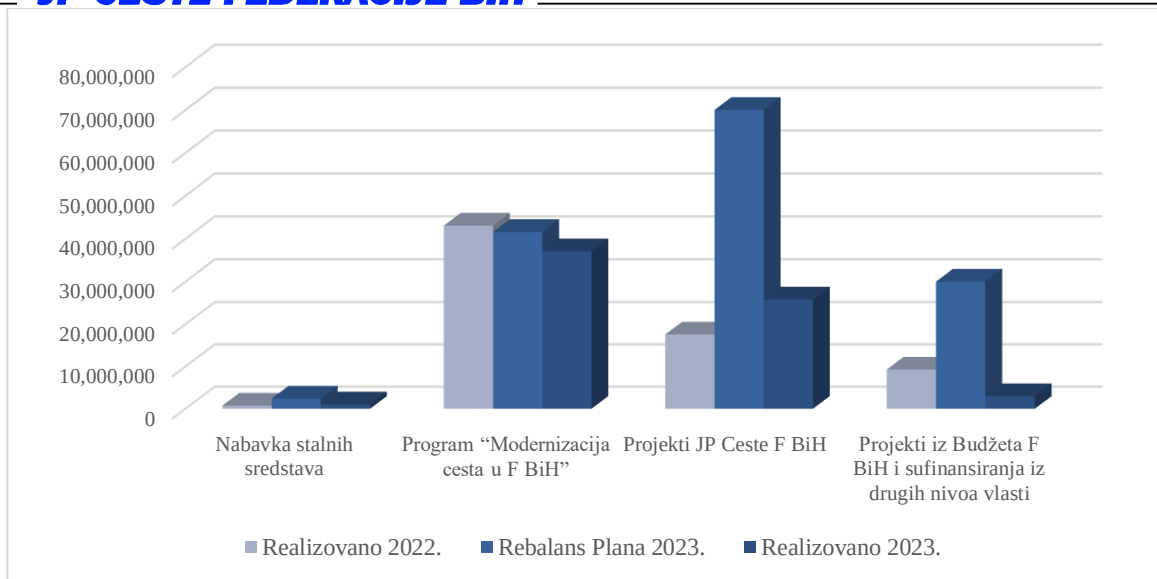

Grafički prikaz visine realiziranih ulaganja

1. Nabavka stalnih sredstava

Red. Br.	O P I S	Rebalans Plana 2023.	Realizovano 01.01.-31.12.2023.	Index 4/3
1	2	3	4	5
1.	Automobili	202.000	-	
2.	Oprema za poboljšanje funkcionisanja informatičkih sistema u JP Ceste F BiH	420.000	117.785	28
3.	Ulaganja u poslovnu zgradu	100.000	59.792	60
4.	Nabavka brojača prometa sa uvezivanjem u postojeći QLTCNet application sistem	740.000	414.537	56
5.	Nabavka cestovnih meteo stanica sa uvezivanjem u RWIS sistem JP Ceste FBiH	200.000	-	
6.	Nabavka komplet prenosne osovinske vage „za srednje točkove“	140.000	138.413	99
7.	Nadogradnja sistema RAMS -upravljanje mostovima	-	-	
8.	Nabavka 1. kompleta prenosne osovinske vage	75.000	-	
9.	Nadogradnja aplikacije pipGIS JP Ceste F BiH za upravljanje investicijama i projektima	60.000	30.629	51
10.	Nadogradnja sistema upravljanje cestama - SUGOC	300.000	243.552	81
11.	Druge nabavke neophodne za izvršenje planiranih aktivnosti	30.000	13.842	46
12.	Nadogradnja GROPRI sistema (generatora rješenja o cestovnim priključcima, reklamama i instalacijama)	129.000	-	
UKUPNO		2.396.000	1.018.550	43

R.b. 2 - Config d.o.o. Mostar je dobavljač računara i računarskih komponenti na osnovu ugovora broj: 01-02.2-1586/23 od 02.03.2023. vrijednosti 74.995 KM od čega 69.872 KM se odnosi na investicije, a 5.123 KM na održavanje stalnih sredstava. Racional d.o.o. Sarajevo je isporučio pet skenera od čega po dva stolna i plošna, te jedan ručni skener, vrijednosti 5.254 KM, a sve na osnovu ugovora broj: 01-02.3-2851/23. od 12.04.2023. Također, potpisan je i novi ugovora sa Config d.o.o. Mostar 01-02.3-11536/23 od 14.12.2023. vrijednost 39.999 KM za nabavku računarske opreme.

- R.b. 3 - Tokom izvještajnog period ulaganje u poslovnu zgradu je realizovano sa 3.915 KM, na osnovu ugovora sa Probosfor d.o.o. Sarajevo, gdje od ukupno ugovorenog iznosa od 6.606 KM, 2.691 KM, tereti rashode perioda. Ugovor 01-03.2-2999/23 potpisan sa Unioninvest d.d. Sarajevo za sanaciju sistema grijanja i hlađenja u zgradi JP Ceste FBiH, vrijednost ugovora 119.586 KM. Realizacija ugovora u izvještajnom periodu u iznosu 55.877 KM.
- R.b. 4 - U toku 2023. godine realizovano 388.259 KM za nabavku i ugradnju brojača prometa sa uvezivanjem u postojeći QLTCNet sistem, broj ugovora 01-02.3-1179/23 od 13.02.2023. godine. Također su nabavljeni zamjenski/rezervni brojači za iznos 20.311 KM, te su nabavljeni solarni paneli i montažni ormari ukupne vrijednosti 5.967 KM. U istom periodu pokrenuta nabavka novih 18 uređaja za brojanje prometa, broj nabavke 01-02.3-10423/23 od 11.12.2023. godine u ukupnom iznosu od 282.000 KM.
- R.b. 5 - Nabavka u toku cestovnih meteo stanica sa uvezivanjem u RWIS sistema JP Ceste FBiH, ugovor zaključen sa Alem Sistem d.o.o. Sarajevo, broj ugovora 01-02.3-10895/23 od 23.11.2023. god. u ukupnom iznosu 200.000 KM.
- R.b. 6 - Nabavka 4 kompleta prenosnih osovinskih vaga „za srednje točkove“ namijenjena je za mjerenje prekoosovinskog opterećenja vozila na magistralnim cestama. Dobavljač su Vage BH d.o.o. Bihać, na osnovu ugovora broj: 01-02.3-12435/22 od 30.12.2022.
- R.b. 8 - Nabavka u toku kompleta prenosne osovinske vage za vaganje teretnih vozila, dobavljač su Vage BH d.o.o. Bihać, broj ugovora 01-02.3-107800/23 od 20.11.2023. vrijednost ugovora 69.207 KM.
- R.b. 9 - Ugovor za nadogradnju aplikacije pipGIS za upravljanje investicijama i projektima je zaključen sa TIM Konzalting d.o.o. Sarajevo, broj ugovora 01-02.3-9820/23 od 19.10.2023. god, ukupna vrijednost ugovora 60.000 KM.
- R.b. 10 - Nadogradnja sistema upravljanja cestama SUGOC, ugovor zaključen sa TEB Informatika d.o.o. Sarajevo, 01-02.3-9871/23 od 19.10.2023., vrijednost 298.089 KM.
- R.b. 11 - Drugim nabavkama je obuhvaćena oprema neophodna za obavljanje radnih aktivnosti, kao što su kancelarijske stolice, eksterni USB itd.
- R.b. - 1, 7, 12 nije bilo realizacije u izvještajnom periodu.

2. Zajednički projekti sa međunarodnim finansijskim institucijama

Program „Modernizacija cesta u F BiH“

Program „Modernizacija cesta u FBiH“ (u daljem tekstu Program), prva je faza modernizacije cestovnog sektora u FBiH, a osnovni razvojni cilj Programa je modernizacija cesta i cestovnih objekata (mostovi, tuneli) duž prioriternih dionica na magistralnoj cestovnoj mreži, izgradnja obilaznica oko gradova, poboljšanje sigurnosti prometa, te jačanje kapaciteta za održivo upravljanje magistralnom cestovnom mrežom u FBiH.

Program obuhvata više podprojekata koji se mogu podijeliti u dvije grupe i to:

- **I grupa** projekti izgradnje cestovnih dionica od strateškog značaja za FBiH/ BiH i izgradnje obilaznica oko gradova; i
- **II grupa** projekti rekonstrukcije/sanacije postojećih cesta i kolovozne konstrukcije, korekcija osovine, izgradnje trećih traka za spora vozila, rehabilitacije/ rekonstrukcije mostova i tunela, rehabilitacije/ rekonstrukcije crnih tačaka i opasnih mjesta i dr.

Program se najvećim dijelom finansira iz dugoročnih kredita međunarodnih razvojnih banaka,

a dijelom i vlastitim sredstvima JP Ceste FBiH. Odobreni iznosi kredita za podršku Programu su sljedeći:

1. Evropska investicijska banka (EIB), kredit op.br. 82137 – 50,00 mil. EUR
2. Svjetska banka (WB) -Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD), kredit op.br. 8640 – 58,00 mil. EUR
3. Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD), kredit op.br. 47461– 65,00 mil. EUR

Najznačajnije aktivnosti u posmatranom izvještajnom periodu bile su:

- Završetak radova na dionici Ulaz u Stolac (Vidovo Polje) - veza na magistralnu cestu M-6, te kompletiranje dokumentacije potrebne za tehnički prijem;
- Završetak radova na M5 dionica Ripač-Dubovsko, izgradnja trake za spora vozila;
- Kompletiranje dokumentacije potrebne za tehnički prijem radova na dionici Konjic-Jablanica 1, rekonstrukciji tunela Crnaja na M17;
- Nastavak radova na obilaznici Mostara M 6.1 – dionica Miljkovići-Rodoč-veza na M 17, tunel Novi;
- Nastavak radova na LOT 1 M18 Olovo-Semizovac, dionica Čevljanovići –Nišići, izgradnja trake za spora vozila i zaštita kosina i LOT 2 M6 Grude (veza M6 i R420) izgradnja sjeverne obilaznice;
- Završetak radova na obilaznicama: Bugojno, Livno i Kiseljak;
- implementacija ugovora za nadzor za radove na dionici Ulaz u Stolac (Vidovo Polje) - veza na magistralnu cestu M-6, te dionici Ripač-Dubovsko, te mplementacija ugovora za nadzor za radove finansirane iz kredita EBRD;
- završetak konsultantskih usluga izrade inženjerskih projekta za tipična inženjerska rješenja za dionicu Živinice-Vitalj, koja pripada cesti M18, koja je naročito pogođena klimatskim rizicima (odroni stijena, klizišta, slijeganje ceste);

Krajnji rok povlačenja EBRD kredita je do 13.01.2024. godine, jer je I tranša kredita efektivna tek od polovine 2019., a II tranša je efektivna od kraja 2021., a obuhvata izgradnju novih dionica magistralnih cesta i obilaznica oko gradova koji zahtjevaju duži period izgradnje. Na početak implementacije podprojekata izgradnje novih dionica cesta i obilaznica oko gradova najveći uticaj je imao dug i složen proces rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i pribavljanja odobrenja za građenje. Nakon pažljive procjene tekućeg napretka ugovorenih radova i očekivanih nabavki građevinskih radova koji se finansiraju iz EBRD kredita, JP Ceste FBiH je procijenilo da će biti potrebno produženje krajnjeg datuma zatvaranja EBRD kredita za oko 18 mjeseci u cilju potpune implementacije projekta i ciljeva Projekta. Zahtjev za produženje krajnjeg roka raspolaganja sredstvima kredita dostavljen je EBRD, putem Ministarstva finansija i trezora, u septembru 2023., te se očekuje pozitivan odgovor EBRD na zahtjev.

JP CESTE FEDERACIJE BIH

2.1. Radovi na modernizaciji magistralnih cesta i objekata i konsultantske usluge nadzora

2.1.1. Preneseni projekti ranijeg perioda

Red. Br.	Mag. Cesta	DIONICA	Aktivnosti na projektu	Rebalans Plana 2023.	Izvođač /konsultant ugovor	Ugovoreno	Realizovano 01.01.-31.12.2023.	Napomena
1. Izgradnja cesta – Poboljšanje elemenata u postojećem koridoru								
M17.3		Ulaz u Stolac (Vidovo Polje, veza na M6) L=1,3 km	Izvođenje	3.147.000	JV HP Investing d.o.o. Mostar, Putovi d.o.o. Grude i Euro-asfalt d.o.o. Sarajevo Amandman 1 na ugovor Stolovi-Drenovac 01-05.2-6997/21_BP 28.06.2021, Amandman br.2 01-05.2-6997-1/21 14.03.2023 Amandman br.3 01-05.2-8659/23, 11.09.2023.	4.058.362	3.095.155	Okončano
			Nadzor	155.000	JV iC consuelten GesmbH, Nievelt Ingenieur GmbH Wien i AIK Inženjering d.o.o. Banovići, 01-02.3-2574/18. 28.03.2018 Adendum 1 01-05.2-2123/22. 30.03.2022. Adendum 2 01-05.2-4000 30.05.2023	259.486	150.618	
			Kamata				303.467	
			Ukupno				3.549.240	
		Neum-Stolac, izgradnja ceste Stolovi-Drenovac	Izvođenje		JV HP Investing d.o.o. Mostar, Putovi d.o.o. Grude i Euro Asfalt d.o.o. Sarajevo, Amandman 1 01-05.2-6997/21_BP 28.06.2021, Amandman br.2 01-05.2-6997-1/21, 14.03.2023 Amandman 3 01-05.2-8659/23, 11.09.2023.		50.600	Okončano
			Kamata				4.575	
			Ukupno				55.175	
		Neum-Stolac, izgradnja ceste Cerovica-Stolovi	Izvođenje		JV Hering d.d. Široki Brijeg i Cestar d.o.o. Split, 01-05.2-7176/20 BP, 16.07.2020. Amandman br.1,01-05.2-8167/22, 15.09.2022. Amandman br.2, 01-05.2-8657/23, 11.09.2023		83.227	Okončano
			Ukupno				83.227	
		Neum -Stolac, izgradnja dionice Hutovo - Cerovica, L= 4,475 km	Izvođenje		JV Hering d.d. Široki Brijeg i Cestar d.o.o. Split, 01-05.2-7176/20 BP, 16.07.2020. Amandman br.1,01-05.2-8167/22, 15.09.2022. Amandman br.2, 01-05.2-8657/23, 11.09.2023		108.762	Okončano
			Kamata				3.718	

JP CESTE FEDERACIJE BIH

					Ukupno				112.480	
3. Rekonstrukcije ceste i kolovozne konstrukcije, korekcija osovine										
3.1	M5	002	Bihać 4-Ripač, sanacija kolovoza i korekcija osovine	Izvođenje	384.000	JV Kov-grad d.o.o. Bužim i BC-Gradnja d.o.o Bos. Otoka 01-02.3-8459/18, 03.10.2018.		325.837	Okončana I faza za koju su riješeni imovinsko-pravni odnosi i pribavljeno odobrenje za građenje. Jedna kuća i pripadajuća parcela predmet spora što je onemogućava pristup u dužini od oko 200 m i pribavljanje građevinske dozvole za navedeni dio	
				Nadzor	-	JV Divel d.o.o. Sarajevo, IG d.o.o. Banja Luka i IGH d.o.o. Mostar, 01-02.3-5708/18, 17.07.2018.		-		
				Kamata				11.139		
				Ukupno				336.976		
3.2	M5	009	Jajce jug-Donji Vakuf , presvlačenje i ispravka osovine (tuneli Vinac i Skela i dvije dionice)	Izvođenje	671.000	JV Euro Asfalt d.o.o. Sarajevo i BBM d.o.o. Sarajevo, 01-02.3-9997/19, 21.08.2019.	7.092.070 (preneseno 670.578)	563.564	Okončano	
				Nadzor	42.000	JV Divel d.o.o. Sarajevo, IG d.o.o. Banja Luka i IGH d.o.o. Mostar, 01-02.3-5708/18, 17.07.2018.	308.882 (preneseno)	237.104		
				Kamata				63.588		
				Ukupno				864.256		
2. Izgradnja traka za spora vozila										
2.1	M5	003	Ripač – Dubovsko	Izvođenje	4.822.000	Jata Group d.o.o. Srebrenik, 01-05.2-220/22_BP 17.02.2022.	5.649.086 (preneseno 4.821.556)	4.821.455	Okončano	
				Nadzor	41.000	JV Divel d.o.o. Sarajevo, IG d.o.o. Banja luka IGH d.o.o. Mostar, 01-02.3-5708/18, 17.07.2018.	218.755 (preneseno 26.205)	67.266		
				Kamata				282.723		
				Ukupno				5.171.444		
			Izgradnja trake za spora vozila Stupari-Vitalj	Kamata				14.282		
				Ukupno				14.282		
2.2	M5	006	Bosanski Petrovac - Ključ – prevoj Lanište	Izvođenje	152.000	Euro-Asfalt d.o.o.Sarajevo, 01-02.3-3180/19, 19.03.2019.	4.468.663 (preneseno 369.207)	176.863	Po Zapisniku o okončanju projekta izvršeno preknjižavanje 31.12.2023.u iznosu 25.109. KM sa projekta rekonstrukcije crne tačke Skokovi-Srbljani na projekat „Prijevoj Lanište“	
				Kamata				6.046		
				Ukupno				182.909		
6. Rekonstrukcija crnih tačaka i opasnih mjesta										
	M4.2	002	Skokovi-Srbljani, rekonstrukcija crne tačke „Mala Lisa“ km 11+230	Izvođenje		Euro-Asfalt d.o.o.Sarajevo, 01-02.3-3180/19, 19.03.2019.	830.861	-25.109		
				Ukupno				-25.109		
4. Rekonstrukcije/ rehabilitacije tunela										
4.1	M17	007	Topčić polje – Lašva, sanacija tunela Vranduk II km 7+416	Izvođenje	30.800	JV Hering d.d. Široki Brijeg i BBM d.o.o. Sarajevo, 01-02.3-7602/18, 06.09.2018., Amandman 1 01.05.2-12323/19,22.11.2019 Amandman 2	21.712.909	30.845	Okončano	

JP CESTE FEDERACIJE BIH

				Nadzor	12.500	01-05.2-586/21 BP, 15.04.2021 JV Divel d.o.o. Sarajevo, IG d.o.o. Banja Luka, 01-02.3-5708/18. 17.07.2018		12.470	
				Kamata				1.055	
				Ukupno				44.370	
4.2	M17	012	Rekonstrukcija tunela Crnaja na magistralnoj cesti M17, dionica Konjic-Jablanica	Izvođenje	79.000	JV HP Investing d.o.o. Mostar i Euro Asfalt d.o.o. Sarajevo, 01-02.3-7425/19, 16.06.2019. Amandman 1, 01-05.2-3103/21 BP 29.03.2021	12.833.631	78.671	Okončano
				Kamata				59.508	
				Ukupno				138.179	
Zajedničko finansiranje EIB +WB				Izvođenje	9.285.800			9.309.870	
				Nadzor	250.500			467.458	
	M 6.1	N	Mostar obilaznica – Izgradnja dionice Miljkovići – Rodoč, vijadukt Marjanovića Draga	Izvođenje	150.000	JV Hering d.d. Široki Brijeg i KTM Brina d.o.o. Posušje, 01-05.2-7204/20, 16.07.2020. Amandman 1 01-05.2-3706/22, 19.05.2022 Amandman 2 01-05.2-8782/22, 11.10.2022 Amandman 3 01-05.2-7462/23, 08.08.2023		135.458	Okončano
				Kamata				14.519	
				Ukupno				149.977	
4.2	M5		Izgradnja obilaznice Donji Vakuf – I faza	Izvođenje	1.000.000	JVCA Bossil d.o.o. Vitez-Point d.o.o. Sarajevo, 01-05.2-3/21.BP. 05.01.2021.	3.380.073	710.785	Radovi u toku
				Kamata				76.452	
				Ukupno				787.237	
5. Izgradnja i rekonstrukcija obilaznica									
5.1	M16.4		Izgradnja obilaznice Bugojno	Izvođenje	2.910.000	JV Putovi d.o.o. Grude i Dobojputevi d.d.Doboj Jug. 01-05.2-3381/22 BP, 11.05.2022. Amandman br.1 01-05.2-11223/22; 1.12.2022 Amandman 2 01-05.2-6649/23, 26.07.2023; Amandman 3 01-05.2-9659/23, 12.10.2023	4.679.594	2.909.278	Okončano
				Nadzor	193.000	Roughton International LTD. UK, Amandman br 2 01-05.2-3288/22. 06.05.2022. Amandman 4 ;01-05.2-11231/23, 06.12.2023	264.500	172.619	
				Kamata				344.408	
				Ukupno				3.426.305	
5.2				Izvođenje	4.110.000	JV Livnopotovi d.o.o Livno i KTM Brina d.o.o Posušje 01-05.2-3382/22 BP	4.605.549	3.773.121	Okončano

JP CESTE FEDERACIJE BIH

	M15		Livno obilaznica – I faza			31.05.2022 Amandman br.1 01-05.2-12336/22, 27.12.2022			
				Nadzor	290.000	Roughton International LTD. UK, Amandman br.2 01-05.2-3288/22 06.05.2022. Amandman 4 ;01-05.2-11231/23, 06.12.2023	343.000	186.313	
				Kamata				443.045	
				Ukupno				4.402.479	
6. Izgradnja i rekonstrukcija pristupnih cesta i obilaznica									
6.1	M18	007 i 009	Olovo – Semizovac – rekonstrukcija skarpi i spora traka Čevljanovići – Nišići	Izvođenje	3.600.000	Strabag AG 01-05.2-8863/22 11.10.2022. Amandman 1 01-05.2-6610/23, 10.07.2023	5.517.712	2.754.023	Radovi u toku, JP „Sarajevošume“ nije izvršilo obavezu sječe šume. Sječa šume počela u novembru 2023, te će dinamika izvođenja ovih radova uticati na konačni završetak radova
				Nadzor	65.000	Roughton International LTD. UK, 01-05.2-511/20. 13.01.2020. Amandman 1 01-05.2-2615/22, April 2022 Amandman 4 01-05.2-11231/23, 06.12.2023	100.600	169.684	
				Ukupno				2.923.707	
6.2	M 6.1		Mostar obilaznica – Izgradnja dionice Miljkovići – Rodoč (Tunel Novi)	Izvođenje	10.700.000	JV Hering d.o.o. Široki brijeg & Azvirt LLC Baku Azerbejdžan 01-05.2-7664/22 30.08.2022.	25.131.195 (Preneseno 23.975.612)	7.946.909	Radovi u toku
				Kamata				817.860	
				Ukupno				8.764.769	
7.4	M6		Grude (veza M6 i R420) – Izgradnja sjeverne obilaznice	Izvođenje	2.500.000	JV Putovi D.o.o. Grude i HP Investing d.o.o. Mostar, 01-05.2-10159/22 BP 14.11.2022.	5.056.283	2.066.158	Radovi u toku, planirani datum završetka 16.08.2024
				Kamata				212.947	
				Ukupno				2.279.105	
7. Izgradnja obilaznica									
7.1	M5		Izgradnja obilaznice Kiseljak – I faza	Izvođenje	2.666.000	JV HP Investing d.o.o.Mostar&Jata Group d.o.o.Srebrenik 01-05-3383/22 BP. 18.05.2022. Amandman br.2 01-05.2-12218/22, 29.12.2022	4.252.396	2.665.055	Okončano
				Nadzor	148.000	Roughton International LTD. UK, Amandman br.2 01-05.2-3288/22 06.05.2022. Amandman 4 ;01-05.2-11231/23, 06.12.2023	265.500	193.821	
				Kamata				324.533	
				Ukupno				3.183.409	
EBRD				Izvođenje	27.636.000			22.960.787	
				Nadzor	696.000			722.437	
SVEUKUPNO EIB +WB+EBRD				Izvođenje	36.921.800			32.270.657	
				Nadzor	946.500			1.189.895	

JP CESTE FEDERACIJE BIH

Planirani projekti u 2023. godini

Finansiranje radova i konsultantskih usluga nadzora za M 14 Bihać - Bos. Krupa, I faza Jablanska –Mali Lug km 3.5 osigurano je iz sredstva kredita EBRD. Za navedeni projekat pripremljena je dokumentacija za nabavku radova i dostavljena EBRD na saglasnost, te se objava natječaja za nabavka radova očekuje u januaru 2024. Konsultantske usluge nadzora radova biće osigurane amandmanom na postojeći ugovor za nadzor radova sa Roughton International .

Konsultantske usluge

Red. Br.	N A Z I V	Rebalans Plana 2023.	Izvođač/ Konsultant-ugovor	Ugovoreno	Realizirano 01.01.- 31.12.2023.	Finansijer
1.	Tehnička pomoć pri implementaciji projekta	26.000	Roughton International LTD. UK, 01-02.3-8736/17. 28.09.2017.	463.747 (preneseno)	25.382	100% EIB
2.	Vanjska kontrola kvalitete radova izgradnje Stari Neum-Drenovac	12.000	JV Igmat d.o.o. DTQ d.o.o. IGH d.o.o. Mostar, 01-02.3-4861/19, 22.04.2019.	705.015 (preneseno 11.574)	11.490	EIB/WB
3.	Vanjska kontrola – ostali projekti obuhvaćeni modernizacijom	70.000	JV AIK Inženjering d.o.o. Banovići, TPA d.o.o. .Zagreb, 01-05.2-8210/20. 13.08.2020.	640.887 (preneseno)	49.092	EIB/WB
4.	Nadzor za projekte finansirane od strane EBRD iz II tranše	300.000				JP Ceste F BiH
	- Izgradnja obilaznice Donji Vakuf, I faza 0151		GP: PPG d.o.o. Sarajevo i IGH d.o.o. Mostar, 01-02.1-117/21. 06.01.2021. Anex 01-02.1-243/23 10.01.2023	97.297 (preneseno 19.460) 27.331	42.253	
			PPG d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-7069/23, 25.07.2023.	5.733		
	- Obilaznica Grude (sjeverna) 0169		GP: IGH d.o.o. Mostar, Integra d.o.o. Mostar i Trasa d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-2256/23. 24.03.2023	349.339	179.273	
5.	Izrada projekta za poboljšanje otpornosti na klimatske promjene na mag. cesti M18_007, dionica: Živinice – Vitalj 0421	294.000	JV IPSA Institut d.o.o. Sarajevo i Winner Project d.o.o. Sarajevo, 01-05.2-1879/22, 14.03.2022., Amandman 01-05.2-1879-1/22, 08.04.2022.	391.000	293.325	
UKUPNO		702.000			565.786	

Kamate na međunarodne kredite

N A Z I V	Rebalans Plana 2023.	Realizirano 31.12.2023.	Napomena
Kamate i servisni troškovi za program „Modernizacija cesta u FBiH“	3.000.000	2.983.865	Vlastita sredstva
UKUPNO	3.000.000	2.983.865	

Troškovi održavanja kredita (provizija na nepovućena sredstva kredita), u skladu sa sporazumom o kreditu između Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i BiH iznose 0,5% godišnje. Kamatna stopa je promjenljiva (6-mjesečni EURIBOR) +varijabilna marža 1%, a datumi plaćanja su 15.02. i 15.08. svake godine.

Provizija na nepovućeni iznos kredita, u skladu sa kreditnim sporazumom između Međunarodne

banke za obnovu i razvoj (IBRD) i BiH iznosi 0,25 % godišnje. Kamatna stopa je promjenljiva (6-mjesečni EURIBOR) +varijabilni raspon, a datumi plaćanja su 15.02. i 15.08. svake godine.

Povlačenje kredita Evropske investicijske banke (EIB), u skladu sa finansijskim ugovorom između EIB i BiH, je u tranšama. Za povlačenje tranši kredita Evropske investicijske banke (EIB), u skladu sa finansijskim ugovorom između EIB i BiH, može se odabrati fiksna ili promjenljiva kamatna stopa, a EIB utvrđuje varijabilni raspon u momentu povlačenja tranše. Ukupno je povučeno šest tranši kredita po fiksnoj kamatnoj stopi, jer je u momentu zahtjeva za povlačenje tranši ista bila povoljnija od promjenljive kamatne stope.

U 2023 godini 6-mjesečni EURIBOR-a kretao se u rasponu od 2,73% početkom januara do oko 4% početkom decembra, što je imalo utjecaj na rast kamatnih stopa na odobrene kredite međunarodnih razvojnih banaka za Program „Modernizacije cesta u FBiH“ sa ugovorenim promjenljivom kamatnom stopom (kredit IBRD i EBRD).

Obračunata kamata na međunarodne kredite tereti projekte koji su u toku, a finansirani iz ovih sredstava, sve do trenutka njihovog aktiviranja.

Revolving sredstva za PDV

U skladu sa odredbama člana 29. Zakona o porezu na dodanu vrijednost i instrukcijom Uprave za indirektno oporezivanje o uslovima i načinu povrata PDV-a po osnovu uvoza i isporuke dobara, nabavke radova i usluga za međunarodne projekte, može se ostvariti povrat PDV-a uz podnošenje propisane dokumentacije i dokaza o uplati PDV-a. Obzirom da se radi o povratnim sredstvima, plaćanje istih će se vršiti iz tekućeg priliva sredstava, a nadopunjavati povratom sredstava od Uprave za indirektno oporezivanje

**REKAPITULACIJA PLANIRANIH ULAGANJA ZA
PROGRAM „MODERNIZACIJA CESTA U FBIH“**

Red. Br.	O P I S	Rebalans Plana 2023.					Realizirano 31.12.2023.				
		EIB	EIB + WB	EBRD	WB	UKUPNO	EIB	EIB + WB	EBRD	WB	UKUPNO
I	Radovi		9.285.800	27.636.000		36.921.800		9.309.870	22.960.787		32.270.657
1.	Troškovi nadzora		250.500	696.000		946.500		467.458	722.437		1.189.895
2.	Vanjska kontrola		82.000			82.000		60.582			60.582
3.	Tehnička pomoć pri implementaciji projekta	26.000				26.000	25.382				25.382
4.	Tehnička pomoć za procjenu osjetljivosti cestovne mreže na klimatske promjene				294.000	294.000				293.325	293.325
5.	Konsultantske usluge za sigurnost prometa										
II	Konsultantske usluge – ukupno	26.000	332.500	696.000	294.000	1.384.500	25.382	528.040	722.437	293.325	1.569.184
III	Robe										
IV	SVEUKUPNO (I+II+III)	26.000	9.618.300	28.332.000	294.000	38.270.300	25.382	9.837.910	23.683.224	293.325	33.839.841

JP CESTE FEDERACIJE BIH

3. Projekti JP Ceste F BiH

3.1. Projekti iz prethodnog perioda

3.1.1. Projekti rekonstrukcije i izgradnje

Red Br.	Mag. Cesta	Naziv i opis projekta	Aktivnosti na projektu	Rebalans Plana 2023.	Izvođač/ Konsultant - ugovor	Ugovoreno	Realizovano 01.01.- 31.12.2023.	Napomena
1.	M5	Obilaznica Kiseljaka - Glavni projekat trase (II faza) , tunela (L=cca 600m) ukupna dužina dionice L=cca 1.000m	Projektiranje	122.000	Ipsa Institut d.o.o.Sarajevo 01-02.1-8987/20. 14.09.2020.	149.200 (preneseno 102.895)	55.364	Izrada u toku
			Revizija	10.000	GP: IG d.o.o.Banja luka i Divel d.o.o. Sarajevo 01-02.1-4549/21. 12.04.2021.	9.594	-	
			Ukupno				55.364	
2.	M14.1	Glavni projekat izgradnje dionice ceste Grmuša – Mali Radič, L=8km, uključujući Misiju G21	Projektovanje	76.000	Geoput d.o.o Banja luka, 01-02.1-9577/21. 22.09.2021.	75.763	53.034	Izrada u toku
			Revizija	3.000	Trasa d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-10254/18 20.11.2018.	2.925	-	
			Ukupno				53.034	
3.	M17.3	Rekonstrukcija ceste M17.3, dionica: Drenovac-Stolac, L=cca 8 km - Glavni projekat	Projektovanje	22.000	Integra d.o.o. Mostar, 01-02.1-12269/19 18.10.2019.	39.817 (preneseno 22.576.)	-	Izrada u toku
			Revizija	5.000	Pronasa d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-3227/20. 12.03.2020.	4.998	-	
			Ukupno				-	
4.	M14	Izgradnja obilaznice Bosanska Otoka (veza cesta M14 i R 401) - Glavni projekat trase i mosta preko rijeke Une	Projektovanje	56.300	GP:Routing d.o.o.Banja luka i Geoput d.o.o. Banja luka, 01-02.1-5342/21. 05.05.2021.	84.800 (preneseno 56.318)	-	Izrada u toku
			Revizija	4.700	Trasa d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-7980/21. 29.07.2021.	4.680	-	
			Ukupno				-	
5.	M6	Izrada glavnog projekta izmještanja trase ceste M6 na dionici Gornji Trebižat-spoj sa M17 u Klepcima (obilaznica Čapljine) (L=cca 8,7km)	Projektiranje	420.000			-	Nabavka usluga projektiranja u toku
			Revizija	40.000			-	
6.	M6 i M17.4	Izgradnja obilaznice Ljubuškog (Spoj M6 i M17.4) Izvođenje radova od P61 A do P71	Izvođenje	500.000			-	
			Nadzor	15.000			-	
7.	M6	Izgradnja Južne obilaznice Gruda – Izlaz Prispa (Spoj kružnog toka na M6 sa izgrađenim dijelom obil.)	Izvođenje	500.000	Putovi d.o.o. Grude, 01-02.1-6647/23, 11.07.2023.	499.701	368.862	Okončano
			Nadzor	12.000	IGH d.o.o. Mostar, 01-02.1-6648/23, 11.07.2023.	11.911	8.829	
			Ukupno				377.691	
8.	M4.3	Izgradnja obilaznice Bužim (III faza)	Izvođenje	380.000	Kov-Grad d.o.o. Bužim, 01-02.2-4743/22. 28.06.2022.	1.014.302 (preneseno 380.113)	380.113	Okončano
			Nadzor	25.000	GP: PPG d.o.o. Sarajevo, Geofeld d.o.o. Bihać Arting BH d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-5137/22, 12.07.2022.	24.661	24.661	
			Ukupno				404.774	
9.	M18	Idejno rješenje modernizacije ceste M18,	Projektiranje	13.000	IG d.o.o. Banja luka	35.568 (preneseno)	12.929	Okončano

JP CESTE FEDERACIJE BIH

		dionica: Stupari-Vitalj			01-02.1-7139/22, 02.08.2022.	12.928)		
			Ukupno				12.929	
10.	M4.2	Izgradnja obilaznice Cazina - Izrada Glavnog projekta (izmještanja) raskrsnice Čizmići na projektu izgradnje Obilaznice Cazina	Projektiranje	6.300	Geo-Feld d.o.o.Bihać, 01-02.1-11407/22 01.12.2022.	6.962	6.265	Revizija u toku
			Revizija	2.000	GF Univerziteta u Sarajevu, 01-02.1-11886/23, 29.12.2023.	1.980	-	
			Ukupno				6.265	
11.	M4.2	Izgradnja obilaznice Cazina - Izrada Glavnog projekta (izmještanja) raskrsnice Kapići na projektu izgradnje Obilaznice Cazina	Revizija	2.000			-	Nije ugovoreno projektiranje
12.	M18	Rekonstrukcija ceste M18, dionica Kladanj-Podpaklenik – u ukupnoj dužini cca 3,50km Glavni projekat trase i idejni projekat objekata - dionica 1 (LOT 1) Kladanj-Karaula, - dionica 2 (LOT 2) Karaula -Olovo	Projektiranje	102.000	Institut za građevinarstvo „IG“ d.o.o. Banja Luka, 01-02.1-9861/23, 19.10.2023.	101.895	-	Izrada u toku Nabavka usluga revizije u toku
			Revizija	10.000			-	
			Ukupno				-	
13.		Izmještanje trase ceste M6, Grude-Ljubuški-Čapljina Izrada idejnog rješenja trase, dionica: Podledinac-Lipno-križanje sa M17.4(Cerno)-Miletina, L=cca 26,00 km	Projektiranje	130.000			-	Ugovor u pripremi
14.	M4.3	Izgradnja obilaznice Bužima (završetak radova)	Izvođenje	1.590.000	Kov-grad d.o.o. Bužim, 01-02.2-8989/22, 12.10.2022.	1.789.047 (preneseno 1.588.998)	1.588.061	Okončano
			Nadzor	22.000	GP Geo Feld d.o.o. Bihać, PPG d.o.o. Sarajevo, FM Inženjering d.o.o. Sarajevo, Geo Feld d.o.o. Bihać,	21.645	21.645	
			Ukupno				1.609.706	
15.	M6	Izgradnja Južne obilaznice Gruda – Izlaz Prispa (izgradnja kraka prema Ljubuškom)	Izvođenje	823.000	Putovi d.o.o.Grude 01-02.1-12350/22 28.12.2022.	822.510	822.352	Okončano
			Nadzor	10.000	Arting BH d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-715/23, 26.01.2023	9.629	9.629	
			Ukupno				831.981	
16.	M17	Revizija glavnog projekta petlje Drivuša i izrada separata za saglasnosti i dozvole	Revizija	10.000			-	
17.	M17.6	Izrada idejnog rješenja rekonstrukcije (ili izgradnja) ceste M17.6, Dračevo-Hutovo_Ravno, dionica: Hutovo-Trnčina	Projektiranje	323.000			-	PZ u pripremi
18.	M5	Izgradnja (izmještanje) ceste M5, dionica I Izačić – Kamenica, glavni projekat trase	Projektiranje	34.000	Ipsa Institut d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-7262/20. 13.07.2020.	48.555 (preneseno 33.988)	33.988	Okončano
			Revizija	700	GF UNSA 01-02.1-5952/23. 20.01.2023.	700	700	
			Ukupno				34.688	
19.	M17.5	Rekonstrukcije ceste M17.5, dionica Jablanica-Sovići (cca 20km) – Idejni projekat (sa geodezijom)	Projektiranje	20.500	IG d.o.o. Banjaluka 01-02.1-12239/21. 14.12.2021.	68.445 (preneseno 20.534)	20.534	Okončano
			Ukupno				20.534	
				5.289.500			3.406.966	

3.1.2. Rasvjeta i semaforizacija raskrsnica

Red br.	Mag. Cesta	Naziv i opis projekta	Aktivnosti na projektu	Rebalans Plana 2023.	Izvođač/ Konsultant - ugovor	Ugovoreno	Realizovano 01.01.- 31.12.2023.	Napomena
1.	M16	Rasvjeta tunela Tuk na M16, dionica: Crna Rijeka – Jajce	Izvođenje	400.000			-	Potrebno sa EP HZHB dovesti dalekovod do mag. ceste (400m)
			Nadzor	7.000			-	
2.	M14.2	Semaforizacija mosta u Prudu /Šamac na cesti M14.2	Izvođenje	45.000			-	Poništen tender jer je ponuda veća od plana.
3.	M1.9	Rasvjeta tunela Ormanica	Izvođenje	130.000	Nexen d.o.o. Banja Luka, 01-02.2-3061/23 20.04.2023		-	Izvođač nije pristupio radovima. Upozoren na raskid ugovora
			Nadzor	3.000			-	
			Ukupno				-	
4.	M14.1 M1.9	Rasvjeta raskrsnice cesta M14.1 i M1.9 u Gradačcu (kružni tok)	Projektovanje	4.000			-	Žalbeni postupak u toku
			Izvođenje	250.000			-	
			Nadzor	2.500			-	
5.	M16	Rasvjeta raskrsnice cesta M16 i R413b, skretanje za Dobretiće, općina Jajce	Projektovanje	3.900	Manedra d.o.o. Mostar 01-02.2-10675/22, 18.11.2022.	3.896	-	Projekt. Okončano, nije situirano
			Izvođenje	120.000			-	
			Nadzor	2.500			-	
			Ukupno				-	
6.	M16 M16.2	Rasvjeta raskrsnice cesta M16 i M16.2, općina Bugojno	Projektovanje	4.000	Manedra d.o.o. Mostar, 01-02.2-9003/22, 13.10.2022.	3.978	3.978	Nabavka radova i nadzor u toku
			Izvođenje	120.000			-	
			Nadzor	2.500			-	
			Ukupno				3.978	
7.	M17	Rasvjeta raskrsnice na cesti M17, skretanje Brankovići, općina Žepče	Projektovanje	4.000	ATS d.o.o. Sarajevo 01-02.2-491/23, 17.01.2023	3.955	3.955	
			Izvođenje	120.000			-	
			Nadzor	2.500			-	
			Ukupno				3.955	
8.	M17	Rasvjeta raskrsnice na cesti M17, skretanje Željezno polje	Projektovanje	4.000	ATS d.o.o. Sarajevo 01-02.2-9004/22, 13.10.2022.	3.966	3.966	Autoceste FBiH rade petlju
			Izvođenje	120.000			-	
			Nadzor	2.500			-	
			Ukupno				3.966	
9.	M4.2	Rasvjeta raskrsnice na cesti M4.2, skretanje Mihaljevac, grad Cazin	Projektovanje	3.900	Manedra d.o.o. Mostar, 01-02.2-10676/22, 18.11.2022.	3.861	-	Nabavka u toku
			Izvođenje	120.000			-	
			Nadzor	2.500			-	
			Ukupno				-	
10.	M6 M16.5	Rasvjeta raskrsnice cesta M6.1 i M16.5, Karlov Han, općina Livno	Projektovanje	3.900	Manedra d.o.o. Mostar, 01-02.2-9002/22, 13.10.2022. Nexen d.o.o. Banja Luka, 01-02.2-	3.896	3.896	Očekuje se početak radova
			Izvođenje	120.000		102.869	-	

JP CESTE FEDERACIJE BIH

			Nadzor	2.500	9060/23, 21.09.2023. IPSA Institut d.o.o. Sarajevo, 01-02.2- 9061/23, 21.09.2023.	1.708	-	
			Ukupno				3.896	
11.	M17	Sanacija semafora u Konjicu na M17 i R435	Projektovanje	7.000	Electra d.o.o. Sarajevo, 01-02.2- 8324/23, 06.09.2023.	6.997	6.997	Okončano projektovanje
			Izvođenje	75.000			-	
			Ukupno				6.997	
12.	M17	Rasvjeta Ribičkog mosta, dionica: Konjic-Jablanica	Projektovanje	7.000	IPSA Institut d.o.o. Sarajevo, 01-02.2- 9993/23, 25.10.2023.	5.540	-	Okončano projektiranje, nije fakturisano
13.	M17	Rasvjeta mosta Begića i Begovića na M17	Izvođenje	1.600	Elko-Marić d.o.o. Mostar, 01-02.2-6382/20. 12.06.2020.	58.393 (preneseno 1.631)	1.591	Okončano
			Nadzor	2.000	Habitat d.o.o. Mostar 01-02.2-3104/20. 10.03.2020.	1.989	-	
			Ukupno				1.591	
UKUPNO				1.692.800			24.383	

3.1.3. Poboljšanje sigurnosti prometa na magistralnim cestama izgradnjom traka za lijeva skretanja, pješačkih staza sa odvodnjom kišne kanalizacije, odmorišta i sanacija crnih tačaka

Red Br.	Mag. Cesta	Naziv i opis projekta	Aktivnosti na projektu	Rebalans Plana 2023.	Izvođač/ Konsultant - ugovor	Ugovoreno	Realizovano 01.01.- 31.12.2023.	Napomena
1.	M18	Rekonstrukcija raskrsnice na M18 010 Kobilja Glava-Sarajevo – Malta km 8+340	Izvođenje	600.000			-	U toku ishodovanje odobrenja za građenje
			Nadzor	10.000			-	
2.	M17	Rekonstrukcija raskrsnice magistralne ceste i lokalne ceste za Orahovicu, općina Konjic	Izvođenje	392.000	HP Investing d.o.o. Mostar, 01-02.2-11317/22, 30.11.2022.	391.561	391.380	Okončano
			Nadzor	5.900	Interprojekt d.o.o. Mostar, 01-02.4-6966/20. 03.07.2020.	5.850	5.850	
			Ukupno				397.230	
3.	M17	Sanacija crne tačke Misurići, dionica (005) općina Maglaj, km 19+000	Projektovanje	8.000	CPK d.o.o. Banja luka, 01-02.1-523/22. 18.01.2022.	7.921	7.921	Okončano
			Revizija	2.000	Saraj Inženjering d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-1903/22. 14.03.2022.	1.950	1.950	
			Ukupno				9.871	
4.	M17	Sanacija crne tačke Tatarbudžak, dionica (006), općina Žepče km 3+500	Projektovanje	9.000	CPK d.o.o. Banja luka, 01-02.2-12452/21 21.12.2021.	8.927	8.927	Okončano
			Revizija	2.000	Saraj Inženjering d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-664/22. 24.01.2022.	1.950	1.950	
			Ukupno				10.877	
5.	M1.8	Izgradnja pješačke staze na dionici Ježinac-Čehaje-Srebrenik-skretanje za Ljenobud, L=3179 m(Ifaza)	Projektovanje	7.000			-	Priprema TD
			Izvođenje	200.000			-	
			Nadzor	7.000			-	
6.	M4	Rekonstrukcija raskrsnice za poslovnu zonu	Projektovanje	4.700	GP FM	9.335	4.668	Okončano

JP CESTE FEDERACIJE BIH

		Glinište na M4			Inženjering d.o.o. Sarajevo i Modus projekt d.o.o. Kakanj, 01-02.2-6564/21. 09.06.2021. PPG d.o.o.Sarajevo 01-02.2-12395/21 20.12.2021.	(preneseno 4.667)		
			Revizija	2.000		1.950	-	
			Ukupno				4.668	
7.	M17	Postavljanje odbojnih ograda nivoa zaštite H1 - dionica: Bilješevo-Lašva-Zenica	Izvođenje	596.000	Sacom d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-9896/22. 03.11.2022.	303.760 (preneseno 276.634)	244.204	Okončano
			Izvođenje		Sacom d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-7461/23. 08.08.2023	292.076	291.968	
			Ukupno				536.172	
8.	M6	Rekonstrukcija raskrsnice na M6 i R427, općina Stolac	Izvođenje	605.000	HP Investing d.o.o. Mostar, 01-02.1-8352/22. 21.09.2022.	684.850 (preneseno 604.546)	604.425	Okončano
			Nadzor	7.000	Interprojekt d.o.o. Mostar, 01-02.1-3489/22. 13.05.2022.	6.903	6.903	
			Ukupno				611.328	
9.	M5	Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok na cesti M5 u naseljenom mjestu Kalibunar, općina Travnik	Izvođenje	700.000			-	U toku
			Nadzor	7.000	Artimg BH d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-9736/20. 12.10.2020.	6.929	-	ishodovanje odobrenja za građenje
			Ukupno				-	
10.	M17	Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok na cesti M17, ulaz u industrijsku zonu Pečuj, grad Zenica	Projektovanje	14.000			-	
			Revizija	2.000			-	
11.	M 16.2	Rekonstrukcija raskrsnice za naselje Duge, općina Prozor	Izvođenje	550.000			-	Eksproprijac. u toku
			Nadzor	15.000			-	
12.	M17	Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok, cesta M17-skretanje Hadžići	Izvođenje	1.070.000	Strabag d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-4538/23. 15.06.2023	899.042	897.896	Nabavka dodatnih radova u toku (rasvjeta)
			Nadzor	6.500	Design&QC d.o.o. Sarajevo 01-02.2-362/23. 12.01.2023.	6.318	6.318	
			Ukupno				904.214	
13.	M1.9	Rekonstrukcija ceste M1.9. Slatina (gr.entiteta) – Gradačac – izgradnja kružnog toka na križanju za industrijsku zonu, općina Gradačac	Izvođenje	650.000			-	U toku
			Nadzor	7.000			-	ishodovanje odobrenja za građenje
14.	M17	Rekonstrukcija raskrsnice magistralne ceste M17, dionica: 008 HW (Jošanica) 1 – Stup 1, km 3+500 sa ulicom Reljevska, općina Novi grad Sarajevo	Projektovanje	8.700	Design&QC d.o.o. Sarajevo 01-02.2-4909/20. 24.04.2020.	8.658	8.658	Okončano projektovanj. Revizija se neće raditi
			Revizija	2.000				
			Ukupno				8.658	
15.	M16	Rekonstrukcija raskrsnice na magistralnoj cesti M16, općina Karadže, općina Bugojno	Projektovanje	9.300			-	Okončano u 2022.
16.	M6.1	Izgradnja nogostupa uz cestu M6.1 u naseljenom mjestu Knešpolje	Izvođenje	300.000			-	Grad treba da uradi fekalnu kanalizaciju
			Nadzor	7.000			-	
17.	M4	Rekonstrukcija raskrsnice u Gornjoj Kalesiji, općina Kalesija	Izvođenje	765.000	Jata group d.o.o. Srebrenik, 01-02.2-9893/22, 03.11.2022.	764.681	764.680	Okončano
			Nadzor	6.700	Radis d.o.o. Istočno Sarajevo, 01-02.2-9890/22, 03.11.2022.	6.669	6.669	
			Ukupno				771.349	
18.	M18	Rekonstrukcija pješačkih staza sa rješavanjem	Izvođenje	500.000			-	U toku

JP CESTE FEDERACIJE BIH

		odvodnje, magistralna cesta M18, dionica 010 Semizovac – Sarajevo – Malta, km 8+400 km – km 10+400 (Kobilja glava – Šip)	Nadzor	7.000			-	ishodovanje odobrenja za građenje
19.	M5	Rekonstrukcija raskrsnice sa pješačkom stazom u naselju Barice, općine Donji Vakuf	Izvođenje	250.000			-	U toku
			Nadzor	7.000			-	ishodovanje odobrenja za građenje
20.	M17	Izgradnja podhodnika za pješake u naselju Čelebići, općina Konjic	Projektovanje	-				
21.	M6.1 M17	Sjeverni ulaz u Mostar – Izrada glavnog projekta odvodnje raskrsnice i tunela	Projektovanje	7.000	Design&QC d.o.o. Sarajevo 01-02.1-821/21 22.01.2021.	7.020	7.020	Okončano
			Ukupno				7.020	
22.	M4	Rekonstrukcija raskrsnice na ulazu u Jelah, općina Tešanj (Sufinansiranje sa Općinom Tešanj)	Projektovanje	6.600			-	Rješavanje imov. prav. odnosa u toku
23.	M 17.5	Poboljšanje sigurnosti prometa na M-17.5, dionica: Posušje –Jablanica	Izvođenje	128.500	Sacom d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-4400/23. 12.06.2023.	128.500	128.321	Okončano
			Ukupno				128.321	
24.	M6	Rekonstrukcija raskrsnice za naselje Šuško, na cesti M6, općina Čapljina	Projektovanje	9.000			-	Okončano u 2022.
25.	M1.8	Rekonstrukcija raskrsnice cesta M1.8 i R 461 u Srebreniku, na cesti M1.8, dionica Orašje - Tuzla	Projektiranje	20.000			-	Priprema projektnog zadatka i TD
			Revizija	3.000			-	
26.	M1.9	Poboljšanje sigurnosti prometa na M1.9 – Industrijska zona Gradačac	Izvođenje	1.015.000			-	Rješavanje IP odnosa u toku
			Nadzor	23.000			-	
27.	M5	Rekonstrukcija/Sanacija raskrsnice na M5 Azize Šećerbegović Korija -Ljubogošća, km 1+350	Projektovanje	7.000			-	U toku
			Izvođenje	400.000			-	ishodovanje odobrenja za građenje
			Nadzor	7.000			-	
28.	M5	Izrada projekta sanacije raskrsnice na cesti M5 – ulaz u Travnik	Projektovanje	7.000			-	Priprema projektnog zadatka i TD
			Revizija	4.000			-	
29.	M4	Rekonstrukcija i dogradnja potputnjaka na M4 u Mravićima, općina Doboju jug	Projektovanje	7.000			-	Priprema projektnog zadatka i TD
			Revizija	4.000			-	
30.	M16	Sanacija raskrsnice na cesti M16 u Kupresu	Projektovanje	7.000	Trasa d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-9888/22, 03.11.2022.	6.938	6.938	U toku
			Revizija	4.000	Design&QC d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-11541/23, 15.12.2023.	2.000	-	ishodovanje odobrenja za građenje i rješavanje IP odnosa
			Ukupno				6.938	
31.	M4.2	Sanacija raskrsnice cesta M4.2 i R402, grad Cazin	Projektovanje	7.000	GeoFeld d.o.o. Bihać, 01-02.2-11175/22, 29.11.2022.	6.669	-	U toku
			Revizija	4.000			-	
			Ukupno				-	
32.	M17	Izrada projektne dokumentacije – skretanje za naselje Ortiješ	Projektovanje	7.000			-	
33.	M14.1	Izgradnja pješačke staze uz cestu M14.1_008 Modriča - Gradačac 0	Izvođenje	167.000	BalegemM d.o.o. Gradačac 01-02.2-121/23, 06.01.2023	166.740	166.383	Okončano
			Nadzor	4.500	AIK Inžinjeri d.o.o. Banovići, 01-02.2-489/23. 17.01.2023	4.485	4.485	
			Ukupno				170.868	
34.	M5	Dogradnja trake na petlji Korija, M5: Šeherćehajin most-Korija	Projektovanje	7.000			-	Dobili odbijenicu od FMPU
			Izvođenje	320.000			-	
			Nadzor	7.000			-	

JP CESTE FEDERACIJE BIH

35.	M6	Izgradnja i sanacija pješačke staze uz cestu M6_001 Gorica-Vitina	Izvođenje	150.000	Putovi d.o.o. Grude, 01-02.2-477/23. 17.01.2023.	149.173	148.999	Okončano
			Ukupno				148.999	
36.	M5	Izgradnja pješačke staze uz magistralnu cestu M5 u naselju Putiš	Izvođenje	157.000	Dobojputevi d.d. Doboj jug, 01-02.2-388/23. 13.01.2023	156.503	117.676	Okončano
			Nadzor	4.000	AIK Inženjering d.o.o. Banovići, 01-02.2-490/23, 17.01.2023.	3.955	3.955	
			Ukupno				121.631	
37.	M18	Rekonstrukcija raskrsnice cesta M18 i R455a u km 6+100, općina Živinice, naselje Maline	Izvođenje	400.000			-	U toku ishodovanje odobrenja za građenje i rješavanje IP odnosa
			Nadzor	7.000			-	
38.	M17.3	Rješavanje odvodnje u Neumu (II faza)	Izvođenje	300.000	HP Investing d.o.o Mostar, 01-02.2-9583/23, 12.10.2023.	398.842	-	Radovi u toku
			Nadzor	7.000	ProKonsling d.o.o. Mostar, 01-02.2-9584/23, 12.10.2023.	3.452	-	
			Ukupno				-	
39.	M18	Rekonstrukcija raskrsnice na cesti M18, skretanje Vogošća centar, općina Vogošća	Izvođenje	250.000			-	Potrebno riješiti IP odnose
			Nadzor	7.000			-	
40.	M16	Izgradnja pješačke staze u naselju Guber, općina Livno	Projektovanje	7.000			-	Ugovoreno projektovanje Izrada projekta u toku
			Izvođenje	150.000			-	
			Nadzor	7.000			-	
41.	M5	Sanacija pješačkih staza uz cestu M5 u naselju Nova Bila	Projektovanje	-			-	Okončano
			Izvođenje	157.000	Dobojputevi d.d. Doboj jug, 01-02.2-9360/22, 24.10.2022..	177.602	157.032	
			Nadzor	3.000	AIK Inženjering d.o.o. Banovići 01-02.2-11839/22, 12.12.2022.	2.866	2.169	
			Ukupno				159.201	
42.	M5	Rješavanje odvodnje, cesta M5_018, Prača – Hrenovica, dionica: Podgrab-Sastavci, km 11+800	Izvođenje	300.000	Goraždeputevi d.o.o. Goražde, 01-02.2-3793/23. 19.05.2023.	299.989	299.986	Okončano
			Nadzor	5.700	Arting BH d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-3794/23. 19.05.2023.	5.663	5.663	
			Ukupno				305.649	
43.	M6.1	Sanacija raskrsnice M6.1 i lokalne ceste u naselju Knežpolje, Grad Široki Brijeg	Izvođenje	400.000			-	Priprema sporazume sa Upravom za regionalne ceste
			Nadzor	7.000			-	
44.	M5	Izgradnja pješačke staze uz magistralnu cestu M5 u naselju Kačuni	Projektovanje	7.000			-	Nabavka projektovanja u toku
			Izvođenje	140.000			-	
			Nadzor	3.000			-	
45.	M4	Sanacija raskrsnice cesta M4 i R416A u mjestu Rečica, općina Gračanica	Projektovanje	7.000	Arting BG d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-11767/23, 25.12.2023.	3.510	-	Ugovoreno projektovanje
			Izvođenje	300.000			-	
			Nadzor	7.000			-	
			Ukupno				-	

JP CESTE FEDERACIJE BIH

46.	M14.2	Izgradnja pješačke staze uz cestu M14.2, općina Domaljevac	Izvođenje	199.000	Roding d.o.o. Gračanica, 01-02.2-11840/22. 12.12.2022.	198.438	198.393	Okončano
			Ukupno				198.393	
47.	M4	Idejni projekat rekonstrukcije raskrsnice na cesti M4, ulaz u Gračanicu, grad Gračanica	Projektovanje	7.000			-	Nabavka u toku
48.	M16	Izgradnja pješačke staze na M16, 006 Crna rijeka-Jajce jug u naselju Vidikovac-Zastinje, općina Jajce	Projektovanje	15.000	Arting d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-11435/23, 13.12.2023.	6.500	-	Ugovoreno
49.	M4	Rekonstrukcija raskrsnice na cesti M4, skretanje Stanić Rijeka, općina Doboj Istok	Projektovanje	7.000	Urbis Centar d.o.o. Banja Luka, 01-02.2-11062/23, 30.11.2023.	5.148	-	Ugovoreno
50.	M17.4	Izgradnja trake za lijeva skretanja na cesti M17.4 u općini Čitluk	Izvođenje	380.000			-	Ishodovanje odobrenja
			Nadzor	7.000			-	
51.		Zamjena odbojnih ograda na magistralnim cestama minimalnog nivoa H1	Projektovanje	-			-	
			Izvođenje	800.000			-	
			Nadzor	-			-	
52.	M5	Izgradnja pješačke staze uz magistralnu cestu M5 u naselju Bilalovac - II faza	Izvođenje	248.500	Grakop d.o.o. Kiseljak, 01-02.2-411/23. 31.05.2023.	248.809	248.504	Okončano
			Nadzor	2.900	GP:Modus projekt d.o.o. Kakanj i Sollo-ing d.o.o. Kiseljak 01-02.2-3995/23. 25.05.2023.	2.808	2.808	
			Ukupno				251.312	
53.	M18	Rekonstrukcija i dogradnja potputnjaka na M18 u Živicama	Izvođenje	414.000	Jata Group d.o.o. Srebrenik, 01-02.2-12349/22, 28.12.2022.	413.914	413.913	Okončano
			Nadzor	2.800	HG Inženjering d.o.o. Tuzla, 01-02.2-12348/22, 28.12.2022.	2.796	2.796	
			Ukupno				416.709	
54.	M17	Izgradnja pješačke staze petlja Žepče do ulice Zenički put	Izvođenje	115.500	Dobojputevi d.o.o. Doboj jug, 01-02.2-9248/22. 21.10.2022.	119.049	119.047	Okončano
			Ukupno				119.047	
55.	M4	Izgradnja pješačke staze od Klokotnice (Samarica) do Velike Brijesnice, II faza	Izvođenje	199.500	Rial-šped d.o.o. Doboj Istok, 01-02.2-6548/23, 07.07.2023.	199.373	178.278	Okončano
			Nadzor	6.900	AIK Inženjering d.o.o. Banovići, 01-02.2-4203/23. 02.06.2023.	6.845	6.845	
			Ukupno				185.123	
56.	M18	Izgradnja pješačke staze u naselju Olovske Luke, općina Olovo II faza	Izvođenje	200.000	Dobojputevi d.d. Doboj Jug, 01-02.2-7460/23, 08.08.2023.	199.799	189.657	Okončano
			Nadzor	7.000	AIK Inženjering d.o.o. Banovići, 01-02.2-4658/23 2.06.2023.	6.845	6.844	
			Ukupno				196.501	
57.	M4	Rekonstrukcija raskrsnice na cesti M4, skretanje Mala Brijesnica, općina Doboj Istok	Projektovanje	7.000	Arting BH d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-11484/23, 14.12.2023.	3.900	-	Projektiranje ugovoreno
			Izvođenje	300.000			-	
			Nadzor	7.000			-	
			Ukupno				-	
58.	M18	Rekonstrukcija raskrsnice na cesti M18, skretanje	Projektovanje	7.000			-	Priprema

JP CESTE FEDERACIJE BIH

		za naselje Ugorsko, općina Vogošća						projekt zadatka i TD
59.	M5	Sanacija kolovozne konstrukcije na cesti M5 sa izgradnjom i sanacijom pješačkih staza: Kamenica –skretanje za poslovnu zonu	Izvođenje	1.364.000	Konzorcij: Behić-Sanny boy d.o.o. Bihać i I-Selimović d.o.o. Cazin, 01-02.2-1389/23. 22.02.2023	1.363.913	1.363.486	Okončano
			Nadzor	34.000	GP: Geofeld d.o.o. Bihać, PPG d.o.o. Sarajevo i Radis d.o.o. Istočno Sarajevo 01-02.2-392/23. 13.01.2023	33.930	33.930	
			Ukupno				1.397.416	
60.	M15	Izgradnja pješačke staze na cesti M15: Sanski Most-Tomina	Izvođenje	250.000			-	Priprema tend.dok.
			Nadzor	7.000			-	
61.	M14.1	Izrada idejnog i glavnog projekta izgradnje raskrsnice (kružnog toka) na M14.1 dionica: Odžak-Brod,(veza poslovnih zona Svilaj 1 i Svilaj 2 na M14.1)	Projektovanje	22.000	IPSA Institut d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-10944/23, 27.11.2023.	21.528	-	Projekt zadatak u pripremi
			Revizija	3.000			-	
			Ukupno				-	
62.	M6.1	Izgradnja pješačke staze na M6.1 dionica 011: Gnojnice- Nevesinje 2	Projektovanje	7.000	Design&QC d.o.o.Sarajevo 01-02.2-10094/23. 30.10.2023.	4.680	-	Ugovoreno projektovanje
63.	M17.4	Izgradnja trake za lijevo skretanje za poslovnu zonu „Mostarska vrata“, na M17.4 002, dionica: Čitluk-Međugorje -Ljubuški, općina Ljubuški	Projektovanje	7.000	Design&QC d.o.o.Sarajevo 01-02.2-3796/23. 19.05.2023.	5.850	-	U toku ishodovanje odobrenja za građenje
			Revizija	1.500			-	
			Ukupno				-	
64.	M17.3	Sanacija crne tačke na M17.3 001,(Kukavuša), dionica: Buna –Masline, km18+400	Projektovanje	7.000			-	Nabavka u toku
			Revizija	1.500			-	
65.	M17	Rekonstrukcija sa semaforizacijom raskrsnice magistralne ceste M17, dionica: 008 HW (Jošanica) 1 – Stup 1, km 5+000 sa ulicom Rajlovačka cesta, općina Novi grad Sarajevo	Projektovanje	8.700	Design&QC d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-4909/20. 24.04.2020.	8.658	8.658	Okončano
			Revizija	2.000	Trasa d.o.o. Sarajevo 01-02.2-12042/22, 19.12.2022.	1.998	1.998	
			Ukupno				10.656	
66.	M16	Izgradnja raskrsnice ili treće trake: Donji Vakuf-Bugojno-Kupres (naselje Čipuljić-Poriće)	Projektovanje	6.500	Arting d.o.o. Sarajevo, 01-02.2.4-11238/21 09.11.2021.	14.742 (preneseno 6.503)	6.503	Okončano
			Ukupno				6.503	
		U K U P N O		16.961.400			7.084.654	

3.1.4. Vanredno održavanje

3.1.4.1. Sanacija cestovnih objekata

Red br.	Mag. Cesta	Naziv i opis projekta	Aktivnosti na projektu	Rebalans Plana 2023.	Izvođač/ Konsultant - ugovor	Ugovoreno	Realizovano 01.01.- 31.12.2023.	Napomena
1.	M5	Rekonstrukcije mosta preko Koševskog potoka u Sarajevu, Skenderija (M 05.0-5-01-a) dionica Stup-Vijećnica-Gr Ent ... Gr Ent Prača-Renovica-Gr Ent Kaljani, km 7+310	Projektiranje	17.500	Design & QC d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-4907/19. 24.04.2019.	17.550	-	Vezano za 3.2.4.1. Red. Broj 12
2.	M17	Rekonstrukcija/sanacija tunela „Ivan“ (T17-011-46) l=646m, Ivan sedlo, dionica Tarčin-Konjic, km 7+750	Projektiranje	49.000	GP PPG d.o.o. Sarajevo i Pronasa d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-5662/21.	111.939 (preneseno 48.947)	-	Popravke po reviziji u toku

JP CESTE FEDERACIJE BIH

					14.05.2021.			
			Revizija	7.500	GP: Divil d.o.o. Sarajevo i Instit. za građev. d.o.o. Banja luka. 01-02.1-7979/21. 29.07.2021.	7.500	7.500	
			Ukupno				7.500	
3.	M18	Rekonstrukcija/Sanacija mosta preko rijeke Suha u Stuparima (M18-007-83) dionica Živinice 1 – Vitalj, km 16+426	Izvođenje	1.150.000	HP Investing d.o.o. Mostar, 01-02.1-8743/23, 13.09.2023.	1.148.056	-	Ugovor za nadzor u pripremi
			Nadzor	35.000			-	
			Ukupno				-	
4.	M 17.3	Sanacija mosta (M17.3-002-323) preko rijeke Bregave u Stocu, na cesti M17.3, dionica Stolac 2- Hutovo, km 0+139	Projektovanje	17.500	Infra d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-4347/22. 13.06.2022.	29.507 (preneseno 17.222)	17.222	Okončano Revizija nije naplaćena
			Revizija	2.900	PPG d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-12235/22, 23.12.2022.	2.867	-	
			Ukupno				17.222	
5.	M15	Rekonstrukcija mosta preko potoka Krbava (M15-004-49), dionica Kamičak-Ključ, km 9+622	Izvođenje	380.000			-	U toku pribavljanje urb. sagl.
			Nadzor	12.000			-	
6.	M18	Sanacija (rekonstrukcija) mosta preko nepoznatog potoka u Poturovićima (M18-009-604), dionica Olovo – Semizovac, km 31+567	Izvođenje	340.000			-	Ponovljeni Tender u pripremi
			Nadzor	10.000			-	
7.	M4.3	Rekonstrukcija mosta preko rijeke Baštre (M4.3-003-626), lokacija Baštre dionica Bosanska Otoka-Bužim, km 8+882	Projektiranje	33.000	GP:Infra d.o.o. Pronasa d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-10497/22, 15.11.2022.	32.312	10.729	Izrada u toku
			Revizija	2.200	IG d.o.o. Banja Luka, 01-02.1-4460/23. 13.06.2023.	2.118	-	
			Ukupno				10.729	
8.	M4.3	Rekonstrukcija mosta preko rijeke Baštre (M4.3-003-624), lokacija Čava, dionica Bosanska Otoka-Bužim, km 7+695	Projektiranje	32.500	GP:Infra d.o.o. Pronasa d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-10497/22, 15.11.2022.	32.429	26.957	Izrada u toku
			Revizija	2.200	IG d.o.o. Banja luka, 01-02.1-4460/23. 13.06.2023.	2.117	-	
			Ukupno				26.957	
9.	M18	Rekonstrukcija mosta preko rijeke Gostelja (M18-007-81), lokacija Tarevo –kamenolom Stupari, dionica Živinice 1 – Vitalj – sa izmještanjem trase	Projektiranje	49.000	Infra d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-4667/23. 20.06.2023.	48.181	7.605	Izrada u toku
			Revizija	4.000	Institut za građevinarstvo „IG“ d.o.o. Banja Luka, 01-02.1-9888/23, 20.10.2023.	3.744	-	
			Ukupno				7.605	
10.	M17	Rekonstrukcija/Sanacija mosta preko rijeke Bosne (M17-007-181) na petlji Lašva, dionica Topčić polje-Lašva 0, km 32+357	Revizija	3.000	IG d.o.o. Banja Luka, 01-02.1-3638/22. 19.05.2022.	2.808	-	Projekt. okončano 2022 Revizija nije situirana
			Ukupno				-	
11.	M17	Rekonstrukcija /Sanacija mosta preko ceste M5 (pravac za Travnik) (M17-007-180) na petlji Lašva, dionica Topčić polje – Lašva 0, km 32+261	Revizija	2.500	IG d.o.o. Banja Luka, 01-02.1-3638/22. 19.05.2022.	2.515	-	Projekt. okončano 2022 Revizija nije situirana
			Ukupno				-	
12.	M5	Rekonstrukcija/Sanacija mosta preko rijeke Bosne (M5-D13-199), na petlji Lašva dionica Kaonik-	Revizija	2.500	IG d.o.o. Banja Luka, 01-02.1-3638/22. 19.05.2022.	2.515	-	Projekt. okončano 2022 Revizija nije

JP CESTE FEDERACIJE BIH

		Lašva , km 5+115	Ukupno				-	situirana
13.	M16	Rekonstrukcija mosta preko rijeke Vrbas (M16-007-259) u Donjem Vakufu, na cesti M16, dionica Donji Vakuf 1- Bugojno	Izvođenje	837.000	Struktura d.o.o. Jajce, 01-02.1-4353/23, 08.06.2023.	836.903	550.449	Radovi u toku
			Nadzor	20.000	INK Constructor d.o.o. Banja Luka, 01-02.1-3704/23. 16.05.2023.	19.167	12.650	
			Ukupno				563.099	
14.	M5	Rekonstrukcija mosta preko potoka Rika sa rekonstrukcijom raskrsnice Skela, na cesti M5 , dionica Jajce jug-D.Vakuf 1	Izvođenje	225.000	GP: Struktura d.o.o.Jajce i MG Mind d.o.o. Mrkonjić Grad, 01-02.1-4893/22. 04.07.2022.	811.919 (preneseno 224.129)	224.086	Okončano
			Nadzor	7.300	INK Constructor d.o.o.Banja Luka, 01-02.1-7125/22, 02.08.2022.	18.252 (preneseno 7.301)	7.301	
			Ukupno				231.387	
15.	M4	Zamjena dilatacija na mostu preko rijeke Spreče (4-010-133) na cesti M4, dionica Donja Orahovica – Šićki Brod 1 km 11+083 , Sižje (M 04.0-3-10)	Izvođenje	130.000	Sikra d.o.o. Sarajevo 01-02.1-6817/22, 01.08.2022.	129.438	152.391	Okončano
			Nadzor	3.200	Trasa d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-7614/22, 23.08.2022.	3.131	1.468	
			Ukupno				153.859	
16.	M18	Zamjena dilatacija na mostu preko rijeke Stupčanice (M18-008-162), na cesti M18, dionica Vitalj – Olovo km 18+242, Olovske Luke (M 18.0-2-30-b)	Izvođenje	147.500	Sikra d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-6817/22, 01.08.2022.	147.150	135.266	Okončano
			Nadzor	2.300	Trasa d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-7614/22, 23.08.2022.	2.237	2.665	
			Ukupno				137.931	
17.	M18	Zamjena dilatacija na mostu preko rijeke Stupčanice (M18-008-163), na cesti M18, dionica Vitalj – Olovo km 18+503, Olovske Luke (M 18.0-2-30-c)	Izvođenje	147.500	Sikra d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-6817/22, 01.08.2022.	147.150	134.847	Okončano
			Nadzor	2.300	Trasa d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-7614/22, 23.08.2022.	2.237	2.182	
			Ukupno				137.029	
18.	M16	Rekonstrukcija mosta preko potoka Komotin u Podmilačju (M16-006-246) dionica Crna Rijeka – Jajce Jug , km 18+285	Projektiranje	4.500	IG d.o.o.Banja luka, 01-02.1-8060/20 10.08.2020.	9.957 (preneseno 4.446)	4.446	Projekt. okončano Revizija nije situirana
			Revizija	750	Infra d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-2144/21. 24.02.2021.	1.500 (preneseno 750)	-	
			Ukupno				4.446	
19.	M4	Rekonstrukcija mosta preko Lohinjske rijeke u Donjoj Lohinji (M4-009-504) dionica Doboj - Donja Orahovica, km 23+498	Projektiranje	4.700	IG d.o.o.Banja luka, 01-02.1-8060/20. 10.08.2020	11.326 (preneseno 4.680)	4.680	Projekt. okončano Revizija nije situirana
			Revizija	750	Infra d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-2144/21. 24.02.2021.	1.500 (preneseno 750)	-	
			Ukupno				4.680	
20.	M 18.1	Rekonstrukcija mosta preko Crne rijeke, Garež (M18.1-001-448) dionica Ustikolina-Grebak-Delijaš-Trnovo, km 46+237	Projektiranje	4.500	IG d.o.o.Banja luka, 01-02.1-8060/20. 10.08.2020	9.957 (preneseno 4.446)	-	Popravke po reviziji u toku
			Revizija	750	Infra d.o.o.Sarajevo 01-02.1-2144/21. 24.02.2021.	1.500 (preneseno 750)	-	
			Ukupno				-	
21.	M17	Sanacija mosta (M17-009-405) preko rijeke	Izvođenje	1.685.000	Hering d.d.Široki brijeg,	1.619.280	1.619.280	Okončano

JP CESTE FEDERACIJE BIH

		Željeznice na Ilidži, dionica Stup 3 - Blažuj, km 2+635			01-02.1-12352/22, 28.12.2022.			
					Annex ugovora: Hering d.d. Široki Brijeg, 01-02.1-11328/23, 08.12.2023.	64.695	64.682	
			Nadzor	20.000	PPG d.o.o.Sarajevo 01-02.1-12351/22, 28.12.2022.	19.792	19.792	
			Ukupno				1.703.754	
22.	M1.8	Sanacija mosta (M1.8-004-114) preko rijeke Tinje u Donjoj Potpeći, dionica Srebrenik-Šiški Brod 3, km 10+709	Izvođenje	-			-	
			Nadzor	-			-	
23.	M18	Sanacija mosta (M18-008-71) preko Ujica rijeke u Kladnju, dionica Vitalj-Olovo, km 2+405	Izvođenje	661.000	HP Investing d.o.o.Mostar, 01-02.1-4461/23. 13.06.2023.	661.003	650.428	
			Nadzor	19.300	AIK Inženjering d.o.o. Banovići, 01-02.1-6575/23, 10.07.2023.	19.282	19.282	Okončano
			Ukupno				669.710	
24.	M20	Sanacija mosta (M20-008-206) preko rijeke Koline u Ustikolini, na cesti M20, dionica Foča 1- Ustikolina, km 9+916	Izvođenje	450.000	HP Investing d.o.o. Mostar, 01-02.1-10004/23, 25.10.2023.	448.759	-	Ugovoreno (Početak radova na proljeće)
			Nadzor	12.000	IPSA Institut d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-10195/23, 01.11.2023.	8.073	-	
			Ukupno				-	
25.	M15	Sanacija mosta M15-003-42 preko rijeke Sane, Krkojevačko polje, na cesti M15, dionica Sanski Most 1-Kamičak, km 4+283	Izvođenje	2.130.000	HP Investing d.o.o. Mostar, 01-02.1-5190/23, 05.07.2023.	2.129.400	1.308.695	
			Nadzor	50.000	JV PPG d.o.o. i Pronasa d.o.o., 01-02.1-5189/23, 05.07.2023.	49.993	-	Radovi u toku
			Kons. usluge	6.500				
			Ukupno				1.308.695	
26.	M18	Sanacija mosta M18-009-395 preko rijeke Ljubine, dionica Olovo – Semizovac, km 38+850	Izvođenje	450.000			-	Priprema ponovljenog Tendera u toku
			Nadzor	12.000			-	
27.	M20	Sanacija mosta M20-009-210 preko Odske rijeke u Mravinju, na cesti M20, dionica Ustikolina-Goražde 8, km 14+840	Izvođenje	440.000	HP Investing d.o.o. Mostar, 01-02.1-10007/23, 25.10.2023.	439.656	-	Nabavka usluga nadzora u toku
			Nadzor	12.000			-	
			Ukupno				-	
28.	M18	Zamjena dilatacija na mostu preko rijeke Ljubine (M18-009-397) na cesti M18, dionica Olovo – Semizovac km 39+201, Semizovac (M 18.0-2-53)	Izvođenje	104.000	Sikra d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-9692/23, 13.10.2023.	103.661	-	Nabavka usluga nadzora u toku
			Nadzor	4.000			-	
			Ukupno				-	
29.	M5	Sanacija mosta (M05.0-5-02) preko strme padine, Babin zub u Sarajevu, na cesti M5, dionica Stup-Vijećnica-Gr. ent. km 9+992	Projektiranje	30.200	INK Constructor d.o.o. Banja luka, 01-02.1-1741/23. 08.03.2023.	30.116	-	Projektiranje u toku
			Revizija	3.300	IG d.o.o. Banja luka, 01-02.1-4668/23. 20.06.2023.	3.276	-	
			Ukupno				-	
30.	M5	Sanacija mosta (M05.0-5-04) preko rijeke Miljacke, Dariva na cesti M5 dionica Stup-Vijećnica-Gr ent., km 10+390	Projektiranje	25.000	Trasa d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-5187/23,	24.544	-	Projektiranje u toku

JP CESTE FEDERACIJE BIH

			Revizija	3.500	05.07.2023. Infra d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-7933/23, 29.08.2023.	3.510	-	
			Ukupno				-	
31.	M5	Sanacija mosta (M05.0-5-05) preko rijeke Miljacke, Krečane na cesti M5 dionica Stup-Vijećnica-Gr.ent. km 10+610	Projektiranje	31.100	Trasa d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-5188/23, 05.07.2023.	31.089	-	Projektiranje u toku
			Revizija	4.000	PPG d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-7607/23, 15.08.2023.	3.978	-	
			Ukupno				-	
32.	M5	Sanacija mosta (M5-016-433) objekat na petlji Korijana cesta M5 dionica Azize Šaćirbegović - Korija - Ljubogošta km 6+394 (M 05.0-A-11)	Projektiranje	50.000	INK Constructor d.o.o. Banja Luka, 01-02.1-8724/23, 12.09.2023.	49.725	14.888	Projektiranje u toku
			Revizija	5.000	Institut za građevinarstvo „IG“ d.o.o. Banja Luka, 01-02.1-11134/23, 01.12.2023.	4.446	-	
			Ukupno				14.888	
33.	M14	Rekonstrukcija mosta preko željezničke pruge Bihać-Bosanski Novi, Kostela (M14-002-51) dionica: Srbljani-Bos. Krupa 1, km 5+171 - Projekat izmještanja stuba/ova kontaktne mreže sa opremom, - Projekat izmještanja željezničkih telefonskih kablova.	Projektiranje	20.000			-	Ponovljeni tender za projekt. U pripremi
			Revizija	2.000			-	
34.	M19.2	Sanacija tunela Ravne (T19.2-001-33) na cesti M19.2, dionica Kladanj-Vlasenica, km 7+748	Projektiranje	50.000			-	Ponovljeni tender za projekt. u pripremi (treći put)
			Revizija	5.000			-	
35.	M19.2	Sanacija mosta M19.2-001-97 preko rijeke Drinjače, u Gojsalićima na cesti M19.2, dionica Kladanj-Vlasenica, km 2+323	Izvođenje	546.000	Hering d.d. Široki Brijeg, 01-02.1-9507/23, 10.10.2023.	545.770	-	Ugovoreno (početak radova na proljeće)
			Nadzor	15.000	IPSA Institut d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-9912/23, 23.10.2023.	14.988	-	
			Ukupno				-	
36.	M17.1	Rekonstrukcija/izgradnja mosta preko rijeke Krivaje na cesti M17.1_001-643, Žepče-Zavidovići-Ribnica, lokacija Mustajbašići - Čanici, općina Zavidovići, km 15+385	Projektiranje	96.000			-	Ponovljeni tender za projekt. u pripremi
			Revizija	10.000			-	
37.	M17.1	Rekonstrukcija mosta preko rijeke Gostović na cesti M17.1_001_642; Žepče-Zavidovići-Ribnica, lokacija Potkleče, km 9+650	Projektiranje	50.000			-	Ponovljeni tender za projekt. u pripremi
			Revizija	4.000			-	
38.	M1.8	Sanacija mosta na M1.8_001_62, preko rijeke Save u Orašju, dionica: Granica BiH/ HR (Županja)-Lončari, km 0+000	Projektiranje	100.000			-	Ponovljeni tender za projekt. u pripremi
			Revizija	9.000			-	
39.	M5	Rekonstrukcija mosta (M-5-012-227) preko r. Bile, na cesti M-5, dionica Nević Polje- Kaonik, km 4+988	Izvođenje	8.000	Struktura d.o.o. Jajce, 01-02.1-8415/20. 25.08.2020. Anex 01-02-1-8225/22, 16.09.2022.	8.023	-	Radovi okončani Nije ispostavljena okončana situacija
				10.813.250			4.999.491	

JP CESTE FEDERACIJE BIH

3.1.4.2. Sanacija klizišta, odrona, sanacija slijeganja trupa puta, kosina, usjeka i zasjeka

Red. Br.	Mag. Cesta	Naziv i opis projekta	Aktivnosti na projektu	Rebalans Plana 2023.	Izvođač/ Konsultant - ugovor	Ugovoreno	Realizovano 01.01.- 31.12.2023.	Napomena
1.	M16.4	Sanacija slijeganja trupa ceste, dionica: Bugojno – Nević polje, km 22+900	Izvođenje	200.000	Ceste Company d.o.o. Kiseljak, 01-02.2-9978/23, 25.10.2023.	199.962	60.455	Radovi u toku
			Nadzor	7.000	GP:PPG d.o.o. Sarajevo i Arting BH d.o.o.Sarajevo 01-02.2-3997/23 .25.05.2023.	6.845	-	
			Ukupno				60.455	
2.	M18	Sanacija slijeganja trupa ceste na M18_010 Semizovac-Sarajevo-Malta, km 10+880	Izvođenje	173.000	HP Investing d.o.o.Mostar, 01-02.2-5259/22, 15.07.2022.	388.227 (preneseno 172.540)	172.341	Okončano
			Nadzor	3.700	GF Sarajevo, 01-02.2-3959/22. 31.05.2022.	8.073 (preneseno 3.633)	3.633	
			Ukupno				175.974	
3.	M16.2	Sanacija skarpi zasjeka, cesta M16.2, dionica 002 na potezu od km 13+000 do km 15+150	Izvođenje	300.000	HP Investing d.o.o Mostar, 01-02.2-3795/23 19.05.2022.	298.701	298.496	Okončano
			Nadzor	3.000	GF UNSA, 01-02.2-4205/23. 02.06.2023.	2.925	2.925	
			Ukupno				301.421	
4.	M17	Sanacija slijeganja trupa ceste, cesta M17_013, dionica: Jablanica I-Potoci, km 1+400	Izvođenje	314.000	HP Investing d.o.o. Mostar, 01-02.2-9636/22. 28.10.2022.	315.651	313.735	Okončano
			Nadzor	3.500	GP:AIK Inženjering d.o.o.Banovići, Arting BH d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-11756/22. 09.12.2022.	3.510	3.510	
			Ukupno				317.245	
5.	M18.1	Sanacija slijeganja trupa ceste cesta M1.8_003, dionica: Pelagićevo-Srebrenik (Blaževac)	Izvođenje	250.000			-	Odgođeno. Zbog hitnosti sanirano kroz RO
			Nadzor	5.500			-	
6.	M17	Sanacija slijeganja trupa ceste, cesta M17_013, dionica: Jablanica I-Potoci, km 2+600	Izvođenje	250.000	HP Investing d.o.o. Mostar, 01-02.2-8575/22. 30.09.2022.	248.688	-	Odgođeno na zahtjev Općine
			Nadzor	7.000	GP:AIK Inženjering d.o.o. Banovići Arting BH d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-12347/22. 28.12.2022.	5.382	-	
			Ukupno				-	
7.	M5	Sanacija skarpi i kosina, dionica: Kaonik-Lašva km 3+100 do km 3+250 i od 3+600 do km 3+850	Izvođenje	450.000			-	Nabavka u toku (4 x)
			Nadzor	7.000	GP: PPG d.o.o. Sarajevo i Arting BH d.o.o.Sarajevo 01-02.2-3996/23. 25.05.2023.	6.845	-	
			Ukupno				-	
8.	M16	Sanacija skarpi, cesta M16_006, dionica: Crna Rijeka-Jajce, lok 5 , km 10+290 -km 10+460,	Izvođenje	149.000			-	Okončano
			Nadzor	7.000			-	
9.	M17	Sanacija slijeganja i izdizanja trupa ceste petlja Blatuša, Zenica, I faza	Izvođenje	300.000	Jata Group d.o.o. Srebrenik, 01-02.2-7645/23, 17.08.2023.	299.919	-	Ugovoreno
			Nadzor	10.000	GF UNSA, 01-02.2-4513/23.	9.828	-	

JP CESTE FEDERACIJE BIH

			Ukupno				-	
10.	M16	Sanacija potpornog zida i trupa ceste M16_009, Bugojno 2- Kupres 1, km 13+000	Projektovanje	6.800	Design & QC d.o.o.Sarajevo 01-02.2-12041/22, 19.12.2022.	6.792	6.792	Okončano
			Izvođenje	200.000	Jata Group d.o.o. Srebrenik, 01-02.2-3998/23. 25.05.2023	199.968	199.965	
			Nadzor	9.700	GP: PPG d.o.o. i Arting BH d.o.o., 01-02.2-5161/23, 05.07.2023.	9.642	9.642	
			Ukupno				216.399	
11.	M18	Sanacija škarpe na cesti M18_010 dionica: Semizovac-Sarajevo-Malta, općina Vogošća km 2+100	Izvođenje	370.000			-	Nabavka u toku (4 x)
			Nadzor	6.100	GP: PPG d.o.o. Sarajevo i Arting BH d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-3797/23. 19.05.2023.	6.084	-	
			Ukupno				-	
12.	M1.8	Sanacija slijeganja trupa ceste na M1.8_001, dionica Granica Republike Hrvatske-Granica entiteta, km 0+300	Projektovanje	15.700	INK Konstruktor d.o.o. Banja luka 01-02.2-2409/22. 04.04.2022.	15.678	15.678	Okončano
			Ukupno				15.678	
13.	M18	Revizija programa geološko-geotehničkih ispitivanja cesta M18_007 dionica:Živinice-Vitalj	Projektovanje	6.800	Design & QC d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-12043/22, 19.12.2022.	6.786	6.786	Okončano
				6.800	Design & QC d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-6799/23, 14.07.2023.	6.786	6.786	
			Ukupno				13.572	
				3.061.600			1.100.744	

3.1.4.3. Sanacija oštećenih asfaltnih kolovoza

Red br.	Mag. Cesta	Naziv i opis projekta	Aktivnosti na projektu	Rebalans Plana 2023.	Izvođač/ Konsultant - ugovor	Ugovoreno	Realizovano 01.01.- 31.12.2023.	Napomena
1.	M4	Sanacija asfaltnog kolovoza na cesti M4_009 Doboj – Donja Orahovica	Izvođenje	333.000	Rial-Šped d.o.o. Klokotnica, 01-02.2-9184/22. 20.10.2022.	332.750	332.590	Okončano
			Nadzor	5.500	IG d.o.o.Banja luka 01-02.2-12058/21. 08.12.2021.	5.441	5.438	
			Ukupno				338.028	
2.	M4	Sanacija asfaltnog kolovoza na cesti M4_010: Donja Orahovica-Sićki Brod	Izvođenje	1.500.000	GP:Rial-Šped d.o.o. Doboj Istok i Roding d.o.o. Gračanica, 01-02.2-11838/22, 12.12.2022.	1.499.857	1.499.839	Okončano
			Nadzor	3.000	GP: Celab d.o.o. Kakanj i Arting d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-804/23, 30.01.2023	2.925	2.340	
			Ukupno				1.502.179	
3.	M5	Sanacija asfaltnog kolovoza na cestiM5_014: Gromiljak-Blažuj	Izvođenje	297.000	Grakop d.o.o. Kiseljak, 01-02.2-390/23. 13.01.2023	296.593	296.592	Okončano
			Nadzor	6.700	FM Inženjring d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-391/23. 13.01.2023.	6.669	6.669	

JP CESTE FEDERACIJE BIH

			Ukupno				303.261	
4.	M15	Sanacija asfaltnog kolovoza na cesti M15: Šuica-Tomislavgrad	Izvođenje	298.000	KTM-Brina d.o.o. Posušje, 01-02.2-9000/22, 13.10.2022.	297.671	297.522	Okončano
			Nadzor	-			-	
			Ukupno				297.522	
5.	M18	Sanacija asfaltnog kolovoza na cesti M18_007: Šićki brod-Živinice1-Vitalj-Olovo	Izvođenje	1.500.000	Jata group d.o.o. Srebrenik, 01-02.2-9635/22, 28.10.2022.	1.499.995 (preneseno 450.864)	450.863	Okončano
			Nadzor	11.600	AIK Inženjering d.o.o.Banovići 01-02.2-9894/22, 03.11.2022.	11.583 (preneseno 5.791)	5.791	
			Ukupno				456.654	
6.	M17	Sanacija asfaltnog kolovoza na cesti M17: Buna-Tasovčići	Izvođenje	526.000	HP Investing d.o.o.Mostar, 01-02.4-475/23, 17.01.2023.	525.495	525.495	Okončano
			Nadzor	-			-	
			Ukupno				525.495	
7.	M17.5	Sanacija asfaltnog kolovoza na cesti M17.5: Jablanica-Blidinje	Izvođenje	300.000	HP Investing d.o.o. Mostar, 01-02.1-1924/23, 14.03.2023	299.364	299.200	Okončano
			Nadzor	2.400	Smajić inženjering d.o.o. Goražde, 01-02.1-1437/23, 24.02.2023	2.315	2.314	
			Ukupno				301.514	
8.	M5	Sanacija asfaltnog kolovoza na cestiM5_012:Nević polje-Kaonik	Izvođenje	546.000	Dobojputevi d.d. Doboj jug, 01-02.2-9360/22, 24.10.2022.	524.990	545.559	Okončano
			Nadzor	3.000	Aik Inženjering d.o.o. Banovići, 01-02.2-11839/22, 12.12.2022.	2.867	3.564	
			Ukupno				549.123	
9.	M15	Sanacija asfaltnog kolovoza na cesti M15: Livno-Šujica, L=800m	Izvođenje	147.000	Livnoputovi d.o.o. Livno, 01-02.2-11315/22, 30.11.2022.	146.238	146.237	Okončano
			Nadzor	3.000	Smajić Inženjering d.o.o. Goražde, 01-02.2-3017/23, 18.04.2023.	2.797	2.797	
			Ukupno				149.034	
10.	M16	Sanacija asfaltnog kolovoza na cesti M16:Livno-Renjići L=2,5km	Izvođenje	314.000	Livnoputovi d.o.o.Livno, 01-02.2-11989/22, 15.12.2022.	313.912	313.911	Okončano
			Nadzor	3.500	Smajić Inženjering d.o.o. Goražde, 01-02.2-3016/23, 18.04.2023.	3.480	3.480	
			Ukupno				317.391	
11.	M14.2	Sanacija asfaltnog kolovoza na cesti M14.2: Domaljevac-Šamac	Izvođenje	299.000			-	Okončano 2022.
			Nadzor	5.800			-	
12.	M17.5	Sanacija asfaltnog kolovoza, dionica: Posušje-Grude	Izvođenje	314.000	KTM Brina d.o.o. Posušje, 01-02.2-6479/23, 06.07.2023.	313.326	313.284	Okončano
			Nadzor	6.600	Arting BH d.o.o Sarajevo, 01-02.2-7159/23, 27.07.2023	6.517	6.517	
			Ukupno				319.801	
13.	M4	Sanacija asfaltnog kolovoza na cesti:M4_010: Donja-Orahovica –Šićki Brod	Izvođenje	1.000.000	Jata Group d.o.o. Srebrenik, 01-02.2-6645/23 od	677.632	-	Poništen postupak. Nabavka u

JP CESTE FEDERACIJE BIH

					11.07.2023.; 01-02.2-7170/23 raskid ugovora			toku
			Nadzor	8.000	AIK Inženjering d.o.o. Banovići, 01-02.2-10566/23, 13.11.2023.	7.839	-	
			Ukupno				-	
14.	M5	Sanacija asfaltnog kolovoza na cesti M5_005: Bosanski Petrovac-Gornje Bravsko	Izvođenje	398.000	I-Selimović d.o.o. Cazin, 01-02.2-6800/23, 14.07.2023.	397.579	397.572	Okončano
			Nadzor	3.700	Institut za građevinarstvo „IG“ d.o.o. Banja Luka, 01-02.2-7497/23, 10.08.2023.	3.627	3.627	
			Ukupno				401.199	
15.	M15	Sanacija asfaltnog kolovoza na cesti M15: Obilaznica Tomislavgrad-Šuica	Izvođenje	500.000	Livnoputovi d.o.o. Livno, 01-02.2-9338/23, 04.10.2023.	494.056	-	Žalba za nadzor
			Nadzor	4.000	IPSA Institut d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-9347/23, 04.10.2023.	3.920	-	
			Ukupno				-	
16.	M5	Sanacija asfaltnog kolovoza na cesti M5: Obilaznica Sarajevo	Izvođenje	400.000	Sarajevoputevi d.d. Sarajevo, 01-02.2-4820/23, 26.06.2023.	399.913	399.564	Okončano
			Nadzor	2.800	Artimg BH d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-7581/23, 14.08.2023.	2.796	2.796	
			Ukupno				402.360	
17.	M17	Sanacija asfaltnog kolovoza na cesti M17 Konjic-Jablanica	Izvođenje	500.000	HP Investing d.o.o. Mostar, 01-02.2-9148/23, 26.09.2023.	499.730	474.059	Okončano
			Nadzor	2.500	ProKonsling d.o.o. Mostar, 01-02.2-9147/23, 26.09.2023.	2.024	2.024	
			Ukupno				476.083	
18.	M1.9	Sanacija asfaltnog kolovoza na M1.9 Gradačac-Ormanica	Izvođenje	233.000	Jata Group d.o.o. Srebrenik 01-02.1-4548/23, 15.06.2023	232.800	232.798	Okončano
			Nadzor	2.700	AIK Inženjering d.o.o. Banovići 01-02.2-4659/23, 20.06.2023	2.691	2.691	
			Ukupno				235.489	
19.	M4	Sanacija asfaltnog kolovoza na M4, dionica: Simin Han 1- Donje Caparde	Izvođenje	325.000	Jata Group d.o.o. Srebrenik, 01-02.2-6627/23 od 10.07.2023.; 01-02.2-7169/23 raskid ugovora	323.960	-	Okončano
					Roadimg d.o.o. Gračanica, 01-02.2-9010/23, 20.09.2023.	324.351	324.329	
			Nadzor	5.100	AIK Inženjering d.o.o. Banovići, 01-02.2-6629/23, 10.07.2023.	5.031	5.031	
			Ukupno				329.360	
		UKUPNO		9.809.900			6.904.493	

3.2. Planirani projekti

3.2.1. Projekti rekonstrukcije i izgradnje

Red br.	Mag. Cesta	Naziv i opis projekta	Aktivnosti na projektu	Rebalans Plana 2023	Izvođač/ Konsultant - ugovor	Ugovoreno	Realizovano 01.01.- 31.12.2023.	Napomena
1.	M18	Izrada idejnog projekta rekonstrukcije ceste M18, dionice Stupari – Vitalj L=cca 10km	Projektiranje	150.000			-	Nabavka u toku (žalba)
2.	M4	Izrada glavnog projekta izgradnje mosta preko rijeke Jale u Slavinovićima (T9) u okviru projekta izgradnje dionice Ši Selo – Slavinovići	Projektiranje	30.000			-	PZ u pripremi
			Revizija	4.000			-	
3.	M15	Izgradnja novog mosta (M15-004-50) preko rijeke Banjice, dionica Kamičak-Ključ, km 18+414	Izvođenje	500.000			-	Pribavljanje suglasnosti u toku
			Nadzor	15.000			-	
4.	M14.1 i 14.2	Izgradnja sjevernog kraka obilaznice Odžaka („Sjeverna veza“-nastavak) – II faza	Izvođenje	1.100.000			-	Nabavka usluga nadzora u toku
			Nadzor	40.000			-	
5.	M17.4	Izrada idejnog rješenja izmještanja ceste M17.4 u zoni Čitluka, dionica: Sretnice-Služanj-Cerno sa vrednovanjem varijanti (Izrada idejnog rješenja obilaznice Čitluka)	Projektiranje	50.000			-	PZ u pripremi
6.		Pribavljanje saglasnosti, elaborata i dozvola za projekte	Ostalo	500.000	Infra d.o.o. Sarajevo 01-02.1-233/22, 10.01.2023.	6.962	6.962	
	M18	- Sanacija mosta M18-009-395 preko rijeke Ljubine, dionica Olovo – Semizovac, km 38+850 0720			Etas d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-3465/23. 09.05.2023.	6.646	6.646	
	M17	- Projektantski nadzor na sanaciji tunela Vranduk II I rekonstrukciji mosta Bosna IV I V na M17			Elaborat	770	770	
					Tehnički pregled	3.844	3.844	
	M17.4	Izgradnja trake za lijeva skretanja na cesti M17.4 u općini Čitluk- izrada geotehničke studije misija G1			IGH d.o.o.Mostar, 01-02.2-3369/23. 04.05.2023.	3.627	3.627	
					Tehnozaštita 01-02.2-4373/23. 26.06.2023	4.680	4.680	
					Naknada, suglasnost	1.241	1.241	
	M17.4	Izgradnja trake za lijevo skretanje za poslovnu zonu „Mostarska vrata“ na M17.4_002 dionica: Čitluk-Međugorje-Ljubuški, općina Ljubuški			Naknada, suglasnost, taksa	640	640	
	M18	Izrada studije za prethodnu vodnu saglasnost izgradnja trake za spora vozila M18 Čevljanovići – Nišići			ASI Inžinjeri d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-4762/23. 23.06.2023	4.680	4.680	
					Naknada	42.201	42.201	
					Saglasnost	269	269	
	M17	Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok ulaz u Hadžiće			Divel d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-8451/22, 26.09.2022..	1.755	-	
					Naknada	1.428	1.428	
	M5	Rekonstrukcija mosta preko Koševskog potoka u Sarajevu, Skenderija			ASI Inžinjeri d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-11404/22. 01.12.2022.	5.499	5.499	
					Saglasnost	150	150	
	M14	Obilaznica Bihaća: - Elaborat za vodnu saglasnost			Euroing d.o.o. Bihać, 01-02.1-10024/22. 07.11.2022.	4.914		
					Taksa	320	320	
	M18	- Izrada izvoda iz glavnog projekta „Rekonstrukcija mosta u Poturovićima, Olovo –Semizovac, km31+567			PPG d.o.o. Sarajevo 01-02.1-12246/22. 23.12.2022.	2.574	2.574	

JP CESTE FEDERACIJE BIH

				ZT Tehnozaštita d.o.o. Sarajevo	948	948	
				Naknada	58	58	
M6	Izmjene glavnog projekta- Izgradnja obilaznice Ljubuškog (spoj M6 i M17.4)			Design&QC d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-12167/22. 21.12.2022.	3.510	3.510	
M14.2	Projektovanje rasvjete kružne raskrsnice u Odžaku			ATS d.o.o. Sarajevo 01-02.1-12112/22, 20.12.2022.	5.733	5.733	
M6	Rekonstrukcija raskrsnice cesta M6 i R427 ulaz u Stolac: - Revizija elaborata o inženjerskogeološkim karakteristikama - Revizija elektrotehničkog projekta rasvjete			Taksa	294	294	
				Integra d.o.o. Mostar, 01-02.1-1905/22. 14.03.2022.	1.147	-	
				Habitat d.o.o. Mostar, 01-02.1-4573/22.	585	-	
M17	Rekonstrukcija raskrsnice u naselju Zalik, grad Mostar - revizija glavnog projekta Izrada idejnog rješenja rekonstrukcije raskrsnice sjeverni ulaz u Mostar -Izrada elaborta o brojanju saobraćaja i analize saobraćajnih tokova raskrsnice Sjeverni ulaz u Mostar - Vizualizacija projekta rekonstrukcije raskrsnice Sjeverni ulaz u Mostar			Integra d.o.o. Mostar 01-02.1-4615/22. 23.06.2022.	2.340	2.340	
				Design & QCd.o.o. Sarajevo, 01-02.1-11358/22, 30.11.2022	6.786	6.786	
				Design & QCd.o.o. Sarajevo, 01-02.1-11357/22, 30.11.2022	6.786	6.786	
				Naknada,taksa	840	840	
M17.3	Izgradnja ceste Neum-Stolac, dionica Hutovo-Cerovica			Tehnički pregled	16.410	16.410	
				Geodet d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-9546/23, 11.10.2023.	6.949	6.949	
M17.3	Izgradnja ceste Neum-Stolac, Cerovica-Stolovi Konsultantske usluge za okolišna i socijalna pitanja			Tehnički pregled	16.410	16.410	
				Taksa	180	180	
M4.2	Izgradnja Obilaznice Cazina			T3 Consulting Tim d.o.o.Sarajevo, 01-05.2-279/23. 10.01.2023.	6.962	6.962	
M6.1	Izgradnja južne Obilaznice Mostara			Taksa	10	10	
M20	Izgradnja Obilaznice Goražda			Taksa	1.323	1.323	
	Rekonstrukcija tunela Crnaja			Naknada	76.357	76.357	
M14.1	Izgradnja Obilaznice Odžak			Saglasnost, taksa	430	430	
	Izgradnja Obilaznice Livna			Naknada, suglasnost	241	241	
M5	Rasvjeta tunela Vratnik			Saglasnost Naknada	605	605	
	Izgradnja gradskog autoputa u Sarajevu/Stup-Buća Potok-Pofalići-Velešići-Bentbaša			Naknada, taksa	625	625	
M4.3	Izgradnja obilaznice Bužim III faza			Suglasnost	76	76	
M5	Izgradnja obilaznice Kiseljak – I faza			Suglasnost	80	80	
M6.1	Izgradnja Južne obilaznice Mostara tunel Novi			Taksa	105	105	
M5	Izgradnja kružne raskrsnice Drivuša-Dolac			Tehnički pregled	4.311	4.311	
M20	Rekonstukcija raskrsnice Goražde-Ustiprača 0+550			Saglasnost, naknada	2.622	2.622	
M17	Rekonstrukcija raskrsnice magistralne ceste i lokalne ceste za Orahovicu, općina Konjic			Naknada	150	150	
	Rekonstrukcija raskrsnice Šaćirbegović_Korija Vraca			Saglasnost	30	30	
M18	Rekonstrukcija raskrsnice M18 i R455a Živinice			Naknada,taksa	402	402	
				Taksa	1.605	1.605	
				Naknada	11	11	
				Saglasnost	120	120	

JP CESTE FEDERACIJE BIH

		Maline						
		Rekonstrukcija raskrsnice u naselju Barice			Taksa	100	100	
	M16	Sanacija/rekonstrukcija raskrsnice u Kupresu			Elaborat ZT Tehnozaštita 029-10/23	702	702	
		Rekonstrukcija mosta u Stuparima			Suglasnost, taksa	325	325	
		Rekonstrukcija ceste Devijacija puta V korpusa			Taksa	100	100	
	M5	Jajce jug-Donji Vakuf, presvlačenje i ispravka osovine			Naknada	11.932	11.932	
	M17.3	Ulaz u Stolac (Vidovo Polje, veza na M6) L=1,3 km			Naknada	5.305	5.305	
	M18	Poddionica: Šićki Brod-Đurđevik na trasi ceste Tuzla – Sarajevo			Naknada, taksa	27.650	27.650	
	M18	Rekonstrukcija ceste M18, dionica Kladanj-Podpaklenik – u ukupnoj dužini cca 3,50km			Saglasnost, taksa, naknada	50.659	50.659	
		Sanacija crne tačke Misurići, dionica (005) općina Maglaj, km 19+000			Saraj Inženjering d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-10887/23, 22.11.2023.	1.754	1.754	
	M5	Sanacija mosta preko Sandžačke rijeke, Donji Vakuf			Naknada, saglasnost, taksa	771	771	
	M5	Sanacija mosta preko potoka Mrižnica-Kamenica 7+765			Suglasnost, naknada	585	585	
	M17	Rasvjeta na M17 u naselju Ortiješ, Grad Mostar			Naknada	122	122	
	M18	Rekonstrukcija raskrsnice na M18_010 Kobilja Glava-Sarajevo-Malta km 8+340 (geotehnički izvještaj o stabilnosti terena i nosivosti tla)			Suglasnost	30	30	
	M14	Izgradnja ceste Grmuša-Mali Radić M14			Habitat d.o.o. Mostar, 01-02.2-3792/23. 19.05.2023.	2.925	-	
	M1.9	Rekonstrukcija ceste Slatina-Gradačac-kružni tok za industrijsku zonu			Saglasnost	1.919	1.919	
		Rekonstrukcija raskrsnice sa R463 u kružni tok			Design&QC d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-11542/23, 15.12.2023.	7.020	-	
	M16	Rekonstrukcija raskrsnice Donji Vakuf-Bugojno-Kupres/naselje Čupujići-Poriče			Naknada	808	808	
		Revizija programa geološko-geotehničkih ispitivanja cesta M18 007 dionica:Živinice-Vitalj			Taksa	200	200	
	M15	Izgradnja novog mosta (M15-004-50) preko rijeke Banjice, dionica Kamičak-Ključ, km 18+414			Taksa	200	200	
		Izgradnja obilaznice Bugojno			Naknada, taksa	519	519	
					Suglasnost	402	402	
					Naknada, taksa	132	132	
					Saglasnost, tehnički pregled	29.771	29.771	
			Ukupno				382.826	
7.	M14	Izmjena idejnog i glavnog projekta izgradnje obilaznice Bihaća, dionica: Jablanski čvor-Mali Lug-veza na M14	Projektiranje	44.000	Institut za građevinarstvo „IG“ d.o.o. Banja Luka, 01-02.1-9286/23, 02.10.2023.	43.875	-	Izrada u toku
			Revizija	4.000				
			Ukupno				-	
8.		Izgradnja ceste Tuzla (Drežnik)-Šićki brod, dovršetak izgradnje kružne raskrsnice Lipnica	Izvođenje	600.000			-	TD u pripremi
			Nadzor	25.000			-	
9.		Izgradnja dionice Ši Selo-Slavinovići - Izrada elaborata eksproprijacije	Konsult usluge	20.000			-	
10.		Glavni projekat ceste Bihać-Bos.Krupa, dionica: Veliki Radić-Vranjska, L=cca 6,4 km	Projektiranje	100.000			-	Nabavka u toku
			Revizija	10.000			-	
11.	M20	Izgradnja kružnog toka u Goraždu na M20 - Rušenje ekpropisanog projekta	Izvođenje	30.000			-	Ponovljeni tender u pripremi
12.	M5	Bihać4-Ripač, ispravljanje osovine ceste (Devijacija puta AVNOJ-a)	Projektiranje	7.000			-	

JP CESTE FEDERACIJE BIH

13.	M17.4	Izrada idejnog projekta spoja ceste M17.4 sa Južnom Obilaznicom Mostara, na lokalitetu prevoj Hum-Brkanovo Brdo	Projektiranje	30.000			-	PZ u pripremi
U K U P N O				3.259.000			382.826	

3.2.2. Rasvjeta i semaforizacija raskrsnica i tunela

Red br.	Mag. Cesta	Naziv i opis projekta	Aktivnosti na projektu	Rebalans Plana 2023.	Izvođač/ Konsultant- ugovor	Ugovoreno	Realizirano 01.01.- 31.12.2023	Napomena
1.	M17	Rasvjeta raskrsnice na cesti M17, ulaz u Hadžiće	Projektovanje	-			-	Izvedeno kroz projekat rekonstrukcije raskrsnice
			Izvođenje	-				
			Nadzor	-				
2.	M17.1	Rasvjeta raskrsnice cesta M17.1 i R467 u naselju Ribnica, općina Zavidovići	Projektovanje	10.000			-	Potrebno projektovati novu raskrsnicu
			Izvođenje	180.000				
			Nadzor	7.000				
3.	M17.1	Rasvjeta raskrsnice cesta M-17.1 i R-466, ulaz u Zavidoviće	Projektovanje	10.000			-	Moguć novi projekat raskrsnice
			Izvođenje	180.000				
			Nadzor	7.000				
4.	M5 i M17	Izrada glavnog projekta rekonstrukcije/sanacije rasvjete na petlji Lašva	Projektovanje	7.000			-	Tereti rashode (redovno održavanje)
			Revizija	3.000				
5.	M17	Glavni projekat rasvjete raskrsnice ceste M17 i lokalne ceste za naselje Papratnica dionica M17_006: Ozimica-Topčić polje, km 9+180, općina Žepče	Projektovanje	6.000			-	Priprema PZ
6.		Rasvjeta kružnog toka Odžak, spoj na AC	Projektovanje	7.000			-	Nabavka u toku
			Izvođenje	200.000				
			Nadzor	6.000				
		UKUPNO		623.000				

3.2.3. Poboljšanje sigurnosti prometa na magistralnim cestama izgradnjom traka za lijeva skretanja, pješačkih staza sa odvodnjom kišne kanalizacije, odmorišta i sanacija crnih tačaka

Red br.	Mag. Cesta	Naziv i opis projekta	Aktivnosti na projektu	Rebalans Plana 2023.	Izvođač/ Konsultant- ugovor	Ugovoreno	Realizirano 01.01.- 31.12.2023	Napomena
1.	M6	Izgradnja pješačke staze uz cestu M6 u naselju Ružići, općina Grude	Izvođenje	283.000	Putovi d.o.o. Grude, 01-02.2-10380/23, 07.11.2023.	282.482	-	Ugovoreno
			Nadzor	7.000			-	
			Ukupno				-	
2.	M6	Izgradnja i sanacija pješačke staze uz cestu M6_001 Gorica-Vitina, II faza	Izvođenje	136.000	Putovi d.o.o. Grude, 01-02.2-10117/23, 31.10.2023.	135.682		Ugovoreno
			Nadzor	-				
			Ukupno				-	
3.	M14.2	Izgradnja pješačke staze uz cestu M14.2, općina Domaljevac, II faza	Izvođenje	150.000				Priprema TD
			Nadzor	7.000				
4.	M16.2	Izgradnja pješačke staze uz cest M16.2, općina Prozor/Rama	Projektovanje	7.000	EDI-ING d.o.o. Donji Vakuf, 01-02.2-11079/23, 30.11.2023.	3.510		U toku izrada projekta
			Izvođenje	200.000				

JP CESTE FEDERACIJE BIH

			Nadzor	7.000				
			Ukupno				-	
5.	M5	Rješavanje odvodnje na cesti M5, prolaz kroz Travnik (Lokalitet Bolnica Travnik)	Projektovanje	7.000				Grad treba po dogovoru da riješi prolaz kolektora kroz kasamu
			Izvođenje	100.000				
			Nadzor	3.000				
6.	M17	Rekonstrukcija raskrsnice cesta M17 i lokalnih cesta,(OBI) u kružni tok, općina Ilidža	Izvođenje	600.000				Općina Ilidža će implementirati projekat. Potpisan Sporazum.
			Nadzor	-				
7.	M18	Izgradnja pješačke staze uz cestu M18, Husino-Ljubače, grad Tuzla	Izvođenje	200.000				Potreban projekat
			Nadzor	7.000				
8.	M5	Izgradnja pješačke staze uz cestu M5, neselje Jehovac, općina Kiseljak	Projektovanje	7.000	EDI-ING d.o.o. Donji Vakuf, 01-02.2-11080/23, 30.11.2023.	2.867		U toku izrada projekta
			Izvođenje	200.000				
			Nadzor	7.000				
			Ukupno				-	
9.	M1.8	Rekonstrukcija raskrsnice na cesti M1.8, skretanje za poslovnu zonu , naselje Tinja, općina Sreberenik	Izvođenje	400.000				Ishodovanje potrebnih odobrenja
			Nadzor	10.000				
10.	M17.4	Izgradnja trake za lijevo skretanje za poslovnu zonu „Mostarska vrata“ na M17.4 002 dionica: Čitluk-Međugorje-Ljubuški, općina Ljubuški	Izvođenje	350.000				Ishodovanje potrebnih odobrenja
			Nadzor	7.000				
11.	M6	Rekonstrukcija raskrsnice cesta M6.1 i R419, neselje Trn, općina Široki Brijeg	Izvođenje	450.000				Usaglašavanje sa Upravom za regionalne ceste
			Nadzor	10.000				
12.	M4.3	Rekonstrukcija raskrsnice na cesti M4.3 i lokalne ceste, općina Velika Kladuša	Projektovanje	7.000				Priprema TD
13.	M17	Glavni projekat rekonstrukcije raskrsnice na cesti M17_009, Vrelo Bosne, općina Ilidža	Projektovanje	7.000				Priprema TD
14.	M16	Izrada glavnog projekta rekonstrukcija raskrsnice na cesti M16, dionica Bugojno 2-Kupres 1, naselje Čipuljić-Poriče	Projektiranje	50.000				Nabavka usluga projektiranja u toku
			Revizija	5.000				
15.	M6	Rješavanje odvodnje (Izgradnja oborinske kanalizacije) na cesti M6, prolaz kroz Čapljinu	Izvođenje	300.000				
			Nadzor	10.000				
16.	M4	Rekonstrukcija raskrsnice na M4.2 002, naselje Šepići, općina Cazin	Projektovanje	10.000				Priprema PZ
17.	M6.1	Izgradnja pješačke staze uz M6.1_011, Gnojnice-Nevesinje2, naseljeno mjesto Dračevica	Projektovanje	7.000				Priprema TD
			Izvođenje	100.000				
			Nadzor	3.000				
18.	M20	Izgradnja odmorišta uz magistralnu cestu M20_009,Ustikolina- Goražde8, km 0+950	Izvođenje	97.000				Priprema TD
			Nadzor	3.000				
19.	M4	Rekonstrukcija raskrsnice cesta M4 i R469, općina Kalesija, km 8+860	Projektovanje	12.000				Priprema TD
20.	M17	Rekonstrukcija raskrsnice sa M17 i lokalne ceste za naselje Papratnica, dionica M17_006:Ozimica-Topčić Polje, km 9+180, općina Žepče, I faza	Izvođenje	600.000				Pribavljanje suglasnosti u toku
			Nadzor	20.000				
21.	M17.3	Izrada glavnog projekta trake za spora vozila na M17.3_001: - dionica 1: km4+900-km8+200, -dionica 2: km17+600-km18+500	Projektovanje	60.000				PZ u pripremi
			Revizija	7.000				
22.		Glavni projekta Pješačka staza u cestu M17 dionica: Potoci-Mostar L=cca 2,00 km	Projektovanje	10.000				Priprema TD
		U K U P N O		4.463.000			-	

3.2.4. Vanredno održavanje
3.2.4.1. Sanacija i rekonstrukcija cestovnih objekata

Red br.	Mag. Cesta	Naziv i opis projekta	Aktivnosti na projektu	Rebalans Plana 2023.	Izvođač/ Konsultant-ugovor	Ugovoreno	Realizirano 01.01.-31.12.2023	Napomena
1.	M4	Rekonstrukcija mosta preko rijeke Soline u Tuzli (M-04.0-4-05), dionica Šiški Brod – Kalesija – Gr. Ent (Memići), km 9+555	Izvođenje	450.000			-	Pribavljanje suglasnosti u toku
			Nadzor	15.000			-	
2.	M5	Rekonstrukcija mosta (M5-001-8) preko potoka Mrižnica u Kamenici, na cesti M5, dionica Granica RH (Izačić) – Bihać, km 7+765	Izvođenje	450.000			-	Pribavljanje suglasnosti u toku
			Nadzor	15.000			-	
3.	M5	Rekonstrukcija mosta (M5-009- 508) preko potoka Bravnice, na cesti M5, dionica Jajce Jug –Donji Vakuf 1, km 3+746	Projektiranje	20.000			-	Pribavljanje suglasnosti u toku
			Izvođenje	400.000			-	
			Nadzor	12.000			-	
4.	M5	Rekonstrukcija mosta (M5-009- 218) preko Sandžačke rijeke, na cesti M5, dionica Jajce Jug –Donji Vakuf 1, km 26+245	Izvođenje	300.000			-	Pribavljanje suglasnosti u toku
			Nadzor	10.000			-	
5.	M18.1	Rekonstrukcija mosta preko Crne rijeke, skretanje za Govediće (M18.1-001-442) dionica Ustikolina-Grebak-Delijaš-Trnovo, km 40+088	Izvođenje	750.000			-	Pribavljanje suglasnosti u toku
			Nadzor	22.000			-	
6.	M5	Zamjena dilatacija na mostu preko duboke doline na Komaru (M5-010-224), na cesti M5, dionica Donji Vakuf 1 – Turbe, km 17+773, Komar donji	Izvođenje	110.000	Sikra d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-10770/23, 17.11.2023	109.948	31.704	Radovi u toku
			Nadzor	4.000	Institut za građevinarstvo „IG“ d.o.o. Banja Luka, 01-02.1-10771/23, 17.11.2023.	3.393	979	
			Ukupno				32.683	
7.	M17	Zamjena dilatacija na mostu preko Grabovačkog jezera, Ravlići, Aleksin Han (M17-013-316), na cesti M17, dionica Jablanica 1 - Potoci, km 8+537,	Izvođenje	148.000	Sikra d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-8682/23, 12.09.2023.	147.572	147.521	Okončano
			Nadzor	5.000	IGH d.o.o. Mostar, 01-02.1-10006/23, 25.10.2023.	3.475	3.475	
			Ukupno				150.996	
8.	M17	Sanacija dilatacija na mostu preko potoka Jelašje (M17-012-307) u Donjem Papraskom, na cesti M17 dionica Konjic-Jablanica 1, km 17+923	Izvođenje	100.000			-	Priprema TD u toku
			Nadzor	4.000			-	
9.	M18	Zamjena dilatacija na mostu preko rijeke Ljubine (M18-009-390) u Poturovićima, na cesti M18 dionica Olovo – Semizovac, km 31+941	Izvođenje	100.000			-	Priprema TD u toku
			Nadzor	4.000			-	
10.	M18	Zamjena dilatacija na mostu preko rijeke Ljubine (M18-009-392) u Gareži, na cesti M18 dionica Olovo – Semizovac, km 36+957	Izvođenje	100.000	Sikra d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-11250/23, 06.12.2023.	93.504	-	Nabavka usluga nadzora u toku
			Nadzor	4.000			-	
			Ukupno				-	
11	M17	Zamjena dilatacionih naprava na mostu preko rijeke Save (M17-001-574) u Bosanskom Šamcu na stubnim mjestima S9, S13 i OS16, na cesti M17 dionica Granica RH-Bosanski Šamac- Granica entiteta, km 0+000	Izvođenje	200.000	Sikra d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-11250/23, 06.12.2023.	206.303	-	Nabavka usluga nadzora u toku
			Nadzor	7.000			-	
			Ukupno				-	
12.	M5	Rekonstrukcija mosta preko Koševskog potoka u Sarajevu, Skenderija (M 05.0-5-01-a) dionica Stup-Vijećnica-Gr Ent ... Gr Ent Prača-Renovica-Gr Ent Kaljani, km 7+310 - Glavni projekat izmještanja instalacija (elektroinstalacije, vodovod, kanalizacija, telekom)	Projektiranje	20.000	Design&QC d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-11674/23, 20.12.2023.	19.890	-	Izrada u toku gl. Projekta izmještanja instalacija
			Revizija	3.000			-	
			Ukupno				-	

JP CESTE FEDERACIJE BIH

13.	M5	Sanacija mosta preko rijeke Lašve (M5-010-225) u Turbetu., na cesti M5, dionica Donji Vakuf 1-Turbe, km 25 +545	Projektiranje	20.000		-	Priprema PZ u toku
			Revizija	3.000		-	
14.	M17	Sanacija mosta preko Golijaškog potoka (M17-005-171), na cesti M17, dionica Karuše Ozimica, km 28+814	Projektiranje	20.000		-	Priprema PZ u toku
			Revizija	3.000		-	
15.	M17	Sanacija mosta preko Babine rijeke i lokalnog puta (M17-007-176) na cesti M17, dionica Topčić polje – Lašva 0, km 21+935	Projektiranje	25.000		-	Priprema PZ u toku
			Revizija	3.500		-	
16.	M18.1	Rekonstrukcija mosta preko Crne rijeke, Demira mlin (M18.1-001-606) dionica Ustikolina-Grebak-Delijaš-Trnovo, km 40+646	Projektiranje	25.000		-	Priprema PZ u toku
			Revizija	3.500		-	
		UKUPNO		3.356.000		183.679	

3.2.4.2. Sanacija oštećenih asfaltnih kolovoza

Red br.	Mag. Cesta	Naziv i opis projekta	Aktivnosti na projektu	Rebalans Plana 2023.	Izvođač/ Konsultant-ugovor	Ugovoreno	Realizirano 01.01.-31.12.2023	Napomena
1.	M16.2	Sanacija asfaltnog kolovoza na cesti M16.2_001 Bugojno 2 – Gornji Vakuf	Izvođenje	500.000			-	Nabavka u toku
			Nadzor	7.000			-	
2.	M14.2	Sanacija asfaltnog kolovoza na cesti M14.2_002 Krnjeuša – Bosanski Petrovac 4	Izvođenje	400.000	I-Selimović d.o.o. Cazin, 01-02.2-11437/23, 13.12.2023.	399.231	-	Ugovoreno
			Nadzor	7.000			-	
			Ukupno				-	
3.	M14	Sanacija asfaltnog kolovoza na cesti M14_002 Srbijani – Bosanska Krupa 1	Izvođenje	500.000	Kov-Grad d.o.o. Bužim, 01-02.2-11615/23, 19.12.2023.	499.434	-	Ugovoreno
			Nadzor	7.000	Institut za građevinarstvo „IG“ d.o.o. Banja Luka, 01-02.2-11769/23, 25.12.2023.	3.276	-	
			Ukupno				-	
4.	M16.2	Sanacija asfaltnog kolovoza na cesti M16.2_003 Prozor – Jablanica 1	Izvođenje	400.000	HP Investing d.o.o. Mostar, 01-02.2-11689, 21.12.2023.	398.421	-	Ugovoreno, nabavka za nadzor u toku
			Nadzor	7.000			-	
			Ukupno				-	
5.	M17.5	Sanacija kolovoza na cesti M17.5_004: Grude 2 – Privalj	Izvođenje	200.000	Putovi d.o.o. Grude, 01-02.2-9731/23, 16.10.2023.	199.879	-	Ugovoreno
			Nadzor	7.000			-	
			Ukupno				-	
6.	M4	Sanacija kolovoza na cesti M4_012: Simin Han 1 – Donje Caparde	Izvođenje	326.000	Jata Group d.o.o. Srebrenik, 01-02.2-10364/23, 07.11.2023.	326.272	-	Ugovoreno
			Nadzor	7.000			-	
			Ukupno				-	
7.	M15	Sanacija kolovoza na cesti M15: Baraći – Glavica	Izvođenje	400.000	Livnopotovi d.o.o. Livno, 01-02.2-10378/23, 07.11.2023.	399.727	-	Ugovoreno
			Nadzor	5.000			-	
			Ukupno				-	
8.	M16	Sanacija asfaltnog kolovoza na cesti M16_011: Livno 3-Renjići	Izvođenje	500.000	Livnopotovi d.o.o. Livno, 01-02.2-10384/23, 07.11.2023.	499.656	-	Ugovoreno
			Nadzor	3.000	Artin BH d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-11133/23, 01.12.2023.	1.748	-	

JP CESTE FEDERACIJE BIH

			Ukupno					-	
9.	M14	Sanacija asfaltnog kolovoza na cesti M14_003 Bosanska Krupa 1-Bosanska Otoka	Izvođenje	200.000	BC Gradnja d.o.o. Bosanska Otoka, 01-02.2-10411/23, 08.11.2023.	199.567		-	Ugovoreno
			Nadzor	3.000					
			Ukupno					-	
10.	M5	Sanacija kolovoza na cesti M5_012 Nević polje – Kaonik	Izvođenje	700.000					Nabavka u toku
			Nadzor	10.000					
11.	M17.1	Sanacija kolovoza na cesti M17.1 Zavidovići – Ribnica	Izvođenje	800.000	Dobojputevi d.o.o. Doboj Jug, 01-02.2-11768/23, 25.12.2023.	799.040		-	Ugovoreno
			Nadzor	10.000					
			Ukupno					-	
12.	M17	Sanacija kolovoza na cesti M17_007 Nemila – Lašva	Izvođenje	350.000	Dobojputevi d.o.o. Doboj Jug, 01-02.2-10689/23, 16.11.2023.	349.782		-	Ugovoreno
			Nadzor	1.000	Celab d.o.o. Kakanj, 01-02.2-11538/23, 15.12.2023.	1.053		-	
			Ukupno					-	
13.	M16.4	Sanacija kolovoza na cesti M16.4_001 Bugojno-Nević polje (prevoj Rostovo)	Izvođenje	300.000					Nabavka u toku
			Nadzor	7.000					
14.	M5	Sanacija kolovoza na cesti M5_013 Kaonik-Gromiljak (Kaonik-Busovača)	Izvođenje	400.000	Jata Group d.o.o. Srebrenik, 01-02.2-11022/23, 29.11.2023.	350.601		-	Ugovoreno
			Nadzor	7.000	Arting BH d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-11023/23, 29.11.2023.	3.504		-	
			Ukupno					-	
15.	M4.2	Sanacija kolovoza na cesti M4.2_001 Granica BiH/HR-Skokovi	Izvođenje	400.000					Nabavka u toku
			Nadzor	7.000					
16.	M14	Sanacija kolovozne konstrukcije i pješačkih staza na M14. 001 Bihać 4-Srbljani, L=2,00km	Projektiranje	15.000					Nabavka u toku
17.	M17.5	Sanacija kolovoza na cesti M17.5 Blidinje-Posušje	Izvođenje	400.000	KTM Brina d.o.o. Posušje, 01-02.2-11645/23, 20.12.2023.	308.880		-	Ugovoreno
			Nadzor	7.000	IGH d.o.o. Mostar, 01-02.2-11387/23, 11.12.2023.	3.489		-	
			Ukupno					-	
18.	M14.2	Sanacija kolovoza na cesti M14.2_007_ Bos.Šamac-Orašje	Izvođenje	300.000	Jata Group d.o.o. Srebrenik, 01-02.2-10365/23, 07.11.2023.	209.056	163.565		Radovi u toku
			Nadzor	7.000	AIK Inženjering d.o.o. Banovići, 01-02.2-10456/23, 09.11.2023.	2.808		-	
			Ukupno					163.565	
19.	M5	Sanacija kolovoza na cesti M5 Azize Šećerbegović-Korija	Izvođenje	500.000	Sarajevoputevi d.d. Sarajevo, 01-02.2-9706/23, 16.10.2023.	499.963		-	Ugovoreno
			Nadzor	8.000	Arting BH d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-10768/23, 17.11.2023.	1.404		-	
			Ukupno					-	
20.	M14	Sanacija kolovoza na cesti M14_003: Bos.Krupa 1-Bos.Otoka	Izvođenje	160.000					
			Nadzor	3.000					
		UKUPNO		7.871.000			163.565		

JP CESTE FEDERACIJE BIH

3.2.4.3. Sanacija klizišta, odrona, sanacija slijeganja trupa puta, kosina, usjeka i zasjeka

Red br.	Mag. Cesta	Naziv i opis projekta	Aktivnosti na projektu	Rebalans Plana 2023.	Izvođač/ Konsultant-ugovor	Ugovoreno	Realizirano 01.01.- 31.12.2023	Napomena
1.	M16	Sanacija škarpi i nestabilnih kosina na cesti M16_006, dionica: Crna Rijeka-Jajce, lokacija 2 (km 7+050 - km 7+800)	Izvođenje	700.000			-	Nabavka u toku
			Nadzor	30.000			-	
2.	M14	Sanacija škarpi i nestabilnih kosina na cesti Sribljani-Bos.Krupa	Izvođenje	700.000			-	Priprema PZ
			Nadzor	30.000			-	
3.	M16	Sanacija škarpi i nestabilnih kosina na cesti M16_006, dionica: Crna Rijeka-Jajce, lokacija 4 (km 9+270 - km9+700)	Izvođenje	500.000	GP: Mrkonjićputevi d.o.o. Mrkonjić Grad i Struktura d.o.o. Jajce, 01-02.2-11733/23, 23.12.2023.	499.545	-	Ugovoreno
			Nadzor	20.000			-	
			Ukupno				-	
4.	M16	Sanacija škarpi i nestabilnih kosina na cesti M16_006, dionica: Crna Rijeka-Jajce, km 16+130- km16+310	Projektovanje	20.000	PPG d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-11734/23, 23.12.2023.	10.000	-	Projektovanje u toku
			Revizija	4.000			-	
			Ukupno				-	
5.	M16	Sanacija škarpi i nestabilnih kosina na cesti M16_006, dionica: Crna Rijeka-Jajce, km 16+450 - km18+270	Projektovanje	30.000			-	Nabavka u toku
			Revizija	5.000			-	
6.	M16	Sanacija škarpi i nestabilnih kosina na cesti M16_006, dionica: Crna Rijeka-Jajce, km 19+190- km19+800	Projektovanje	30.000	Design&QC d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-11732/23, 23.12.2023.	16.380	-	Ugovoreno
			Revizija	5.000			-	
			Ukupno				-	
7.	M16	Sanacija škarpi i nestabilnih kosina na cesti M16_006, dionica: Crna Rijeka-Jajce, km 20+390 do km20+900	Projektovanje	30.000			-	Nabavka u toku
			Revizija	5.000			-	
8.	M16	Sanacija škarpi i nestabilnih kosina na cesti M16_006, dionica: Crna Rijeka-Jajce, od km 22+550 do km22+670	Projektovanje	15.000			-	Nabavka u toku
			Revizija	3.000			-	
9.	M18	M18, Sanacija slijeganja trupa ceste na M18_010, Semizovac-Sarajevo-Malta, od km 7+750 do km 8+300	Projektovanje	25.000			-	Priprema TD
			Revizija	3.000			-	
10.	M16.2	Sanacija škarpi zasjeka, cesta M16.2, dionica 002, Gornji Vakuf – Prozor , na potezu od km 13+000 do km 15+150 II faza	Izvođenje	300.000			-	Nabavka u toku
			Nadzor	10.000			-	
11.	M17	Sanacija škarpi i nestabilnih kosina na cesti M17_013,dionica: Jablanica -Potoci	Projektovanje	25.000			-	Priprema PZ
			Revizija	5.000			-	
12.	M17	Sanacija škarpi i uklanjanje ili stabilizacija Ostenjaka iznad ceste M17 i brane HE Grabovica	Projektovanje	30.000			-	Priprema PZ
			Revizija	5.000			-	
13.		Izrada projektne dokumentacije za novonastale sanacije slijeganja, klizišta i škarpi	Projektovanje	100.000			-	
14.	M5	Sanacija slijeganja trupa ceste, dionica: Jajce Jug-Donji Vakuf, km13+300	Projektovanje	6.800	Design&QC d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-5162/23, 05.07.2023.	6.786	6.786	Okončano
			Izvođenje	170.000	Jata Group d.o.o. Srebrenik, 01-02.2-7761/23, 22.08.2023.	169.932	155.010	
			Ukupno				161.796	
		UKUPNO		2.806.800			161.796	

4. Eksproprijacija i elaborati eksproprijacije

Za projekte gdje su neophodne pripreme za eksproprijaciju, elaborati eksproprijacije, kao i vještačenja i konsultantske usluge (pravna pomoć) JP Ceste F BiH su realizirale vlastita sredstva u iznosu od 1,41 mil. KM.

O P I S	Rebalans Plana 2023.	Izvođač/ Konsultant - ugovor	Ugovoreno	Realizovano 01.01.- 31.12.2023.
Elaborati eksproprijacije i pripreme faze za eksproprijaciju (vještačenja, pretvorbe zemljišta..i sl.)				
Pripreme faze za eksproprijaciju (vještačenja, pretvorbe zemljišta..i sl.)				
- Elaborat M1.9 poboljšanje sigurnosti i prometa industrijska zona Gradačac	100.000	Geo_xyz d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-2489/23 31.03.2023.	3.159	3.159
- M18_007 izgradnja trake za spora vozila , dionica: Živince-Vitalj, poddionica Gojsalići Vitalj, podrčje općine Kakanj			2.574	2.574
- Cesta M4, rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok na cesti M4, ulaz u Lukavac			1.170	1.170
- Izgradnja Obilaznice Livna		Ugovor o djelu	300	300
- Rekonstrukcija raskrsnice za naselje Duge, općina Prozor			949	949
- Izgradnja obilaznice Bugojna		Ugovor o djelu	356	356
- Rekonstrukcija raskrsnice magistralne ceste M18_006: Šićki Brod 3-Živinice I i regionalne ceste R455b, km 6+100, grad Živinice		Geo_xyz d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-11777/23 25.12.2023.	1.404	-
Izgradnja Obilaznice Bihaća		Ugovor o djelu	4.447	4.447
Ulaz u Stolac (Vidovo Polje, veza na M6) L=1,3 km		Ugovor o djelu	10.201	10.201
Rekonstrukcija raskrsnice M17-sjeverni priključak Mostara		Ugovor o djelu	901	901
Konsultantske usluge –pravna pomoć				
Izgradnja Obilaznice Bihaća		Ugovor o djelu	2.824	2.824
Rekonstrukcija raskrsnice i LC/naselje Brekovića, Bihać-Srbljani 7+830		Pravna pomoć	281	281
U K U P N O	100.000			27.162

Red. br.	Mag. Cesta	NAZIV PROJEKTA	Rebalans Plana 2023.	Realizovano 01.01.- 31.12.2023.
1.	M17.3	Neum – Stolac, dionica: Stolac-Drenovac (Poplat)	4.000.000	
2.	M6.1	Južna Obilaznica Mostara, servisna saobraćajnica na dionici Međine - Miljkovići i dionici Miljkovići – Rodoč - veza na M17		
3.	M14	Obilaznica Bihaća, dionica Izačić - Kamenica, cca 3 km		957.550
4.	M16.4	Obilaznica Bugojna		5.850
5.	M4.2	Obilaznica Cazina		
6.	M6	Južna obilaznica Gruda (I faza)		40.871
7.	M14.1	Izgradnja magistralne ceste Bihać - Bosanska Krupa, Srbljansko – Grmuški plato, L= 25 km		
8.	M5	Rekonstrukcija raskrsnice cesta M-5 i R-403 u Kamenici		
9.	M5	Bihać: Devijacija pored Robota i Doma zdravlja Bihać		
10.	M1.8	Rekonstrukcija raskrsnice ceste M-1.8 u Špionici dionica (003), km 21+200		
11.	M18	Rekonstrukcija raskrsnice ceste M-18 "Husino" dionica (006), km 2+500		
12.	M4	Rekonstr. raskrsnice ceste M-4 i lokane ceste za Bistarac, dionica (010): Donja Orahovica-Šićki Brod, km 23+500		
13.	M6.1	Rekonstrukcija ceste M-6.1, dionica (010), km 9+000 do 10+000 Dobrič		
14.	M5	Rekonstrukcija raskrsnice M-5 i lokalne ceste Dolac na Lašvi, dionica (011), km 10+200-9+950		
15.	M5	Izgradnja pješačke staze u neslju Izačić, M5_001, km 2+450 – km 3+000		
16.	M1.8	Rekonstrukcija raskrsnice u naselju Čehaje		

JP CESTE FEDERACIJE BIH

17.	M17	Topčić Polje – Lašva 0, km 1+600 i km 3+880		
18.	M18	Priboj 2 – Simin Han 0, km 9+100 – km 9+200		
19.	M18	Priboj 2 – Simin Han 1, km 11+050 do km 21+300		
20.	M15	Kamičak – Ključ, km 17+000		
21.	M4	Magistralna cesta Doboj - Tuzla, dionica Drežnik (bolnica „Kreka“) - petlja Šićki Brod		2.074
22.	M6.1	Izgradnja pješačke staze na dionici: Mostar - Široki brijeg, kroz naseljeno mjesto Medine		
23.	M18	Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok na Šipu, općina Centar, Sarajevo		
24.	M14	Izgradnja kružnog toka u Bosanskoj Krupi (kolodvor) dionica 002		
25.	M15	Izgradnja kružnog toka u Sanskom Mostu na spoju cesta M-15 i R-405 dionica 003		
26.	M5	Rekonstr. raskrsn. cesta M-5 i M-16.4 u kružni tok, M-5, (012), km 0+000 (Nević Polje)		
37.	M18	Rekonstruk. raskrsnice cesta M-17 i ulice Safeta Zajke u kružni tok, M-17, (008), km 7+350		
28.	M5	Rekonstrukcija raskrsnica na obilaznici Viteza		
29.	M18	Rekonstrukcija raskrsnica na cesti M-18 u kružne tokove (prolaz kroz Vogošću)		
30.	M17	Izgradnja potpunjaka za naselje Nemila, M-17		
31.	M17	Rekonstrukcija cme tačke Bulajića krivina na M-17 013, km 35+80 do 36+800		
32.	M5	Izgradnja traka za spora vozila, Bihać - Bos.Petrovac, dionica: Ripač - Dubovsko		
33.	M17	Izgradnja pješačkog prelaza izvan nivoa kolovoza za naselje Nemila, km 4+700		
34.	M4.3	Izgradnja Obilaznice Bužim		
35.	M6.1	Izgradnja trake Tomislavgrad-Široki		
36.	M5	Rekonstrukcija ceste devijacija puta V korpusa AVNOJ-a		
37.	M5	Izgradnja Obilaznice Donji Vakuf		
38.	M20	Rekonstrukcija raskrsnice Goražde-Ustiprača km 0+550, na Obilaznici Goražda		
39.	M17.3	Izgradnja Obilaznice Stoca		
40.	M18	Treća traka Čevljanovići – Nišići		
41.	M17	Petlja Drivuša		
42.		Drugi projekti za koje neophodna eksproprijacija, a nisu obuhvaćeni tabelom		
	-	Izgradnja Obilaznice Livna		45.136
	-	Rekonstrukcija raskrsnice sa R463 u kružni tok		111.305
	M17.3	Neum-Stolac		57.497
	M17.3	Ulaz u Stolac (Vidovo Polje, veza na M6) L=1,3 km		107.109
	M18	Rekonstrukcija raskrsnice Kobilja Glava-Sarajevo-Malta 8+340		55.440
UKUPNO			4.000.000	1.382.832

5. Projekti iz Budžeta Federacije BiH i sufinansiranja iz drugih nivoa vlasti

a/ Vlada F BiH je donijela Odluku o usvajanju Programa utroška dijela sredstava „Kapitalni transferi javnim preduzećima – transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta“ V broj: 1155/2019. utvrđenih Budžetom F BiH za 2019. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija, nakon koje se svake godine, planiraju sredstva iz Budžeta F BiH i donose odluke, kojima se utvrđuju projekti sa finansijskom strukturom i određuje implementator projekata.

JP Ceste F BiH su na osnovu Odluka Vlade F BiH V broj: 370/2023, 508/2023, 509/2023, 578/2023, 648/2023, 1560/2023, 1889/2023 i 1890/2023 zadužene za implementaciju sljedećih projekata iz Budžeta F BiH za 2023. godinu:


JP CESTE FEDERACIJE BIH

Red br.	Mag. Cesta	Naziv i opis projekta	Aktivnosti na projektu	Rebalans Plana 2023.	Izvođač/ Konsultant - ugovor	Ugovoreno	Realizovano 01.01.- 31.12.2023.	Napomena
1.	M5	Izgradnja brze ceste Lašva-Nević polje –prolaz kroz poslovnu zonu Vitez (LOT4)	Eksproprijacija	2.000.000			-	Nabavka projekt. u toku
			Projektovanje				-	
2.	M6.1	Izgradnja Južne obilaznice Mostara (1mil.KM) i pristupne ceste Varda-Rodoč (4mil.KM)	Eksproprijacija	1.000.000			4.335	U toku
			Projektovanje				-	
			Izvođenje	4.000.000			-	
			Nadzor		GP:IGH d.o.o. Mostar i Institut IGH d.d.Zagreb, 01-02.1-7720/22	847.693	437.262	
			Ukupno				441.597	
3.	M17 M17.4	Izgradnja i rješavanje spoja magistralnih cesta M17.4 i M17, te sanacija i rekonstrukcija magistralnih cesta i rasvjeta na M17 Ortiješ u gradu Mostaru	Eksproprijacija	1.000.000			369.251	U toku
			Projektovanje		T3 Consulting Tim d.o.o. Sarajevo 01-02.1-3676/23 16.05.2023.	6.973	6.973	
					T3 Consulting Tim d.o.o. Sarajevo 01-02.1-7051/23 25.07.2023.	6.944	6.944	
					Manedra Company d.o.o. Mostar 01-02.2-11986/22		6.949	
			Revizija		ProKonsIng d.o.o. Mostar 01-02.1-7911/23 28.08.2023.	2.340	2.340	
			Izvođenje		Elko-Marić d.o.o. Mostar 01-02.2-4007/23		89.412	
			Nadzor		-		-	
			Ukupno				481.869	
4.	M18	Poddionica: Šićki Brod-Đurđevik na trasi ceste Tuzla –Sarajevo	Eksproprijacija	4.000.000			1.558.637	Projektiranje za LOT 2 okončano za LOT 1 u toku Eksproprijacija u toku . Nabavka radova za LOT 2 u toku
			Projektovanje		GP: AIK-inženjering d.o.o. Banovići i HS inženjering d.o.o. Sarajevo	11.583	11.583	
					INK Constructor d.o.o. Banja luka 01-02.1-5663/21 14.05.2021.	58.734 (preneseno 11.747)	11.747	
					GP: PPG d.o.o. Sarajevo, Divel d.o.o.Sarajevo i Infra d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-4892/22 21.09.2022.	1.219.243 (preneseno 357.121)	-	
					Institut za građevinarstvo d.o.o. Banja luka 01-02.1-12389/22 29.12.2022.	89.856	-	
			Izvođenje				-	
			Nadzor				-	
			Ukupno				1.581.967	
5.		Izgradnja gradskog autoputa u Sarajevu, dionica:Stup- Buća potok-Pofalići – Velešići-Bentbaša	Projektovanje	3.000.000	GP: Divel d.o.o., Ipsa Institut d.o.o. PPG d.o.o.,Saraj inženjering d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-10265/20. 29.10.2020	1.604.105 (preneseno 1.538.805)	-	Izrada i revizija projekata u toku
					GP: Divel d.o.o. Sarajevo, Ipsa Institut d.o.o. Sarajevo, PPG d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-3273/22.	1.084.724 (oreneseno 962.681)	146.640	

JP CESTE FEDERACIJE BIH

					06.05.2022.			
			Revizija		TZI –Inžinjer d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-993/21.	80.968	-	
					28.01.2021.			
					IG d.o.o.Banja luka 01-02.1- 2941/23.	75.348	22.604	
			Studije		17.04.2023.			
					Ipsa d.o.o.Sarajevo 01-02.1-9491/21. 20.09.2021.	88.569 (preneseno 26.571)	26.571	
			Ukupno				195.815	
6.		Rekonstrukcija i sanacija ceste Kreševo-Kiseljak	Eksproprijacija	500.000			-	
			Projektovanje				-	Na dionici Tomića krivina – Alagići radovi u toku. Za dionicu Alagići – Resnik nabavka u toku
			Izvođenje	3.500.000	GP: Dobojuputevi d.d. Dobj Jug i Euro Asfalt d.o.o. Sarajevo 01-02.1- 9865/23 20.10.2023.	2.434.770	272.555	
			Nadzor		GP: PPG d.o.o. Sarajevo i Celab d.o.o. Sarajevo 01- 02.1-10777/23 20.11.2023.	17.601	-	
			Ukupno				272.555	
7.	M18	Sufinansiranje izgradnje XII transferzale spoj od Stupske petlje do areodroma Sarajevo	Eksproprijacija	2.000.000			-	
			Projektovanje				-	
8.		Rekonstrukcija dijela tomlavgradske obilaznice	Projektovanje				-	
			Izvođenje	1.000.000	Livnoputovi d.o.o. Livno 01-02.2-11863/23 28.12.2023. god	486.155	-	TD za radove - II dio u pripremi
			Nadzor				-	
9.	M5	Izgradnja obilaznice Kiseljaka II faza (tunel i trasa)	Eksproprijacija	2.000.000			-	Podnesen zahtjev za urbanističku suglasnost i zahtjev za utvrđivanje javnog interesa
			Izvođenje				-	
			Nadzor				-	
		UKUPNO		30.000.000			2.973.804	

Za projekat „Spoj magistralnih cesta M17.4 i M17, ta sanacija i rekonstrukcija magistralnih cesta i rasvjeta na M17 Ortiješ u gradu Mostaru“ na pojedinim dionicama je predviđena kompletna izmjena komunalnih instalacija koje su u nadležnosti Grada Mostara. U cilju efikasnije realizacije projekta zaključen je „Sporazum o implementaciji pojedinih dionica kroz grad Mostar“ na temelju kojeg dionice implementira Grad Mostar.

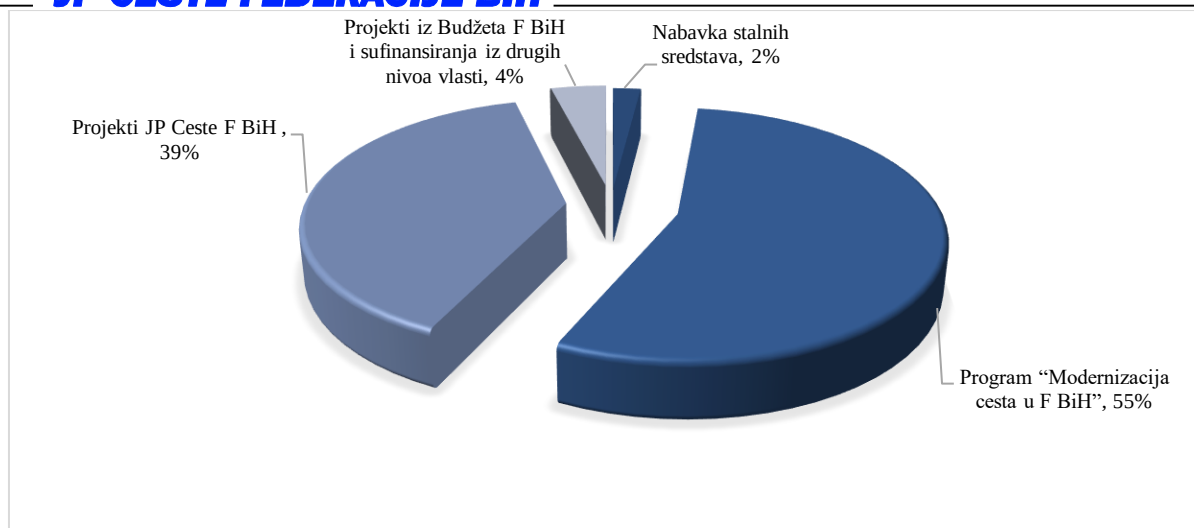*Grafički prikaz realizovane strukture investicija*

D. ODJEL ZA JAVNE NABAVKE

Izveštaj o radu je urađen na bazi raspoloživih podataka, i odnosi se na nabavke provedene po Zakonu o javnim nabavkama BiH.

Nabavke za navedeni period su realizovane u skladu sa Privremenim planom nabavki za 2023.godinu i Planom nabavki za 2023.godinu.

Za navedeni period na osnovu provedenih postupaka nabavki ugovoreno je 255 ugovora u iznosu od 86.535.498,70 KM. Od navedenih ugovora 52 ugovora su potpisana na osnovu postupaka nabavki koji su provedeni u 2022.godini, a 203 ugovora je potpisano na osnovu postupaka nabavki koji su pokrenuti i okončani u 2023.godini

- Ugovorene nabavke po vrstama postupaka uključujući vrijednosti –

Vrsta postupka nabavke	Iznosi u KM (sa PDV-om)	Broj ugovora
Otvoreni	34.861.510	148
Konkurentski	242.493	14
Pregovarački	2.881.671	14
Direktni sporazumi	315.611	61
Neprioritetne usluge	36.930	2
Ograničeni postupak	48.197.284	16
Ukupno	86.535.499	255

Za 32 provedena postupka nabavki se čeka ugovaranje.

Za 4 postupka nabavki su dostavljene ponude i u toku je procjena ponuda.

Poništena su 42 postupka nabavki.

- Žalbe

Tokom godine je podneseno 70 žalbi, od kojih su do 31.12.2023.godine riješene 62 žalbe, te su

postupci nabavke nastavljani. Osam žalbi je na rješavanju u URŽ.

Tokom 2023.godine u odjel za nabavke je uposlen jedan uposlenik.

E. PRAVNI I KADROVSKI POSLOVI

Sektor pravnih, kadrovskih i općih poslova JP Cesta F BiH sve svoje poslove i aktivnosti bazira na primjeni svih pozitivnih zakonskih propisa koji su doneseni i važe u F BiH, odnosno u državi BiH kao i svih izmjena i dopuna koje se donesu u planiranoj godini.

Svi pravni poslovi se dijele na sve oblasti prava i to prvenstveno na oblast privrednog prava, gdje se reguliše rad privrednih društava, javnih preduzeća itd.. kao i oblast parničnih, vanparničnih, prekršajnih, izvršnih i upravnih postupaka i imovinsko-pravnih poslova. Najveća aktivnost ovog pravnog Sektora usmjerena je na organizaciju i zastupanje JP Ceste F BiH pred nadležnim sudovima u F BiH, u BiH i u pojedinim predmetima i u regionu.

Vođene su aktivnosti na pokretanju tužbi, gdje se kao tužilac pojavljuje JP Ceste F BiH, kao i pokretanje izvršnih prijedloga na temelju pravosnažnih i izvršnih presuda protiv korisnika koji redovno ne plaćaju svoje obaveze, te pokretanje tužbi za naknadu štete na cestovnoj opremi i sl. Izdvajamo također i aktivnosti na regresnim tužbama gdje za to postoje zakonski uslovi.

U sudskim postupcima gdje se JP Ceste F BiH pojavljuje u ulozi tužitelja, broj aktivnih tužbi JP Ceste F BiH protiv trećih lica na dan 31.12.2023.god. iznosi 38 predmeta (naplata za cestovno zemljište, regresne tužbe i oštećenje cestovne opreme). Broj aktivnih tužbi protiv JP Ceste F BiH na dan 31.12.2023.god. iznosi 236 predmeta.

U oblasti imovinsko-pravnih poslova vodile su se aktivnosti na provođenju postupka eksproprijacije nepokretnosti, zaključivanju sporazuma o naknadi na planiranim projektima kao i onim već otpočetim te zastupanje pred organima uprave-uglavnom općinskim radi sporazumnog određivanja naknada za izuzete nekretnine kao i zastupanje pred svim sudovima (vanparnični i parnični postupak) u okviru rješavanja imovinsko-pravnih poslova. Broj aktivnih predmeta imovinsko-pravne prirode na dan 31.12.2023.god. iznosi 21 predmet (parnični i vanparnični) a u izvještajnom periodu zaprimljeno je 5 novih predmeta.

U izvještajnom periodu su obavljane aktivnosti na usklađivanju akata JP Ceste F BiH sa izmjenama i dopunama pozitivnih propisa, kao i aktivnosti na izradi nacrti i prijedloga opštih akata preduzeća za usvajanje od strane nadležnih organa JP Ceste F BiH.

U periodu 01.01.- 31.12.2023. godina obavljane su aktivnosti koje se odnose na sve stručne i administrativne poslove vezane za rad i funkcionisanje organa JP Ceste F BiH i to: Uprave, Odbora za reviziju, Nadzornog odbora i Skupštine društva. Vršene su pripreme sjednica organa JP Ceste F BiH, pripremanje i distribucija materijala za iste kao i aktivnosti vezane za realizaciju odluka i zaključaka sa sjednica Skupštine, Nadzornog odbora, Odbora za reviziju i Uprave ovog preduzeća.

U izvještajnom periodu održane su 5 sjednice Skupštine, 5 sjednice Nadzornog odbora (konstituirajuća i redovna), 12 sjednica Odbora za reviziju i 25 sjednica Uprave JP Ceste F BiH.

JP CESTE FEDERACIJE BIH

U skladu sa Odlukom o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora JP Ceste F BiH d.o.o. Sarajevo V. broj: 271/2023 koju je Vlada Federacije BiH donijela 16.02.2023. godine, a Skupština društva je dana 24.03.2023. godine donijela Odluku o razrješenju dužnosti članova Nadzornog odbora JP Ceste Federacije BiH broj: 01-03.2SK-2216-1/23 na osnovu koje je i razriješen Nadzorni odbor.

U skladu sa Odlukom o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje v. d. članova Nadzornog odbora JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo V. broj: 272/2023 koju je Vlada Federacije BiH donijela dana 16.02.2023. godine, Skupština društva je dana 24.03.2023. godine donijela Odluku o imenovanju članova Nadzornog odbora, broj: 01-03.2SK-2216-2/23 na period do najviše tri mjeseca, odnosno do okončanja konkursne procedure, počev od dana stupanja na snagu Odluke Skupštine JP Ceste F BiH d.o.o. Sarajevo, kojom su imenovani v.d. članova Nadzornog odbora. Nadzorni odbor je konstituisan u sastavu:

1. Anis Krivić – v. d. predsjednika
2. Amir Omerović - v.d. člana
3. Igor Josipović – v.d. člana
4. Željko Petrović- v.d. člana
5. Mustafa Abdulahović-v.d. člana

U navedenom sastavu je održana jedna redovna sjednica.

U skladu sa Odlukom o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora JP Ceste F BiH d.o.o. Sarajevo V. broj: 983/2023 koju je Vlada Federacije BiH donijela na 8. Sjednici održanoj dana 18.07.2023. godine, Skupština društva je dana 14.08.2023. godine donijela Odluku o razrješenju dužnosti članova Nadzornog odbora JP Ceste Federacije BiH broj: 01-03.2SK-7143-1/23 na osnovu koje je i razriješen Nadzorni odbor u navedenom sastavu.

Također, u skladu sa Odlukom o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje v. d. članova Nadzornog odbora JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo V. broj: 984/2023 koju je Vlada Federacije BiH donijela na 8. Sjednici održanoj dana 18.07.2023. godine i 3. Hitnoj sjednici održanoj dana 25.07.2023. godine, Skupština društva je dana 14.08.2023. godine donijela Odluku o imenovanju vršioca dužnosti članova Nadzornog odbora, broj: 01-03.2SK-7143-2/23 na period do najviše tri mjeseca, odnosno do okončanja konkursne procedure, počev od dana stupanja na snagu Odluke Skupštine JP Ceste F BiH d.o.o. Sarajevo, kojom su imenovani v.d. članova Nadzornog odbora u sljedećem sastavu:

1. Željko Petrović – v.d.predsjednika
2. Igor Josipović - v.d. člana
3. Ahmed Mušija– v.d. člana
4. Nermin Bojčić- v.d. člana
5. Nermin Jašarević- v.d. člana

Na osnovu Odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Ceste F BiH d.o.o. Sarajevo za razrješenje izvršnog direktora za tehničke poslove V. broj: 1498/2023 od 20.10.2023. godine, koju je Vlada Federacije BiH donijela na 16. sjednici održanoj 04.10.2023. godine i 17. sjednici održanoj dana 20.10.2023. godine, te čl. 17. i 32. Statuta JP Ceste Federacije Bosne i Hercegovine

d.o.o. Sarajevo, Nadzorni odbor JP Ceste F BiH d.o.o. Sarajevo je dana 09.11.2023. godine donio Odluku o razrješenju izvršnog direktora za tehničke poslove Javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo Nijaza Hadžikadunića, a na osnovu Odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Ceste F BiH d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju vršilaca dužnosti izvršnog direktora za tehničke poslove do okončanja konkursne procedure, a najduže na vremenski period do dvanaest mjeseci V. broj 1499/2023 od 20.10.2023. godine, te čl. 17. i 32. Statuta JP Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo Nadzorni odbor je donio Odluku o imenovanju vršioca dužnosti izvršnog direktora za tehničke poslove Ademira Toromanovića.

Na osnovu Odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Ceste F BiH d.o.o. Sarajevo za razrješenje izvršnog direktora za ekonomske i pravne poslove Bekira Isakovića V. broj: 1498/2023 od 20.10.2023. godine, koju je Vlada Federacije donijela na 16. sjednici održanoj 04.10.2023. godine i 17. sjednici održanoj dana 20.10.2023. godine, te čl. 17. i 32. Statuta JP Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo, Nadzorni odbor je dana 09.11.2023. godine donio Odluku o razrješenju izvršnog direktora za ekonomske i pravne poslove Javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo, a na osnovu Odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Ceste F BiH d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju vršioca dužnosti izvršnog direktora za ekonomske i pravne poslove do okončanja konkursne procedure, a najduže na vremenski period do dvanaest mjeseci V. broj 1499/2023 od 20.10.2023. godine, te čl. 17. i 32. Statuta JP Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo, Nadzorni odbor JP Ceste F BiH d.o.o. Sarajevo je na istoj sjednici donio Odluku o imenovanju V.D. izvršnog direktora za ekonomske i pravne poslove u Javnom preduzeću Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo Luku Raguža.

Iz navedenog je evidentno da su Upravu JP Ceste F BiH do 09.10.2023. godine činili:

1. Ljubo Pravdić - direktor
2. Nijaz Hadžikadunić - Izvršni direktor za tehničke poslove
3. Bekir Isaković - Izvršni direktor za ekonomske i pravne poslove

Od 10.10.2023. godine Upravu čine:

1. Ljubo Pravdić - direktor
2. Ademir Toromanović - v.d. Izvršnog direktora za tehničke poslove
3. Luka Raguž - v.d. Izvršnog direktora za ekonomske i pravne poslove

U oblasti općih poslova provodile su se aktivnosti na održavanju voznog parka, održavanju sistema mašinskih instalacija-grijanje i hlađenje, održavanju elektro i vodoinstalacija, održavanju radnih prostorija i poslovi protivpožarne zaštite te poslovi digitalnog protokola.

Također, u izvještajnom periodu su se obavljali poslovi iz oblasti radnih odnosa i kadrovski poslovi u skladu sa zakonom i opštim aktima. Obavljane su aktivnosti na prijemu novih radnika (poslovi sekretara Komisije i sačinjavanje svih potrebnih akata) u skladu sa Zakonom i opštim aktima JP Ceste F BiH kao i redovne svakodnevne aktivnosti iz ove oblast.

Na dan 31.12.2023. god. obrazovna struktura radnika (ažurirano) JP Ceste F BiH je sljedeća:

Red.br.	Vrsta školske spreme	Stanje 31.12.2023.
1.	Doktori nauka (1.građ.i 1.saobr.1. ecc)	3
2.	Magistri nauka (saob, ecc, komunikologije)	3
3.	Magistri struke (saob. građ. mašin. ecc. prava, komunikologije, geografije)	17
4.	VSS građevinske struke	29
5.	VSS saobraćajne struke	3
6.	VSS ekonomske struke	12
7.	VSS pravne struke	9
8.	VSS geodetske struke	1
9.	VSS arh.	1
10.	VSS infor.struke	1
11.	VSS dipl.ing.sigur	2
12.	VSS dipl.ing.sigurnosti i pomoći	1
13.	VSS bakalaureat (umjetnosti) međunarodnih odnosa	1
14.	VSS (ing.građevine, ing.cest.saobraćaja ekonomist,bach.poslovanja)	6
15.	SSS građevinski tehničari	2
16.	SSS mašinske struke SSS saobraćajne struke	3
17.	SSS mašinske struke	1
18.	SSS ekonomske struke	4
19.	SSS ostale struke (društveni,prirodni, opšti, tehnički, elektro smjer)	3
	U K U P N O	102



Direktor

Ljubo Pravdić, dipl.ing.građ.
